

ГАРЧИГ

<i>НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН ТУХАЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА</i>	2
1.1. <i>Төслийн төлөвлөлт, ажиллах хүч</i>	
<i>ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛТАЙ ХОЛБОГДОХ НӨЛӨӨЛӨЛ</i>	3
<i>ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. 2022 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ</i>	5
3.1. <i>Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт</i>	5
3.2. <i>Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний биелэлт</i>	6
3.3. <i>Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт</i>	7
3.4. <i>Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт</i>	8
3.5. <i>Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт</i>	9
3.6. <i>Тухайн жилийн орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт</i>	10
3.7. <i>Удирдлага зохион байгуулалтын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт</i>	12
3.8. <i>Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжилтийг нөлөөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнасан байдал</i>	13
<i>ДҮГНЭЛТ</i>	16

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН ТУХАЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хүснэгт 1. Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Үндсэн үзүүлэлтүүд	Тайлбар
Төслийн нэр	“Шохой болон хөнгөн бетон үйлдвэрлэх үйлдвэр”
Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага	“Силикат” ХК
Төсөл хэрэгжүүлэгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, регистрийн дугаар	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 1910010007 Регистрийн дугаар: 2050463 Харилцах утас: 99053180, 99053485
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р баг, Үйлдвэрийн район, өөрийн байр.
Төслийн байршил	Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутагт 43736.0 м ² талбайд хэрэгжинэ.

Төслийн байршил: Уг “Хөнгөн бетон блок, шохойн үйлдвэр” нь Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутагт газар эзэмших эрхийн 0079244 тоот гэрчилгээ бүхий 43736.0 м² талбайд хэрэгжинэ.


Хүснэгт 2. Төсөл хэрэгжих талбайн солбицол

№	Хойд өргөрөг	Зүүн уртраг
1	49° 26' 10.537"	105° 57' 55.971"
2	49° 26' 3.736"	105° 58' 2.756"
3	49° 26' 2.303"	105° 57' 59.274"
4	49° 26' 0.482"	105° 57' 54.604"
5	49° 26' 0.827"	105° 57' 54.296"
6	49° 26' 4.359"	105° 57' 50.835"
7	49° 26' 4.754"	105° 57' 51.820"
8	49° 26' 4.818"	105° 57' 51.980"
9	49° 26' 5.002"	105° 57' 52.439"
10	49° 26' 5.134"	105° 57' 52.767"
11	49° 26' 5.234"	105° 57' 52.666"
12	49° 26' 6.823"	105° 57' 51.048"
13	49° 26' 6.459"	105° 57' 50.169"
14	49° 26' 6.563"	105° 57' 50.069"
15	49° 26' 6.752"	105° 57' 49.886"
16	49° 26' 7.509"	105° 57' 49.157"
17	49° 26' 7.633"	105° 57' 49.034"



Төслийн талбайн байршил

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум.

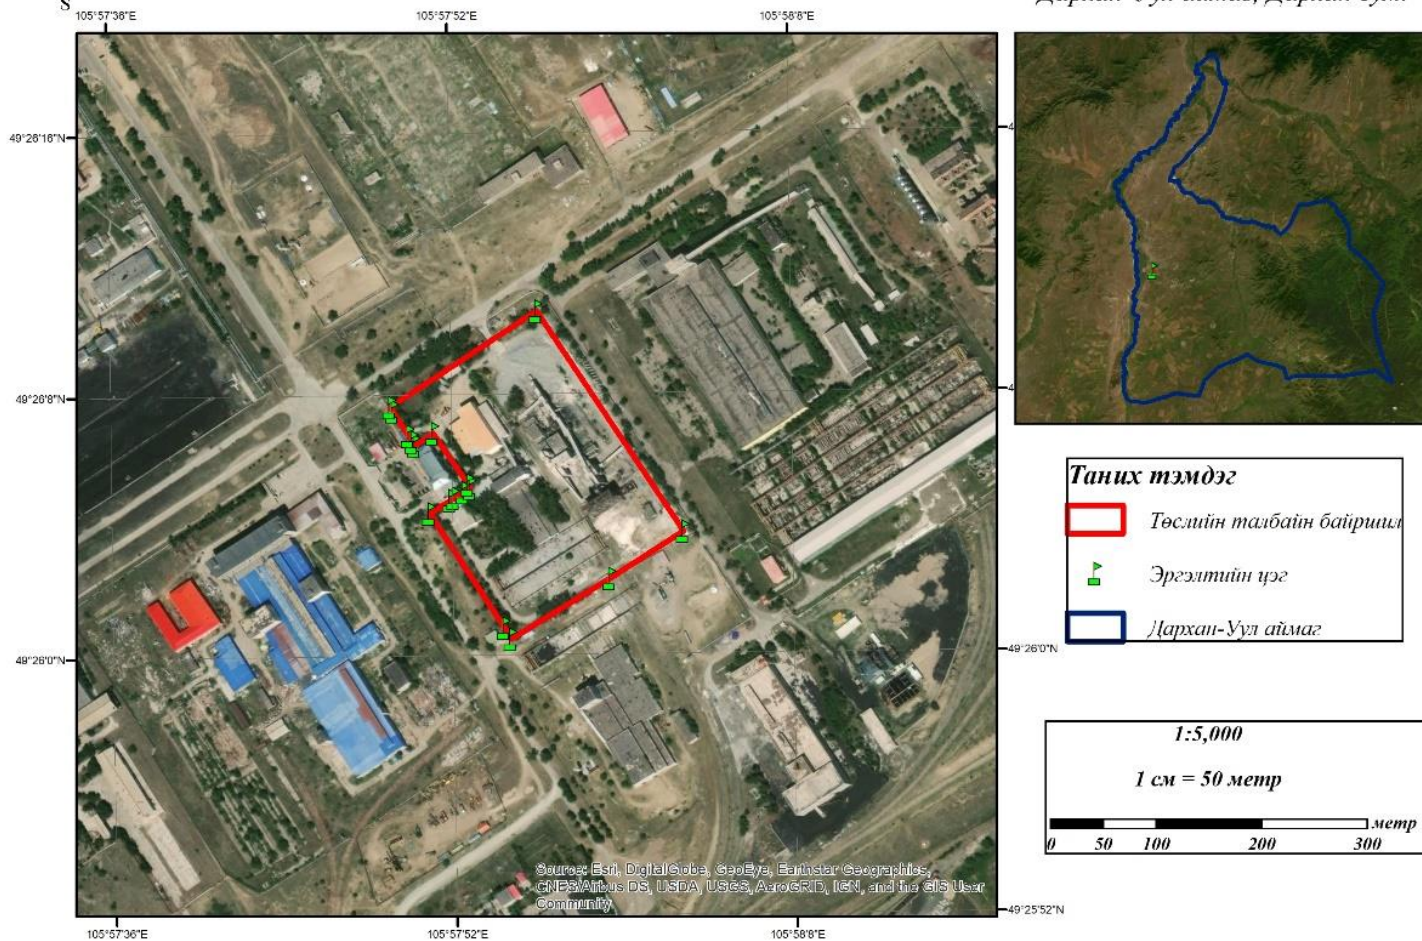

Зураг 1. Төслийн байршилын зураг

“Силикат” ХК-ийн товч танилцуулга

- ✓ 1966 онд “Силикат тоосго, шохойн үйлдвэр” нэрээр Дархан хотын анхны аж үйлдвэр болон баригдаж баригдсан.
- ✓ 1966 оноос 1992 он хүртэл тасралтгүй ажилласан ба тухайн үеийн Монгол улсын ханын материалын хэрэгцээний 25%ийг дангаар хангаж байсан түүхтэй.
- ✓ 2004 онд Ц.Содбилэг нь “Силикат”ХК-ийг худалдан авч 2006 онд силикат цагаан тоосгоны дамжлагыг Силикат хөнгөн блокны үйлдвэр болгон шинэчилсэн.
- ✓ Силикат шохойн үйлдвэрийг бүрэн сэргээн засварлаж шинэчилж, үйлдвэрлэлээ явуулж ирсэн.

1.1.Төслийн төлөвлөлт, ажиллах хүч

Хөнгөн бетон блокны үйлдвэр

Хөнгөн блок нь 360 х 180 х 600 ба 360 х 240 х 600 гэсэн хэмжээтэйгээр хоногт 150 м³, жилд 40000 м³ хөнгөн бетон блок үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Бэлэн бүтээгдэхүүний талбайг 4000 м³ хөнгөн блокоор жил бүрийн өвөл 10-12 сарын хооронд дүүргэдэг.

Цахилгаан хангамж

150 мм-н диаметртэй өндөр даралтын уурын шугамаар ДДЦС ТӨХК-тай холбогдсон. 6000/400кВа цахилгаан дэд станцтай.

Усан хангамж

Усны эх үүсвэр

Төвийн дулаан, цэвэр бохир усны шугамд холбогдсон болно. 2022 онд 10000 м³ хөнгөн бетон блок үйлдвэрлэн Дархан Уул аймаг төдийгүй Эрдэнэт, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ зэрэг төвийн бүсийн бүхий л хэрэглэгчдэд авто замаар болон төмөр замаар тээвэрлэн нийлүүлж байна.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. Төслийн байршилтай холбогдох нөлөөлөл

Төсөл хэрэгжих байршлын хувьд хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэх, түүх соёлын археологийн олдворт газарт ямар нэгэн нөлөөлөл байхгүй.

**ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. 2022 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
 ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

3.1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 2 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Хугацаа ба давтамж	Зардал, мян.төг	Төлөвлөлтийг хэрэгжүүлсэн байдал
Агаар орчин				
Тоосжилт үүсэх	Тоосжилтын хяналтыг тоосжилт үүсэх эх үүсвэрүүд болон ажлын байранд тогтмол хийж, ихэссэн үед нь холбогдох арга хэмжээ авч байх	Төсөл хэрэгжих хугацаанд	300.0	Тоосжилтын хяналтыг ажлын байранд тогтмол хийж, түүхий эд тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь тоосжилт үүсэхээс сэргийлж хучлагатай тээвэрлэлт хийн ажиллаж байгаа.
	Түүхий эд тээвэрлэхдээ асгарах, тоосрохоос хамгаалсан хучлагатай байх	Төсөл хэрэгжих хугацаанд	Үйл ажиллагааны зардлаас	
	Төсөлд хэрэглэгдэж буй тээврийн хэрэгслүүд оношлогоог тогтмол хийлгэх	Төсөл хэрэгжих хугацаанд	500.0	
Хөрс, ургамал				
Ажилчдын оффис, үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдал нь хөрс бохирдуулах	Хог хаягдлыг тухай бүрт нь ангилан зайлуулах арга хэмжээ авах	Төсөл хэрэгжих хугацаанд	Хог хаягдлын зардалд тусгагдсан.	Дархан Уул аймгийн Хот тохижуулах компанитай жил бүр гэрээ хийж хог хаягдалыг тухай бүрт татан зайлуулж ажилласан.
Бусад асуудлаар				
Байгаль орчны хууль тогтоомж, төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, стандартын хэрэгжилтийг хянах	Байгаль орчны аудит хийлгэж Аудитын дүгнэлт зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албанд хүргүүлнэ.	Аудитыг төслийн 2 дахь жилээс хийлгэх	Байгаль орчны аудитын төлөвлөгөөнд тусгасан.	
Сонирхогч талуудын оролцоог хангах	БОННУ тайлан болон БОМТ-г Орон нутгийн холбогдох байгууллагууд, иргэдэд тайлагнах ажил зохион байгуулах	Жилд 1-2 удаа	Үйл ажиллагааны зардлаар	Тайлагнан ажилласан.



3.2. Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 3. Ногоон байгууламжийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Нөхөн сэргээлтийн зорилт	Нөхөн сэргээх арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Нэгжийн өртөг мян.төг	Төлөвлөлтийг хэрэгжүүлсэн байдал
1	Ногоон байгууламжийн арчилгаа, тордолгоо	Ногоон байгууламжийн усалгаа	Үйлдвэрийн талбайн ногоон байгууламж	Үйл ажиллагааны зардлаас	Ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлж, Үйлдвэрийн хашаанд 100ш мод тарьсан.
2	Үйлдвэрийн талбайн үүдний хэсэгт шинээр ногоон байгууламж бий болгох	Ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор мод тарих	Үйлдвэрийн талбайн хашаанд		
Нийт				-	





3.3. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Үйлдвэрийн ашиглалтын үйл явцад түүх соёлын дурсгалт зүйлс олдвол үйлдвэрийн үйл ажиллагааг түр зогсоон зохих байгууллагад мэдэгдэж, түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах ажлыг зохион байгуулах болно.

3.4. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 4. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Зардал, мян.төг
Гал түймрийн булан байрлуулах	Үйлдвэрийн цех тасаг бүрт гал түймрийн булан байрлуулж ажилласан.
Аваар устгах төлөвлөгөө боловсруулах	Аваар устгах төлөвлөгөөг Дархан Уул аймгийн онцгой байдлын газраар батлуулан ажиллаж байна.
Химийн бодис	Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд химийн хорт бодис хэрэглэдэггүй.
Нийт зардал	-



3.5. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 5. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Зардал, мян.төг	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
Хог хаягдлын цэг, ангилан ялгах үйлдвэрийн талбай, кемп орчимд бохирдол үүсгэж болзошгүй	Хог хаягдлыг ялгах, зайлуулах, устгах, цэвэршүүлэх менежментийн төлөвлөгөөг мөрдөн ажиллах	500.0	Хог хаягдалыг ангилан ялган, зайлуулж, стандарт шаардлагын дагуу ажилласан.
	Хог хаягдлын цэгийг стандарт шаардлагын дагуу засаж тохижуулах	Үйл ажиллагааны зардлаар	
Нийт		500.0	

Хог хаягдлын гэрээг Дархан-Уул аймгийн “Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв”-тэй байгуулж, гэрээний дагуу хог хаягдал тээвэрлүүлсний зардал 120 000.0 төгрөгийг тушаасан.



3.6. Тухайн жилийн орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

Хүснэгт 6. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

Хяналт-шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хугацаа ба давтамж	Зардал, мян.төг/жил	Төлөвлөлтийг хэрэгжүүлсэн байдал
Агаарын чанар				
Температур, тоосжилт, Агаарын урсгал, Чийгшил, Нүүрстөрөгчийн исэл, Хүхэрт устөрөгч, Метан,	Ажлын байранд, үйлдвэрийн талбайн ойр орчимд	Жилд 2 удаа, 1 цэгээс. Шаардлагатай тохиолдолд тухай бүрт нь.	100.0	

Азотын давхар исэл, Аммиак г.м				
Хөрсөн бүрхэвч				
Хөрсний үе давхаргын зузаан (см), элэгдэл эвдрэлийн нөхцөл, ялзмаг%, рН, давсжилт, чийгшилт, Pb, As, Cd, Hg, Си-ийн агууламж, Физик шинж чанар, органик бодис, нийт азот, карбонат, Са, Mg, P2O5, K2O, хөрсний рН, Pb, Cd, As, Zn, Се-ийн агууламж	Төсөл хэрэгжих талбай	Жилд 2 удаа, 1 цэгээс	100.0	
Усан орчин				
Усны рН, цахилгаан дамжуулах чадвар нүүрстөрөгчийн исэл CO3, хүчил HCO3, кальци Са, хлор Cl, кали К, магни Mg, сод Na, хүхэр S, хүнцэл As, бор В, бари Ва, кадми Cd, кобальт Со, хром Cr, зэс Си, төмөр Fe, мөнгөн ус Hg, манган Mn, молибден Мо, никель Ni, хар тугалга Pb, селени Se, силикон Si, ванади V, цинк Zn, хөнгөн цагаан Al, мөнгө Ag, Хими бактериологийн бүрэн шинжилгээ	Гүний худгаас	Жилд 1 удаа, гүний худгаас дээжлэлт хийж лабораторийн шинжилгээнд өгч бактериологийн бүрэн шинжилгээ, хүнд металлын шинжилгээг хийлгэх.	200.0	Дархан ус суваг ХК-тай жил бүр гэрээ байгуулан шинжилгээ хийлгэн ажилласан.
Ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэг				
Мэргэжлийн өвчин судлалын үндэсний төвтэй гэрээ байгуулж ажиллана	Төсөл хэрэгжих орчинд	Жил бүр	Байгууллагын үйл ажиллагааны зардалд тусгах	
Төслийг хэрэгжүүлэх эхний жилийн зардлын урьдчилсан дүн			400.0	

ОХШХ-ийн хүрээнд үйлдвэрийн талбай орчмоос агаарын чанарын болон хөрсний бохирдлын дээжийг жил бүр авч шинжлүүлж байна.

Х-200016

Сувилал

“ДАРХАН-УС СУВАГ” ХК



ЦЭВЭР УСААР ХАНГАХ,
 БОХИР УСЫГ ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ,
 ЦЭВЭРЛЭХ АЖ АХУЙН ГЭРЭЭ

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

№	Ажлын нэр	Тарифт үнэ
1	Угаагуур тосгуурын гаргах	3500
2	Ванны бөглөө гаргах	3500
3	Тосгуурын сифон солих	3000
4	Ванны сифон солих	4000
5	Ванн солих	15000
6	Угаагуур солих /ком/	7000
7	Суутуурын бөглөө гаргах	5000
8	Суутуурын холболт салгаж угсрах /солих/	8500
9	Суутуурын манжет резин солих	2000
10	Босоо шугамын бөглөө гаргах	5000
11	Ус хураагуурын ад анги солих /бочки/	5000
12	Бохирын босоо шугам солих	15000
13	Ерөнхий вентиль солих	6000
14	Давхар хоорондын цэвэр усны шугамын монтаж солих	20000
15	Тосгуурын сгон солих	3500
16	Босоо шугамын сгон солих	4000
17	Ванны хөлигч солих /ком/	5000
18	Тосгуурын хөлигч солих	2000
19	Тосгуурын уян холбоос солих	2000
20	ОО-д холбоос солих	2000
21	Кабинтай душ угсрах	30000
22	Угаалгын машины холболт хийх	15000
23	Тоолуурын резин, хог шүүгч цэвэрлэх	1500
24	Тоосгон хана цөмлөж, ухах	3500
25	Бетон хана цөмлөж, ухах	5000
26	Хүйтэн ус хаах /аэриалгаар/ /Цаг хаах/	5000
27	Дуудлагын хөлс /8.00-17.00/	2000
28	Дуудлагын хөлс /17.00-8.00/	4000

Орон сууцны айл өрхийн цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний сантехникийн тоног төхөөрөмжид дуудлагаар засвар үйлчилгээний ажил хийх үнийн тариф

Тайлбар: Орон сууцны 1 дүгээр давхарт болон зoorийн давхарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид 50% нэмэгдэлтэй үнээр үйлчилнэ.

БАТЛАВ:

“Дархан-Ус суваг” ХК-ийн
 захирал /Х.Х.Х./ Т.Доржундалай

БАТЛАВ:

С. Сувилал

ЦЭВЭР УСААР ХАНГАХ, БОХИР УСЫГ ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ,
 ЦЭВЭРЛЭХ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ГЭРЭЭ

№

Нэг. Ерөнхий зүйл

Монгол Улсын Иргэн хууль, Усны тухай хуулийн 16, 17, 19, 20, 22, 28-р зүйл, “Хот суурины усан хангамжийн ашиглалтын тухай хууль”, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуурын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны 05 сарын 19-ний өдрийн 74 дүгээр тогтоолын “Тус зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм”-ийг үндэслэн хангагч гэж нэрлэгдэх “Дархан-Ус суваг” ХК-ний гэрээ хяналтын инженер ажилтай хэрэглэгч гэж нэрлэгдэх хэрэглэгч гэж нэрлэгдэх -ыг төлөөлж албан тушаал: овогтой нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

1.1 Энэхүү гэрээг усан хангамж, ариутгах татуурын сүлжээнээс цэвэр ус авч, бохир ус шууд болон автомашинаар нийлүүлдэг Улсын үйлдвэрийн газар, компани, хоршоолол, бүх аж ахуйн нэгж, төсөвт ААН-ийн газрууд, орон сууцны 1 давхарын аж ахуйн байгууллагуудтай гэрээ хийж ажиллана.

1.2 Хэрэглэгч гэрээ байгуулахдаа дараахь материалыг бүрдүүлж авчирна. Үүнд:

- а. Хэрэглэх цэвэр усны хэмжээ м³/сар, жилээр
- б. Бохир усны хэмжээ м³/сар, жилээр
- в. Албан хаагч, эзлэгийн ажилчдын тоо, ажиллах цаг
- г. Сувилал, ресторан, цайны газрын үйлчилгээний чадал ажиллах хугацаа

- д. Технологийн хэрэгцээ, нэгж бүтээгдэхүүнд орох усны батлагдсан норм
- е. Байгууллагийн орон сууцанд суугчдын тоо
- ё. Цэвэр усны болон бохир ус татан зайлуулах шугам



ДАРХАН-УС СУВАГ ХК-ИЙН
 НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН
 /CERTIFICATE OF ANALYSIS/

ДУГААР №0077

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Шугамын ус	2022.10.28
1	Бүтээгдэхүүний нэр	Шугамын ус	
2	Дээж авсан газрын нэр	Дархан сум үйлдвэрийн рашин "Силикат"	
3	Дээж авсан хүний нэр	Т.Болормаа	
4	Протокол, сорьцын дугаар	1379	
5	Дээжийн хэмжээ	1.0л 0.3л	
6	Шинжилгээнд хүлээн авсан /Он, сар, өдөр/	2022.10.26	
7	Шинжилсэн хугацаа /Он, сар, өдөр/	2022.10.26 - 2022.10.28	
8	Бүтээгдэхүүний стандарт	MNS 0900-2018	

ЛАБОРАТОРИЙН АЛБАН ЁСНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ХУУЛБАРЛАН
 ХЭРЭГЛЭХИЙГ ХОРИГЛОНО.

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

№	Аргын стандарт	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Шавард лага	Химийн Шинжилгээний дүн	
					1379	
1	MNS/ISO 10523-2001	pH		6,5-8,5	6,70	
2	MNS/ISO 6059-2005	Хатуулаг	Mg-эквив	7	1,81	
3	MNS/ISO 9963-1-2005	Шүтлэг	M/g		2,9	
4	MNS 4430-2005	Нийт төмөр	M/g	0,3	<0,1	
5	MNS 9297-2005	Хлорид	M/g	350	19,1	
6	MNS 4431-2005	Нитрит	M/g	1,0	<0,02	
7	MNS/ISO 7890-3-2001	Нитрат	M/g	50	0,514	
8	MNS ISO 7150-1-2006	Аммоний	M/g	1,5	<0,1	
9	MNS 1091-1970	Кальций	M/g	100	31,4	
10	MNS 1097-1970	Гидрокарбонат	M/g	-	173,8	
11	MNS 1091-1970	Магний	M/g	30	2,9	
12	MNS/ISO 6878-2001	Фосфат	M/g	3,5	1,040	
13	MNS 4423-1997	Хуурай үлдэгдэл	M/g	1000	235	
14	MNS 6271-2011	Сульфат	M/g	500	22,23	
15	MNS 6272-2011	Фтор	M/g	0,7-1,5	0,63	
16	MNS/ISO 7393-3-2008	Үлдэгдэл хлор	M/g	-	-	
17	MNS/ISO 7868-1999	ЦДЧ	m/S/cm	1	0,352	

№	Аргын стандарт	Үзүүлэлтийн нэр	Шавард лага	Бактериологийн Шинжилгээний дүн	
				1326	
1	MNS/ISO 6222-1998	Тил дахь нийт нянгийн тоо	100ш	97ш	
2	MNS/ISO 9308-2-1998	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч	0	0	
3	MNS/ISO 19250-2017	Сальмонеллын төрлийн нян илрүүлэх	0	0	
4	MNS ISO 4698-1998	E.Coli-F илрүүлэх	0	0	
5	MNS 5033-2001	Шимэгч хорхой илрүүлэх	0	0	

ТАЙЛАГ: СОРИЛТЫН ДҮН НЬ ЗӨВХӨН ШИНЖИЛСЭН ДЭЭЖИД ХҮЧИНТЭЙ.

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН
 ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ
 ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН: ХИМИЧ
 НЯН СУДЛААЧ

Л.ЦЭВЭЛСҮРЭН
 С.ДАШЧИРАВ
 Б.ЦАГААНЦЭЦЭГ

3.7. Удирдлага зохион байгуулалтын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Хүснэгт 7. Удирдлага зохион байгуулалтын менежментийн төлөвлөгөө

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Зардал, мян.төг
Энэхүү тайлангийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөмжүүдийг үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлэх	Хэрэгжүүлж ажилласан.
Ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт семинарыг тогтмол зохион байгуулж, хамруулах	Ажилчиддаа хөдөлмөр хамгаалал авуулж ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагаар жил бүр зохион байгуулж сургалтанд хамруулсан.
Ажиллагсдыг улиралд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах.	Дархан Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан ажилчидаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан.
Ажиллагсдыг тоосноос хамгаалах хошуувч, хувцас хэрэгслээр хангах	Ажиллагсдыг тоосноос хамгаалах хошуувч, хувцас хэрэгслээр бүрэн хангаж ажилласан.
Газрын төлөв байдлын улсын чанарын хянан баталгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулах	Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааг Эхлэх Цэг Хангай ХХК-гаар хийлгэж, дүгнэлт гаргуулан ажилласан.
Нийт зардал	10 625 000

СИЛИКАТ ХК



НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ



2022 он 03 сарын 07 өдөр № 22/04-01 Дархан-Уул аймаг

Энэхүү гэрээг нэг талаас “Силикат” ХК /шашид “Захиалагч” гэм/ РД-2050463 түүнийг төлөөлж ХАБЭА-н ажилтан А.Агваандорж нөгөө талаас “Ойгон нөмрөг” ТББ /шашид “Үйлдэгч” гэм/, РД-8271275 түүнийг төлөөлж менежер С.Цогбалрах нар нь дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож эзэхүү гэрээг байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Энэхүү гэрээгээр Сургаат захиалагч байгууллагын хэргэнд нийцүүлэн ХАБЭА-н мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах болон харилцан ашигтай хамтран ажиллахтай холбогдсон талуудын хооронд үүсэх эрх зүйн харилцааг зохицуулна.
- 1.2 Гүйцэтгэгч тал нь Хөдөлмөрийн, Нийгмийн хамгааллын Сайдны 2019 оны А/370 тоот тушаалаар батлагдсан журам болон сургалтын хөтөлбөрийг дагуу сургалтын хөтөлбөр, шийн хувиар, сургалтын агуулга зэргийг боловсруулан, батлаж сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
- 1.3 Захиалагч байгууллагын ХАБЭА-н ажилтан болон Сургалтын мэргэжилтэн нь нийт ажигтнуудад сургалтын тухай бүрэн ойлголт өгч сургалтын ач холбогдолыг таниулан сургалтын байгууллагаатай хамтарч ажиллана.
- 1.4 Гүйцэтгэгч байгууллага нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах журам”-ын 4.1, 4.2-т заасан шаардлагыг хангасан байх бөгөөд нотлох баримт бичиг нь гэрээний салшгүй нэг хэсэг байж, гэрээний нэгэн адил хүчин төгөлдөр эрх зүйн баримт бичиг байна.
- 1.5 Хоёр тал тохиролцож гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. Нэмэлт өөрчлөлтийг бичгээр тохиролцож гаран үсэг зурж тамга тэмдэг дарснаар гэрээнд хавсаргана.

ХОЁР. ЗАХИАЛАГЧ ТАЛЫН ЭРХ ҮҮРЭГ

- 2.1 Сургаат зохион байгуулагч талын боловсруулсан сургалтын хөтөлбөртэй танилцан, өөрсдийн саналыг тусгуулах эрхтэй.
- 2.2 Сургаат зохион байгуулагч тал болох багшийн зах арга зүй болон ур чадвар, ёс зүй хангалтгүй байсан тохиолдолд багшийг өөрчлөх шаардлага тавих, түүнчлэн гэрээг цуцлах эрхтэй.
- 2.3 Сургаат явуулах завч танихыг батлаж сургалт явуулах орчин нөхцөлөөр бүрэн хангах үүрэгтэй.
- 2.1 Сургалтанд хамрагдах зохих нийт ажигтны нөрсөн жагсаалтыг гаргаж сургалтанд бэлтгэн.
- 2.2 Сургалтанд хамрагдах ажигтнуудыг алба, нэгж, хэлтсээр зохион байгуулалттай хамруулж, ирцийг бүрэн байлгах үүрэгтэй.
- 2.3 Сургалтын явцад сургалтын сэдэв тус бүрт суралцагчдын бүртгэл хөтөлж ажиллана.
- 2.4 Сургалтын чанар, зах арга барилд хяналт хийж шаардлага тавих эрхтэй.

ИХМангт БМ-3

Силикат ХК

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №

2022 он 7 сар 31 өдөр

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хувиар		
			Кам-мэж нэгж	Тоо	Нийт дүн
1	Ангийн хос	44	50	80000	4000000
2	Усны гутал	44	5	80000	400000
3	Боргооны шув	44	5	85000	425000
4	Коск мөнгөн	44	20	10000	200000

Тэмдэг: Хүлээлгэн өгсөн ад харуулагч, Хүлээлгэн авалч, Шалгалсан нягтлан бодогч

ИХМангт БМ-3

Силикат ХК

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ №

2022 оны 9 сарын 16 өдөр

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хувиар		
			Кам-мэж нэгж	Тоо	Нийт дүн
1	4/2 202-100	44		7	
2	4/1 202-100	44		13	
3	4/0 - 1	44		9	
4	4/9 - 1	44		8	
5	4/2 - 1	44		5	
6	4/9 - 1	44		1	
7	ажлын үнэмлэх				

Тэмдэг: Хүлээлгэн өгсөн ад харуулагч, Хүлээлгэн авалч, Шалгалсан нягтлан бодогч



Огноо/Date: 2022.10.27 11:03:39

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information

Журналын/Journal No: 11948925

Системийн огноо/System Date: 2022.07.31 15:06:51

From	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	5086046007	В****Я МӨНХТУЯА	2,500,000.00 MNT	1.00
/ Хоёр сая таван зуун мянган төгрөг /				
To	Банкны дугаар/Branch No	Банкны нэр Bank Name	Дүн/Amount	Ханш/Rate
	05	Хаан Банк	2,500,000.00 MNT	1.00
	Дансны/Картын дугаар Account/Card number	Нэр/Name		
	5013048249	Б****Й МАЙЖАРГАЛ		

Үйлээний утга/Transaction description:
 клын хувцас урьдчилгаа

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

Үйлээний баримтыг баталгаажуулсан/Transaction statement verified:

илбар, тооцооны төв/Branch, sub-branch:

Гарын үсэг/Signature:

Мөхөр/Stamp:

____ Он/Year (YYYY) ____ Сар/Month (MM) ____ Өдөр/Day (DD)

НХМаягт БМ-3
 Системийн огноо 2017 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн 147 тоот тушаалын хавсралт

ЗАРЛАГЫН БАРИМТ № _____

_____ (байгууллагын нэр)
 _____ (худалдан авагчийн нэр)

Регистрийн № _____ Регистрийн № _____

20... оны ... сарын ... өдөр (тээвэрлэгчийн хаяг, албан тушаал, нэр)

№	Материалын үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар	Код	Хэм-жээг нэгж	Худалдах		
				Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт дүн
1	сааралт шээ		м	8		
2	агд		м	1		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Тэмдэг: _____
 Хүлээлгэн өгсөн эд харилцагч: _____
 Хүлээн авагч: _____
 Шалгасан нягтлан бодогч: _____

Дүн: 630000

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАРХАН СУМАНД БАЙРЛАХ
“СИЛИКАТ” ХХК-НИЙ ЭЗЭМШИЛ СИЛИКАТ ТООСГО,
ШОХОЙН ҮЙЛДВЭРЛЭХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН ТӨЛӨВ
БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ЗАХИАЛГАТ ХЯНАН БАТАЛГААНЫ
АЖЛЫН ТАЙЛАН
(2019/57)



ГҮЙЦЭТГЭГЧ : ГАЗРЫН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА
“ЭХЛЭХ ЦЭГ ХАНГАЙ” ХХК

Улаанбаатар хот
2019 он

“



3.8. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжилтийг нөлөөлдө өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнасан байдал

Хүснэгт 8. Олон нийтийн оролцоог хангах, тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт

№	Ажлын нэр	Хэнд	Хариуцах эзэн	Хугацаа	Зардал
1	Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, төсөл хэрэгжиж буй талбайн өнөөгийн байдлыг танилцуулах	Төсөл хэрэгжих талбай орчмын нутгийн иргэд, холбогдох хүмүүс	Үйлдвэрийн дарга, БО-ны мэргэжилтэн	V сард	150.0 мян.төг
2	Нийт хийгдсэн ажлын хэмжээ, хийгдсэн ажлуудын тайлагнал	Төсөл хэрэгжих талбай орчмын нутгийн иргэд, холбогдох хүмүүс	Үйлдвэрийн дарга, БО-ны мэргэжилтэн	X сард	150.0 мян.төг

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг боловсруулан холбогдох байгууллагуудад танилцуулахаар хүргүүлсэн болно.

ДҮГНЭЛТ

Манай компани нь 2022 онд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

- ✓ Тоосжилтын хяналтыг ажлын байранд тогтмол хийж, түүхий эд тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь тоосжилт үүсэхээс сэргийлж хучлагатай тээвэрлэлт хийн ажилласан.
- ✓ Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж үйлдвэрийн хашаанд 100ш мод тарьсан.
- ✓ Үйлдвэрийн цех тасаг бүрт гал түймрийн булан байрлуулж ажилласан.
- ✓ Хог хаягдлын гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу тээвэрлүүлж байсан.
- ✓ Ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр бүрэн хангаж ажилласан.
- ✓ Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд агаар, хөрс, усны шинжилгээ авч лабораторид шинжлүүлсэн.
- ✓ Аваар устгах төлөвлөгөөг Дархан Уул аймгийн онцгой байдлын газраар батлуулан ажиллаж байна.
- ✓ Дархан ус суваг ХК-тай жил бүр гэрээ байгуулан шинжилгээ хийлгэн ажилласан.
- ✓ Ажилчиддаа хөдөлмөр хамгаалал авулгүй ажиллагааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагаар жил бүр зохион байгуулж сургалтанд хамруулсан.
- ✓ Дархан Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан ажилчидаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан.
- ✓ Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааг Эхлэх Цэг Хангай ХХК-гаар хийлгэж, дүгнэлт гаргуулан ажилласан.

2022 онд аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлэхэд хүндрэлтэй байсан бөгөөд уг нөхцөл байдлын улмаас манай компани төлөвлөгөөндөө хүрч ажиллаж чадаагүй боловч байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгөөр хийгдэх ёстой ажлуудыг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэхийг хичээн ажилласан болно.
