

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, ИХХЭТ СУМ
“ЦАГААН-ДЭЛ ХАЙЛУУР ЖОНШ БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР”



“ЦАГААН-ДЭЛ” ЖОНШ БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН 2024
ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Хянасан:

Биелэлтийг
тайлагнасан:



БОАЖЯ-ны ХБОБНУГ-ын
ахлах шинжээч Ц.Жаргализмэх

“Хөх Бишрэлт” ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал /Рен Девен/

“Хөх Бишрэлт” ХХК-ийн
Үйлдвэрийн дарга /Ц.Ариунцэцэг/

2024 он

АГУУЛГА

1. ҮЙЛДВЭРИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА	5
1.1. Төслийн нэр, байршил.....	5
1.2. Төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын товч мэдээлэл	6
1.3. Төслийн талбайн бүтэц зохион байгуулалт.....	6
1.4. Төсөл хэрэгжих хугацаа, хүчин чадал	6
1.5. Үйлдвэрийн техник, тоног төхөөрөмж.....	7
1.6. Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн дараалал.....	8
2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ.....	10
2.1. Газрын гадаргын тогтоц ба онцлог	10
2.2. Уур амьсгал	10
2.3. Гадаргын ус	10
2.4. Газрын доорх ус	10
2.5. Хөрсөн бүрхэвч.....	11
2.6. Ургамлан нөмрөг	11
2.7. Амьтны аймаг.....	11
3. ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	12
3.1. Газрын гадарга, хэвлий	12
3.2. Агаарын чанар.....	12
3.3. Хөрсөн бүрхэвч, гадаргын болон гүний ус	12
3.4. Ургамлан нөмрөг, амьтны аймаг	12
4. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ - 2024.....	13
5. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ-2024.....	14
5.1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	15
5.1.1. Агаарын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт	18
5.1.2. Хөрсний сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт.....	19
5.1.3. Усны сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт	21
5.1.4. Ургамалын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт	23
5.1.5. Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт	23
5.2. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт.....	24
5.2.1. Биологийн нөхөн сэргээлт	25
5.3. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	26
5.3.1. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын төлөвлөгөө боловсруулах ..	27
5.3.2. Дүйцүүлэн нөхөн сэргээлт.....	27
5.3.3. Биотехникийн арга хэмжээ	28
5.4. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	29
5.5. Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	30
5.5.1. Биет бус өв	31
5.5.2. Журам	31
5.6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	33
5.6.1. Үйлдвэрийн болзошгүй осол.....	35
5.6.2. Химийн бодисын тээвэрлэлт	36
5.6.3. Химийн бодисын хадгалалт.....	37
5.6.4. Химийн бодисын хаягдал	37
5.7. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	39
5.7.1. Энгийн хог хаягдал.....	41
5.7.2. Аюултай хог хаягдал.....	43
5.7.3. Хог хаягдлын тоо бүртгэл хөтлөх	44
5.8. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	45
5.8.1. Зөвлөх үйлчилгээний ААН-тэй гэрээлэх	46
5.8.2. Ногоон байгууламж.....	46
5.8.3. Бичиг баримт.....	47
5.8.4. Орон нутаг, хамтын ажиллагаа	47
5.9. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	49
5.9.1. Байгаль орчны хяналт шинжилгээ	50
5.9.1.1. Орчны хяналт шинжилгээний арга хэмжээний хүрээнд ус, хөрс, агаар, ургамал, амьтны дээжлэлт, хэмжилт, шинжилгээ хийх хяналтын цэгүүдийн байршлыг тодорхойлох, тухайн цэгүүдэд тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулах, кодлол болон дугаарлалтын систем бий болгох.....	50

5.9.1.2. Агаарын хэмжилтийг зөөврийн багажаар гүйцэтгэх, үр дүнг боловсруулах.....	50
5.9.1.3. Хөрсний дээжлэлтийг гүйцэтгэж лабораториудад харгалзах үзүүлэлтүүдээр шинжлүүлэх	51
5.9.1.4. Ундны усны дээж авч химийн болон бактерлогийн үзүүлэлтийг шинжлүүлэх	51
5.10. Нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад БОМТ-ний биелэлтийг тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	53
5.10.1. Багийн ИНХ-д БОМТ болон Хяналт, шинжилгээний гүйцэтгэлийг тайлагнах	54
6. ДҮГНЭЛТ	55

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. Баяжуулах үйлдвэрийн байршил	6
Зураг 2. Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн схем	7
Зураг 3. Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн холболтын схем.....	8
Зураг 4. Баяжуулах үйлдвэрийн схем	9
Зураг 5. Хурдны хязгаар тогтоосон болон зорчих хэсгийг тогтоосон тэмдгүүд.....	18
Зураг 6. Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын хэмжилтийн үр дүн.....	18
Зураг 7. Баяжуулах үйлдвэр доторх засвар, үйлчилгээний талбай.....	19
Зураг 8. Баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдаж буй дугуйт ачигч	19
Зураг 9. Баяжуулах үйлдвэр доторх засвар, үйлчилгээний талбай.....	20
Зураг 10. Асгаралттай тэмцэх иж бүрдэл байрлуулсан байдал.....	20
Зураг 11. Шимт хөрсний овоолгод хэлбэржүүлэлт хийж, тарилтад бэлдэж буй байдал.....	21
Зураг 12. Ус ашигласны төлбөр төлсөн баримт.....	22
Зураг 13. Хяналтын цооног өрөмдүүлэн гаргуулах ажлын төлбөр төлсөн баримт.....	22
Зураг 14. ХАБЭА-н ажилтан галын аюулаас сэргийлэх сургалт орж буй байдал.....	23
Зураг 15. Мал, амьтны осол эндэглийн үеийн иж бүрдэл.....	23
Зураг 16. Овоолгын хэлбэржүүлэлт хийж, тарилтад бэлдэж буй байдал.....	25
Зураг 17. Тарвага сэргээн нутагшуулах ажил гүйцэтгэх гэрээ.....	27
Зураг 18. Техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэж буй байдал	28
Зураг 19. Биотехникийн арга хэмжээ.....	28
Зураг 20. Хэвлүүлсэн номын хэсгээс	31
Зураг 21. Батлагдсан Түүх соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журам.....	32
Зураг 22. ХАБЭА-н давтан сургалтын үеэр “Түүх соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журам”-н сургалт хийж буй байдал	32
Зураг 23. Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө.....	35
Зураг 24. Үйлдвэрийн талбайд байх галын хор	36
Зураг 25. Үйлдвэрийн талбайд байх галын хор	38
Зураг 26. Ангилан ялгалтын хог хаягдлын сав	41
Зураг 27. Хог хаягдлын гэрээ	41
Зураг 28. Ангилан ялгалтын хог хаягдлын сав	42
Зураг 29. Сургалт орж буй байдал	42
Зураг 30. Аюултай хог хаягдлын бүртгэл	43
Зураг 31. Аюултай хог хаягдлын бүртгэл	44
Зураг 32. ХАБЭА-н сургалт авсан бүртгэл	46
Зураг 33. Баяжуулах үйлдвэр орчмын ногоон байгууламж.....	46
Зураг 34. Үйлдвэрийн экологийн паспорт	47
Зураг 35. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн ажлаас.....	48
Зураг 36. Агаарын чанарын хэмжилтийн үр дүн.....	50
Зураг 37. Хөрсний дээжлэлтийн лабораторийн шинжилгээний хариу	51
Зураг 38. Усны дээжний лабораторийн шинжилгээний үр дүнгүүд.....	52

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. БОМТ-2024 биелэлт бүлэг тус бүрээр	14
Хүснэгт 2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	16
Хүснэгт 3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт.....	24
Хүснэгт 4. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	26
Хүснэгт 5. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	29

Хүснэгт 6. Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт.....	30
Хүснэгт 7. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	33
Хүснэгт 8. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	39
Хүснэгт 9. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	45
Хүснэгт 10. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	49
Хүснэгт 11. Нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад БОМТ-ний биелэлтийг тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	53

ХАВСРАЛТЫН ЖАГСААЛТ

- Хавсралт 1. БОМТ 2024-ийн хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэсэн хуудас
- Хавсралт 2. Тарвага сэргээн нутагшуулах ажил гүйцэтгэх гэрээ
- Хавсралт 3. Дүйцүүлэн нөхөн сэргээлт хийх ажлын гэрээ
- Хавсралт 4. Нөхөн сэргээсэн газрыг хүлээн авах комисс томилох тухай захирамж
- Хавсралт 5. Нөхөн сэргээлт хийсэн газрыг хүлээн авах акт
- Хавсралт 6. Түүхэн болон газар нутгийн танилцуулга ном хэвлүүлэх ажлын төлбөрийн нэхэмжлэх
- Хавсралт 7. Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
- Хавсралт 8. Химийн хортой болон аюултай бодисын хаягдал тээвэрлэх, устгах ажил гүйцэтгэх гэрээ
- Хавсралт 9. Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичиг
- Хавсралт 10. Химийн хортой болон аюултай бодисын хаягдал тээвэрлэх, устгах ажил гүйцэтгэх гэрээ
- Хавсралт 11. Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичиг
- Хавсралт 12. Мод худалдан авсан нэхэмжлэх
- Хавсралт 13. Ус ашиглуулах дүгнэлт
- Хавсралт 14. Ус ашиглах гэрээ
- Хавсралт 15. Хаягдал усыг байгальд шууд нийлүүлж байгаа хуулийн этгээдтэй байгуулах ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ
- Хавсралт 16. Иххэт сумын Баян багийн иргэдийн нийтийн хурлын тэмдэглэл

1. ҮЙЛДВЭРИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Хөх бишрэлт” ХХК-ийн “Жонш баяжуулах үйлдвэр” нь Дорноговь аймгийн Иххэт сумын нутагт Монголросцветмет ХХК-ний ашиглаж байсан Хамар-Усны хайлуур жоншны ордын ил уурхайгаас олборлож гаргасан балансын бус жоншны хүдрийн овоолгыг түшиглэн жилд 150.0 мян.тн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтайгаар 2017 онд баригдсан бөгөөд 2021 онд “Сити-Сүлжээ” ХХК-ийн Дэлгэр-3 нэртэй хайлуур жоншны орд, “Тайшаншин юань” ХХК-ийн Дай-Уул нэртэй хайлуур жоншны ордуудыг түшиглэж жилд бүрэн хүчин чадлаараа 300.0 мян.тн хүдэр боловсруулан баяжуулж, ФФ97 маркийн 76.3 мян.тн жоншны баяжмалыг гаргах хүчин чадалтайгаар ажиллахаар ТЭЗҮ /тодотгол/-ыг “Ертөнцийн зүг” ХХК-иар боловсруулуулж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Ашигт малтмал газрын тосны газрын Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2020 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн Т/20-11-03 тоот дүгнэлтээр баталгаажуулжээ.


“Хөх бишрэлт” ХХК нь “Жонш баяжуулах үйлдвэр” төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг 2017 онд “Ашид ананда” ХХК-иар хийлгүүлж, 2018 онд “Ашид ананда” ХХК-иар 2022 онд “ЕАСС” ХХК-иар нэмэлт тодотголыг тус тус хийлгэж, БОАЖЯ-р батлуулсан.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/618-р тушаалын хавсралт “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журмын дагуу төсөл хэрэгжүүлэгч “Хөх Бишрэлт” ХХК нь 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тус журмын дагуу байгуулагдсан ажлын хэсэгт дээрх төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг үнэлүүлж 90.1%-ийн үнэлгээ авсан болно /Хавсралт 1. БОМТ-2024-ийн хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэсэн хуудас/.

Үйлдвэрийн 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” Монгол улсын хууль, Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/618 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, өмнөх жилийн ажлын хэсгийн дүгнэлтээр гарсан зөвлөмж зэргийг удирдлага болгож, төслийн хэмжээнд 2024 онд хийгдэх үйл ажиллагаатай уялдуулан боловсруулж БОАЖЯ-р батлуулсан.

1.1. Төслийн нэр, байршил

“Хөх бишрэлт” ХХК-ийн “Цагаан Дэлийн жонш баяжуулах үйлдвэр” төсөл нь Дорноговь аймгийн Иххэт сумын нутагт, Улаанбаатар хотоос зүүн тийш 345 км, төмөр замын Бор-Өндөр өртөөнөөс зүүн тийш 50 км, Иххэт сумаас баруун тийш 5 км-т оршиж байна.

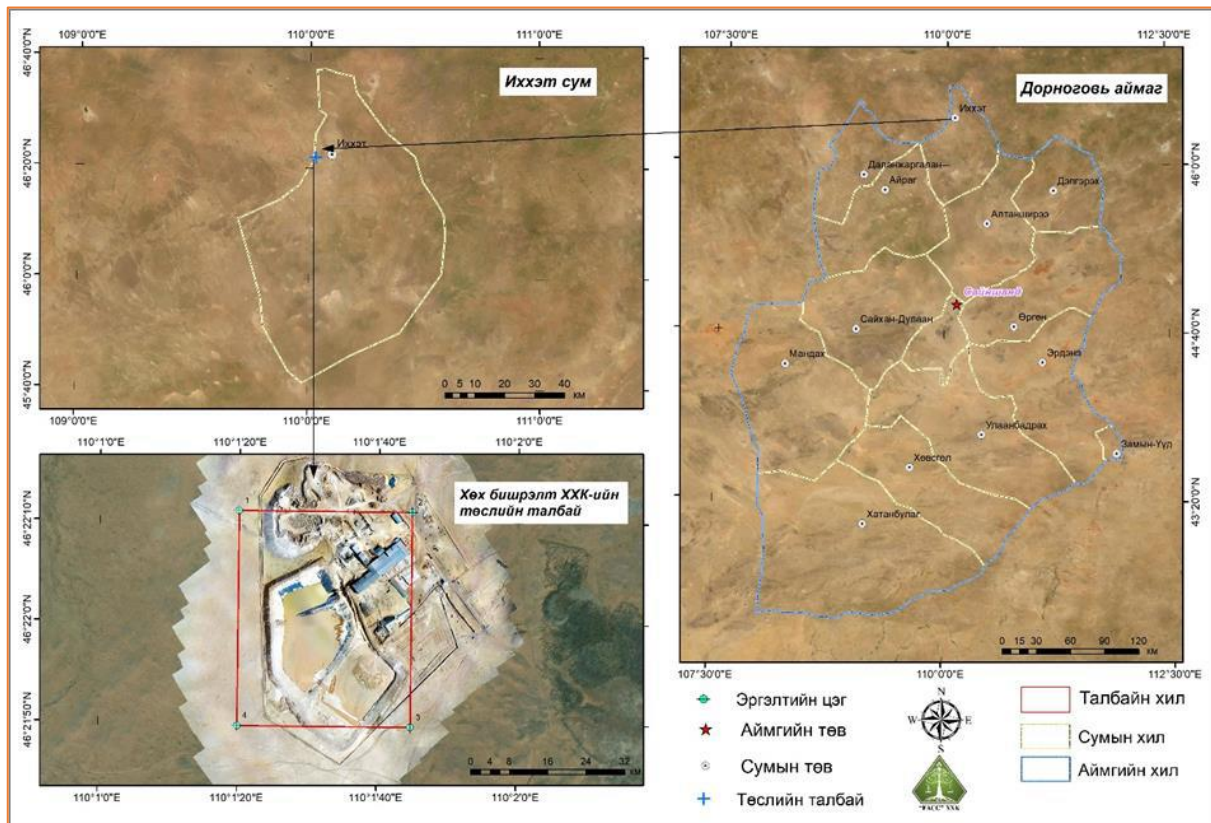

Зураг 1. Баяжуулах үйлдвэрийн байршил

1.2. Төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын товч мэдээлэл

Аж ахуйн нэгжийн нэр:

“Хөх Бишрэлт” ХХК

Аж ахуйн нэгж бүртгэлийн дугаар:

9019078088

Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны чиглэл:

Гадаад худалдаа

Аж ахуйн нэгжийн харьяаллын хаяг:

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Сайн ноён хан Намнансүрэнгийн гудамж, 35-3 тоот

Захирлын нэр, утас, цахим шуудангийн хаяг:

Гүйцэтгэх захирал Рен Девен,
96620509, huhbishrelt.5878@yahoo.com

Холбогдох мэргэжилтний нэр, утас, цахим шуудангийн хаяг:

Үйлдвэрийн дарга Ц.Ариунцэцэг,
99153477, huhbishrelt.5878@yahoo.com

1.3. Төслийн талбайн бүтэц зохион байгуулалт

Жонш баяжуулах үйлдвэрийн дэд бүтэц, зохион байгуулалтийн хувьд түүхий эд буулган жигдрүүлэх талбай, хүдэр бутлан ангилах хэсэг, нунтаглан баяжуулах хэсэг, баяжмал шүүн хатаах хэсэг, баяжмал савлах, хадгалах хэсэг, хаягдлын аж ахуй, засвар үйлчилгээний хэсэг, эргэлтийн усны сав, цэвэр усны худаг, ус дамжуулах насос, урвалж бодисын агуулах, цахилгаан хангамжийн хэсэг, хяналтын лаборатори, уурын зуухны хэсэг, ажилчдын байр гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.


1.4. Төсөл хэрэгжих хугацаа, хүчин чадал

Цагаан Дэл жонш баяжуулах үйлдвэр нь жилд 150.0 мян.тн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтайгаар 2017 онд баригдсан. 2021 онд төслийн ТЭЗҮ-нд нэмэлт тодотгол хийгдэж “Сити Сүлжээ” ХХК-ийн Дэлгэр-3 нэртэй хайлуур жоншны орд, “Тайншаншин Юань” ХХК-ийн Дай-Уул нэртэй хайлуур жоншны ордуудыг түшиглэн жилд 300.0 мян.тонн хүчин чадалтайгаар ФФ97 маркийн жоншны баяжмал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай болсон. Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил 2017 онд бүрэн хэрэгжиж, 2018 оноос эхлэн бүтээгдэхүүн гаргах, үйл ажиллагаа эхэлсэн байдаг.


1.5. Үйлдвэрийн техник, тоног төхөөрөмж

Жоншны хүдэр боловсруулалтын технологийн процесс дараах схемийн дагуу явагдана. Үүнд:

- Хүдрийг 5.0 мян.м2 талбайд овоолж дундажлах:
- Том бутлалтын хэсэг
- Дунд бутлалтын хэсэг (хяналтын шигшилттэй)
- Нунтаглалт (ангилалтын битүү циклээр ажиллах)
- Үндсэн флотаци, хяналтын флотаци, 6 үе шаттай цэвэрлэгээний флотаци,
- Баяжмалын өтгөрүүлэлт, шүүх, хатаах
- Хаягдлын аж ахуй зэрэг процессоос бүрдэнэ.

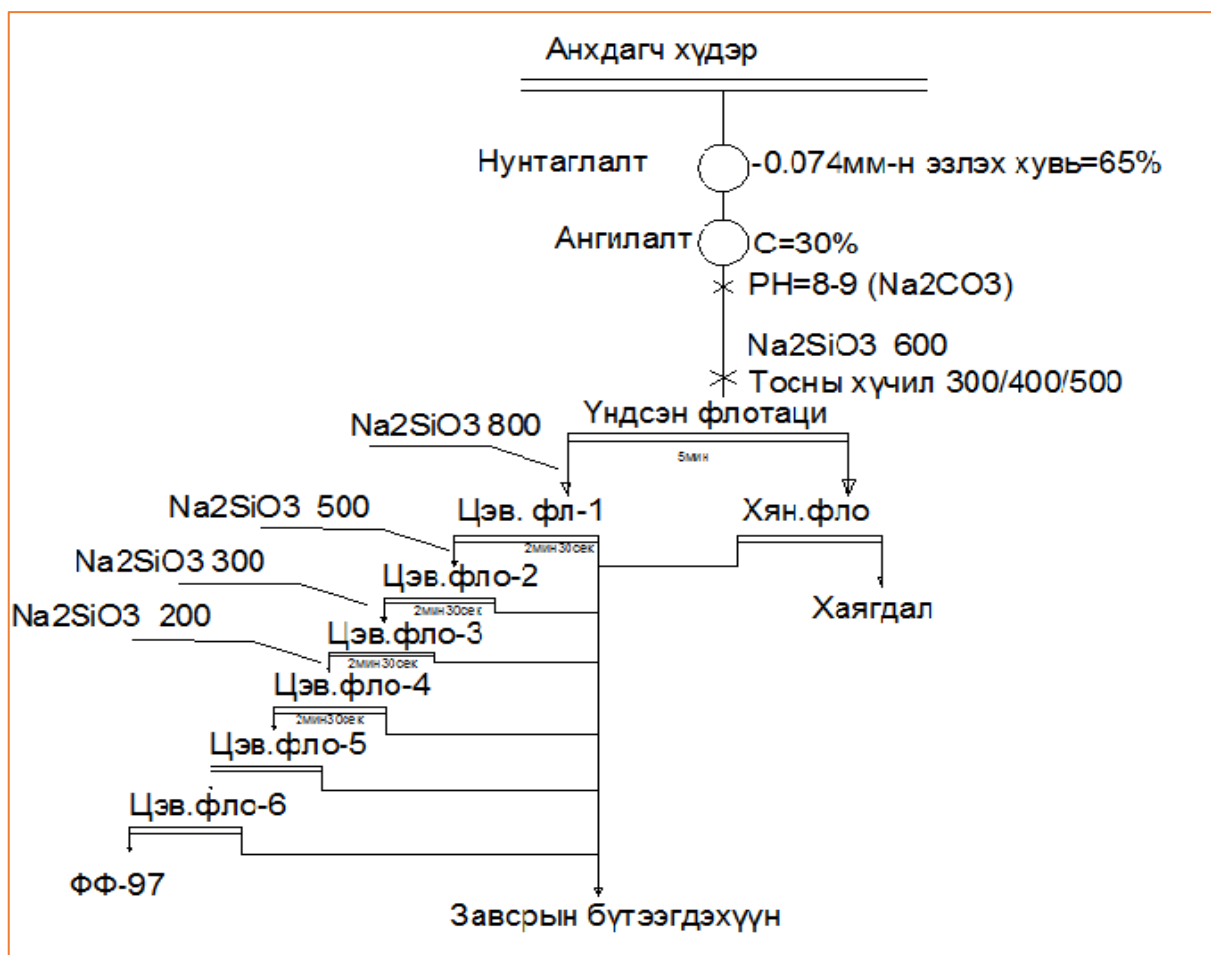

Зураг 2. Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн схем

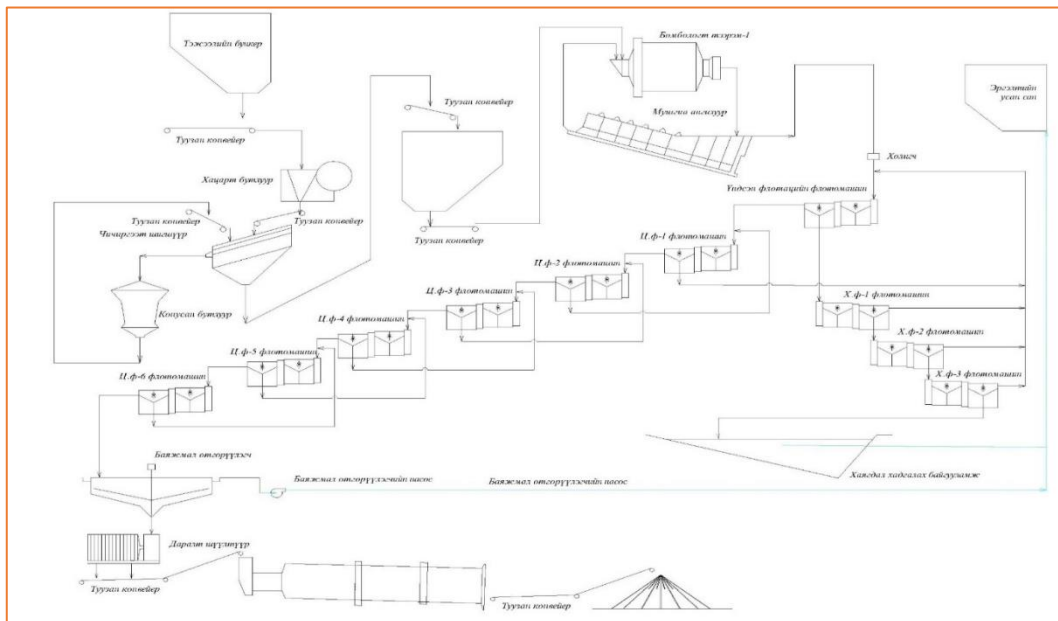

Зураг 3. Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн холболтын схем

1.6. Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн дараалал

Хүдэр бутлалт:

Баяжуулах үйлдвэрийн хүдэр бутлах хэсэг нь 2 шатны бутлуур, 1 шатны шигшүүрээс бүрдэнэ. Анхдагч хүдрийг хяналтын шигшилтэй 2 шатны бутлалтын схемээр буталж хүдэрийн ширхэглэлийг 12мм болгоно.

Анхдагч хүдрийн овоолгоос утгуурт ачигчийн тусламжтай хүдрийг хүлээн авах бункерт тэжээх бөгөөд бункерын доор суурилагдсан хавтант тэжээгүүр нь нэгдүгээр шатны хацарт бутлуурыг тэжээнэ. Нэгдүгээр шатны хацарт бутлуурын хүлээн авах хүдрийн хамгийн том ширхэглэл -400 мм байх бөгөөд бутлуураас -80 мм-ийн ширхэглэлтэй хүдэр гарна.


Хяналтын шигшилтийн зорилго нь бутлагдсан хүдрийн ширхэглэлд хяналт тавих болон хоёрдугаар шатны бутлуурт орох шаардлагагүй хүдрийг ялгана. Бутлах цехэд ажиллах шигшүүрийн торны нүхний хэмжээ 15 мм байна. Хяналтын шигшүүрийн торны дээд ангийг (+12 мм-ийн анги) хоёрдугаар шатны бутлуур (1-р шугам хацарт бутлуур, 2-р шугам конусан бутлуур)-т өгөх бөгөөд бутлуураас гарах хүдрийн ширхэглэл -12мм байна.

Хүдэр жигдрүүлэлт:

Баяжуулах процесст орж байгаа хүдрийн шинж чанар, хүдэр дэх ашигт болон хорт хольцын агуулгын өөрчлөлт нь үйлдвэрийн хүчин чадал, ажлын горим, баяжмалын чанар, бүтээгдэхүүний гарц, минерал авалт зэрэг нөлөөлдөг. Ийм учираас баяжуулах үйлдвэрийн технологийн процессыг хэвийн жигд явуулах зорилгоор хүдэр жигдрүүлэлтийн ажил хийгддэг. Жонш олборлогчдоос нийлүүлж буй түүхий эдийг баяжуулах үйлдвэрийн дэргэдэх хүдэр жигдрүүлэх талбайд зөөвөрлөн авчирч, жоншны агуулга болон хүдэр дэх карбонатын агуулгаас хамааруулан үечлэн овоолго байгуулах замаар хүдрийг жигдрүүлэн баяжуулахад бэлтгэн хадгална. Хүдрийг холих үедээ хүдрийн бүтцийн чанарыг судлах шаардлагатай.

Баяжуулалт:

Баяжуулах үйлдвэр нь түүхий эд буулган жигдрүүлэх талбай, хүдэр бутлан ангилах хэсэг, нунтаглан баяжуулах хэсэг, баяжмал шүүн хатаах хэсэг, баяжмал савлах,хадгалах хэсэг,хаягдлын аж ахуй, засвар үйлчилгээний хэсэг,эргэлтийн усны сав, цэвэр усны худаг, ус дамжуулах насос,урвалж бодисын агуулах,цахилгаан хангамжийн хэсэг,хяналтын лаборатори, уурын зуухны хэсэг,ажилчдын байр контор зэргээс бүрдэнэ.

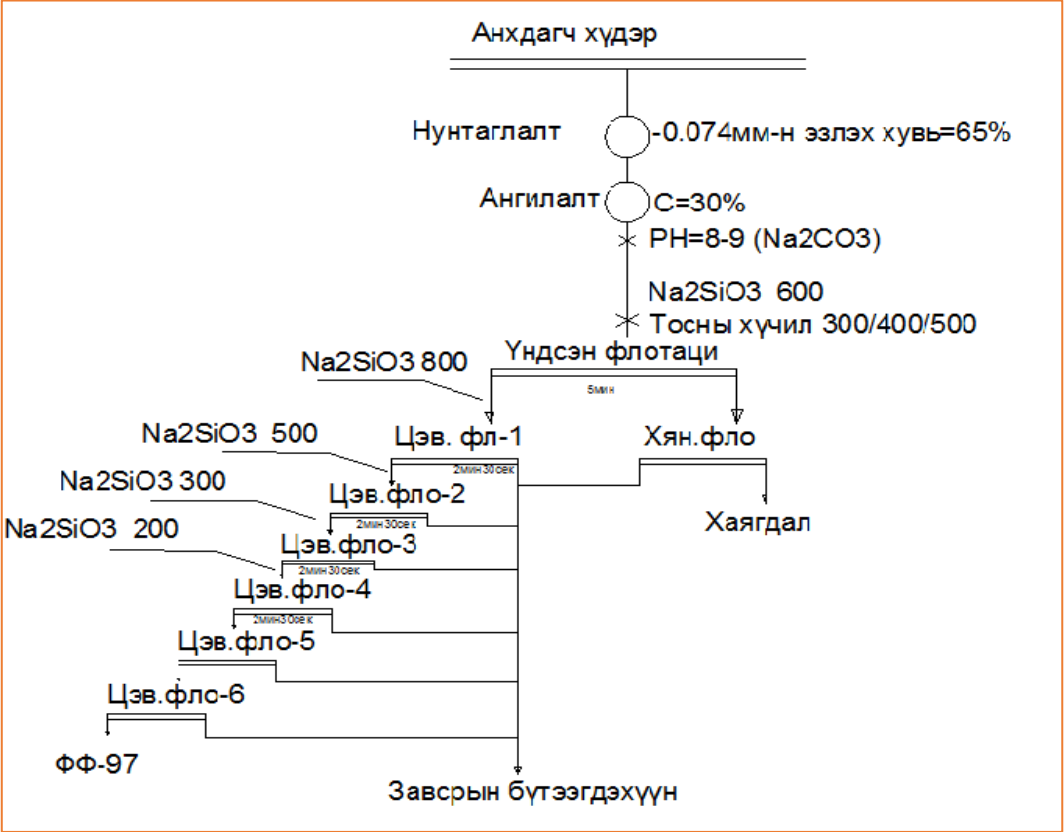

Зураг 4. Баяжуулах үйлдвэрийн схем

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

2.1. Газрын гадаргын тогтоц ба онцлог

“Хөх бишрэлт” ХХК-ийн “Цагаан Дэлийн жонш баяжуулах үйлдвэр” нь Дорноговь аймгийн Иххэт сумын нутагт, Улаанбаатар хотоос зүүн тийш 345 км, төмөр замын Бор-Өндөр өртөөнөөс зүүн тийш 50 км, Иххэт сумаас баруун тийш 5 км-т оршиж байна. Үйлдвэрийн байрлах нутаг дэвсгэр болох Дорноговь аймгийн Иххэт сум нь Төв Азийн их цөл өндөрлөгийн умард хаяанд байрладаг. Үйлдвэр байрлах сумын нутаг дэвсгэр нь уул, гүвээ толгод бүхий заримдаг цөлийн бор саарал, цайвар бор, хужир мараат хөрстэй, хялгана, харганат цөлийн хээр алаг өвст ургамалтай, байгалийн хээржүү цөл хамаарна. Төсөл байрлах талбай нь Дорноговь аймгийн Иххэт сум нь далайн түвшнээс 937-1380 м өргөгдсөн байна.

2.2. Уур амьсгал

“Хөх Бишрэлт” ХХК-ийн Жонш баяжуулах үйлдвэр байрлах Дорноговь аймаг нь уур амьсгалын хувьд хуурайдуу сэрүүвтэр, хуурай дулаавтар мужид багтана. Манай орны бусад нутгийн нэгэн адил эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Агаарын температурын үнэмлэхүй их агууриг 33.6 градус, өвөлдөө хүйтэх боловч зундаа аагим халуун болно.

Жилийн явцад агаарын темпаратурын хамгийн их утга нь 7 дугаар сард, бага утга нь өвөл 1 дугаар сард тус тус ажиглагддаг байна. Жилийн хамгийн дулаан 7 дугаар сарын дундаж агаарын темпаратур +22.1°C хамгийн хүйтэн 1 дугаар сарын дундаж агаарын темпаратур -19.1°C байна. Агаарын үнэмлэхүй хамгийн их темпаратур +33.5°C хүрч дулаарсан бол үнэмлэхүй хамгийн бага темпаратур -31.1°C хүрч хүйтэрсэн байна.

2.3. Гадаргын ус

Үйлдвэр байрлах нутаг дэвсгэр нь Умард говийн гүвээт Халхын дундад талын сав газарт хамаарна. Үйлдвэрийн талбай орчим гадаргын усны сүлжээ муу хөгжсөн, байнгын урсацтай гол горхи болон нуур байхгүй. Умард говийн усны сав газрын хүрээнд гадаргын усны нөөц хомс тул сав газар дахь жижиг нуур, тойром, гол горхиудад ус судлалын байнгын харуул бүхий ажиглалт, хэмжилтийн сүлжээ байхгүй. Сав газрын гадаргын усны сүлжээний нягтшил буюу 1 км² талбайд ногдох голын урт нь маш бага (0.01км/км²) бөгөөд сав газрын хэмжээнд хамгийн их урсац бүрдэлт нь сав газрын хойд, баруун хойд хэсэгт ажиглагдана.

2.4. Газрын доорх ус

“Хөх бишрэлт” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй “Жонш баяжуулах үйлдвэр” байрлах нутаг дэвсгэр нь Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газарт хамаарах ба энэхүү сав газрын гидрогеологийн нөхцлийн гол онцлог нь төв азийн гадагш урсгалгүй ай савд багтах, ихэнх нөхцөлд хоорондоо нарийн хүзүүвчүүдээр холбогдсон, олон төрлийн ус агуулагч үе, давхарга, бүрдэл, ан цавын усжсан бүс бүхий газрын доорх усны сав газар юм. Газрын доорх усны тэжээгдлийн бүс нь янз бүрийн насны өгөршил, тектоникийн хагарал, эвдрэл, ан цавшилт эрчимтэй өртсөн түрмэл (интрузив), бялхмал, тунамал, хувирмал үндсэн чулуулгаас зонхилж тогтсон байна.

Газрын доорх усны хуримтлал болон хөлийн бүс нь дөрөвдэгч, голоцены настай аллюви, пролюви, нуур, салхины гаралтай сэвсгэр хурдасны зузаалаг, дахь уст үе, давхарга, неоген, палеоген, цэрдийн настай тунамал хурдасны зузаалаг дахь нүх сав-давхраасын уст давхарга, бүрдэл, юра, триас, пермийн настай эх газрын гарал үүсэлтэй чулуулгийн зузаалаг дахь ан цавын усжсан бүсээс бүрдсэн хөндий, хотгор, хоолой зэрэг нам доор газрууд хамрагдана.

Газрын доорх усны хөдөлгөөний ерөнхий зүй тогтол нь өндөрлөг хэсгээсээ нам дор газар луугаа чиглэх ба бага зузаантай дөрөвдэгчийн настай сэвсгэр хурдас нь өөрийнхөө доор байрлах бусад ус агуулагч давхарга руу газрын доорх усыг нэвтрүүлэх үүргийг гүйцэтгэдэг. Сав газрын өндөрлөг хэсгүүдээр тархсан үндсэн чулуулгийн массивын гадаргуу орчимд ихэвчлэн экзогенний гарал үүсэлтэй харьцангуй жигд бус, эмх замбараагүй тархалттай ан цавшилын бүс үүссэн байдаг. Эдгээр ан цавын бүсэд газрын доорх ус

тодорхой хэмжээгээр хуримтлагдах боломжтой боловч биеэ даасан уст давхарга ховор ихэвчлэн тэжээлийн гадаад мужийн үүргийг гүйцэтгэнэ.

2.5. Хөрсөн бүрхэвч

Үйлдвэрийн талбайд хамаарах газар нь 1230-1260 метрийн үнэмлэхүй өндөртэй нам уулс болон гүвээрхэг тэгшивтэр талархаг газарт байрлана. Үйлдвэрийн талбайд тархсан хөрсөн бүрхэвч нь Монгол орны хөрс-газарзүйн мужлалтаар хархүрэн, хүрэн хөрс зонхилон тархсан Бор өндөр уул баяны тойрогт хамрагддаг. Энд өргөрөгийн бүсийн зүй тогтолтой уялдан хүрэн хөрс бөгөөд эзэмшил талбайн зүүн хэсэг дэх сайрын гольдролд ул хөрсний усны түвшин, эрдэсжилтээс хамаарч сайрын сул хөгжилтэй хөрс багахан газарт тархдаг.

2.6. Ургамлан нөмрөг

Үйлдвэрийн талбай нь ургамал-газарзүйн тойргоор Дундаж Халхын хээрийн тойрогт байрлах боловч Дорно–Говийн цөлөрхөг хээрийн тойрогт шилжих хил залгаа бүс нутагт байрлаж байна. Энд хойноосоо Дундад халхын хээрийн үет ургамлын төлөөлөл өмнөөсөө цөлөрхөг хээрийн жижиг сөөг сөөгөнцөр ургамлын төлөөлөл тохиолдох онцлогтой. Үйлдвэрийн талбай нь Монголын төв хэсгийн боржин бүхий бэсрэг уулс, ухаа гүвээрхэг толгод хоорондын нарийн хотос хоолойд байрлаж байна.

Ерөнхийдөө талбай орчим нь толгодорхог хэсгээр харгана-үетэн ургамлан бүлгэмдэл харин нам хотос, хажуу хэсгээр харгана-үетэн–алаг өвст, гэсэн 2 үндсэн ургамлан бүлгэмдэл тохиолдож байна. Уг ургамлан бүлгэмдлүүдийг дагаж, Гялгар дэрс (*Achnatherum splendens*), Хазааргана (*Cleistogenes squarrosa*), Ширэг улалж (*Carex duriuscula*), Крылов хялгана (*Stipa Krilovi*), Агь (*Artemisia frigida Willd*), Имт гичгэнэ (*Potentilla bifurca*), Ишгүй гичгэнэ (*Potentilla acaulis*), Жижиг навчит харгана (*Garagana micropylla*), Нарийн навчит харгана (*Caragana stenophylla*), Манан хамхаг (*Bassia dasyphylla*), Аммоны сэдэргэнэ (*Convolus ammoni*), Бага хургалж (*Eragrostis minor*) Шүлхий Шарилж (*Artemisia pectinata*), зэрэг ургамлууд зонхилгогч болон дэд зонхилогчоор ургана.

2.7. Амьтны аймаг

Үйлдвэр байрлах нутаг дэвсгэрийн орчинд хуурай хээр болон хуурайдуу хээрийн экосистем тархсан.

Амьтны аймгийн хувьд цагаан зээр, үлийн цагаан оготно, монгол чичүүл, монгол тарвага, хярс, мануул, идлэг шонхор, хээрийн бүргэд, шилийн сар, монгол болжмор зэрэг хөхтөн болон шувууд төлөөлөх зүйлд тооцогдоно.

Хөхтөн амьтан: Үйлдвэрийн талбай орчим Монгол улсын улаан данс (2006)-ны ховордлын зэргийн үнэлгээгээр “устаж болзошгүй” зүйлийн ангилалд бүртгэгдсэн 1 зүйл, “эмзэг” 1 зүйл, “ховордож болзошгүй” 5 зүйл хөхтөн амьтан тус тус оршин амьдарч байна. Нөгөө талаас “мэдээлэл дутмаг” ангилалд бүртгэгдсэн 5 зүйл хөхтөн амьтад байна.

Мөлхөгчид: Мөлхөгчдөөс энэ бүс нутагт 3 овог, 3 төрөлд хамаарах 3 зүйл тархдаг ажээ. Энд тархсан гүрвэл болон могойн зүйлүүд нь Монгол орны хэмжээнд түгээмэл тархацтай юм. Мөлхөгч амьтдын хувьд газрын тос олборлолт, хайгуулын үед хөнөөгдөх эрсдэл харьцангуй бага бөгөөд энэ талбайд тоо толгойн хувьд элбэг, тархацын хувьд түгээмэл амьтад тархсан байна.

Шувуу: Үйлдвэрийн талбай орчим 123 зүйлийн шувуу тохиох боломжтой ба тус бүс нутагт хээрийн шувууд зонхилон тархсан байдаг. Шувууны аймгийн хувьд зусаж өндөглөдөг ба хэсэгчлэн нүүдэг шувууд зонхилох (103 зүйл) бөгөөд жилийн турш суурин амьдардаг 19 зүйл, зөвхөн өвөл ирээд буцдаг цөөн шувуу (1 зүйл) байна.

3. ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Үйлдвэрээс байгаль орчны бүрдэл хэсгүүд болох газрын гадарга, хэвлий, гадаргын болон газрын доорх ус, хөрс, ургамал зэрэгт үзүүлэх болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг БОННУ-ний тодотгол тайланд нарийвчлан тусгаж, тэдгээрийг бууруулах, сэргийлэх, арилгах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулсан байдаг.

3.1. Газрын гадарга, хэвлий

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас газрын гадарга, хэвлийд үзүүлэх болзошгүй болон зайлшгүй сөрөг нөлөөллүүдийг товч дурдвал:

- Барилгажилт, дэд бүтэц барьж байгуулах болон баяжуулах үйлдвэрийн ашиглалтын үйл ажиллагааны улмаас газрын гадарга, хэвлийн хэлбэр дүрс өөрчлөгдөх,
- Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны улмаас хаягдлын талбай, овоолгын талбай тэлэх, барилга байгууламжууд нэмж байгуулах, шинээр зам гаргах,

3.2. Агаарын чанар

Жигдрүүлсэн хүдрийг бункерт тэжээх, 2 шатны бутлуураар бутлах, шигших, хүдэр хадгалах талбайд туузан дамжуулгаар буулгах зэрэг бүхий л шат дамжлагуудаас тоос тоосонцор үүсдэг. Мөн идэвхтэй овоолго, эвдрэлд орсон талбай зэргээс хуурай салхитай үед тоос шороо агаарт дэгдэж салхины дагуу тархах зэрэг нь үйл ажиллагаанаас агаарт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл болж болзошгүй юм.

3.3. Хөрсөн бүрхэвч, гадаргын болон гүний ус

Үйл ажиллагаанаас гадаргын болон гүний усанд үзүүлэх гол болон болзошгүй нөлөөлөл нь хаягдлын далан болон химийн бодисын агуулхаас бохирдуулагч бодис алдах, шатах тослох материал, хатуу болон шингэн хог хаягдлын талбайгаас бохирдол үүсэх зэрэг юм.

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл нь шинээр шимт хөрсний хуулалт хийгдэх газарт үүсэх хөрсний эвдрэл ба бүтэцийн алдагдал, үйлдвэрийн дотоод замаар зорчих техникийн нөлөөгөөр үүсэх өнгөн хөрсний талхагдал, төслийн талбайгаас үүсэх тоосонцорын тархалт гэсэн өдөр тутамд үүсч байгаа сөрөг нөлөөллөөс гадна авто зогсоол ба засвар үйлчилгээний талбай орчимд үүсэх шатах тослох материалын цэгэн бохирдол, ахуйн гаралтай органик ба хатуу, шингэн хог хаягдлаас үүдэлтэй механик болон нянгийн бохирдол гэсэн болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд байна.

3.4. Ургамлан нөмрөг, амьтны аймаг

Жонш баяжуулах үйлдвэрийн 2022 онд хийгдсэн БОННУ-ний тодотгол тайланд төслийн талбай орчим Монгол улсын улаан данс (2006)-ны ховордлын зэргийн үнэлгээгээр “устаж болзошгүй” зүйлийн ангилалд бүртгэгдсэн 1 зүйл, “эмзэг” 1 зүйл, “ховордож болзошгүй” 5 зүйл хөхтөн амьтан тус тус оршин амьдарч байгаа талаар тусгасан байдаг. Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас амьтны аймагт үзүүлэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл нь дуу чимээнээс амьтад дайжих, зам, дэд бүтэц байгуулснаас үүдэн амьдрах орчин алдагдах зэрэг болно.

Харин ургамлан нөмрөгт үзүүлэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл нь дэд бүтэц, барилга, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаанаас үүдэн ургамлан нөмрөг талхлагдах юм.

4. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ - 2024

“Хөх Бишрэлт” ХХК нь жонш баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа явагдах газар нутгийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг боломжит хамгийн бага түвшинд байлгах, байгаль орчинд үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн талуудын оролцоог хангасан хууль эрх зүйн шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үр дагаврыг тогтмол хянах, илрүүлэх, хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж мөн нутгийн иргэдийн оролцоог хангах, нэмэгдүүлэх зорилт тавьж байна.

Бид 2024 онд Үйлдвэрийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний судалгаагаар тогтоогдсон гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, тухайн жилийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна,

Үйлдвэрийн 2024 оны “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө”-ний гол зорилт нь жонш баяжуулалтын үйл ажиллагаа, химийн бодис тээвэрлэх, хадгалах болон ашиглах, хог хаягдлыг түр хадгалах, тээвэрлэх зэрэг үйл ажиллагааны улмаас байгаль орчинд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ тэдгээрийг хэрэгжүүлэх зардал, баримтлах хууль эрх зүйн орчныг тодорхойлох, мөн байгаль орчинд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Бид 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа Монгол улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” болон “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хуулиуд, 2019 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын А/618 тоот тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, мөн нарийвчилсан үнэлгээний үр дүн зэргийг удирдлага болгож, үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай уялдуулан төлөвлөсөн болно.

Бид үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг байж болох хамгийн бага хэмжээнд байлгах бөгөөд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээ нь тусгай зөвшөөрөлтэй талбай, түүнээс гадна ОХШХ-т багтсан хяналт шинжилгээний цэгүүд хамаарна.

5. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ-2024

“Цагаан Дэл” хайлуур жонш баяжуулах үйлдвэрийн 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд 66 төсөвт болон төсөвт бус арга хэмжээнүүд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. 2024 оны 10-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар БОМТ-ний биелэлт **97.7%**, нийт БОрчны арга хэмжээнд **66.0 сая төгрөг** төсөвлөснөөс, гүйцэтгэлээр **252.75 сая** төгрөг зарцуулсан байна. Доорх хүснэгтэд 2024 оны БОМТ-ний хэрэгжилтийг бүлэг тус бүрээр тусгав. БОМТ-ний хэрэгжилттэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг уг тайлангийн холбогдох бүлгүүдээс харна уу.

Хүснэгт 1. БОМТ-2024 биелэлт бүлэг тус бүрээр

№	БҮЛЭГ	БИЕЛЭЛТ
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө	97%
2	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө	100%
3	Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	100%
4	Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	100%
5	Нүүлгэн шилжүүлэх нөхөн олговор олгох	-
6	Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	100%
7	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	93%
8	Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө	90%
9	Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	100%
10	БОМТ-2024 хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах хуваарь	100%
11	2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	97.7%

5.1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10-р сарын 29-ны өдрийн А/618 тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”, “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө” боловсруулах зөвлөмжийн дагуу уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэх гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийг өртөх орчноор буюу байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэгт хуваасан. Тус бүрэлдэхүүн хэсэг болох агаар, хөрс, гадаргын ба газрын доорх ус, амьтан, ургамал, газрын хэвлийд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах зэрэг чиглэлүүдээр бүлэглэн энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулсан.

БОННУ-нд тодорхойлсон байгаль орчны бүрдэл хэсгүүдэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл мөн төслийн 2024 оны үйл ажиллагаатай уялдуулан гол болон болзошгүй 11 сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, тэдгээрийг бууруулах, сэргийлэх, арилгах 17 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Төлөвлөн хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бүрд тухайн сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ, хэмжих нэгж, шаардагдах төсөв, баримтлах стандарт, хуулийн шаардлагыг тусгасан болно.

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд нийт 17 арга хэмжээ төлөвлөснөөс 17 ажлыг хэрэгжүүлсэн буюу тогтмол хэрэгжиж Тус төлөвлөгөөний хэрэгжилт 11-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар 97%-тай байна.

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд төлөвлөсөн ажлуудын биелэлтийн тайлбарыг доорх хүснэгтээс, мөн нотлох баримтыг хавсралтаас харна уу.

Энэхүү сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийн товч тайлбарыг Хүснэгт 2. -с, дэлгэрэнгүйг бичвэр мэдээллийг тайлангийн 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 0, бүлгүүдээс харна уу.

Хүснэгт 2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
Агаар			
1	Нам даралтын халаалтын зуухнаас гарах утаанд агаарт ялгарах бохирдлын хэмжээг тодорхойлуулах, агаарын бохирдуулсны төлбөрийг төлөх	Биелсэн	Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын Байгаль орчин, хэмжил зүйн төв лаборатори-д тайлант жилд хүсэлт гарган хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоос, дуу чимээ хэмжилтүүд хийлгэсэн.
2	Олон салаа зам гаргахаас сэргийлэх шаардлагагүй замыг хаах, тэмдэг байрлуулах, хурдны хязгаар тогтоох	Биелсэн	Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд хурдны хязгаарыг дагаж мөрдөж ажиллаж байна. Мөн хурдны хязгаар тогтоох тэмдэг, тэмдэглэгээ 4 ш шинээр байрлуулсан.
3	Баяжуулах үйлдвэрийн тоос босох боломжтой байршлуудад тоосны болон агаарын бохирдлын хэмжилтийг тогтмол хийх. Стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гарсан тохиолдолд хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх	Биелсэн	Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын Байгаль орчин, хэмжил зүйн төв лаборатори-д тайлант жилд хүсэлт гарган хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоос, дуу чимээ хэмжилтүүд хийлгэсэн.
4	Суурин тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг тогтмол хийх	Биелсэн	Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийн засвар үйлчилгээг тогтмол хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Хөрс			
5	Хөнгөн тэрэгний засвар үйлчилгээг хуваарийн дагуу хийх	Биелсэн	Үйл ажиллагаанд ашиглагддаг хөнгөн тэрэгнүүдийн засвар үйлчилгээг 5000 км тутамд хийж ажиллаж байна.
6	ШТС-г байнгын хяналтад байлгаж өдөр тутмын үзлэг хийх	Биелсэн	Холбогдох ажилчид шатахуун түгээх станцад тогтмол үзлэг хийж, аюулгүй ажиллагаа болон байгаль орчны эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
7	Тоног төхөөрөмж, хөнгөн тэрэг, технологийн хүнд машин механизмын засвар үйлчилгээг зориулалтын хөрсөнд нэвчилт үүсгэхгүй талбайд хийх	Биелсэн	Баяжуулах үйлдвэр дотор байрлах бетон талбайд тоног төхөөрөмж, хөнгөн тэрэгний засвар үйлчилгээг хийж ажиллаж байна.
8	Асгаралттай тэмцэх иж бүрдлийн бүрэн байдлын үзлэгийн сар тутам гүйцэтгэх, шаардлагатай тохиолдолд тухайн бүрд цэнэглэх	Биелсэн	Аюулгүй ажиллагааны ажилтан сар бүр асгаралттай тэмцэх иж бүрдлийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, шаардлагатай тохиолдолд цэнэглэлт хийж ажиллаж байна.
9	Химийн бодисын агуулахаас асгаралт үүсэхээс сэргийлж тогтмол ажлын байрны үзлэг хийх, аливаа дутагдал, зөрчил илэрсэн тохиолдолд тухай бүр сайжруулах, залруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх	Биелсэн	Аюулгүй ажиллагааны ажилтан, баяжуулах үйлдвэрийн ажилчид химийн бодисын агуулахад тогтмол үзлэгийг хийж, аливаа аюул, эрсдэл, асгаралтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан.
10	Шимт хөрсний овоолгийн ахилт хийгдэхгүй хэсгийг хэлбэржүүлж, шимт чанарыг алдагдахаас сэргийлж ургамалжуулах	Биелсэн	Шимт хөрсний овоолгод ургамалжуулалтийн ажлын хүрээнд ургамлын үр тарьсан.
Гадаргын болон газрын доорх ус			
11	Хаягдлын сангийн тогтвортой байдал, аюулгүй ажиллагааг хангах, тогтмол үзлэг хийх, зөрчил, дутагдал илэрсэн тохиолдолд тухай бүр сайжруулах, залруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх	Биелсэн	Холбогдох ажилчид хаягдлын сангийн үзлэгийг хуваарийн дагуу хийж ажилласан.

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
12	Гүний худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоох, худгуудын тоолуурын заалтыг БОрчны хяналтын улсын байцаагчийг байлцуулан акт үйлдэж байх, ус ашиглах гэрээг эрх бүхий байгууллагатай байгуулах	Биелсэн	Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч болон татварын улсын байцаагч нарыг байлцуулан худгуудын тоолуурын заалтын акт үйлдэж, түүн дээр үндэслэн нэхэмжлэх гаргуулан авч, төлбөрийг төлөн ажилласан.
13	Газрын доорх усны геофизикийн судалгаа хийлгэх, судалгаанаас гарсан үр дүнгээс хамааран хяналтын цооног байгуулах,	Биелсэн	Баяжуулах үйлдвэрийн талбайд газрын доорх усны хяналтын цооног өрөмдүүлэн гаргуулсан.
Ургамал			
14	Тоос босож буй зам талбайд усалгааг тогтмол хийх	Биелсэн	Тайлант жилд хур тунадас сайн орсон тул зам талбайн усалгааг зөвхөн шаардлагатай тохиолдлуудад хийж ажилласан.
15	Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх	Биелсэн	Галын аюулаас аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд ХАБЭА-н ажилтан нь нийт 76 ажилтанд галын аюулаас сэргийлэх онол болон практик сургалтыг орсон.
Амьтан			
16	Төслийн хашааны бүрэн бүтэн байдлыг хянаж мал, амьтан орохоос сэргийлж үзлэг шалгалт хийх	Биелсэн	Баяжуулах үйлдвэрийн шаардлагатай газруудад мал амьтан орохоос сэргийлсэн хашаа суурилуулах ажлыг хийж байгаа бөгөөд харахан дуусаагүй байна. Мөн хашаа дагасан мод тарихаар төлөвлөж байна.
17	Баяжуулах үйлдвэрийн талбай орчимд мал, амьтан эндсэн тохиолдолд халдвар хамгааллын дэглэмийн хүрээнд ашиглах багаж, тоног төхөөрөмжийн иж бүрдэл худалдан авч, бэлэн байдлыг ханган ажиллах	Биелсэн	Мал, амьтны осол эндэгдлийн үед ашиглах тоног төхөөрөмж болон материал бүхий иж бүрдэл бүрдүүлсэн.

5.1.1. Агаарын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

5.1.1.1. Нам даралтын халаалтын зуухнаас гарах утаанд агаарт ялгарах бохирдлын хэмжээг тодорхойлуулах, агаарын бохирдуулсны төлбөрийг төлөх

Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын Байгаль орчин, хэмжил зүйн төв лаборатори-д тайлант жилд хүсэлт гарган хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоос, дуу чимээ хэмжилтүүд хийлгэсэн. Мөн нам даралтын зуухны их засвар, үйлчилгээний арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.

5.1.1.2. Олон салаа зам гаргахаас сэргийлэх шаардлагагүй замыг хаах, тэмдэг байрлуулах, хурдны хязгаар тогтоох

Үйлдвэрийн талбайд тогтсон замуудаар тээврийн хөдөлгөөн үйлддэг бөгөөд автозамуудад хурдны хязгаарын 5, 10 км/цаг явах тэмдэг, тэмдэглэгээнүүдийг байршуулсан. Төслийн талбайд замын тэмдэг тэмдэглэгээ нийт 4 ш байрлуулсан.



Зураг 5. Хурдны хязгаар тогтоосон болон зорчих хэсгийг тогтоосон тэмдгүүд

5.1.1.3. Баяжуулах үйлдвэрийн тоос босох боломжтой байршлуудад тоосны болон агаарын бохирдлын хэмжилтийг тогтмол хийх. Стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гарсан тохиолдолд хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх

Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын Байгаль орчин, хэмжил зүйн төв лаборатори-д тайлант жилд хүсэлт гарган хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоос, дуу чимээ хэмжилтүүдийг нийт 2 удаа хийлгэсэн. Тухайн хэмжилтүүдийн үр дүнгээр холбогдох стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гараагүй болно.



**ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ**

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо. Утас: 11-341818
E-mail: bohzt@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН



Дугаар он/IV
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал
Сорьцын тоо, төрөл
Сорьц авсан өнөө
Сорьцын тодорхойлолт
Шинжилгээний аргын стандарт

Шинжилсэн өнөө
Хуудасны тоо
Үг дүм

2024/А-273
“Хөх Бишрэлт” ХХК
Д.Сүнд агаарын хэсэг
2 агаар, 2 дуу чимээ
2024.10.05
Хэнтий аймаг Их хэт сум жоншны үйлдвэр
MNS 17-2-5-12-2021, MNS 17-2-5-11-2021
MNS 5002-2000, CAJ A07-2016
2024.10.07
1/1

№	Сорьц авсан газар	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос (TSP)	Дуу чимээ
							дБА
1	Бутлуур орчим	Х/05	14:10	0.034	0.072	0.140	60
2	Уурын бууц орчим	Х/05	15:05	0.091	0.074	0.340	64
				0.450	0.200	0.500	60

Агаарын чанарын стандарт MNS 4588:2016 (20 минутын хэмжилт)

Шинжилгээг гүйцэтгэсэн шинжлэгч:

Хянаж баталгаажуулсан:

Байгаль орчны шинжилгээний алба хаагч



Э.Оюунтуяа

Д.Түвшиндэлгэр

Зураг 6. Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын хэмжилтийн үр дүн

5.1.1.4. Суурин тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг тогтмол хийх

Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдэд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус үзлэг, засвар үйлчилгээг хуваарийн дагуу тогтмол хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тухайн засвар үйлчилгээний хүрээнд баяжуулах үйлдвэрийн нам даралтын зууханд их засвар, үйлчилгээг мөн хэрэгжүүлэн ажилласан.



Зураг 7. Баяжуулах үйлдвэр доторх засвар, үйлчилгээний талбай

5.1.2. Хөрсний сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

5.1.2.1. Хөнгөн тэрэгний засвар үйлчилгээг хуваарийн дагуу хийх

Үйл ажиллагаанд ашиглагддаг хөнгөн тэрэгнүүдийн засвар үйлчилгээг 5000 км тутамд хийж ажиллаж байна. Засвар үйлчилгээний хүрээнд тос, тосолгооны шингэнг солих, шүүрнүүдийг цэвэрлэх болон солих, бусад үзлэг болон үйлчилгээг хийж ажилласан.



Зураг 8. Баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдаж буй дугуйт ачигч

5.1.2.2. ШТС-г байнгын хяналтад байлгаж өдөр тутмын үзлэг хийх

Холбогдох ажилчид шатахуун түгээх станцад тогтмол үзлэг хийж, аюулгүй ажиллагаа болон байгаль орчны эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тайлант жилд шатахуун түгээх станцад анхаарал татахуйц эвдрэл болон доголдол үүсээгүй болно.

5.1.2.3. Тоног төхөөрөмж, хөнгөн тэрэг, технологийн хүнд машин механизмын засвар үйлчилгээг зориулалтын хөрсөнд нэвчилт үүсгэхгүй талбайд хийх

Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдэд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус үзлэг, засвар үйлчилгээг хуваарийн дагуу тогтмол хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үйл ажиллагаанд ашиглагддаг хөнгөн тэрэгнүүдийн засвар үйлчилгээг 5000 км тутамд хийж ажиллаж байна. Засвар үйлчилгээний хүрээнд тос, тосолгооны шингэнг солих, шүүрнүүдийг цэвэрлэх болон солих, бусад үзлэг болон үйлчилгээг хийж ажилласан.



Зураг 9. Баяжуулах үйлдвэр доторх засвар, үйлчилгээний талбай

5.1.2.4. Асгаралттай тэмцэх иж бүрдлийн бүрэн байдлын үзлэгийн сар тутам гүйцэтгэх, шаардлагатай тохиолдолд тухайн бүрд цэнэглэх

Баяжуулах үйлдвэр болон химийн бодисын агуулахад шингээгч материал, аюулын үед ашиглах тоног төхөөрөмж болон модны үртэс бүхий асгаралттай тэмцэх иж бүрдлүүд байрлуулсан. Тухайн асгаралттай тэмцэх иж бүрдлүүдийн үзлэгийг аюулгүй ажиллагааны ажилтан тогтмол хэрэгжүүлсэн бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд цэнэглэх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.



Зураг 10. Асгаралттай тэмцэх иж бүрдэл байрлуулсан байдал

5.1.2.5. Химийн бодисын агуулахаас асгаралт үүсэхээс сэргийлж тогтмол ажлын байрны үзлэг хийх, аливаа дутагдал, зөрчил илэрсэн тохиолдолд тухай бүр сайжруулах, залруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх

Аюулгүй ажиллагааны ажилтан, баяжуулах үйлдвэрийн ажилчид химийн бодисын агуулахад тогтмол үзлэгийг хийж, аливаа аюул, эрсдэл, асгаралтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан. Тайлант жилд химийн бодисын агуулахын үзлэгээр ямарваа анхаарал татахуйц дутагдал, зөрчил илрээгүй болно.

5.1.2.6. Шимт хөрсний овоолгийн ахилт хийгдэхгүй хэсгийг хэлбэржүүлж, шимт чанарыг алдагдахаас сэргийлж ургамалжуулах

Шимт хөрсний чанар, хэмжээ, хэлбэрийг алдагдахаас сэргийлэн шимт хөрсний овоолгод хэлбэржүүлэлт хийж, зүлэгний үр тарьсан.



Зураг 11. Шимт хөрсний овоолгод хэлбэржүүлэлт хийж, тариатад бэлдэж буй байдал

5.1.3. Усны сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

5.1.3.1. Хаягдлын сангийн тогтвортой байдал, аюулгүй ажиллагааг хангах, тогтмол үзлэг хийх, зөрчил, дутагдал илэрсэн тохиолдолд тухай бүр сайжруулах, залруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх

Үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны ажилтан болон баяжуулах үйлдвэрийн холбогдох ажилчид хаягдлын сан, далан, түүний хамаарал бүхий тоног төхөөрөмжийн үзлэг, шалгалтыг өдөр тутам хийж ажилласан. Тухайн үзлэгийн үеэр ямарваа нэг анхаарал татахуйц дутагдал, зөрчил, эвдрэл илрээгүй болно.

5.1.3.2. Гүний худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоох, худгуудын тоолуурын заалтыг БОрчны хяналтын улсын байцаагчийг байлцуулан акт үйлдэж байх, ус ашиглах гэрээг эрх бүхий байгууллагатай байгуулах

Баяжуулах үйлдвэр болон унд ахуйн хэрэглээнд ашигласан усны хэрэглээ, худгуудын тоолуурын заалтыг Иххэт сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч болон Татварын улсын байцаагч нарыг байлцуулан актаар баталгаажуулан, төлбөрийн нэхэмжлэхийг гаргуулан ажилласан. Тус төлбөрийн нэхэмжлэх дээр үндэслэн ус ашигласны төлбөрийг холбогдох төрийн дансанд байрлуулан ажилласан байна.

ТӨЛБӨРИЙН ДААЛГАВАР №355
2024 оны 05 сарын 31-ны өдөр

Төлөгч: Хөх Бишрэлт ХХК	Дт данс	ДҮН
Банк: ХААН БАНК	5166055499	10,000,000.00
Хүлээн авагч: Дорноговь татварын алба	3240312231078	
Банк: БАНК		
Мөнгөний дүн /үсгээр/ Арван сая төгрөг ..00. мөнгө Барааг хүлээн авсан буюу ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлсэн Төлбөрийн зориулалт: Барааны болон ажил үйлчилгээний нэр, дагалдах баримтын № Хөх Бишрэлт ХХК рд: 5878756 Үйлдвэрийн зориулалтаар ашигласан усны төлбөр 2024-1		

Дарга..... ПЕН ДЕВЕН
Тамга.....

Банкинд гүйлгээ хийсэн
2024 он 05 сар 31 өдөр

ТЭМДЭГ ГАРЫН ҮСЭГ

Зураг 12. Ус ашигласны төлбөр төлсөн баримт

5.1.3.3. Газрын доорх усны геофизикийн судалгаа хийлгэх, судалгаанаас гарсан үр дүнгээс хамааран хяналтын цооног байгуулах

Тайлант жилд 2024 оны 5-р сарын 31-ны өдөр “Гранд Холдинг” ХХК-тай Г-05/24 тоот “Ажил гүйцэтгэх гэрээ” байгуулсан. Тус гэрээний дагуу баяжуулах үйлдвэрийн талбайд газрын доорх усны хяналтын цооног өрөмдөх ажлыг хэрэгжүүлсэн. Хяналтын цооног нь 50 м гүнтэй бөгөөд 2025 оны ОХШХ-т тухайн цооногоос хуваарийн дагуу дээжлэлт хийж, Монгол улсад магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна.

ТӨЛБӨРИЙН ДААЛГАВАР №329
2024 оны 05 сарын 27-ны өдөр

Төлөгч: Хөх Бишрэлт ХХК	Дт данс	ДҮН
Банк: ХААН БАНК	5166055499	10,000,000.00
Хүлээн авагч: Грандхолдинг	343100032007	
Банк: Төрийн банк		
Мөнгөний дүн /үсгээр/ Арван сая төгрөг .. мөнгө Барааг хүлээн авсан буюу ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлсэн Төлбөрийн зориулалт: Барааны болон ажил үйлчилгээний нэр, дагалдах баримтын № рд: 5021065 сити сүлжээ ХХК -хяналт цооног урьд		

Дарга..... ПЕН ДЕВЕН
Тамга.....

Банкинд гүйлгээ хийсэн
2024 он 05 сар 27 өдөр

ТЭМДЭГ ГАРЫН ҮСЭГ

Зураг 13. Хяналтын цооног өрөмдүүлэн гаргуулах ажлын төлбөр төлсөн баримт

5.1.4. Ургамалын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

5.1.4.1. Тоос босож буй зам талбайд усалгааг тогтмол хийх

Тайлант жилд хур тунадас их унасан учир зам талбайн усалгаа тогтмол хийгээгүй. Гэхдээ хур тунадас ороогүй, хуурайшилттай буюу зам талбайгаас тоос босох тохиолдолд усалгааг тухай бүрд хэрэгжүүлэн ажилласан.

5.1.4.2. Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийх

Галын аюулаас аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд ХАБЭА-н ажилтан нь нийт 76 ажилтанд галын аюулаас сэргийлэх онол болон практик сургалтыг орсон.



Зураг 14. ХАБЭА-н ажилтан галын аюулаас сэргийлэх сургалт орж буй байдал

5.1.5. Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

5.1.4.1. Төслийн хашааны бүрэн бүтэн байдлыг хянаж мал, амьтан орохоос сэргийлж үзлэг шалгалт хийх

Баяжуулах үйлдвэрийн шаардлагатай газруудад мал амьтан орохоос сэргийлсэн хашаа суурилуулах ажлыг хийж байгаа бөгөөд харахан дуусаагүй байна. Тухайн хашаа суурилуулах ажил цаг уур хүйтэрсэнтэй холбоотой түр зогссон бөгөөд 2025 онд дулааны улирал эхэлсний дараа үргэлжлүүлэн хийж, хэрэгжилтийг бүрэн хангахаар төлөвлөж байна. Мөн хашаа дагасан мод тарихаар төлөвлөж байна.

5.1.4.2. Баяжуулах үйлдвэрийн талбай орчимд мал, амьтан эндсэн тохиолдолд халдвар хамгааллын дэглэмийн хүрээнд ашиглах багаж, тоног төхөөрөмжийн иж бүрдэл худалдан авч, бэлэн байдлыг ханган ажиллах

Мал, амьтны осол эндэгдлийн үед ашиглах тоног төхөөрөмж болон материал бүхий иж бүрдэл бүрдүүлсэн.



Зураг 15. Мал, амьтны осол эндэгдлийн үеийн иж бүрдэл

5.2. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

“Хөх Бишрэлт” ХХК нь “Цагаан Дэл” хайлуур жонш баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хариуцлагатай байлгах, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг Монгол улсын холбогдох хууль, эрх зүй, стандарт шаардлагуудад нийцүүлэх, тухайн бүс нутгийн цаг уурын онцлог, ордын геологийн тогтоц, орчин нөхцөлд тохирсон байх, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн туршлага арга зүйд тулгуурлах, байгалийн унаган төрхийг хэвээр хадгалах, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах зэрэг зарчмуудыг баримтлан ажиллаж байна. Тус төлөвлөгөөний товч тайлбарыг Хүснэгт 3. бичвэр мэдээллийг тайлангийн 5.2.1.1-5.2.2.1 бүлгүүдээс харна уу

Хүснэгт 3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
Биологийн нөхөн сэргээлт			
1	Шимт хөрсний овоолгийн ахилт хийгдэхгүй хэсгийг хэлбэржүүлж, шимт чанарыг алдагдахаас сэргийлж ургамалжуулах	Биелсэн	Шимт хөрсний чанар, хэмжээ, хэлбэр алдагдахаас сэргийлж 5-р сард зүлэгжүүлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлсэн.
2	Өнгөрсөн жилүүдэд хийгдсэн техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайнуудад шаардлагатай тохиолдолд нэмэрлэн тариалалт хийх	Биелсэн	Өнгөрсөн жилүүдийн нөхөн сэргээлтийн талбайнуудад нэмэрлэн тарилт хийх шаардлага үүсээгүй болно.

5.2.1. Биологийн нөхөн сэргээлт

5.2.1.1. Шимт хөрсний овоолгийн ахилт хийгдэхгүй хэсгийг хэлбэржүүлж, шимт чанарыг алдагдахаас сэргийлж ургамалжуулах

Үйлдвэрийн хаалт болон явцын нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламжийн үйл ажиллагаанд хамгийн чухал, шаардлагатай зүйл шимт хөрс байдаг. Шимт хөрсний чанар, хэмжээ, хэлбэр алдагдахаас сэргийлэн овоолгод олон наст болон нэгт наст ургамлын үрийг хольж тарьсан. Тарилт хийхийн өмнө дугуйт ачигч техник ашиглан овоолгын налууг багасгах, ургамал тарих талбайг хэлбэржүүлэн бэлтгэл ажлыг хангасан. Тарьсан ургамлын ургалтыг 2025 онд ажиглалт хийж шалгах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд нэмэрлэн тарилтыг хийх болно.



Зураг 16. Овоолгын хэлбэржүүлэлт хийж, тарилтад бэлдэж буй байдал

5.2.1.2. Өнгөрсөн жилүүдэд хийгдсэн техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайнуудад шаардлагатай тохиолдолд нэмэрлэн тариалалт хийх

Өнгөрсөн жилүүдийн нөхөн сэргээлтийн талбайнуудад нэмэрлэн тарилт хийх шаардлага үүсээгүй болно.

5.3. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

“Хөх Бишрэлт” ХХК нь Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн холбогдох заалтууд, Засгийн газрын 2013 оны 374 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журмын 5.2, 5.3 дах заалтууд болон 2014 оны БОНХ-ийн сайдын А-117 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт “Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний аргачлал”-ын 3.3.6-д тус тус заасны дагуу Биологийн олон янз байдлыг (БОЯБ) дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.


Тайлант жилд биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрээнд 2 ажил төлөвлөсөн. Тус төлөвлөгөөний хүрээнд Иххэт сумын “Хөх Өндөр” нэртэй газарт 1.2 га талбайд хэсэгчилсэн техникийн нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлж холбогдох сумын ЗДТГ-т хүлээлгэн өгсөн. Мөн орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд булгийн эх хашиж хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Тус төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар 100 хувьтай байна.

Хүснэгт 4. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт			
№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын төлөвлөгөө боловсруулах			
1	Холбогдох орон нутгийн засаг даргын тамгын газар, БОАЖГ-тай хамтран хэрэгжүүлж болох биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хувилбаруудыг тодорхойлох	Биелсэн	Аймгийн БОАЖГ болон сумын ЗДТГ-ын санал болгосноор тарвага нутагшуулах ажлыг хийлгэхээр 2024 онд судалгааны ажлыг хийлгэсэн. Урьдчилгаа санхүүжилт 21.0 сая төгрөгийн зардалыг шилжүүлсэн.
Дүйцүүлэн нөхөн сэргээлт			
2	Орон нутгын удирдлагатай зөвшилцөн эзэнгүй орхигдсон эвдэрсэн газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийх	Биелсэн	Орон нутгийн иргэдийн өнгөт чулуу олборлож эвдрэлд орсон газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн.
Биотехникийн арга хэмжээ			
3	Зэрлэг амьтанд өвс тэжээл өгөх ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах	Биелсэн	Тайлант жилийн өвөл 300 боодол өвс 5 аргал хонь амьдардаг байршилд тавьж өгөх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.

5.3.1. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын төлөвлөгөө боловсруулах

5.5.1.1. Холбогдох орон нутгийн засаг даргын тамгын газар, БОАЖГ-тай хамтран хэрэгжүүлж болох биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хувилбаруудыг тодорхойлох

Дорноговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар болон Иххэт сумын Засаг даргын тамгын газруудтай 2024 онд хэрэгжүүлэх Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээний талаар санал солилцсон. Тухайн байгууллагуудаас Иххэт сумын нутагт Монгол тарвага сэргээн нутагшуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр болсон. Сэргээн нутагшуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр “Хустайн Цогцолборт Газар” төв ТББ-тай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан. Тус гэрээний хүрээнд тайлант жилд тарвага сэргээн нутагшуулах ажлын судалгааг хэрэгжүүлсэн /Хавсралт 2. Тарвага сэргээн нутагшуулах ажил гүйцэтгэх гэрээ/.

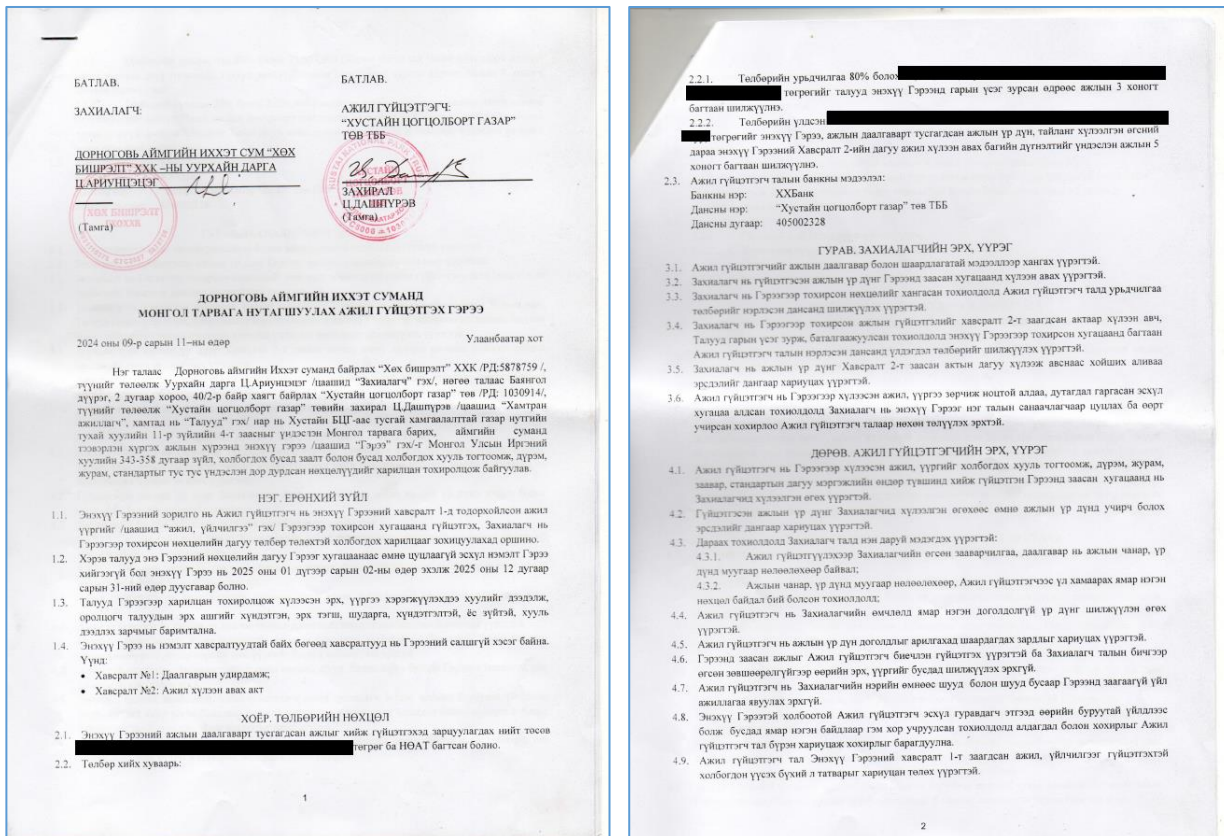

Зураг 17. Тарвага сэргээн нутагшуулах ажил гүйцэтгэх гэрээ

5.3.2. Дүйцүүлэн нөхөн сэргээлт

5.5.1.1. Орон нутгын удирдлагатай зөвшилцөн эзэнгүй орхигдсон эвдэрсэн газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийх

Дорноговь аймгийн Иххэт сумын Засаг даргын тамгын газартай ярилцсаны үндсэн дээр сумын Бүрдэнэ багийн нутагт орших “Хөх Өндөр” нэртэй орон нутгийн иргэдийн өнгөт чулуу зөвшөөрөлгүй олборлож, нөхөн сэргээлт хийлгүй эвдрэлд оруулан орхисон талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийх ажлыг хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон. Техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэх ажлыг “Хөх Бишрэлт” ХХК нь өөрийн техник, ажиллах хүчээр хийхээр гэрээ байгуулан, гүйцэтгэлийг ханган ажилласан /Хавсралт 3. Дүйцүүлэн нөхөн сэргээлт хийх ажлын гэрээ/. Нөхөн сэргээлтийн хүрээнд нийт 11.1 га талбайд 2024 оны 10-р сарын 21-ны өдрөөс 10-р сарын 28-ны өдрүүдийн хооронд гүйцэтгэсэн. Гүйцэтгэсэн дүйцүүлэн нөхөн сэргээлтийг Дорноговь аймгийн Иххэт сумын засаг даргын 2024 оны 10-р сарын 21-ний өдрийн А/83 тоот захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн /Хавсралт 4. Нөхөн сэргээсэн газрыг хүлээн авах комисс томилох тухай захирамж/.

Нөхөн сэргээлт хийсэн газрыг хүлээж авах ажлыг 2024 оны 10-р сарын 29-ны өдөр ажлын хэсэг нөхөн сэргээлтийн талбайд биечлэн танилцаж, актаар баталгаажуулсан байдаг /Хавсралт 5. Нөхөн сэргээлт хийсэн газрыг хүлээн авах акт/.



Зураг 18. Техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэж буй байдал

5.3.3. Биотехникийн арга хэмжээ

5.3.3.1. Зэрлэг амьтанд өвс тэжээл өгөх ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах

Тайлант жилд биотехникийн арга хэмжээний хүрээнд мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зэрлэг амьтанд өвс, тэжээл тавьж өгөх ажлыг зохион байгуулсан. Тус ажлын хүрээнд Дорноговь аймгийн нутагт байршин амьдардаг 5 аргал хонинд 300 боодол өвс тавьж өгөх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.



Зураг 19. Биотехникийн арга хэмжээ

5.4. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Үйлдвэрийн нөлөөллийн бүсэд хамрагдаж байсан нэг өрхөд нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох, тусламж үзүүлэх санал албан ёсоор гаргасан. Гэвч тухайн өрх саналыг хүлээн аваагүй бөгөөд үйлдвэрийн нөлөөллийн бүсээс нүүсэн. Иймд үйлдвэрийн нөлөөллийн бүсэд орших нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шаардлагатай өрх байхгүй болно.

Хүснэгт 5. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээ			
1	2024 онд Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөт ажил төлөвлөөгүй болно	Хэрэгжиж дууссан	-

5.5. Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

“Хөх Бишрэлт” ХХК нь түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээг холбогдох хууль, дүрэм журмын хүрээнд хэрэгжүүлэн ажиллахыг зорилго болгон ажилладаг. Үүний хүрээнд соёлын биет болон биет бус өвийг хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах арга хэмжээнд хувь нэмэр оруулан ажиллахыг зорьж байна.

Компанийн дээрх зорилгын хүрээнд “Хөх Бишрэлт” ХХК нь түүх соёлын өвийн хамгааллын арга хэмжээний хүрээнд 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд 3 арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжилтийг 100 хувь биелүүлэн ажиллалаа. Биелэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хүснэгт болон холбогдох дэд бүлгүүдээс харна уу.

Хүснэгт 6. Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт			
№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
Биет бус өв			
1	Иххэт сумын ЗДТГ-тай хамтран биет болон биет бус өврүү чиглэсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх	Биелсэн	Иххэт сум үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойд зориулсан түүхэн ном хэвлүүлэх, байгалийн үзэсгэлэнт болон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн танилцуулга ном хэвлүүлэх арга хэмжээнг хэрэгжүүлэн, орон нутгийн иргэдэд тараасан. Сумын нум сумын харвааны холбоонд анхлан суралцгчидад зориулан нум сум авч өгсөн.
Журам			
2	Түүх, соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журмыг боловсруулах.	Биелсэн	Түүх, соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журмыг боловсруулан, батлуулсан.
3	Түүх, соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журмыг нийт ажилчдад танилцуулах сургалт орох. Журмын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах	Биелсэн	Компанийн ХАБЭА-н давтан сургалттай хамтран Түүх, соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журмыг нийт ажилчдад танилцуулан сургалт орсон.

5.5.1. Биет бус өв

5.5.1.1. Иххэт сумын ЗДТГ-тай хамтран биет болон биет бус өврүү чиглэсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх

Иххэт сум үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойд зориулсан түүхэн номыг 65.0 сая төгрөгөөр, байгалийн үзэсгэлэнт болон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн танилцуулга номыг 25.0 сая төгрөгөөр санхүүжүүлж хэвлэн, орон нутгийн иргэдэд тараасан /Хавсралт 6. Түүхэн болон газар нутгийн танилцуулга ном хэвлүүлэх ажлын төлбөрийн нэхэмжлэх/. Мөн Иххэт сумын нум сумын харвааны холбоонд анхлан суралцагчидад зориулан 2.0 сая төгрөгөөр нум сум худалдан авч өгсөн.



Зураг 20. Хэвлүүлсэн номын хэсгээс

5.5.2. Журам

5.5.2.1. Түүх, соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журмыг боловсруулах

Компанийн “Түүх, соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журам”-ыг боловсруулан, Гүйцэтгэх захирлаар батлуулсан.

ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ БОЛОН ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ ЖУРАМ 1. Зорилго 1.1. Энэхүү Түүх, соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журам (шаард “Журам гэх”)–ын зорилго нь Степ Голд ХХК (шаард “Компани” гэх)–ийн Алтан Цагаан-Овоо уурхайд хайгуулын болон олборлогийн үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш үйл ажиллагааны бүх үе шатанд археологи, палеонтологийн олдвор санамсаргүй байдалаар олдсон тохиолдолд уг олдвор, хэрэгсэлдхүүнд ямарваа гэмтэл учруулалгүйгээр холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хамгаалах, тээвэрлэх, судлуулах, мон газрын хөрсон доор байгаа археологи, палеонтологийн дурсгалуудад тохиолдож болохгүй эрсдэлийг бодитойгоор бууруулахад оршино. 2. Хамрах хүрээ 2.1. Энэхүү журам нь үндсэн болон гэрээт компанийн нийт ажилтанд хамаарна. 3. Нэр томьёо 3.1. Соёлын өв гэдэг нэр томьёог хүмүүс өөрсдийнх нь тогтмол хувьсан өөрчлөгдөж байгаа үнэт зүйлс, итгэл үнэмшил, мэдлэг, уламжлалын тусгал, илэрхийлэл гэж өмчлөөс нь үл хамааран үлдэг, өнгөрсөн үеэс өвлөгдөн ирсэн баялаг гэж тодорхойлдог. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 7.1-д “Монголын ард түмний түүх, соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв төрийн хамгаалалтад байна.” хэмээн заасан бол, Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 3.1.1 дэх заалтад “Соёлын өв” гэж түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийн аль нэг хэсгийг төлөөлж чадах байгаль, нийгэм, түүх, соёл, урлаг, шинжлэх ухааны үнэ цэнэ, ач холбогдол бүхий өв” хэмээн тодорхойлсон байдаг. 3.2. Дараах соёлын биет өвийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалд хамааруулаа: 3.2.1. эртний ургамал, амьтны чулуужсан олдворт газар; 3.2.2. эртний хүний оршин сууж байсан үл мөрийг хадгалсан соёлт давхарга; 3.2.3. чулуун хэвсгийн олдворт газар; 3.2.4. хадны зураг, бичлэг; 3.2.5. булш, хиргисүүр, оршуулга, тахиа, тайгын байгууламж; 3.2.6. эртний хот суурин, сүм хийдийн үлдэгдэл, архитектурын дурсгалт; 3.2.7. хөшөө дурсгалт; 3.2.8. эрт цагт ашигт малтмал олборлож, боловсруулж үйлдвэрлэл, газар тариалан эрхэлж байсан газар, түүнд холбогдох чулуун дурсгалт; 3.2.9. тахиогат газар; 3.2.10. түүхэн үйл явдал болсон дурсгалт газар; 3.2.11. бусад түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт. 4. Үүрэг хариуцлага 4.1. Ерөнхий менежер болон удирдах түвшний ажилтнууд: Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 38.3-д, “Газрын хэвлийг эзэмших, ашиглах явцад соёлын биет өв илэрвэл газрын хэвлийг ашиглагч ажлаа зогсоож, энэ тухай сум, дүүргийн Засаг дарга, цагдаагийн болон уг асуудлыг хариуцсан мэргэжлийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэн” хэмээн заасны дагуу Монгол	Улсын Шинжлэх ухааны академийн Түүх, Археологийн хүрээнд албан ёсоор шинжлүүлэх хүртэлх хугацаанд тус байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу хадгалан хамгаална. 4.2. Байгаль орчны менежер: энэхүү журамд заасан шаардлагыг нийт ажилтан мөрдөж ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавина. 4.3. Байгаль орчны мэргэжилтэн: энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, мэргэжлийн байгууллагад мэдээлэх асуудлыг хариуна. 4.4. Байгаль орчны ажилтан: Төслийн талбайд ажиллаж байгаа үндсэн болон гэрээт компанийн нийт ажилтанд энэ журамд заасан үүрэг хариуцлагыг нь бүрэн ойлгуулах, журмын хэрэгжилтийг хангах үүрэг, ажлын удирдамж өгөх үүрэгтэй. SG-ENV-PROC-008-04 “Байгаль орчны сургалтын журам”-ын дагуу нийт ажилтанд сургалт орох. 4.5. Нийт ажилтнууд: энэхүү журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллах үүрэгтэй ба журам зөрчилдсөн тохиолдолд: Байгаль орчны хэлтэст мэдэгдэн Палеонтологи, археологийн олдвор, хэрэгсэлдхүүн илэрмэгц ажлын нэн даруй зогсоож, Байгаль орчны хэлтэст мэдэгдэн. 5. Горим 5.1. Уул уурхайн төслийн байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний шатанд хийсгэр соёлын өвийн суурь судалгаагаар ихэвчлэн тухайн газарт байгаа палеонтологи, археологийн дурсгалыг бүртгэж тогтоолог. Палеонтологийн дурсгал нь газрын хөрсон дээр ил харагдах хэлбэрээр орших нь тухайн бүс нутагт эрс ховор байдаг. Археологийн дурсгал нь газрын хөрсон дээр ил харагдах өвөр хэмжээтэй орших хэдий ч ихэнх дурсгал нь газрын хөрсон доор дэлд байдаг тул тэдгээрийг олж илрүүлэх, үнэлж боломж бага байхас гадна өртөнц өндөр байдаг. Энэхүү журамд үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш палеонтологи, археологийн дурсгал болон олдвор олон буюу байж болохгүй тохиолдолд уг асуудлыг зонхил хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэх арга хэмжээг тусгаж. 5.2.1. Соёлын өвийн суурь судалгаагаар ашиглагдах үндсэн аргууд Төрийн байгууллагууд, мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын судлаач мэргэжилтнүүдтэй зөвлөхөд; 5.2.2. Төслийн газрын зургийг соёлын өв бүхий газруудын жагсаалттай тулгаж харьцуулах; 5.2.3. Бүс нутгийн археологийн судалгааны бэлэн материалуудтай танилцах; 5.2.4. Төслийн нөлөөллийн бүсэд хэргийн танилцагч судалгааны ажил хийх. 5.2. Барилгын болон малталтын ажлын төлөвлөгөөгт холбоотойгоор археологи, палеонтологийн дурсгал болон олдвор байж болохгүй газрыг олж тогтооход “Дурсгалт газрын байршилг урьдчилан тогтоох аргачлал”-ыг зарим судалгаанд ашигладаг. Эдгээрт голын эрэг дэнж, уулын орой, энгэр, бэл эрэг тогтворд хамаарна. 6. Арга хэмжээ 6.1. Энэхүү журмын гүйцэтгэлийн шаардлагын зорилтууд нь: 6.1.1. Төслийн хүрээнд соёлын өвийг хамгаалах асуудалд дэмжлэг үзүүлэх; 6.1.2. Төслийн үйл ажиллагааны өртөнц нөлөөлөөс соёлын өвийг хамгаалах; 6.1.3. Боломжтой нөхцөлд соёлын өвийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг түгээх, тэдгээрээр бахархах нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг болно. 6.2. Соёлын өвийн үнэ цэнэ эсвэл ач холбогдлыг нэрнэйсэн талбай, олдвор, эд хэрэгсэлдхүүнийг батлагдсан төслийг хэрэгжүүлэх явцад тооцоолж байгаагүй байрлалд олж болохыг “Степ Голд” (Үнэт металлын компани) ХХК хүлээн зөвшөөрдөг. Тиймээс дараах тохиолдолд тосголд дээрх гүйцэтгэлийн шаардлагын заалтуудыг мөрдөнө: 6.2.1. Төслийн хүрээнд их хэмжээний малтлаг, буулгалт хийх, газар хөндөх, үер болох эсвэл байгаль орчинд бусад өөрчлөлт оруулах бол;
---	---

Зураг 21. Батлагдсан Түүх соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журам

5.5.2.2. Түүх, соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журмыг нийт ажилтдад танилцуулах сургалт орох. Журмын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах

Компанийн ХАБЭА-н давтан сургалтын үеэр тайлант жилд батлагдсан “Түүх соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журам”-ын талаар танилцуулга сургалтыг орсон.



Зураг 22. ХАБЭА-н давтан сургалтын үеэр “Түүх соёлын үл хөдлөх болон хөдлөх дурсгалын талаар баримтлах журам”-н сургалт хийж буй байдал

5.6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Бид Жонш баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа химийн бодис материалуудын худалдан авалт, тээвэрлэлт хадгалалт, ашиглалт болон устгал зэргийг Монгол улсын зохих стандарт, журамд нийцүүлэн боловсруулсан компанийн дотоод журмын дагуу гүйцэтгэнэ. Байгаль орчин болон баяжуулах үйлдвэрийн хэлтэс нь уурхайд ашиглагдаж буй химийн бодис материалын тээвэрлэлт, хадгалалт ашиглалт, түүний хаягдал сав баглаа боодлын устгалд хяналт тавьж аливаа үүсэж болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж түүний дагуу тавигдах шаардлагуудыг биелүүлэн ажиллаж байна.

Бид Байгаль орчин, Аялал Жуулчлалын яамнаас Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамнуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, ашиглах, худалдах, устгах аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлтэй компанитай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.

Тус төлөвлөгөөний хүрээнд нийт 13 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд тухайн арга хэмжээнүүдийг бүрэн хэрэгжүүлж дуусан. Биелэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хүснэгт болон 5.6.1-5.6.3-р бүлгээс харна уу.

Хүснэгт 7. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт


№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
Үйлдвэрийн болзошгүй осол			
1	Баяжуулах үйлдвэрийн аваар устгах төлөвлөгөө боловсруулж, холбогдох газраар батлуулах	Биелсэн	Баяжуулах үйлдвэрийн 2024 оны аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан, ОБЕГ-ын дэргэдэх уул уурхайн 09 дүрээг аврах ангийн захирагчаар батлуулсан байдаг
2	Үйлдвэрийн барилга байгууламж бүрд галын дүгнэлтийг холбогдох төрийн байгууллагаас гаргуулан авах	Биелсэн	Баяжуулах үйлдвэр, ажилчдын оффис, түр амрах байруудын галын дүгнэлтийг холбогдох төрийн байгууллагаас тайлант жилд гаргуулан авсан байдаг.
3	Үйлдвэрийн талбайд үүсэж болзошгүй аюул, эрсдэлийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний практик сургалтыг нийт ажилчдад орох	Биелсэн	Үйлдвэрийн талбайд гал түймэр, онцгой байдалд эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр ажлын талбайд тогтмол ажлын байрны үзлэгүүд зохион байгуулж, бүх барилга байгууламжийг гал унтраах, утаа мэдрэгч тоног төхөөрөмжүүдийг бүрэн суурилуулсан.
4	Аюулгүй ажиллагааны хэлтэс ажлын байр, талбаруудад үзлэг хийж, аливаа үүсэж болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх	Биелсэн	Аюулгүй ажиллагааны ажилтан болон үйлдвэрийн холбогдох ажилчид тогтмол ажлын байрнуудад үзлэг хийж ажиллаж байна.
Химийн бодисын тээвэрлэлт			
5	Химийн бодисын агуулахаас бодис үйлдвэр лүү тээвэрлэхдээ асгаралтаас урьдчилан сэргийлж ажиллах, зааварчилгаа өгөх	Биелсэн	ХАБЭА-н ажилтан байнгын зааварчилгаа өгдөг.
Химийн бодисын хадгалалт			
6	Даралтат савласан хийг хүлээж авах шаардлагын дагуу хүлээн авч, ашиглах нөхцөлүүдийн дагуу ашиглах	Биелсэн	Зааврын дагуу даралтат савласан хийг хүлээн авсан.
7	Химийн бодисын тэмдэг тэмдэглэгээг гэмтсэн салсан тохиолдолд яаралтай дахин шинэчлэн наах	Биелсэн	Баяжуулах үйлдвэрийн ажилчид химийн бодисын сав, баглаа боодолд тогтмол хяналт тавьж ажилладаг бөгөөд тэмдэг, тэмдэглэгээ муудсан тохиолдол тухай бүрд сольж ажилласан.
8	Баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдах химийн бодисын зарцуулалт, ашиглалтад хяналт тавих, бүртгэл хөтлөх, зарцуулалтын тайланг холбогдох байгууллага руу илгээх	Биелсэн	Химийн бодисын зарцуулалт болон ашиглалтад баяжуулах үйлдвэрийн дарга, нярав нар хяналт тавьж ажилладаг.
9	Химийн бодисын агуулахад засвар, үйлчилгээ хийх, Агуулахын технологийн бүтэц, үзүүлэлт	Биелсэн	Химийн бодисын агуулахад Баяжуулах үйлдвэрийн ажилчид тогтмол үзлэг хийж ажилладаг бөгөөд

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
	өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор дахин дүгнэлт гаргуулан авах		үзлэгээр аливаа эвдрэл, гэмтэл илэрсэн тохиолдолд тухай бүр засвар хийсэн.
Химийн бодисын хаягдал			
10	Химийн бодисын сав баглаа боодлыг хадгалах, хоргүйжүүлэх, устгах журмын дагуу аюулгүй хадгалах	Биелсэн	Химийн бодисын сав, баглаа боодлыг цэвэр усаар угааж, саармагжуулан химийн бодисын агуулахад аюулгүй хадгалж ажилласан.
11	Химийн бодисын сав баглаа боодлын үүсгэсэн хугацаа, тоо хэмжээ, жинг нэг бүрчлэн бүртгэх	Биелсэн	Химийн бодисын агуулах руу сав, баглаа боодол тээвэрлэх тохиолдол бүрд баяжуулах үйлдвэрийн ажилчид бүртгэл хөтөлж, нярав нэгтгэн ажилласан.
12	Химийн бодисын сав баглаа боодлыг аюултай ачаа хүлээн авагч буюу аюултай хог хаягдал устгуулахаар холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн мэргэжлийн байгууллагад хүлээлгэн өгөх	Биелсэн	Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх, цуглуулах, устгах тусгай зөвшөөрөл бүхий “Элемент” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажилласан.
13	Үйлдвэр орчимд гарч болзошгүй тал хээрийн түймэрт бэлэн байдлыг хангаж ажиллах, шаардлагатай тохиолдолд гал унтраах ажилд оролцох	Биелсэн	Аюулгүй ажиллагааны ажилтан нь баяжуулах үйлдвэрийн галын аюулын үзлэгийг тогтмол хэрэгжүүлсэн. Баяжуулах үйлдвэрийн нийт ажилчдад гал унтраах дадлага сургалтыг тайлант жилд 2 удаа хэрэгжүүлсэн.

5.6.1. Үйлдвэрийн болзонгүй осол

5.6.1.1. Баяжуулах үйлдвэрийн аваар устгах төлөвлөгөө боловсруулж, холбогдох газраар батлуулах

Жонш баяжуулах үйлдвэрийн 2024 оны аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан, ОБЕГ-ын дэргэдэх уул уурхайн 09 дүрээг аврах ангийн захирагч, хурандаа Д.Гантулга-аар батлуулсан байдаг /Хавсралт 7. Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө/.

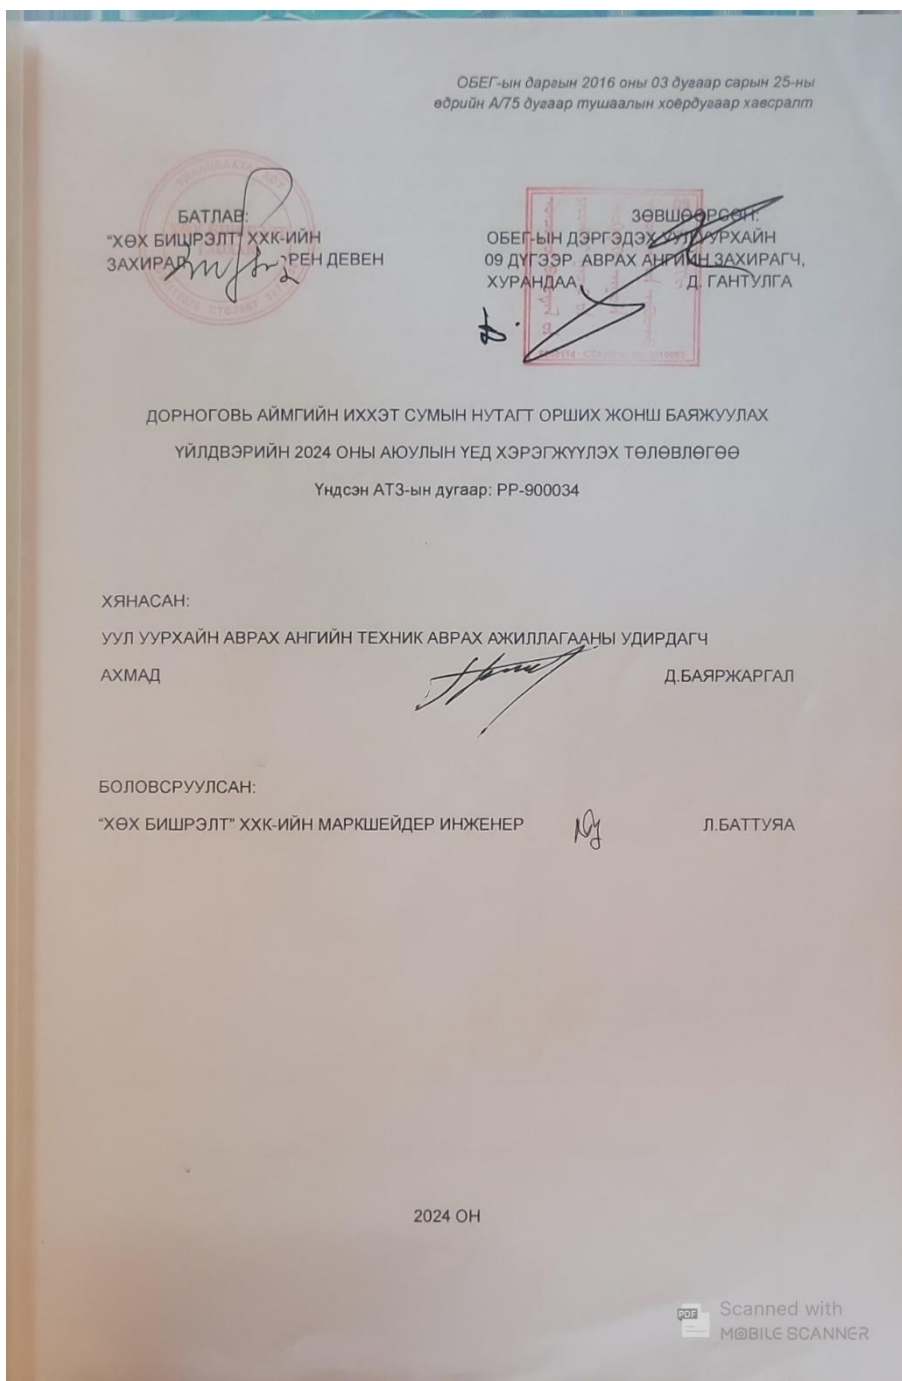

Зураг 23. Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

5.6.1.2. Үйлдвэрийн барилга байгууламж бүрд галын дүгнэлтийг холбогдох төрийн байгууллагаас гаргуулан авах

Баяжуулах үйлдвэр, ажилчдын оффис, түр амрах байруудын галын дүгнэлтийг холбогдох төрийн байгууллагаас тайлант жилд гаргуулан авсан байдаг.

5.6.1.3. Үйлдвэрийн талбайд үүсэж болзошгүй аюул, эрсдлийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний практик сургалтыг нийт ажилчдад орох

Үйлдвэрийн талбайд гал түймэр, онцгой байдалд эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр ажлын талбайд тогтмол ажлын байрны үзлэгүүд зохион байгуулж, бүх барилга байгууламжийг гал унтраах, утаа мэдрэгч тоног төхөөрөмжүүдийг бүрэн суурилуулсан.



Зураг 24. Үйлдвэрийн талбайд байх галын хор

Гал түймэртэй тэмцэх болон Гамшгийн тухай хуулийн дагуу Үйлдвэрийн талбайн барилга эрсдэлийн үнэлгээ, бүх хэсэг нэгжүүдэд онцгой байдлын үед ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдөн ажиллаж байна.

5.6.1.4. Аюулгүй ажиллагааны хэлтэс ажлын байр, талбаруудад үзлэг хийж, аливаа үүсэж болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх

Баяжуулах үйлдвэрийн Аюулгүй ажиллагааны ажилтан болон үйлдвэрийн холбогдох ажилчид аулын байр, талбаруудад төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус ажлын байрны үзлэгийг тогтмол хийж ажилласан. Төлөвлөгөөт үзлэгийг 7 хоног тутам хийж байгаа бөгөөд төлөвлөгөөт бус ажлын байрны үзлэгийг өдөр тутам хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүний хүрээнд аливаа учирч болох аюул, эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээг тус ажлын байр хариуцсан ажилтантай зөвшилцөн, хэрэгжилтийг ханган ажилласан.

5.6.2. Химийн бодисын тээвэрлэлт

5.6.2.1. Химийн бодисын агуулахаас бодис үйлдвэр лүү тээвэрлэхдээ асгаралтаас урьдчилан сэргийлж ажиллах, зааварчилгаа өгөх

“Хөх Бишрэлт” ХХК-ийн Баяжуулах үйлдвэрийн дарга, Аюулгүй ажиллагааны ажилтан нар химийн бодистой харьцан ажилладаг нийт ажилчдад аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг өгч, тухайн өдөрт гүйцэтгэх ажлын учирч болох аливаа аюул, осол, эрсдлийн талаар мэдээлэл өгдөг бөгөөд тухайн сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээг тодорхойлдог.

5.6.3. Химийн бодисын хадгалалт

5.6.3.1. Даралтат савласан хийг хүлээж авах шаардлагын дагуу хүлээн авч, ашиглах нөхцөлүүдийн дагуу ашиглах

Даралтат савласан хийг аюулгүй ажиллагааны ажилтан, нярав, үйлдвэрийн дарга нар хүлээн авдаг. Хүлээн авахдаа даралтат савны гаднах хэлбэр, даралт, хавхлага, тэмдэг тэмдэглэгээ зэргийг шалгаж хүлээн авдаг бөгөөд ямарваа нэгэн гэмтэл, эвдрэл илэрсэн тохиолдолд нийлүүлэгч байгууллага руу буцааж ажилласан.

Мөн даралтат савласан хийг баяжуулах үйлдвэрийн талбайд зориулалтын хадгалах саванд байрлуулж, зөвхөн зөвшөөрөгдсөн ажилчид ашиглаж байна.

5.6.3.2. Химийн бодисын тэмдэг тэмдэглэгээг гэмтсэн салсан тохиолдолд яаралтай дахин шинэчлэн наах

Баяжуулах үйлдвэрийн ажилчид химийн бодисын сав, баглаа боодолд тогтмол хяналт тавьж ажилладаг бөгөөд тэмдэг, тэмдэглэгээ муудсан тохиолдол тухай бүрд сольж ажилласан.

5.6.3.3. Баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдах химийн бодисын зарцуулалт, ашиглалтад хяналт тавих, бүртгэл хөтлөх, зарцуулалтын тайланг холбогдох байгууллага руу илгээх

Химийн бодисын зарцуулалт болон ашиглалтад баяжуулах үйлдвэрийн дарга, нярав нар хяналт тавьж ажилладаг.

5.6.3.4. Химийн бодисын агуулахад засвар, үйлчилгээ хийх, Агуулахын технологийн бүтэц, үзүүлэлт өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор дахин дүгнэлт гаргуулан авах

Химийн бодисын агуулахад Баяжуулах үйлдвэрийн ажилчид тогтмол үзлэг хийж ажилладаг бөгөөд үзлэгээр аливаа эвдрэл, гэмтэл илэрсэн тохиолдолд тухай бүр засвар хийсэн.

5.6.4. Химийн бодисын хаягдал

5.6.4.1. Химийн бодисын сав баглаа боодлыг хадгалах, хоргүйжүүлэх, устгах журмын дагуу аюулгүй хадгалах

Аливаа химийн бодис ашигласан тухай бүрд сав баглаа боодлыг саармагжуулах, хоргүйжүүлэх үйл ажиллагааг Баяжуулах үйлдвэрийн операторууд Аюулгүй ажиллагааны ажилтан, үйлдвэрийн дарга нарын удирдлага дор хэрэгжүүлэн химийн бодисын агуулахад байрлах аюултай хог хаягдлын агуулахад аюулгүй байдлыг ханган хадгалдаг.

5.6.4.2. Химийн бодисын сав баглаа боодлын үүсгэсэн хугацаа, тоо хэмжээ, жинг нэг бүрчлэн бүртгэх

Химийн бодисын агуулах руу сав, баглаа боодол тээвэрлэх тохиолдол бүрд баяжуулах үйлдвэрийн ажилчид бүртгэл хөтөлж, нярав нэгтгэн ажилласан. Аюултай хог хаягдлыг үүсгэсэн хугацаа, төрөл, жин болон хэмжээ тус бүрээр бүртгэн химийн бодисын агуулахад байрлуулан, хадгалж ажилласан.

5.6.4.3. Химийн бодисын сав баглаа боодлыг аюултай ачаа хүлээн авагч буюу аюултай хог хаягдал устгуулахаар холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн мэргэжлийн байгууллагад хүлээлгэн өгөх

Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх, цуглуулах, устгах тусгай зөвшөөрөл бүхий “Элемент” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажилласан.

5.6.4.4. Үйлдвэр орчимд гарч болзошгүй тал хээрийн түймэрт бэлэн байдлыг хангаж ажиллах, шаардлагатай тохиолдолд гал унтраах ажилд оролцох

Аюулгүй ажиллагааны ажилтан нь баяжуулах үйлдвэрийн галын аюулын үзлэгийг тогтмол хэрэгжүүлсэн. Баяжуулах үйлдвэрийн нийт ажилчдад гал унтраах дадлага сургалтыг тайлант жилд 2 удаа хэрэгжүүлсэн.



Зураг 25. Үйлдвэрийн талбайд байх галын хор

5.7. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Бид үйл ажиллагаанаас бий болж буй хог хаягдлын хэмжээг багасгах, аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, түүнийг дахин ашиглах болон дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх замаар гарсан хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг хүрээлэн буй орчинд аюулгүй байдлаар устгах 3R зарчмыг баримтлан ажиллахаар зорьж байна.

Бид холбогдох хууль, дүрэм, стандартын шаардлагад нийцүүлэн хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, устгах үйл ажиллагааг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Үүний дагуу хог хаягдлыг ахуйн болон аюултай хог хаягдал хэмээн ангилан, ахуйн хог хаягдлыг орон нутгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт нийлүүлэх, аюултай хог хаягдлыг холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагаас аюултай хог хаягдал устгах тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж байгууллагад нийлүүлэн ажиллахаар 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгаж оруулсан.

Тус төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 15 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 14 арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлж, 1 арга хэмжээ хэрэгжүүлээгүй байна. Биелэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хүснэгт болон холбогдох дэд бүлгүүдээс харна уу.

Хүснэгт 8. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт			
№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
Энгийн хог хаягдал			
1	Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдлыг ангилан ялгаж, бүртгэх, дахин ашиглах боломжтой хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх	Биелсэн	Хог хаягдлыг ангилж хог хаягдал хадгалах түр цэгт хогийн сав байршуулсан
2	Ахуйн буюу дахин ашиглах боломжгүй энгийн хог хаягдлыг сумын төвлөрсөн хогийн цэгт нийлүүлэх гэрээг эрх бүхий байгууллагатай байгуулах, бүртгэл хөтлөх,	Биелсэн	Холбогдох гэрээг байгуулж байнга хамтран ажилладаг.Иххэт сумын ЗДТГ-ын даргатай 2024 оны 01-р сарын 18-ны өдөр №02 тоот гэрээ байргуулсан.
3	Хог хаягдлын түр цэгт халдваргүйжүүлэлт, цэвэрлэгээг тогтмол хийх	Биелсэн	Элемент ХХК-тай Химийн хортой болон аюултай бодисын хаягдал тээвэрлэх, устгах гэрээ байгуулж, аюултай хог хаягдлыг нийлүүлсэн.
4	Дахин ашиглах боломжтой хаягдлыг /хаягдал мод, төмөр/ өрхийн хэрэгцээнд ашиглах зориулалтаар орон нутгийн малчин иргэдэд олгох	Биелсэн	Сумын хогийн цэг дээрхи ахуйн хог хаягдлыг түрэх, бөөгнүүлэх үйл ажиллагаанд туслах ажлыг сард нэг удаа, хог булшлах булах ажлыг хэрэгжүүлэн ажилласан.
5	Хог хаягдлын цэгт ангилан ялгалтыг сайжруулах, шаардлагатай газруудад хогийн сав байрлуулах	Биелсэн	Үйлдвэрээс гарч буй хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ангилах зориулалтын сав хаягжуулан байрлуулж, нийт ажилчдад хог хаягдлын ангилан ялгалтыг хэвшүүлж ажилласан. Үйлдвэрийн хашаан дортор болон ойролцоох газрын их цэвэрлэгээг сард 1 удаа хийдэг.
6	Хог хаягдлын ангилан ялгалтад хяналт тавих үзлэг шалгалт хийх	Биелсэн	Түр хадгалах талбайд ангилж байршуулсан.
7	Компанийн багц дотоод сургалтын хүрээнд нийт ажилчдад хог хаягдалтай холбоотой сургалт зохион байгуулах	Биелсэн	ХАБЭА-н сургалтын дараа нийт ажилчдад сургалт орсон.

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
8	Төслийн талбайд байрлах бүх хогийн савны тэмдэг тэмдэглэгээ муудсан тохиолдолд тухай бүрд солих	Биелсэн	Шаардлагатай тохиолдол бүрд хог хаягдлын тэмдэг тэмдэглэгээг сольж ажилласан.
Аюултай хог хаягдал			
9	Аюултай хог хаягдал хадгалах сав, талбайг холбогдох шаардлага хангасан байдлаар шинэчлэх, сайжруулах	Биелсэн	Химийн бодисын агуулахад аюултай хог хаягдлыг байрлуулан ажиллаж байна.
10	Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх болон устгах тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагатай гэрээ байгуулах, аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэн өгч акт үйлдэх	Биелсэн	Ашиглагдсан шатах тослох материалыг хүдэр бутлах механизмын тосолгоонд эргүүлэн ашигладаг. Элемент ХХК-тай Химийн хортой болон аюултай бодисын хаягдал тээвэрлэх, устгах гэрээ байгуулсан.
11	Аюултай хог хаягдлыг эрх бүхий байгууллагатай гэрээ байгуулан хүлээлгэж өгөх, устгалд оруулах	Биелсэн	Ашиглагдсан шатах тослох материалыг хүдэр бутлах механизмын тосолгоонд эргүүлэн ашигладаг. Элемент ХХК-тай Химийн хортой болон аюултай бодисын хаягдал тээвэрлэх, устгах гэрээ байгуулсан.
12	Техник тоног төхөөрөмжийн ашигласан хаягдал тосыг үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн тосолгоонд дахин ашиглах, тухай бүр ашиглалтын бүртгэл хөтлөх	Биелсэн	Ашиглагдсан шатах тослох материалыг хүдэр бутлах механизмын тосолгоонд эргүүлэн ашигладаг.
13	Үйлдвэрт ашиглах химийн бодисын сав баглаа боодлыг цэвэрлэх, ангилан төрөлжүүлж бүртгэх, түр цэгт хадгалах, устгах үйлдвэрт нийлүүлэх	Биелсэн	Элемент ХХК-тай Химийн хортой болон аюултай бодисын хаягдал тээвэрлэх, устгах гэрээ байгуулсан.
14	Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн дугаар авах	Биелээгүй	Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн дугаарыг тайлант жилд гаргуулах аваагүй тул энэхүү ажил хэрэгжээгүй.
Хог хаягдлын тоо бүртгэл хөтлөх			
15	Үйл ажиллагаанаас гарсан нийт хог хаягдал болон дахин ашигласан хог хаягдлын хэмжээг тогтмол бүртгэж, БОХ тайланд тусгаж сумын захиргаанд хүргүүлнэ	Биелсэн	Иххэт сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид БОХ тайланг хүргүүлсэн.

5.7.1. Энгийн хог хаягдал

5.7.1.1. Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдлыг ангилан ялгаж, бүртгэх, дахин ашиглах боломжтой хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх


Хог хаягдлыг ангилж хог хаягдал хадгалах түр цэгт хогийн сав байршуулсан. Тус хогийн сав нь ангилан ялгалт хийх зориулалт бүхий сав бөгөөд аж ахуйн ажилчид хог хаягдлыг тус ангилан ялгалтыг дагуу хаяж байна.



Зураг 26. Ангилан ялгалтын хог хаягдлын сав

5.7.1.2. Ахуйн буюу дахин ашиглах боломжгүй энгийн хог хаягдлыг сумын төвлөрсөн хогийн цэгт нийлүүлэх гэрээг эрх бүхий байгууллагатай байгуулах, бүртгэл хөтлөх

Холбогдох гэрээг байгуулж байнга хамтран ажилладаг. Иххэт сумын ЗДТГ-ын даргатай 2024 оны 01-р сарын 2-ны өдөр №04 тоот гэрээ байгуулсан.

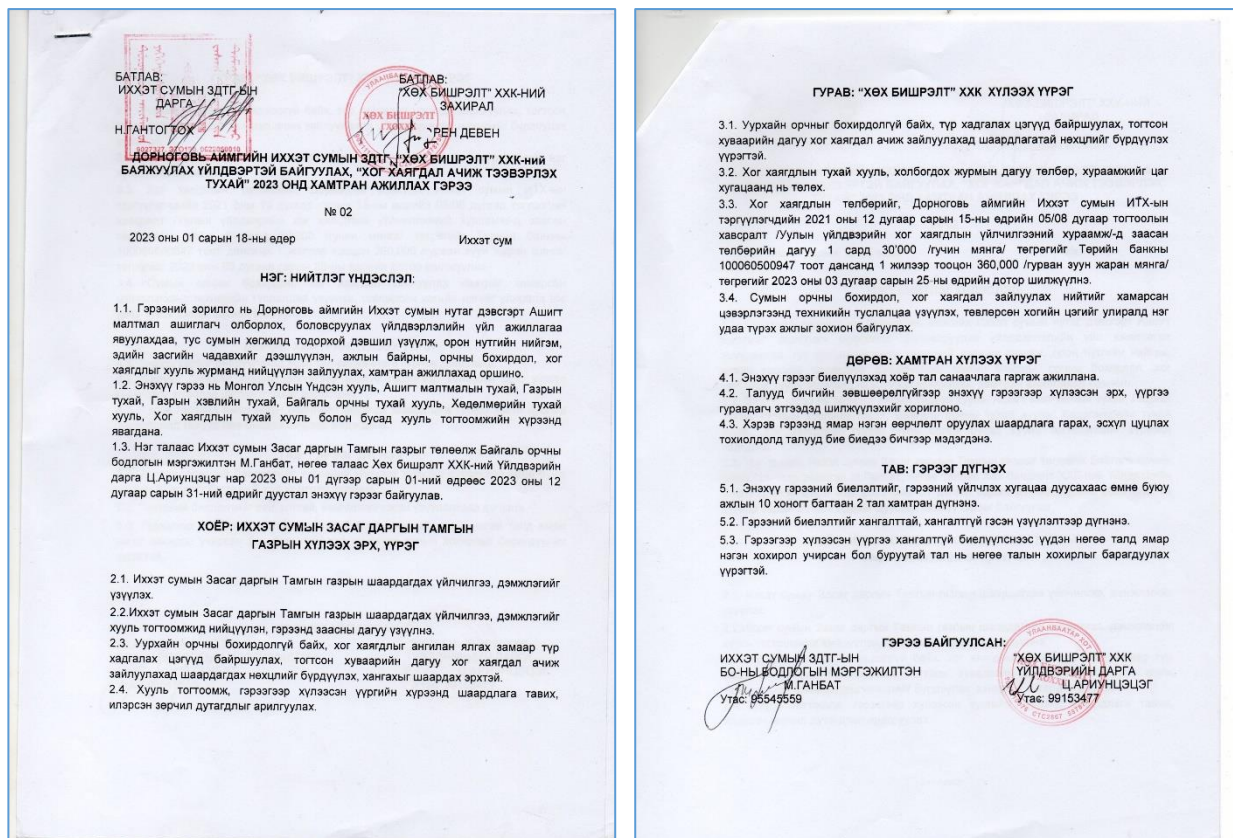

Зураг 27. Хог хаягдлын гэрээ

5.7.1.3. Хог хаягдлын түр цэгт халдваргүйжүүлэлт, цэвэрлэгээг тогтмол хийх

Баяжуулах үйлдвэрийн үйлчилгээ, цэвэрлэгээний ажилчид болон ХАБЭА-н ажилчид хамтран хог хаягдлын түр цэгийн халдваргүйжүүлэлт, цэвэрлэгээг 7 хоног тутам хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

5.7.1.4. Дахин ашиглах боломжтой хаягдлыг /хаягдал мод, төмөр/ өрхийн хэрэгцээнд ашиглах зориулалтаар орон нутгийн малчин иргэдэд олгох

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас үүссэн дахин ашиглах боломжтой хаягдал мод, төмөр зэрэг хаягдал хэмжээ багатай, өрхйн хэрэгцээнд өгөхөд бага байгаа тул тайлант жилд энэхүү арга хэмжээ хэрэгжээгүй. Бид 2025 онд дахин ашиглах хог хаягдлыг үргэлжлүүлэн цуглуулж, орон нутгийн иргэдээс хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд шилжүүлэн өгөхөөр төлөвлөж байна.

5.7.1.5. Хог хаягдлын цэгт ангилан ялгалтыг сайжруулах, шаардлагатай газруудад хогийн сав байрлуулах

Хог хаягдлын түр цэгт нийт 4 ангилал бүхий хог хаягдлын сав байрлуулсан. Мөн баяжуулах үйлдвэр, ажилчдын амрах байр, гал тогоо, оффисууд зэрэг шаардлагатай байршлуудад 2-оос 3 ангилал бүхий хог хаягдлын савнууд байрлуулсан.



Зураг 28. Ангилан ялгалтын хог хаягдлын сав

5.7.1.6. Хог хаягдлын ангилан ялгалтад хяналт тавих үзлэг шалгалт хийх

Баяжуулах үйлдвэрийн үйлчилгээ, цэвэрлэгээний ажилчид, үйлдвэрийн дарга нар сар тутам хог хаягдлын ангилан ялгалт, ил задгай хог хаялт, хог хаягдлын савны үзлэгийг хийж ажиллаж байна. Тайлант жилд анхаарал татахуйц зөрчил илрээгүй бөгөөд тэмдэг тэмдэглэгээ муудсан зэрэг илэрсэн зөрчлийг нэн даруй арилган ажилласан.

5.7.1.7. Компанийн багц дотоод сургалтын хүрээнд нийт ажилчдад хог хаягдалтай холбоотой сургалт зохион байгуулах

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн давтан сургалтыг ХАБЭА-н ажилтан өгөх үеэр хог хаягдлын ангилан ялгалт, хог хаягдлын талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний сургалтыг зохион байгуулсан.



Зураг 29. Сургалт орж буй байдал

5.7.1.8. Төслийн талбайд байрлах бүх хогийн савны тэмдэг тэмдэглэгээ муудсан тохиолдолд тухай бүрд солих

Баяжуулах үйлдвэрийн үйлчилгээ, цэвэрлэгээний ажилчид, үйлдвэрийн дарга нар сар тутам хог хаягдлын ангилан ялгалт, ил задгай хог хаялт, хог хаягдлын савны үзлэгийг хийж ажиллаж байна. Тухайн үзлэгээр тэмдэг тэмдэглэгээ муудсан зэрэг илэрсэн зөрчлийг нэн даруй арилган ажилласан.

5.7.2. Аюултай хог хаягдал

5.7.2.1. Аюултай хог хаягдал хадгалах сав, талбайг холбогдох шаардлага хангасан байдлаар шинэчлэх, сайжруулах

Химийн бодисын агуулахад аюултай хог хаягдлыг байрлуулан ажиллаж байна. Химийн бодисын агуулахруу зөөж байрлуулсан аюултай хог хаягдлыг үйлдвэрийн нярав тухай бүр төрөл тус бүрээр, ширхэг болон жин хэмжээгээр тэмдэглэн хөтөлж байна.

Хог хаягдлын бүртгэл									
Бариа материалын нэр Зэрэг, дугаар Нөөцийн норм			Хаягдал бошиг код						
			хугацаа тоо, хэмжээ			10-р сар 1647			
№	Баримтын		Гүйцээний утга	Тоо, (хэмжээ нэгж)			Үлдэгдлийг хянан баталсан		
	Сар, өдөр	дугаар		Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Сар, өдөр	Зарлага	Гарын үсэг
	х	х	Эхний үлдэгдэл			х	х	х	
1			1647			1647			
2						0			
3						0			
4			1647	11		1658			
5						0			
6						0			
7			1658	11		1669			
8						0			
9						0			
10						0			
11						0			
12			1669	11		1680			
13						0			
14						0			
15						0			
16						0			
17						0			
18			1680	11		1691			
19						0			
20						0			
21						0			
22						0			
23			1691	11		1702			
24						0			
25						0			
26						0			
27						0			
28			1702	11		1713			
29			1713		96	1817			
30									
31									
Дүн									

Хог хаягдлын бүртгэл									
Бариа материалын нэр Зэрэг, дугаар Нөөцийн норм			Хаягдал бошиг код						
			хугацаа тоо, хэмжээ			9-р сар 1570 ширхэг			
№	Баримтын		Гүйцээний утга	Тоо, (хэмжээ нэгж)			Үлдэгдлийг хянан баталсан		
	Сар, өдөр	дугаар		Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Сар, өдөр	Зарлага	Гарын үсэг
	х	х	Эхний үлдэгдэл			х	х	х	
1			1570		11	1581			
2						0			
3						0			
4			1581		11	1592			
5						0			
6						0			
7						0			
8			1592		11	1603			
9						0			
10						0			
11						0			
12						0			
13			1603		11	1614			
14						0			
15						0			
16						0			
17			1614		11	1625			
18						0			
19						0			
20			1625		11	1636			
21						0			
22						0			
23			1636		11	1647			
24						0			
25						0			
26						0			
27						0			
28						0			
29						0			
30						0			
31						0			
Дүн						1647			

Зураг 30. Аюултай хог хаягдлын бүртгэл

5.7.2.2. Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх болон устгах тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагатай гэрээ байгуулах, аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэн өгч акт үйлдэх

Ашиглагдсан шатах тослох материалыг хүдэр бутлах механизмын тосолгоонд эргүүлэн ашигладаг. Элемент ХХК-тай 2024 оны 5-р сарын 28-ны өдөр “Химийн хортой болон аюултай бодисын хаягдал тээвэрлэх, устгах ажил гүйцэтгэх гэрээ” байгуулсан /Хавсралт 8. Химийн хортой болон аюултай бодисын хаягдал тээвэрлэх, устгах ажил гүйцэтгэх гэрээ/. Тайлант жилд нийт химийн бодисын хуванцар сав 385 ширхэг, сав баглаа боодол 2100 кг тус тус устгалд оруулсан байна /Хавсралт 9. Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичиг/.

5.7.2.3. Аюултай хог хаягдлыг эрх бүхий байгууллагатай гэрээ байгуулан хүлээлгэж өгөх, устгалд оруулах

“Элемент” ХХК-тай 2024 оны 5-р сарын 28-ны өдөр “Химийн хортой болон аюултай бодисын хаягдал тээвэрлэх, устгах ажил гүйцэтгэх гэрээ” байгуулсан /Хавсралт 8. Химийн хортой болон аюултай бодисын хаягдал тээвэрлэх, устгах ажил гүйцэтгэх гэрээ/. Тайлант жилд нийт химийн бодисын хуванцар сав 385 ширхэг, сав баглаа боодол 2100 кг тус тус устгалд оруулсан байна /Хавсралт 9. Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичиг/.

5.7.2.4. Техник тоног төхөөрөмжийн ашигласан хаягдал тосыг үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн тосолгоонд дахин ашиглах, тухай бүр ашиглалтын бүртгэл хөтлөх

Ашиглагдсан шатах тослох материалыг хүдэр бутлах механизмын тосолгоонд эргүүлэн ашигладаг. Тайлант жилд хөнгөн тэрэг, техник тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнээс үүссэн нийт тос, тосолгооны материалыг үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийн тосолгоонд дахин ашигласан болно.

5.7.2.5. Үйлдвэрт ашиглах химийн бодисын сав баглаа боодлыг цэвэрлэх, ангилан төрөлжүүлж бүртгэх, түр цэгт хадгалах, устгах үйлдвэрт нийлүүлэх

Химийн бодисын агуулахад аюултай хог хаягдлыг байрлуулан ажиллаж байна. Химийн бодисын агуулахруу зөөж байрлуулсан аюултай хог хаягдлыг үйлдвэрийн нярав тухай бүр төрөл тус бүрээр, ширхэг болон жин хэмжээгээр тэмдэглэн хөтөлж байна.

Хог хаягдлын бүртгэл									
Бариа материалын нэр Зэрэг, дугаар Нөөцийн норм			Хаягдал бошиг код						
хугацаа тоо, хэмжээ			10-р сар			1647			
№	Баримтын сар, дугаар		Гүйлгээний утга		Тоо, (хэмжээ нэгж)		Үлдэгдлийг хянан баталсан		
	х	х	Эхний үлдэгдэл	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Сар, дугаар	Гарын үсэг	
1			1647			1647			
2						0			
3						0			
4			1647		11	1658			
5						0			
6						0			
7			1658		11	1669			
8						0			
9						0			
10						0			
11						0			
12			1669		11	1680			
13						0			
14						0			
15						0			
16						0			
17						0			
18			1680		11	1691			
19						0			
20						0			
21						0			
22						0			
23			1691		11	1702			
24						0			
25						0			
26						0			
27						0			
28			1702		11	1713			
29			1713		96	1817			
30									
31									
Дүн									

Хог хаягдлын бүртгэл									
Бариа материалын нэр Зэрэг, дугаар Нөөцийн норм			Хаягдал бошиг код						
хугацаа тоо, хэмжээ			9-р сар			1570 ширхэг			
№	Баримтын сар, дугаар		Гүйлгээний утга		Тоо, (хэмжээ нэгж)		Үлдэгдлийг хянан баталсан		
	х	х	Эхний үлдэгдэл	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Сар, дугаар	Гарын үсэг	
1			1570			1570			
2						0			
3						0			
4			1581		11	1592			
5						0			
6						0			
7						0			
8			1592		11	1603			
9						0			
10						0			
11						0			
12						0			
13			1603		11	1614			
14						0			
15						0			
16						0			
17			1614		11	1625			
18						0			
19						0			
20			1625		11	1636			
21						0			
22						0			
23			1636		11	1647			
24						0			
25						0			
26						0			
27						0			
28						0			
29						0			
30						0			
31						0			
Дүн						1647			

Зураг 31. Аюултай хог хаягдлын бүртгэл

5.7.2.6. Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн дугаар авах

Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн дугаарыг тайлант жилд гаргуулах аваагүй тул энэхүү ажил хэрэгжээгүй.

5.7.3. Хог хаягдлын тоо бүртгэл хөтлөх

5.7.3.1. Үйл ажиллагаанаас гарсан нийт хог хаягдал болон дахин ашигласан хог хаягдлын хэмжээг тогтмол бүртгэж, БОХ тайланд тусгаж сумын захиргаанд хүргүүлнэ

Иххэт сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид БОХ тайланг хүргүүлэхээр төлөвлөн боловсруулалтын ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тухайн арга хэмжээг тайлант жилд багтаан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

5.8. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

Бид төлөвлөгөөт жилд удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээний хүрээнд нийт 7 арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Хэрэгжилтийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хүснэгт болон дэд бүлгүүдээс харна уу.

Хүснэгт 9. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт			
№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
Зөвлөх үйлчилгээний ААН-тэй гэрээлэх			
1	Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран нийт ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, байгаль орчныг хамгаалах, гал түймрээс урьдчилсан сэргийлэх талаар сургалт, сурталчилгааг хийх ажлыг зохион байгуулах	Биелсэн	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны чиглэлээр сургалт зохион байгуулах эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагатай хамтран үйлдвэрийн нийт ажилчдад сургалт зохион байгуулсан.
Ногоон байгууламж			
2	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд уурхайн хашаан дотор модны суулгац тарих	Биелсэн	Баяжуулах үйлдвэрийн талбайд нийт 800 ширхэг улиас мод худалдан авч, тарьсан.
Бичиг баримт			
3	Төслийн ус ашиглах дүгнэлт авах, гэрээ байгуулан ажиллах	Биелсэн	Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Усны Газар”-аас 2024 оны 6-р сарын 4-ны өдөр Е-2404-000028 дугаартай “Ус ашиглуулах дүгнэлт” авсан бөгөөд 2024 оны 6-р сарын 12-ны өдөр “Умард говийн гүвээт-халхын дундад талын сав газрын захиргаа”-тай 11 дугаар “Ус ашиглах гэрээ”-г багуулсан.
4	Төслийн хаягдал усны дүгнэлт авах, гэрээ байгуулах, зөвшөөрөл авах, холбогдох төлбөрийг төлөх	Биелсэн	2024 оны 7-р сарын 2-ны өдөр “Умард говийн гүвээт-халхын дундад талын сав газрын захиргаа”-тай 13 дугаар “Хаягдал усыг байгальд шууд нийлүүлж байгаа хуулийн этгээдтэй байгуулах ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ”-г багуулсан.
5	Аймгийн Засаг даргаар тээврийн замын маршрутыг тогтоолгох	Биелээгүй	Хэнтий аймгийн Засаг дарга-д тээврийн маршрут батлуулах хүсэлт өгсөн боловч тайлант жилд захирамж гараагүй тул энэхүү ажил хэрэгжээгүй.
6	Экологийн паспорт хөтлөх	Биелсэн	MNS 4219:1994 стандартын дагуу экологийн паспорт боловсруулсан.
Орон нутаг, хамтын ажиллагаа			
7	Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээ болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх арга хэмжээнүүдэд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах	Биелсэн	Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Дорноговь аймгийн АУК-д сурдаг 1 оюутаны төлбөрийг төлдөг. 2024 оны зудтай өвөл Бүрдэнэ баг, Баян багийн малчдын айл хоорондын зам, сум орон нутаг орох замыг 7 хоног тутам 2 ковшоор хусах ажил хийсэн. Хавар малын сэг зэм ачиж булшлах ажилд 20 хоног 1 ковш, 3 ажилтан ажилласан байна.

5.8.1. Зөвлөх үйлчилгээний ААН-тэй гэрээлэх

5.8.1.1. Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран нийт ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, байгаль орчныг хамгаалах, гал түймрээс урьдчилсан сэргийлэх талаар сургалт, сурталчилгааг хийх ажлыг зохион байгуулах

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны чиглэлээр сургалт зохион байгуулах эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагатай хамтран үйлдвэрийн нийт 52 ажилчдад сургалт зохион байгуулсан.

д/д	Огноо	Албан тушаал	Овог, нэр	Хийгдэх ажил	ХАБЭА-н зааварчилгаа	Зааварчилгаа өссөн	Зааварчилгаа огссон
1	8/18	Хөдөлмөр	У.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
2		Хөдөлмөр	А.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
3		Хөдөлмөр	А.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
4		Хөдөлмөр	Т.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
5		Хөдөлмөр	Н.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
6		Хөдөлмөр	Б.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
7		Хөдөлмөр	Х.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
8		Хөдөлмөр	З.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
9		Хөдөлмөр	Б.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
10		Хөдөлмөр	Н.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
11		Хөдөлмөр	О.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
12		Хөдөлмөр	С.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
13		Хөдөлмөр	М.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
14		Хөдөлмөр	Б.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
15		Хөдөлмөр	М.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
16		Хөдөлмөр	М.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
17		Хөдөлмөр	Н.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
18		Хөдөлмөр	Б.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр
19		Хөдөлмөр	Н.Амгалан	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх Ажлын газраас урьдчилан сэргийлэх	Хөдөлмөр	Хөдөлмөр

Зураг 32. ХАБЭА-н сургалт авсан бүртгэл

5.8.2. Ногоон байгууламж

5.8.2.1. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд уурхайн хашаан дотор модны суулгац тарих

Баяжуулах үйлдвэрийн талбайд нийт 800 ширхэг улиас мод худалдан авч, тарьсан /Хавсралт 10. Мод худалдан авсан нэхэмжлэл/.



Зураг 33. Баяжуулах үйлдвэр орчмын ногоон байгууламж

5.8.3. Бичиг баримт

5.8.3.1. Төслийн ус ашиглах дүгнэлт авах, гэрээ байгуулан ажиллах

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Усны Газар”-аас 2024 оны 6-р сарын 4-ны өдөр Е-2404-000028 дугаартай “Ус ашиглуулах дүгнэлт” авсан /Хавсралт 11. Ус ашиглуулах дүгнэлт/ бөгөөд 2024 оны 6-р сарын 12-ны өдөр “Умард говийн гүвээт-халхын дундад талын сав газрын захиргаа”-тай 11 дугаар “Ус ашиглах гэрээ”-г байгуулсан /Хавсралт 12. Ус ашиглах гэрээ/.

5.8.3.2. Төслийн хаягдал усны дүгнэлт авах, гэрээ байгуулах, зөвшөөрөл авах, холбогдох төлбөрийг төлөх

2024 оны 7-р сарын 2-ны өдөр “Умард говийн гүвээт-халхын дундад талын сав газрын захиргаа”-тай 13 дугаар “Хаягдал усыг байгальд шууд нийлүүлж байгаа хуулийн этгээдтэй байгуулах ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ”-г багуулсан /Хавсралт 13. Хаягдал усыг байгальд шууд нийлүүлж байгаа хуулийн этгээдтэй байгуулах ус бохирдуулсны төлбөрийн гэрээ/.

5.8.3.3. Аймгийн Засаг даргаар тээврийн замын маршрутыг тогтоолгох

Хэнтий аймгийн Засаг дарга-д тээврийн маршрут батлуулах хүсэлт өгсөн боловч тайлант жилд захирамж гараагүй тул энэхүү ажил хэрэгжээгүй.

5.8.3.4. Экологийн паспорт хөтлөх

Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны хүрээнд MNS 4219:1994 стандартын дагуу экологийн паспорт боловсруулсан.

MNS 4219 : 1994

ХӨХ БИШРЭЛТ ХХК-ИЙН ЭКОЛОГИЙН ПАСПОРТ
 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1 дүгээр хүснэгт


д/д	Мэдээллийн агууллага	Паспорт бүрдүүлэх үед	өөрчлөлт
1	Аж ахуй нэгжийн нэр, РД	Хөх Бишрэлт ХХК, РД: 5878756	
2	Харъяалах дээд байгууллага	Хөх Бишрэлт ХК	
3	Аж ахуй нэгжийн хаяг - шуудангийн - холбооны -	Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Сайн ноён хан Намнансүрэнгийн гудамж, 35- 3 тоот	
4	Удирдлага, холбогдох ажилтны нэр, харилцах утас - Дарга - Ерөнхий инженер - Ерөнхий технологи - БОХ асуудал хариуцсан ажилтан - Лаборатори	- Гүйцэтгэх захирал, Рен Девен - Үйлдвэрийн дарга Ц.Ариунцэцэг	
5	Харилцах банкны хаяг, дансны дугаар	- Худалдаа хөгжлийн банк, дансны дугаар	

Зураг 34. Үйлдвэрийн экологийн паспорт

5.8.4. Орон нутаг, хамтын ажиллагаа

5.8.4.1. Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээ болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх арга хэмжээнүүдэд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Дорноговь аймгийн АУК-д сурдаг 1 оюутаны төлбөрийг төлдөг. 2024 оны зудтай өвөл Бүрдэнэ баг, Баян багийн малчдын айл хоорондын зам, сум орон нутаг орох замыг 7 хоног тутам 2 ковшоор хусах ажил хийсэн. Хавар малын сэг зэм ачиж булшлах ажилд 20 хоног 1 ковш, 3 ажилтан ажилласан байна.

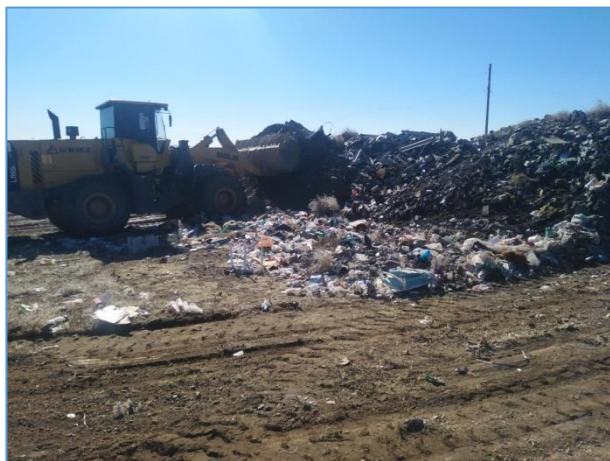

Зураг 35. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн ажлаас

5.9. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль зэрэг хуулиудын дагуу төсөл хэрэгжүүлэгч Хөх Бишрэлт ХХК нь орчны хяналт шинжилгээний ажлын зардлыг хариуцан гаргаж, аливаа ажиглалт, хээрийн хэмжилт, дээжлэлтийг батлагдсан аргазүй, стандартын дагуу хийж, төслийн талбайгаас авсан аливаа дээжүүдийг Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораториудад хүргүүлж, гарсан үр дүн, гэрээт компанийн тайланг холбогдох газруудад хүргүүлэн ажиллалаа.

Хүснэгт 10. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
Байгаль орчны хяналт шинжилгээ			
1	Орчны хяналт шинжилгээний арга хэмжээний хүрээнд ус, хөрс, агаар, ургамал, амьтны дээжлэлт, хэмжилт, шинжилгээ хийх хяналтын цэгүүдийн байршлыг тодорхойлох, тухайн цэгүүдэд тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулах, кодлол болон дугаарлалтын систем бий болгох	Биелсэн	Орчны хяналт шинжилгээний арга хэмжээний хүрээнд авч буй ус, хөрс, агаарын дээжлэлт болон хэмжилтийг тухайн байршлын ойр орчимд байрлах үйлдвэрийн объектын нэршлээр нэрлэн, мэдээллийн сан үүсгэн ажиллаж байна.
2	Агаарын хэмжилтийг зөөврийн багажаар гүйцэтгэх, үр дүнг боловсруулах	Биелсэн	Хуваарийн дагуу хэмжилтүүдийг тогтмол хэрэгжүүлж ажилласан. Хэмжилтийн үр дүнд холбогдох стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гараагүй.
3	Хөрсний дээжлэлтийг гүйцэтгэж лабораториудад харгалзах үзүүлэлтүүдээр шинжлүүлэх	Биелсэн	Хуваарийн дагуу дээжлэлтийг тогтмол хэрэгжүүлж ажилласан. Лабораторийн шинжилгээний үр дүнд холбогдох стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гараагүй.
4	Ундны усны дээж авч химийн болон бактерлогийн үзүүлэлтийг шинжлүүлэх	Биелсэн	Хуваарийн дагуу дээжлэлтийг тогтмол хэрэгжүүлж ажилласан. Лабораторийн шинжилгээний үр дүнд холбогдох стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гараагүй.

5.9.1. Байгаль орчны хяналт шинжилгээ

5.9.1.1. Орчны хяналт шинжилгээний арга хэмжээний хүрээнд ус, хөрс, агаар, ургамал, амьтны дээжлэлт, хэмжилт, шинжилгээ хийх хяналтын цэгүүдийн байршлыг тодорхойлох, тухайн цэгүүдэд тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулах, кодлол болон дугаарлалтын систем бий болгох

Орчны хяналт шинжилгээний арга хэмжээний хүрээнд авч буй ус, хөрс, агаарын дээжлэлт болон хэмжилтийг тухайн байршлын ойр орчимд байрлах үйлдвэрийн объектын нэршлээр нэрлэн, мэдээллийн сан үүсгэн ажиллаж байна. Ингэснээр дараа дараагийн хяналт шинжилгээний ажилд цэгийн байрлалыг олоход тустай гэж үзэж байна.

5.9.1.2. Агаарын хэмжилтийг зөөврийн багажаар гүйцэтгэх, үр дүнг боловсруулах

Хуваарийн дагуу хэмжилтүүдийг тогтмол хэрэгжүүлж ажилласан. Хэмжилтийг Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын Байгаль орчин, хэмжил зүйн төв лабораторитой хамтран хэрэгжүүлсэн. Хэмжилтийн үр дүнд холбогдох стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гараагүй.



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohztli@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН



БАЙГАЛЬ
Орчин дэмжлэгтэй төв лаборатори

Дугаар он/№	: 2024/A-273
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: “Хөх Бишрэлт” ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Д.Сувд агаарын хэсэг
Сорьцын тоо, төрөл	: 2 агаар, 2 дуу чимээ
Сорьц авсан огноо	: 2024.10.05
Сорьцын тодорхойлолт	: Хэнтий аймаг Их хэт сум жоншны үйлдвэр
Шинжилгээний аргын стандарт	: MNS 17-2-5-12:2021, MNS 17-2-5-11:2021
	: MNS 5002:2000, CA3 A07-2016
Шинжилсэн огноо	: 2024.10.07
Хуудасны тоо	: 1/1
Үр дүн :	

№	Сорьц авсан цэг	Сорьц авсан өдөр	Сорьц авсан цаг	Хүхэрлэг хий	Азотын давхар исэл	Нийт тоос /TSP/	Дуу чимээ
					мг/м³	ДБА	
1	Бутлуур орчим	X/05	14:10	0.034	0.072	0.140	60
2	Уурын зуух орчим	X/05	15:05	0.091	0.074	0.349	54
Агаарын чанарын стандарт MNS 4585:2016 (20 минутын хэмжилт)				0.450	0.200	0.500	60

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээч :

Хянаж баталгаажуулсан:
Байгаль орчны шинжилгээний ахлах шинжээч



Э.Оюунтуяа


Д.Түмэндэлгэр

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцод хүчинтэй

Зураг 36. Агаарын чанарын хэмжилтийн үр дүн

5.9.1.3. Хөрсний дээжлэлтийг гүйцэтгэж лабораториудад харгалзах үзүүлэлтүүдээр шинжлүүлэх

Хуваарийн дагуу дээжлэлтийг тогтмол хэрэгжүүлж ажилласан. Хөрсний дээжийг Монгол улсад магадлан итгэмжлэгдсэн лаборатори болох “Нарт ШУҮН Консалтинг” ХХК-ийн Хөрсний итгэмжлэгдсэн лабораторид хийлгэсэн. Лабораторийн шинжилгээний үр дүнд холбогдох стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гараагүй.

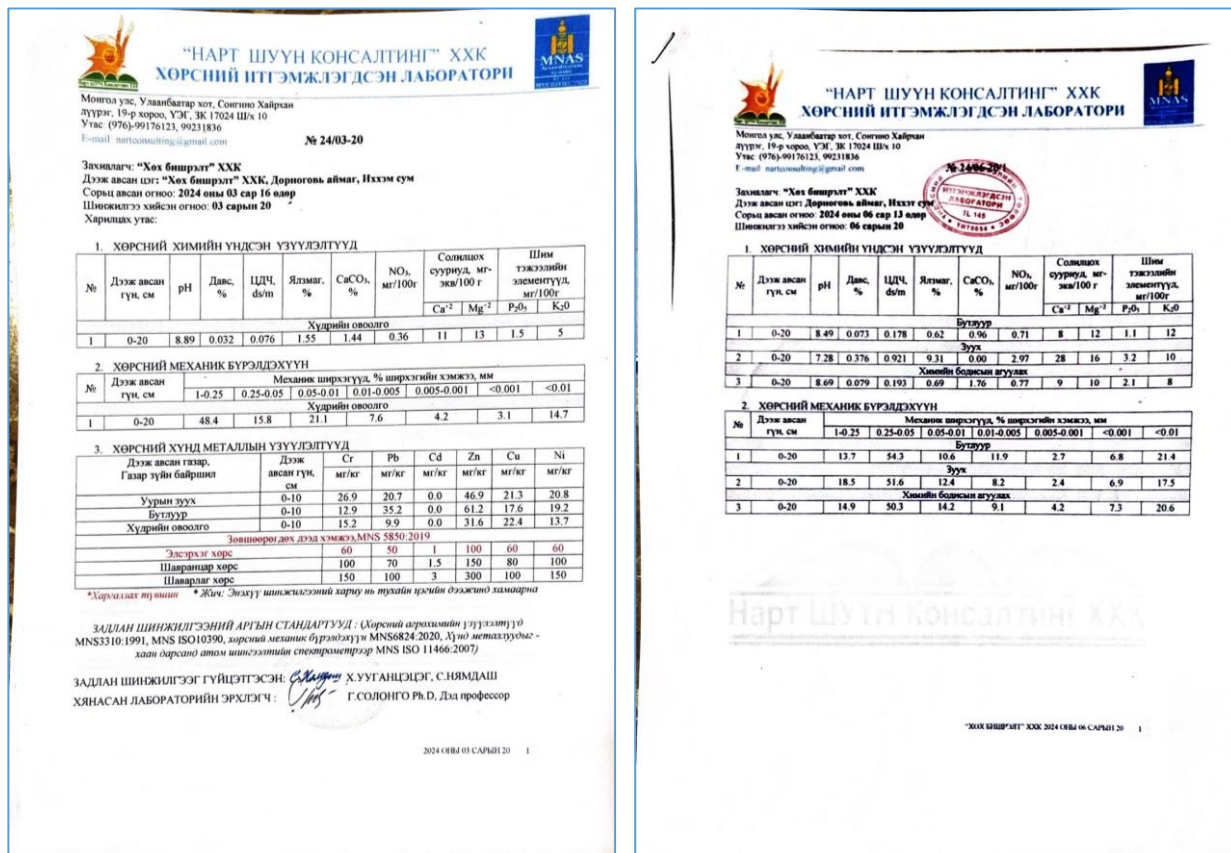

Зураг 37. Хөрсний дээжлэлтийн лабораторийн шинжилгээний хариу

5.9.1.4. Ундны усны дээж авч химийн болон бактерлогийн үзүүлэлтийг шинжлүүлэх

Хуваарийн дагуу дээжлэлтийг тогтмол хэрэгжүүлж ажилласан. Усны дээжийг Монгол улсад магадлан итгэмжлэгдсэн лаборатори болох “Нарт ШУҮН Консалтинг” ХХК-ийн Хөрсний итгэмжлэгдсэн лабораторид хийлгэсэн. Лабораторийн шинжилгээний үр дүнд холбогдох стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гараагүй.

Хуудас 56-ийн 52

5.10. Нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад БОМТ-ний биелэлтийг тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт

“Хөх Бишрэлт” ХХК нь Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны бүхий л үе шатанд орон нутгийн иргэд, засаг захиргааны байгууллагуудтай нягт уялдаа холбоотой ажиллаж, нээлттэй байх, хамтран ажиллах зарчмыг баримталж байна.

Энэхүү төлөвлөгөөний хүрээнд бид 2024 онд нийт 2 ажил төлөвлөсөн бөгөөд бүрэн хэрэгжиж дууссан. Хэрэгжилт 2024 оны 11-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар 100 хувьтай байна.

Хүснэгт 11. Нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад БОМТ-ний биелэлтийг тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт			
№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөв	Биелэлт
БОМТ-ний биелэлт тайлагнах			
1	Иххэт сумын ИНХ-д Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг танилцуулах	Биелсэн	2024 оны 12-р сарын 6-ний өдөр зохион байгуулагдсан Иххэт сумын Баян багийн Иргэдийн нийтийн хуралд оролцсон
2	Иххэт сумын ИНХ-д Компанийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл болон БОМТ, ОХШХ-ийн талаарх мэдээллүүдийг танилцуулах	Биелсэн	2024 оны 12-р сарын 6-ний өдөр зохион байгуулагдсан Иххэт сумын Баян багийн Иргэдийн нийтийн хуралд оролцсон

5.10.1. Багийн ИНХ-д БОМТ болон Хяналт, шинжилгээний гүйцэтгэлийг тайлагнах

5.10.1.1. Иххэт сумын ИНХ-д Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг танилцуулах

Бид 2024 оны 12-р сарын 6-ний өдөр зохион байгуулагдсан Иххэт сумын Баян багийн Иргэдийн нийтийн хуралд оролцож, байгууллагын үйл ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд авсан дээж болон хэмжилтийн үр дүнгүүдийн талаар мэдээллийг танилцуулсан /Хавсралт 14. Иххэт сумын Баян багийн иргэдийн нийтийн хурлын тэмдэглэл/.

5.10.1.2. Иххэт сумын ИНХ-д Компанийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл болон БОМТ, ОХШХ-ийн талаарх мэдээллүүдийг танилцуулах

Бид 2024 оны 12-р сарын 6-ний өдөр зохион байгуулагдсан Иххэт сумын Баян багийн Иргэдийн нийтийн хуралд оролцож, байгууллагын үйл ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд авсан дээж болон хэмжилтийн үр дүнгүүдийн талаар мэдээллийг танилцуулсан /Хавсралт 14. Иххэт сумын Баян багийн иргэдийн нийтийн хурлын тэмдэглэл/.

6. ДҮГНЭЛТ

“Хөх Бишрэлт” ХХК нь “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Ашигт малтмалын тухай”, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хуулийн холбогдох заалтууд болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/618 тоот тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу 2024 оны “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө”-г боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.

Бид баяжуулах үйл ажиллагаа явагдах газар нутгийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байлгах, байгаль орчинд үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ, төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үр дагаврыг тогтмол хянах, илрүүлэх, хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж ажиллах зорилготой ажилладаг.

Дээрх зорилгын дагуу тухайн жилийн уурхайн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулж, 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж түүний биелэлтийг ханган ажиллалаа.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг товч байдлаар нэгтгэн дүгнэвэл:

- ❖ БОННУ-нд тодорхойлсон байгаль орчны бүрдэл хэсгүүдэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл мөн төслийн 2024 оны үйл ажиллагаатай уялдуулан гол болон болзошгүй 11 сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, тэдгээрийг бууруулах, сэргийлэх, арилгах 17 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Төлөвлөн хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бүрд тухайн сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ, хэмжих нэгж, шаардагдах төсөв, баримтлах стандарт, хуулийн шаардлагыг тусгасан болно.
- ❖ Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд нийт 17 арга хэмжээ төлөвлөснөөс 17 ажлыг хэрэгжүүлсэн буюу тогтмол хэрэгжиж Тус төлөвлөгөөний хэрэгжилт 11-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар 97%-тай байна.
- ❖ “Хөх Бишрэлт” ХХК нь “Цагаан Дэл” хайлуур жонш баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хариуцлагатай байлгах, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг Монгол улсын холбогдох хууль, эрх зүй, стандарт шаардлагуудад нийцүүлэх, тухайн бүс нутгийн цаг уурын онцлог, ордын геологийн тогтоц, орчин нөхцөлд тохирсон байх, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн туршлага арга зүйд тулгуурлах, байгалийн унаган төрхийг хэвээр хадгалах, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах зэрэг зарчмуудыг баримтлан ажиллаж байна.
- ❖ Тайлант жилд биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрээнд 3 ажил төлөвлөсөн. Дорноговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар болон Иххэт сумын Засаг даргын тамгын газруудтай 2024 онд хэрэгжүүлэх Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээний талаар санал солилцсон. Тухайн байгууллагуудаас Иххэт сумын нутагт Монгол тарвага сэргээн нутагшуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр болсон. Сэргээн нутагшуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр “Хустайн Цогцолборт Газар” төв ТББ-тай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан. Тус гэрээний хүрээнд тайлант жилд тарвага сэргээн нутагшуулах ажлын судалгааг хэрэгжүүлсэн.
- ❖ Дорноговь аймгийн Иххэт сумын Засаг даргын тамгын газартай ярилцсаны үндсэн дээр сумын Бүрдэнэ багийн нутагт орших “Хөх Өндөр” нэртэй орон нутгийн иргэдийн өнгөт чулуу зөвшөөрөлгүй олборлож, нөхөн сэргээлт хийлгүй эвдрэлд оруулан орхисон талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийх ажлыг хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон. Техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэх ажлыг “Хөх Бишрэлт” ХХК нь өөрийн техник, ажиллах хүчээр хийхээр гэрээ байгуулан, гүйцэтгэлийг ханган ажилласан. Нөхөн сэргээлтийн хүрээнд нийт 11.1 га талбайд 2024 оны 10-р сарын 21-ны өдрөөс 10-р сарын 28-ны өдрүүдийн хооронд гүйцэтгэсэн. Гүйцэтгэсэн дүйцүүлэн нөхөн сэргээлтийг Дорноговь аймгийн Иххэт сумын засаг даргын 2024 оны 10-р сарын 21-ний өдрийн А/83 тоот захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн.

- ❖ Тайлант жилд биотехникийн арга хэмжээний хүрээнд мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зэрлэг амьтанд өвс, тэжээл тавьж өгөх ажлыг зохион байгуулсан. Тус ажлын хүрээнд Дорноговь аймгийн нутагт байршин амьдардаг 5 аргал хонинд 300 боодол өвс тавьж өгөх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.
- ❖ Иххэт сум үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойд зориулсан түүхэн номыг 65.0 сая төгрөгөөр, байгалийн үзэсгэлэнт болон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн танилцуулга номыг 25.0 сая төгрөгөөр санхүүжүүлж хэвлэн, орон нутгийн иргэдэд тараасан.
- ❖ Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд нийт 13 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд тухайн арга хэмжээнүүдийг бүрэн хэрэгжүүлж дуусан.
- ❖ Иххэт сумын ЗДТГ-ын даргатай 2024 оны 01-р сарын 2-ны өдөр №04 тоот “Хог хаягдал ачиж, тээвэрлэх” гэрээ байгуулсан.
- ❖ Хог хаягдлын түр цэгт нийт 4 ангилал бүхий хог хаягдлын сав байрлуулсан. Мөн баяжуулах үйлдвэр, ажилчдын амрах байр, гал тогоо, оффисууд зэрэг шаардлагатай байршлуудад 2-оос 3 ангилал бүхий хог хаягдлын савнууд байрлуулсан.
- ❖ Ашиглагдсан шатах тослох материалыг хүдэр бутлах механизмын тосолгоонд эргүүлэн ашигладаг. Элемент ХХК-тай 2024 оны 5-р сарын 28-ны өдөр “Химийн хортой болон аюултай бодисын хаягдал тээвэрлэх, устгах ажил гүйцэтгэх гэрээ” байгуулсан. Тайлант жилд нийт химийн бодисын хуванцар сав 385 ширхэг, сав баглаа боодол 2100 кг тус тус устгалд оруулсан байна.
- ❖ Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны чиглэлээр сургалт зохион байгуулах эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагатай хамтран үйлдвэрийн нийт 52 ажилчдад сургалт зохион байгуулсан.
- ❖ Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд баяжуулах үйлдвэрийн талбайд нийт 800 ширхэг улиас мод худалдан авч, тарьсан.
- ❖ Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Усны Газар”-аас 2024 оны 6-р сарын 4-ны өдөр Е-2404-000028 дугаартай “Ус ашиглуулах дүгнэлт” авсан бөгөөд 2024 оны 6-р сарын 12-ны өдөр “Умард говийн гүвээт-халхын дундад талын сав газрын захиргаа”-тай 11 дугаар “Ус ашиглах гэрээ”-г байгуулсан.
- ❖ Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны хүрээнд MNS 4219:1994 стандартын дагуу экологийн паспорт боловсруулсан.
- ❖ Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Дорноговь аймгийн АУК-д сурдаг 1 оюутаны төлбөрийг төлдөг. 2024 оны зудтай өвөл Бүрдэнэ баг, Баян багийн малчдын айл хоорондын зам, сум орон нутаг орох замыг 7 хоног тутам 2 ковшоор хусах ажил хийсэн. Хавар малын сэг зэм ачиж булшлах ажилд 20 хоног 1 ковш, 3 ажилтан ажилласан байна.
- ❖ Орчны хяналт шинжилгээний ажиглалт, хээрийн хэмжилт, дээжлэлтийг батлагдсан аргаар, стандартын дагуу хийж, төслийн талбайгаас авсан аливаа дээжүүдийг Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораториудад хүргүүлж, гарсан үр дүн, гэрээт компанийн тайланг холбогдох газруудад хүргүүлэн ажиллалаа.
- ❖ Бид 2024 оны 12-р сарын 6-ний өдөр зохион байгуулагдсан Иххэт сумын Баян багийн Иргэдийн нийтийн хуралд оролцож, байгууллагын үйл ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд авсан дээж болон хэмжилтийн үр дүнгүүдийн талаар мэдээллийг танилцуулсан.

“Цагаан Дэл” хайлуур жонш баяжуулах үйлдвэрин 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд компанийн удирдлагаас эхлээд гүйцэтгэх түвшний бүх ажилчид, сум орон нутгийн төрийн байгууллага, орон нутгийн иргэн, малчдын бүлэг түүний гишүүдийн оролцоотойгоор амжилттай хэрэгжүүлэн ажилласан байна.
