

**“ТЕРРА ВИСТА” ХХК-ИЙН ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ
СУМЫН НУТАГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ “ШАРАНГАТАЙ” ХАЙЛУУР
ЖОНШНЫ ОРДЫГ ИЛ АРГААР АШИГЛАХ ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**
(Регистрийн дугаар – 5968216)

ХЯНАСАН:

ХБОБХГ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:

“ТЕРРА ВИСТА” ХХК

ЗАХИРАЛ

“ТЕРРА ВИСТА” ХХК

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН



ГАРЧИГ

1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА	3
2. ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ТҮҮНИЙ ОРЧМЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ	8
3. ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ	10
4. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	12
5. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	13
6. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	20
7. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	22
8. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	23
9. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	23
10. ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	24
11. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	27
12. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ	29
13. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	39
14. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	43

Хүснэгтийн жагсаалт

Хүснэгт 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн эргэлтийн цэгийн солбилцолууд.....	3
Хүснэгт 2. Ил уурхайн ажлын горим	5
Хүснэгт 3. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	13
Хүснэгт 4. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	20
Хүснэгт 5. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	22
Хүснэгт 6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт.....	24
Хүснэгт 7. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	27
Хүснэгт 8. Орчны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний биелэлт.....	29
Хүснэгт 9. Хөрсний хүнд металлын шинжилгээний дүн.....	35
Хүснэгт 10. Хөрсний эрүүл ахуйн шинжилгээний дүн.....	36
Хүснэгт 11. Хөрсний агрохимийн шинжилгээний дүн	36
Хүснэгт 12. Хөрсний механик бүрэлдэхүүний шинжилгээний дүн	37
Хүснэгт 13. Усны химийн шинжилгээний дүн	38
Хүснэгт 14. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	39
Хүснэгт 15. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт.....	43

Зургийн жагсаалт

Зураг 1. Төслийн байршлын зураг.....	3
Зураг 2. 2024 оны уурхайн өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил.....	6
Зураг 3. 2024 оны тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн хэрэглээ	6
Зураг 4. 2024 оны тэсрэх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл	7
Зураг 5. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт	7

1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

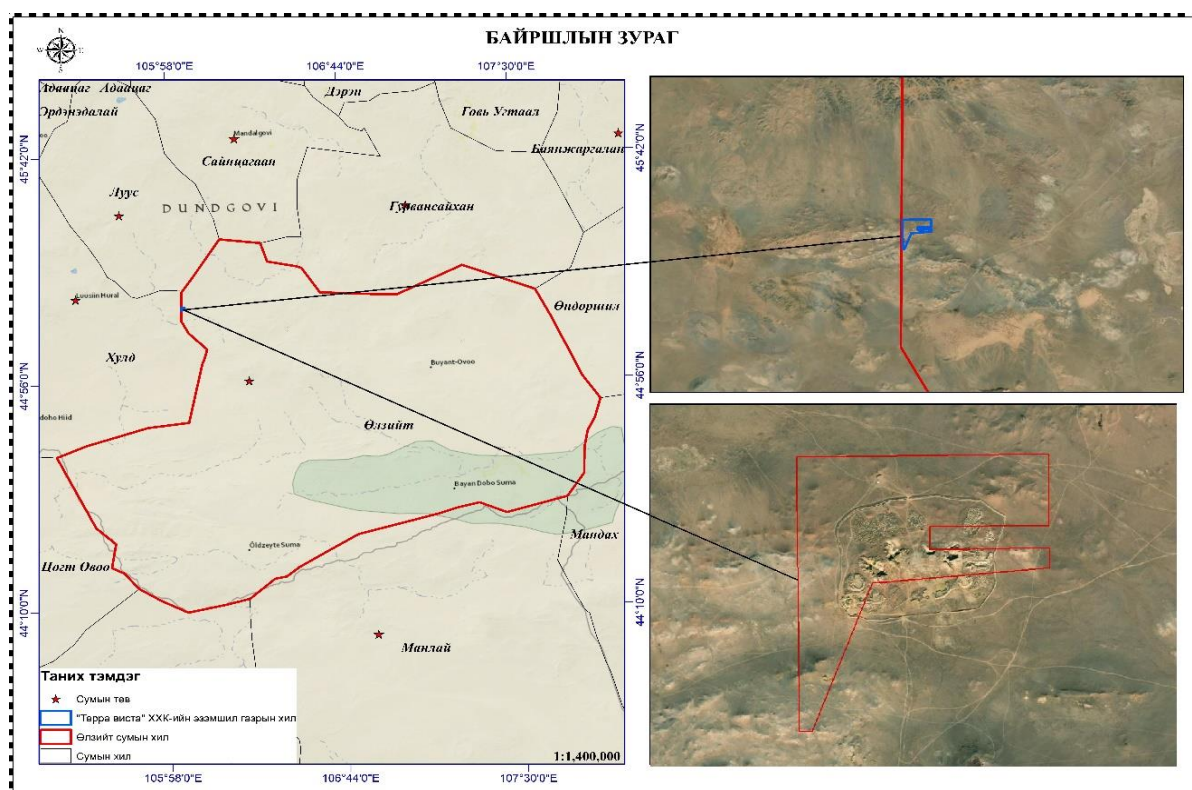
Төслийн нэр: “Шарангатай” хайлуур жоншны ордыг ил аргаар ашиглах төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгч: “Терра виста” ХХК

Төслийн байршил: MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий хайлуур жоншны ордын талбай нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд Дундговь аймгийн Өлзийт сумын 4-р багийн нутагт орших бөгөөд Улаанбаатар хотоос урагш 312 км, Дундговь аймгийн төв Мандалговь хотоос урагш 70 км, Өлзийт сумаас баруун хойш 40км зайд байрлана.

Хүснэгт 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн эргэлтийн цэгийн солбилцолууд

Цэгийн дугаар	Уртраг	Өргөрөг
	Х	У
1	106° 2' 10.58"	45° 11' 30"
2	106° 2' 10.58"	45° 11' 26.8"
3	106° 2' 33.7"	45° 11' 26.8"
4	106° 2' 33.7"	45° 11' 24.02"
5	106° 1' 59.26"	45° 11' 22.16"
6	106° 1' 47.26"	45° 11' 1.32"
7	106° 1' 44.9"	45° 11' 1.32"
8	106° 1' 44.9"	45° 11' 40"
9	106° 2' 33.7"	45° 11' 40"
10	106° 2' 33.7"	45° 11' 30"



Зураг 1. Төслийн байршлын зураг

Ордыг ашиглах тусгай зөвшөөрөл: Ашигт Малтмал Газрын Тосны Газрын Кадастрын хэлтсийн даргын 2021 оны 12 сарын 28-ний өдрийн 505 тоот шийдвэрээр Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 2051 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр хүртэл 30 жилийн хугацаатай “Терра виста” ХХК-д олгосон байна.

Ашиглалтын систем: Ордын уул-техникийн нөхцөл, хүдрийн биетийн геологийн тогтцыг харгалзан ил аргаар, экскаватор-автосамосвалын хослол бүхий тээвэртэй, гадаад болон гадаад овоолготой ашиглалтын системээр ашиглана.

Доголын өндөр: Хүдрийн хаягдал бохирдлыг бага байлгах, хүдрийн биетийн цул тогтцоос хамааруулан уурхайн ажлын доголын өндрийг $H_d=5\text{м}$ байхаар тооцов. Доголын өндөр бага байснаар хүдэр хөрсний чулуулгийн зааг орчимд үүсэх хаягдал болон бохирдлын хэмжээ багасах нөхцөл бүрдэнэ.

Ажлын бус доголын өндөр: Уурхайн ажлын доголыг цаашид ашиглахгүй, ил уурхайн хүрээ хязгаарт хүрсэн үед ажлын доголуудыг нэгтгэн ажлын бус догол үүсгэнэ. Ажлын бус доголын өндөр 10м байна.

Ажлын доголын хажуугийн налуугийн өнцөг: Ажлын доголын хажуугийн налуугийн өнцгийг чулуулгийн шинж чанарын нөхцөлөөр тодорхойлоход хөрс, хүдрийн доголд $\alpha_d=60^\circ$ байна. Шинээр ашиглалтын түвшин нээхэд огтлох траншейгаар нээнэ. Траншей нээх, ажиллах техникийн аюулгүй зайн нөхцөлөөр ажлын талбай тодорхойлогдоно. Ажлын хамгийн бага өргөн 25 м-ээс багагүй байна.

Хэвийн ажлын талбайн өргөн нь доголын ахилтын хурд (нөөц орлын тоо), дээд доголын тоогоор тодорхойлогдоно.

- Доголын ирмэгээс аюулгүйн зурвасын өргөн- 3.0м
- Автомашины тэнхлэгээс дээд доголын хормой хүртэлх зай –3м
- Хөдөлгөөний зурвасуудын тэнхлэг хоорондох зай - 3м

Хүснэгт 1. Ашиглалтын технологи

Технологи	Үндсэн ажил	Технологийн процессууд
Тээвэртэй ашиглалтын технологи	Хөрс хуулалт	Өрөмдлөг тэсэлгээ Ухаж ачих Тээвэрлэх Овоолох
	Олборлолт	Өрөмдлөг тэсэлгээ Ухаж ачих Тээвэрлэх Овоолох

Уурхайн тээвэр

Дотоод тээвэр: Уулын ажлын календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу жилд дунджаар 80.0 мян.м³ хөрс хуулж, 40 мян.тн хүдэр олборлоно.

а. Хөрс тээвэрлэлт. Хөрсийг уурхайн дотор явах замын дундаж зайг оруулан дунджаар 0.9 км зайнд байрлах гадаад овоолгод тээвэрлэнэ.

б. Хүдрийн дотоод тээвэр. Жилд дунджаар 15.4 мян.м³ буюу 40.0 мян.тн хүдрийг мөргөцгөөс шууд ачиж, хүдэр буулгах талбай хүртэл тээвэрлэнэ. Уурхай дотоод тээвэрт Nowo 25 маркийн автосамосвалыг ашиглана.

Гадаад тээвэр: “Шарангатай”-н уурхайн бутлан ангилах хэсгээс гарах баяжмалыг Чойр өртөө хүртэл 220 км зайд 35 тн-ын даацтай автосамосвалалаар Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэрээр уул уурхайн гаралтай бүтээгдэхүүний тээвлэх маршрутын дагуу тээвэрлэнэ.

Уулын ажлын горим: Уулын ажил нь жилд 8 сар явагдана. Үйлдвэрлэлийн үндсэн процессууд нь тасралтгүй 7 хоног, өдөрт 1 ээлжээр 10 цагаар явагдана.

Туслах ажлууд болох цахилгаан хангамж, усан хангамж, гэрэлтүүлэг зэрэг үйлдвэрлэлийн дотоод ажлын зохион байгуулалтаар хийнэ.

Хүснэгт 2. Ил уурхайн ажлын горим

Үзүүлэлт	Х.нэгж	Хоног
Календарь хоног	хоног	180
Жилд ажиллах сар	сар	6
Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа	цаг	10
Ээлжийн тоо	ээлж	1
Баяр ёслолын хоног	хоног	10
Цаг агаарын саатал	хоног	8
Бэлтгэл ажлын хоног	хоног	2
Жилд ажиллах хугацаа	хоног	160

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

2024 оны уулын ажлын төлөвлөгөө:

“Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны уурхайн өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил:



Аж ахуйн нэгжийн нэр:
Ашигт малтмалын төрөл:
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Терра виста
Хайлуур жонш
MV-022056

Баяжуулалтын технологи, Гар ялгалт
Төлөвлөгөөний он: 2024
Тухайн онд боловсруулах хүдрийн (элс) хэмжээ: 30.00

Маягт-9.1



Ашигт малтмал газрын тосны газар

Уурхайн өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил

Д/д	Тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо		Өрөмдлөгийн хэмжээ (мян.тууш.м)			Нийт уулын цул мян.м³		Тэсэлгээх уулын цулын хэмжээ мян.м³		Нийт уулын цулын хэмжээ		Агуулахын багтаамж (тн)			Тайлбар
	Тэсэлгээ	Тэсэлгээний туслан гүйцэтгэгч	Хөрс	Хүдэр	Нийт өрөмдлөгийн хэмжээ	Хөрс	Хүдэр	Хөрс	Хүдэр	Хөрс	Хүдэр	Агуулахын ангилал	Тэсрэх бодис	Тэсэлгээний хэрэгсэл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	№174, 2018-02-20	МОНТРЕКС ХХК	11.5	1.2	12.7	90.2	10.489510489510	90.2	10.489510489510	100.689510489510	100.689510489510	Байнгын	15		

Зураг 2. 2024 оны уурхайн өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил

“Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны тэсрэх бодис, тэсэлгээний ажил:



Аж ахуйн нэгжийн нэр:
Ашигт малтмалын төрөл:
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Терра виста
Хайлуур жонш
MV-022056

Баяжуулалтын технологи, Гар ялгалт
Төлөвлөгөөний он: 2024
Тухайн онд боловсруулах хүдрийн (элс) хэмжээ: 30.00

Маягт-9.2



Ашигт малтмал газрын тосны газар

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн хэрэглээ

Д/д	Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл	Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн хэрэглээ				Тайлбар
		Нэр, төрөл	Хэмжих нэгж	Орлого	Зөрлөг	
1	2	3	4	5	6	7
1	Тэсрэх бодис	АНФО	тн	86.125	86.125	
2	Тэсрэх бодис	ЭМУЛЬС	тн	21.537499999999998	21.537499999999998	
3	Тэсэлгээний хэрэгсэл	НОНЭЛЬ	ш	1250	1250	
4	Тэсэлгээний хэрэгсэл	ӨДӨӨГЧ	ш	625	625	
5	Тэсэлгээний хэрэгсэл	Цочир дамжуулах шкимм	м	3125	3125	
6	Тэсэлгээний хэрэгсэл	Хором удаашруулагч	ш	125	125	
7	Тэсэлгээний хэрэгсэл	Тэслүүр	ш	62.5	62.5	

Зураг 3. 2024 оны тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн хэрэглээ

“Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төлөв:

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

Зураг 4. 2024 оны тэсрэх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

“Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын тоног төхөөрөмжийн жагсаалт:



Аж ахуйн нэгжийн нэр:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Ашигт малтмалын төрөл:

Терра виста

MV-022056

Хайлуур жонш

Ашигт малтмал газрын тосны газар

Баяжуулалтын технологи:

Гар ялгалт

Төлөвлөгөөний он:2024

Тухайн онд боловсруулах хүдрийн (элс) хэмжээ:30.00

Маягт-8



Уурхайн олборлолтын тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр				Хүчин чадал ба тавил		Ашигтлалын хугацаа			Цахилгаан зарцуулалт	Түлш зарцуулалт				Өнцлөлийн хэлбэр	Тайлбар
	Марк	Төрөл	Загвар	Үйлдвэрлэсэн улс	Нэгж	Хэмжээ	Үйлдвэрлэсэн он	Ашигтлалдаг өгсөн он	Ашигтлалын хугацаа		Сууригэлэгдсэн чадал кВт (kW)	Хэмжих нэгж	Зарцуулалтын тоон утга	Нийт ажиллах гүйцт (моторцаг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HYUNDAI	Экскаватор	R480LC-9	БНСУ	м3	2.7	2016	2021	10	266	моторцаг	25	1920.00	48000.00	Өөрийн	
2	HOWO	Автосамосвал	SINOTRUCK ZZ3317N2861	БНХАУ	м3	16	2020	2022	10	273	нэг.км	0.35	13600.00	4760.00	Өөрийн	
3	HOWO	Автосамосвал	SINOTRUCK ZZ3317N2861	БНХАУ	м3	16	2020	2022	10	273	нэг.км	0.35	13600.00	4760.00	Өөрийн	
4	SHANTUI	Бульдозер	SD23	БНХАУ	м3	250	2019	2022	10	280	моторцаг	35	1200.00	42000.00	Өөрийн	
5	XCMG	Утгуурт ачигч	ZL50F	БНХАУ	м3	3	2019	2022	10	250	моторцаг	30	1600.00	48000.00	Өөрийн	
НИЙТ		---	---	---	---	---	---	---	50.00	---	---	---	---	147 520.00	---	---

Төлөвлөгөө гаргасан:

Ерөнхий инженер:

Баяжуулагч инженер:

Амарбаясгалан

Амарбаясгалан

Амарбаясгалан

Хүлээн авсан:

Мэргэжилтэн:

Зураг 5. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

2. ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ТҮҮНИЙ ОРЧМЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Физик газарзүйн нөхцөл: Тус бүс нутаг нь физик газарзүйн мужлалаар Говийн их болон Дорнод говийн мужийн Дорноговийн хотгор, Умард говийн ухаа толгодот талын тойрогт хамаарах ба байгалийн бүсийн ангиллаар хээржүү цөлийн бүсэд, Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын гадаргын усны сав газрын ангилалд хамаарна.

Ашигт малтмал ашиглалтын талбай, түүний орчмын нутаг нь Дундговь аймгийн төвөөс урагш, Өлзийт сумын хойд хэсгийг хамран хээр ба говийн их мужийн шилжилтийн заагаар орших бөгөөд цав толгодлог, ухаа гүвээт гэсэн 2 төрлийн рельеф зонхилдог.

Цав толгодлог рельефийн үнэмлэхүй өндөр нь баруунаас зүүн урагшлах тутам аажим намсах ба ихэвчлэн бөмбөгөрдүү оройтой налуу хажуутай байдаг. Боржин болон дэл судлын чулуулаг тархсан газар янз бүрийн хэлбэртэй цохионууд ажиглагдана.

Мөлгөрдүү ухаа гүвээт талархаг рельеф нь цэрд, юрагийн хурдас тархсан нутгуудаар голлон байрлана. Харьцангуй өндөр нь 10-30м байдаг. Ийм төрлийн рельеф нь гуу жалгаар харьцангуй бага хэрчигдсэн. Маш налуу хажуутай толигор оройтой бөгөөд, цав толгодлог рельефтэй хяр хэцүүдтэй ихэвчлэн налуу хажуугаар хааяа мөргөцгөөр тусгаарлагдана. Чулуулгийн гарш, илэрц нь толгодын хажуу хормой, хааяа оройн хэсгээр тохиолдоно.

Хөрс, хөрсөн бүрхэвч: Тал, газар хөндий хотгорын хүрэн хөрс тархана. Энэ хэвшинжийн хөрс Монгол орны тал хээр, уулсын хоорондох хөндий хотгорт өргөргийн ба хотгорын бүс, дэд бүсүүд үүсгэж дорнод хэсэгт 600-700 м-ээс өрнөд хэсэгт 2300-2400 м хүртэл үнэмлэхүй өндөрт хамгийн түгээмэл тархсан байна. Ургамал бүрхэвчид нь үетэнт, агь-үетэнт, алаг өвс-үетэнт хуурай хээрийн ба заримдаа цөлөрхөг хээрийн ургамалшил зонхилж, харгана байнга тааралдана. Газрын дээрх ургамлын массын (фитомассын) хэмжээ 6-27 ц/га, газрын доорхи нь 170-400 ц/га хүрдэг.

Хүрэншороон хөрсний профиль дараах үе давхаргуудаас тогтоно: А-В-ВСа-ВССа-ССа.

Ялзмаг хуримтлалын давхарга (А) нь бараан хүрэн, хүрэн, цайвар хүрэн өнгөтэй, өнгөнийх нь байдал ялзмагийн хуримтлалтай шууд холбоотой, бүдэг илэрсэн бөөмөрхөг бүтэцтэй, жижиг сайр чулуу бараг байнга агуулсан байдаг, доод хил нь тод ялгарч зааглагддаг, зузаан нь янз бүр, 10 см-ээс 30-35 см хүртэл хэлбэлзэнэ.

Шилжилтийн ялзмагт (В) давхарга тод бор, цайвар бор өнгөтэй, бусад давхаргуудаас арай хурц туяатай, нягтавттар, хил зааг нь тод, зузаан нь 10-25 см заримдаа эртний

цэвдгийн ан цаваар доошоо 40-80 см хүртэл хошуурч орсон байна. Энэ давхарга хархүрэн, хүрэн хөрсөнд байхаас цайвар хүрэн хөрсөнд А давхаргын доор шууд карбонатын (BCa) давхарга оршино.

Ургамлан нөмрөгийн төлөв байдал: Цөөннаст алаг өвс болох толгодын бударгана, монгол өвс-таанат (*Allium polyrrhizum*, *A.mongolicum*, *Stipa gobica*, *Cleistogenes squarrosa*) ургамалжил зонхилж, олон наст үетэн говийн хялгана болон дэрвээн хазаар өвс дэд зонхилгогч, цөөннаст үетэн болох алтан харгана, бага хургалж, ямаан шарилж дагалдах бөгөөд ордын толгодорхог хэсгээр экологийн бүлгийн хуурайсаг элементүүд болох говийн хялгана, алтан харгана, ямаан шарилж, бага хургалж зэрэг зүйлүүд бүртгэгдсэн.

3. ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ

Агаарын орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл:

Уурхайн тээвэрлэлтийн үед үүсэх тоосжилт:

- Хүдрийн овоолгын уусгалт
- Хүдэр овоолох талбай
- Уурхайн гадаад тээвэрлэлт
- Техник тоног төхөөрөмжийн дуу чимээ

Хөрс хуулах, түрэх, тээвэрлэх зэрэг бүхий л ажиллагаа тасралтгүй явагдах тул бульдозер, экскаватор, автомашин, бусад төхөөрөмжийн дуу чимээ болон хорт хий утаа гарах, тоос шороо дэгдэх зэргээр агаар орчныг бохирдуулж, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд сөргөөр нөлөөлнө. Үүнээс гадна барилга угсралтын үйл ажиллагаа болон тээврийн хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор агаарын бохирдол үүсч болзошгүй.

Хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл:

Уурхайн олборлолтын болон бусад төрлийн үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх нөлөөллийн эх үүсвэр нь:

Ордын ашиглалтын хугацаанд ордын барилга байгууламж барих бүтээн байгуулалтын үед хөрсөн бүрхэвч ихээр талхлагдана. Цаашлаад үйл ажиллагааны явцад засвар үйлчилгээ, ШТМ агуулах, ахуйн хог хаягдал зэргээс хөрс бага зэрэг бохирдох

Гадаргын болон гүний усанд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл:

Төслийн үйл ажиллагааны явцад дараах эх үүсвэрүүдээс гадаргын болон газар доорх усны нөөц, чанарт нөлөөлөл бий болж болзошгүй. Үүнд:

- Хөрс хуулалт болон барилга угсралтын явцад тоосжилт дарахад цэвэр усны нөөц хомсдох
- Уулын малталтын үед хөрсний болон гүний усыг зайлуулж усны нөөц хомсдох
- Барилга угсралтын ажлын явцад барилгын материал хур тунадас болон үерийн усаар угаагдан барилгын материалд агуулагдах бодисууд хөрсөнд нэвчих, улмаар хөрсний бага гүний усыг бохирдуулах
- Уулын ажлын болон ахуйн бохир ус хадгалах сав хүчтэй аадар бороо болон үерийн усаар дүүрч хальхаас үүдэн хөрсөнд нэвчиж хөрсний ус болон бага гүний усыг борхирдуулах
- Техник, тоног төхөөрөмжийн шатах тослох материал алдагдаж хөрсийг бохирдуулхаас үүдэн хөрсний усыг бохирдуулах

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

- Уурхайн байгууламж, хоосон овоолго, хаягдлын сан, техник хэрэгслийн байршуулалт зэргээр газрын гадаргыг өөрчилж улмаар байгалийн хур тунадас унаж урсац бүрдэх, хөрсний чийг, газрын доорх усыг сэлбэх нөхцөлийг доройтуулах магадлалтай.

4. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Байгаль орчны 2024 оны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө, хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний менежментийн төлөвлөгөө, удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний арга хэмжээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах зэрэг арга хэмжээнүүдийг тус тус хэрэгжүүлсэн байна.

Мөн Монгол улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” болон “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хуулиуд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10 сарын 29-ний өдрийн А/618 тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам” зэргийг удирдлага болголоо.

2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө, хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний менежментийн төлөвлөгөө, удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний арга хэмжээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах зэрэг ажлууд багтсан бөгөөд 8.740 сая.төг зарцуулахаар төсөвлөсөн байна.

5. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Төслийн үйл ажиллагаанаас үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.

Хүснэгт 3. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Хэрэгжилт	Тайлбар	Гүйцэтгэл
1	Уурхайн олборлолт болон тээврийн хэрэгслүүдийн үйл ажиллагааны улмаас гарч болох тоосжилтын эх үүсвэрүүд: Уурхайн олборлолтын үеийн хөрс хуулалт, олборлолт, овоолго хийх газар шорооны ажил, - Уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй	Уурхайн олборлолтын үе шатанд тоосжилт ихээр үүсэх үед усалгаа хийх	Бүрэн хэрэгжсэн	Уурхайн үйл ажиллагааны үед бороо ороогүй, салхи ихтэй, тоосжилт дэгдсэн үеүдэд зам талбайн усалгааг хийж гүйцэтгэсэн.	 

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

2	тээврийн хөдөлгөөн, Тээвэрлэлтэнд явж буй машинуудаас ялгарах хорт бодисуудаар орчны агаар бохирдох	Уурхайн ажиллагсад тоосноос хамгаалах амны маск, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр ажилчдыг хангах, сургалт сурталчилгаа явуулах	Бүрэн хэрэгжсэн	Төслийн хугацаанд уурхайн ажиллагсад тоосноос хамгаалах амны маск болон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдээр ажилчдыг хангаж ажилласан.	
3		Хүнд машин механизмын утааны хэмжээг стандартын шаардлага хангах хэмжээнд байлгах, үзлэг шалгалтыг хийх засвар үйлчилгээг тогтмол хийх	Бүрэн хэрэгжсэн	Уурхайн ажлын явцад ашиглагдаж буй машин механизмд үзлэг шалгалтыг хийж шаардлага хангахгүй машин механизмыг талбайд гаргахгүйгээр ажилласан.	
4	Ордын ашиглалтын явцад хөрсний бүтэц найрлагад өөрчлөлт орох, хог хаягдал, тоосжилтоос бохирдол үүсгэх,	Асгаралтын үе хэрэглэх багаж хэрэгслээр хангаж ажиллах	Бүрэн хэрэгжсэн	ШТС-ын бүтээгдэхүүн асгарахаас сэргийлэн ШТС-ыг бетон хучилттайгаар байгуулж, ажилчдад мэдээлэлээр хангаж ажилласан.	

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

5	хүнд даацын машин механизмууд олон салаа зам гаргаж хөрс болон ургамлыг гэмтээх Шатах тослох материал, барилгын материалын хог хаягдал, шатахуун асгарах зэрэг болзошгүй осол аваараас үүдэн хөрсөн бүрхэвчийг бохирдуулах	Төслийн эдэлбэр газраас бусад талбайн ургамлыг хамгаалах зорилгоор ажилчид болон машин техникийн хөдөлгөөнийг тогтсон маршрутын дагуу явуулах, авто зогсоолыг тэмдэгжүүлэх	Бүрэн хэрэгжсэн	Техникийн хөдөлгөөнийг тогтсон маршрутын дагуу явуулах тэмдэг тэмдэглэгээ болон авто зогсоолын талбайд тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулсан.	   
6		Хөрсний овоолго болон шимт хөрсний овоолгыг төлөвлөгөөний дагуу цэгцтэй хураах	Бүрэн хэрэгжсэн	Хөрсний овоолго болон шимт хөрсний овоолгыг стандарт, төлөвлөгөөний дагуу цэгцтэйгээр байршуулсан.	

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

[illegible]

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашигдалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

8	сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.	Ахуйн гал түймэртэй тэмцэх багаж хэрэгсэл худалдаж авах (галын хор, гал унтраагч, ус цацагч гэх мэт)	Бүрэн хэрэгжсэн	Галын сараа, гал түймэртэй тэмцэх багаж хэрэгслүүдийг авч шаардлагатай газруудад байршуулсан.	  
---	----------------------------	--	-----------------	---	---

8		Ажилчдын гал тогоо, амрах байр, хог хаягдлын цэг, 00-ийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт	Бүрэн хэрэгжсэн	Ажилчдын гал тогоо, амрах байр, хог хаягдлын цэг, 00-ийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт, цэвэрлэгээг тогтмол хийж гүйцэтгэсэн.	 
---	--	---	-----------------	--	--

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашигдалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

					
--	--	--	--	--	--

2	Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэх	Бүрэн хэрэгжсэн	
---	--	-----------------	--

7. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 5. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ	Хэрэгжилт	Хэрэгжилт
1	Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх	Орон нутгийн удирдлагуудтай уулзаж сургуулийн тохижилт, хашаа хайс будах, өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд тусалсан. 1 айлд харааны шороо зөөж өгсөн. 1 айлд хороо хийх чулуу, шороо зөөж өгсөн.	 

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

8. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

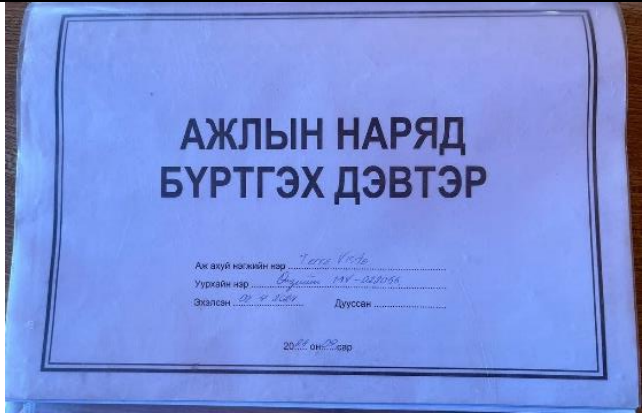
Төслийн хүрээнд нүүлгэн шилжүүлэх үйл аж иллагаа хийгдэхгүй тул 2024 оны БОМТ-нд нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээ тусгагдаагүй болно.

9. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

“Терра виста” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийн талбайд палеонтологийн олдворын ул мөр ажиглагдаагүй байна. Түүнчлэн археологийн дурсгал илрээгүй байна. Үйл ажиллагааны явцад түүх соёлын дурсгалт зүйлс олдвол уурхайн үйл ажиллагааг түр зогсоон зохих байгууллагад мэдэгдэж, түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах ажлыг зохион байгуулна.

10. ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 6. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Болзошгүй аюул, осол,сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Хэрэгжилт	Тайлбар	Гүйцэтгэл
1	Цаг агаарын үзэгдэл, ажилчдын хариуцлагагүй байдлаас шалтгаалан осол гарах	Цаг агаарын мэдээг байнга авч үйл ажиллагаатайгаа холбон ажиллах, болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх гарын авлагатай болох	Бүрэн хэрэгжсэн	Болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж, ажиллагсдадаа заавар, зааварчилгааг тогтмол өгч ажилласан.	
2		Ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгуулах, аюулгүй ажиллагааны талаарх мэдээллийг өгч байх, самбартай байх	Бүрэн хэрэгжсэн	Ажилтан албан хаагчдад аюулгүй ажиллагааны талаарх мэдээллийг тогтмол өгч, ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулсан.	

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

					
3		Болзошгүй аюул ослын үед ашиглах багаж хэрэгсэл холбооны хэрэгсэлтэй болох	Бүрэн хэрэгжсэн	ШТС-ын ойролцоо аянга зайлуулагч байршуулсан.	

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан


4	Аваар ослын үед авран хамгаалах төлөвлөгөөтэй байх	Бүрэн хэрэгжсэн	Аваар ослын үед авран хамгаалах төлөвлөгөөг ерөнхий инженер Б.Батбаяр, эрүүл ахуйн инженер Э.Жамсранжав нар хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд тухайн төлөвлөгөөг батлуулахаар ажиллаж байна.	ОБЕГ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 25-ны едийн А/75 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт БАТЛАВ: ТЕРРА ВИСТА ХХК-ий ЗАХИРАЛ Г.ГАНБАГАНА ЗӨВШӨӨРСӨН: ОБЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ УУЛ УУРХАЙН АВРАХ 09 ДҮГЭЭР АНГИЙН ЗАХИРАГЧ ХУРАНДАА Д.ГАНТУЛГА 20.. оны .. сарын ... өдөр 20.. оны .. сарын ... өдөр ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ ШАРАНГАТАЙ ХАЙЛУУР ЖОНШНЫ ОРДЫН 2024 ОНЫ АЮУЛЫН ҮЕД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Үндсэн АТЗ-ын дугаар: MV-022056 ХЯНАСАН: УУЛ УУРХАЙН АВРАХ 09 ДҮГЭЭР АНГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА, АВРАХ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАГЧ, АХМАД / Д.БАЯРЖАРГАЛ / ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР / Б. БАТБАЯР / БОЛОВСРУУЛСАН: ТЕРРА ВИСТА ХХК-ийн ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ИНЖЕНЕР / Э.ЖАМСРАНЖАВ / 2024 он
5	Байгаль орчныг хамгаалах талаар сургалтыг жилд нэг удаа зохион байгуулах, холбогдох сумын байгаль орчны алба, байгаль хамгаалагч нартай харилцан холбоотой ажиллах	Бүрэн хэрэгжсэн	Нийт ажилчдад байгаль орчныг хамгаалах сургалтыг зохион байгуулсан.	
6	Эрүүл мэнд	Бүрэн хэрэгжсэн	Ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулсан.	

11. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 7. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах бууруулах арга хэмжээ	Хэрэгжилт	Тайлбар	Гүйцэтгэл	
1	Хатуу хог хаягдлыг тогтмол зайлуулаагүйгээс орчин бохирдох	Хатуу хог хаягдлыг цуглуулж нэгдсэн цэгт хүргэж устгаж байх	Бүрэн хэрэгжсэн	Хатуу хог хаягдлыг түр хадгалах цэгт хадгалж, нэгдсэн цэгт хүргэдэг.		
2		Хог хаягдлыг цуглуулах савыг битүүмж сайтай хийх, аль болох олон газарт байрлуулах	Бүрэн хэрэгжсэн	Хог хаягдал түр хадгалах савыг салхиар хийсэхээргүй байхаар хийж байршуулсан.		
3		Хаягдал тосыг хуримтлуулах сав байрлуулах	Бүрэн хэрэгжсэн	Хаягдал тосыг битүү тагтай саванд хадгалж байна.		

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

4		Хаягдал дугуй болон төмрийн хаягдлыг ангилан цуглуулах цэгийг хашаажуулах, тэмдэг тэмдэглэгээ тавих	Бүрэн хэрэгжсэн	Хаягдал дугуй болон төмрийн хаягдлыг нэг цэгт хадгалж хашаалсан.	
5		Хог хаягдлын гэрээ байгуулах	Бүрэн хэрэгжсэн	2024 оны 11 сарын 29 өдөр аймгийн Өлзийт сумын ЗДТГ-тай гэрээ байгуулан ажилласан.	

12. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 8. Орчны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хэрэгжилт	Тайлбар	Гүйцэтгэл
Хөрсний шинжилгээ					
1	Хөрсний морфологи бичиглэл, рН, цахилгаан дамжуулалт, давс %, ялзмагийн агууламж %, шим тэжээлийн элемент, хөрсний механик бүрэлдэхүүн, нүүрс устөрөгчийн нэгдлүүд	Хөрс элэгдэл эвдрэлд орох, үржил шимээ алдах, гадаргын унаган хэлбэр өөрчлөгдөх	Бүрэн хэрэгжсэн	Хөрсний агрохими, механик бүрэлдэхүүний дээжийг 2024 оны 10 сарын 10 өдөр төслийн талбайгаас 6 цэгт хөрсний зүсэлт хийж дээж авч “Инженер геодези” ХХК-ийн хөрс судлалын итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн.	
2	Хүнд металлын агууламж	Түлш, тосолгооны материал болон химийн бодис, хог хаягдлаар хөрс бохирдох	Бүрэн хэрэгжсэн	Хөрсний хүнд металлын дээжийг 2024 оны 10 сарын 10 өдөр төслийн талбайгаас 6 цэгт хөрсний зүсэлт хийж дээж авч “Инженер геодези” ХХК-ийн хөрс судлалын итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлсэн.	

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

[illegible]

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

[illegible]

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

					
--	--	--	--	--	--

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

					
Усны хяналт шинжилгээ					
4	Усны чанар рН, ууссан нийт давс (жингийн аргаар), усны ерөнхий болон хүнд металлын шинжилгээ	Төслийн талбай орчим	Бүрэн хэрэгжсэн	Уурхайн ажилчдын унд ахуйн усны шинжилгээг 2024 оны 10 сарын 10-ний өдөр авч Шинжлэх ухааны академи Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн Усны шинжилгээний лабораторид шинжлүүлсэн.	 
4	Усны түвшин усны ундарга нөөц	Ус ашиглалтаас, зарцуулалтаас газар доорх усны горим өөрчлөгдөх			

Усны химийн шинжилгээний тодорхойлолт

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН
УСНЫ ШИНЖЛЭГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Сориг авсан: 2024 оны 10 сарын 14 өдөр
 Шинжилгээ хийсэн: 2024 оны 10 сарын 15 өдөр
 Сориг авсан газрын нэр: Дундговь аймат, Өлзийт сум, 4-р баг
 Барактатой хайдуур жонны орд
 Сориг шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Терра виста" ХХК

Солбицол: X= Y= Гүс м
 Ундарга: n/сек

Уст цэгийн төрөл ба дугаар: Худал: Тодорхойлсон нь:

Анион	1дм³-д байгаа			Катион	1дм³-д байгаа		
	мг	мг-экв	мг-экв%		мг	мг-экв	мг-экв%
Cl⁻	91.6	2.58	26.1	Na⁺+K⁺	191.8	8.34	84.3
SO₄²⁻	75.0	1.56	15.8	Ca²⁺	16.8	0.84	8.5
NO₃⁻	1.00	0.02	0.2	Mg²⁺	8.6	0.71	7.2
NO₂⁻	14.0	0.23	2.3	NH₄⁺	0.0	0.00	0.0
CO₃²⁻	0.0	0.00	0.0	Fe³⁺	0.0	0.00	0.0
HCO₃⁻	335.5	5.50	55.6	Fe²⁺	0.0	0.00	0.0
Дүн	517.1	9.89	100.0	Дүн	217.3	9.89	100.0

НCO₃⁻ ийн хатгасыг хассан анион катионуудын
 нийлбэр: 566.6 мг/дм³ Анион катионуудын
 нийлбэр: 734.4 мг/дм³

Ерөнхий катуулаг: 1.55 мг-экв/дм³ ЕС: 998 µS/cm
 pH: 7.66 TDS: 549 ppm

Исэлдэх чанар: 12.32 мг/дм³
 Физик шинж чанар

Тунгалаг: 28 см Үнэр: үгүй Тунгас: үгүй
 Өнгө: саарал Амт: ... Булгаршилт: 3.92 NTU

HCO₃, 56 Cl 26 SO₄ 16
 Na⁺+K⁺84

Дүгнэлт

Химийн бүрэлдэхүүнээр нь гидркарбонатын агтуйн, натрийн бүтэцтэй, 1-р төрлийн, чанарын хувьд
 шинжлүүл, жонны ус байна. Шинжилсэн жонны усныг ургууллагуулахаар илэрхийн нон нь "Жонны
 ус", эртүүр хувиар ашиглах, чанар, аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүд 100000/2018" стандартад нэгдсэн
 эхлүүлнэртэй дэлгэж хэмжээнд нон дундажтай нийцсэн чанар нь стандартад нийцсэн хэмжээнд
 нх байна.

Мэс: Энэ үрэг үрэгт өргөгдсөн өвсө үрэг жонны шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн хайрдуур хувиар нийцсэн байна.

Гүйцэтгэсэн: Химич, ЭСДДА: Б. Урангол
 Шинжилгээ: Хинаж баталгаажуулсан: Лабораторийн эрхлэгч: Д. Гэрэл-Од

ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН

2024 оны БОМТ-ний орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгагдсан хөрсний агрохимийн шинжилгээ, хөрсний хүнд металлын шинжилгээ, хөрсний эрүүл ахуйн шинжилгээ, усны ерөнхий химийн шинжилгээний үр дүнгүүдийг тус бүрт нь харуулав.

Хүснэгт 9. Хөрсний хүнд металлын шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн см	Хүнд металл мг/кг					
				Cd /Кадми/	Cr /Хром/	Ni /Никель/	Pb /Хар тугалга/	Zn /Цайр/	Cu /Зэс/
1	24/5551	Дээж-1	0-20	ND	163.79	83.23	14.81	49.36	14.34
2	24/5552	Дээж-2	0-20	ND	12.35	15.52	8.35	52.50	7.35
3	24/5553	Дээж-3	0-20	ND	36.86	39.23	24.80	41.43	10.08
4	24/5554	Дээж-4	0-20	ND	12.74	13.94	11.05	49.50	6.40
5	24/5555	Дээж-5	0-20	ND	3.69	10.49	14.0	51.36	6.01
6	24/5556	Дээж-6	0-20	ND	75.07	48.02	15.83	52.70	8.54
Хүлцэх агууламж /MNS 5850:2019/				3	150	150	100	300	100
Хортой агууламж /MNS 5850:2019/				10	400	1000	500	600	500
Аюултай агууламж /MNS 5850:2019/				20	1500	1800	1200	1000	1000

Хөрсний дээжин дэх хүнд элементүүдийг тодорхойлсон шинжилгээг Монгол улсын стандарт (MNS 5850:2019)-ын хүлцэх агууламжийн хэмжээтэй харьцуулахад хөрсний зүсэлт хийсэн I-р цэгт хромын агууламж хүлцэх агууламжаас давсан бохирдолттой байна. Хөрсний зүсэлт хийгдсэн бусад цэгүүд дэх хүнд металлын шинжилгээний дүн (MNS 5850:2019)-ын хүлцэх агууламж, хортой болон аюултай агууламжаас хэтрээгүй байна. Цаашдын үйл ажиллагааны явцад хөрсний эвдрэл, доройтол, бохирдлыг хянаж байх зорилгоор дээрх мониторингийн цэгээс хөрсний дээж авч шинжилгээ хийлгэж шинжилгээний дүнг манай улсад мөрдөгдөж буй стандарт “Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” (MNS 5850:2019)-ын хүлцэх агууламж, хортой болон аюултай агууламжтай харьцуулан дүгнэлт гаргаж байх шаардлагатай.

Хүснэгт 10. Хөрсний эрүүл ахуйн шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Нянгийн тоо MNS6341:2012	Гэдэсний савханцарын таныц		Перфингенсийн таныц	
			Шинжилгээний хариу	Шинжилгээний хариу	Бохирдлын зэрэг	Шинжилгээний хариу	Бохирдлын зэрэг
1	24/5551	Дээж-1	1.6*10 ⁵	≥0.1	Илрээгүй	≥0.1	Илрээгүй
2	24/5552	Дээж-2	1.3*10 ⁵	≥0.1	Илрээгүй	≥0.1	Илрээгүй
3	24/5553	Дээж-3	2.6*10 ⁵	≥0.1	Илрээгүй	≥0.1	Илрээгүй
4	24/5554	Дээж-4	0.8*10 ⁵	≥0.1	Илрээгүй	≥0.1	Илрээгүй
5	24/5555	Дээж-5	2.3*10 ⁵	≥0.1	Илрээгүй	≥0.1	Илрээгүй
6	24/5556	Дээж-6	12.3*10 ⁵	≥0.1	Илрээгүй	≥0.1	Илрээгүй

Хөрсний эрүүл ахуйн задлан шинжилгээний дүнг хүн амьтны эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийн байдлыг нь шинжлэх зорилгоор хийдэг. Эрүүл ахуйн шинжилгээгээр нянгийн тоо, гэдэсний савханцарын таныц, перфингенсийн таныц зэргийг хэмждэг. Хөрсний эрүүлзүй, хот суурин газрын хөрсний ариун цэврийн үзүүлэлтийн норм, хэмжээ (MNS6341:2012) стандартад зааснаар нийт нянгийн тоо 10⁵ хэтрэхгүй, өвчин үүсгэгч нян илрэхгүй байх ёстой. Лабораторийн задлан шинжилгээний дүнгээс үзэхэд төслийн талбайн хүрээнд хөрсний өнгөн хэсгийн нийт нянгийн тоо хөрсний зүсэлт хийсэн IV-р цэгт стандарт хязгаарт, хөрсний зүсэлт хийгдсэн бусад цэгт стандарт хязгаараас давсан бохирдолттой байна. Гэдэсний савханцарын таныц болон перфингенсийн таныц илрээгүй байна.

Хүснэгт 11. Хөрсний агрохимийн шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Дээж авсан гүн, см	Ялзмаг,%	pH	ЦДЧ, dsm	Давс, %	CaCO ₂ %	Шингээгдсэн сууриуд, мг- экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/100 гр	
									Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	24/5551	Дээж-1	0-20	0.18	8.79	0.09	0.04	0.16	5.9	4.7	1.1	30
2	24/5552	Дээж-2	0-20	0.37	8.61	0.055	0.02	0.16	4.7	5.8	1.8	28
3	24/5553	Дээж-3	0-20	0.43	8.54	0.623	0.31	0.32	5.9	2.7	1.5	19
4	24/5554	Дээж-4	0-20	0.15	8.82	0.103	0.05	0.32	5.2	4.8	0.7	23
5	24/5555	Дээж-5	0-20	0.19	8.65	0.088	0.04	0.32	7.8	6.0	1.1	27
6	24/5556	Дээж-6	0-20	0.52	8.82	0.102	0.05	0.32	6.7	4.8	1.6	14

Хөрсний урвалын орчин (pH) нь шинжилгээний дүнгээр дунд шүтлэг урвалын орчинтой. Хөрсөн дэх нийт хялбар уусах давсжилт буюу хөрсний цахилгаан дамжуулах чадвар (EC) нь 0.055-0.623 dS/m, хуурай үлдэгдэл 0.02-0.31% байгаа нь давсжилтгүй хөрсний ангилалд хамаарна. Хөрсний үржил шимийн үзүүлэлт болох хөдөлгөөнт фосфорын агууламж хөрсний зүсэлт хийгдсэн I, IV, V-р цэгт бага, хөрсний зүсэлт хийгдсэн II, III, VI-р цэгт дунд агууламжтай. Калийн агууламж хөрсний зүсэлт хийгдсэн III, VI-р цэгт бага, хөрсний зүсэлт хийгдсэн I, II, IV, V-р цэгт дунд агууламжтай. Шингээгдсэн сууриудын нийлбэр 15.6-31.1 мг-экв буюу дундаж агууламжтай. Ялзмагийн бодис буюу органик бодисын агууламж 0.15-0.52% байгаа нь ялзмагийн агууламжаар бага агууламжтай байна.

Хүснэгт 12. Хөрсний механик бүрэлдэхүүний шинжилгээний дүн

№	Лаб №	Дээжний нэр	Дээж авсан гүн, см	Жижиг хэсгийн эзлэх хэмжээ мм,хувиар						
				Элс		Тоос				Шавар
				(2-0.05 мм)		(0.05-0.002 мм)				(<0.002мм)
				1-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01
1	24/5551	Дээж-1	0-20	20.7	62.0	6.8	4.2	4.2	2.2	10.5
2	24/5552	Дээж-2	0-20	20.7	62.0	6.8	4.2	4.2	2.2	10.5
3	24/5553	Дээж-3	0-20	19.8	59.6	8.1	3.8	7.4	1.4	12.6
4	24/5554	Дээж-4	0-20	22.5	66.5	2.1	1.3	3.8	3.8	8.8
5	24/5555	Дээж-5	0-20	17.7	69.4	3.7	2.8	5.0	1.5	9.2
6	24/5556	Дээж-6	0-20	27.3	54.3	5.6	3.3	6.7	2.9	12.8

Хөрсний дээжийг механик ширхэгийн хэмжээ мм-ээр тодорхойлоход 1-0.25 мм ширхэгтэй хөрс 17.7-27.3%, 0.25-0.05 мм ширхэгтэй хөрс 54.3-69.4%, 0.05-0.01 мм ширхэгтэй хөрс 2.1-8.1%, 0.01-0.005 мм ширхэгтэй хөрс 1.3-4.2%, 0.005-0.001 мм ширхэгтэй хөрс 3.8-7.4%, 0.001 ширхэгтэй хөрс 1.4-3.8%, 0.01 ширхэгтэй хөрс 8.8-12.8% байна. Үүнээс хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох Н.А.Качинскийн ангиллаар 0.01 мм ширхэгийн хэмжээ физик шаврын эзлэх хувиар тус ашигт малтмал ашиглалтын талбайд элсэнцэр механик бүрэлдэхүүнтэй хөрс тархана.

Хүснэгт 13. Усны химийн шинжилгээний дүн

Анион	1 дм ³ –д байгаа			Катион	1 дм ³ –д байгаа		
	мг/л	мг-экв/л	мг-экв%		мг/л	мг-экв/л	мг-экв%
Cl ⁻	91.6	2.58	26.1	Na ⁺ +K ⁺	191.8	8.34	84.3
SO ₄ ⁻	75.0	1.56	15.8	Ca ⁺⁺	16.8	0.84	8.5
NO ₂ ⁻	1.00	0.02	0.2	Mg ⁺⁺	8.6	0.71	7.2
NO ₃ ⁻	14.0	0.23	2.3	NH ₄ ⁺	0.0	0.00	0.0
CO ₃ ⁻	0.0	0.00	0.0	Fe ⁺⁺	0.0	0.00	0.0
HCO ₃ ⁻	335.5	5.50	55.6	Fe ⁺⁺⁺	0.0	0.00	0.0
Дүн	517.1	9.89	100.0	Дүн	217.3	9.89	100.0

Шинжилгээний дүнгээр усны чанар, төлөв байдлын хувьд үнэргүй, тунадасгүй, тунгалаг 28 см, өнгө саарал, булингаршил 3.92 NTU байна. Анион катионуудын нийлбэр: 734.4 мг/дм³, HCO₃⁻-ийн хагасыг хассан анион, катионуудын нийлбэр: 566.6 мг/дм³ хэмжээтэй байна. Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын ангийн, натрийн бүлгийн, 1-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэгдүү, зөөлөн ус байна. Шинжилсэн химийн үндсэн үзүүлэлтүүдээс нитритийн ион нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS0900:2018” стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд мөн перманганатын исэлдэх чанар нь стандартад заасан хэмжээнээс их байна.

13. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 14. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хэрэгжилт	Тайлбар	Гүйцэтгэл
1	Байгаль орчны удирдлага зохион байгуулалтын арга хэлбэрийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх чиглэлээр үүрэг хариуцлагын дотоод журам тогтоож мөрдөх шинэчлэн засварлах	Бүрэн хэрэгжсэн	Байгаль орчныг хамгаалах сургалтыг ажиллагсдад зохион байгуулж, үйл ажиллагааны дотоод дүрэм журмыг ажиллагсдад дагаж мөрдүүлэн ажилласан.	
2	Байгаль орчныг хамгаалах, осол аваар, гал түймэр, усны аюул мэтийн гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, осол гарсан тохиолдолд шуурхай хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах талаар жилд 2 удаа сургалт, судалгааны ажлыг мэргэжлийн байгууллага хүмүүстэй хамтран зохион байгуулах	Бүрэн хэрэгжсэн	Гэнэтийн осол эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, осол эрсдэл гарсан үед авах арга хэмжээ, байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан.	
3	Байгаль хамгаалах талаар хийсэн ажлын жил бүрийн тайланг БОАЖЯ-т хүргэн өгч байх	Бүрэн хэрэгжсэн	2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг хүргүүлж байна.	

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

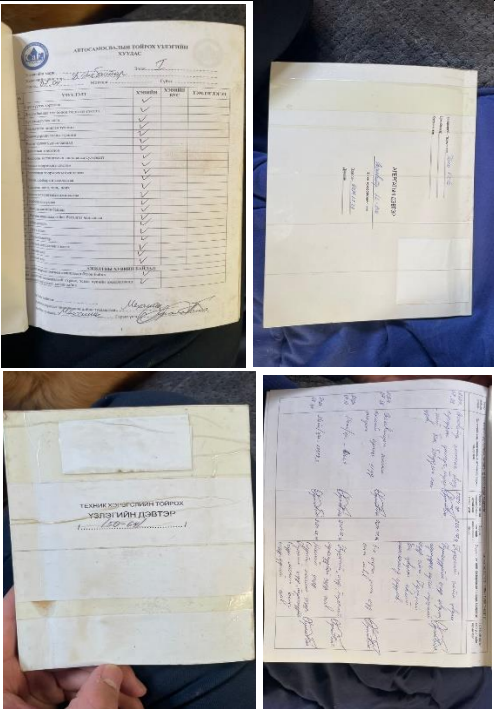
4	Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийлгэх	Бүрэн хэрэгжсэн	Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны тайланг “Теем смайл” ХХК газрын мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлэн, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.	ГАЗАР ЭХЛЭХН БАЙГУУЛАГЧ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ, ТУВИН ЕРӨНХЛЭЙ ГАЗАР ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ Дугаар: 2024/095 Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн холбоотой хэсгээр тус тус үндэслэн “Теем смайл” ХХК (6052356)-о “Газар эхлэхн байгуулалтын үйл ажиллагаа явуулах” мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох” тусгай зөвшөөрлийг 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөрөөс 5 жилийн хугацаатай олгож. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ нь гэрээний хамт хүчинтэй. ДАРГА  А.ЭНХМАНЛАЙ Улаанбаатар хот 2024 он ДУНДГОВЬ (48) АЙМАГ, ӨЛЗИЙТ (28) СУМЫН 4-Р БАГИЙН НУТАГТ БАЙРЛАХ “ТЕРРА ВИСТА” ХХК-ИЙН MV-022056 ТООТ АШИГТ МАЛТМАЛ АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТӨЙ “ШАРАНГАТАЙ” ХАЙЛУУР ЖОНШНЫ ОРДЫН ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ ЧАНАРЫН ЗАХИАЛГАТ ХИЯНАН БАТАЛГАА Гүйцэтгэгч: “Теем смайл” ХХК Судалгааны ажил оролцсон шинжээчид: “Теем смайл” ХХК-ийн захирал Газар эхлэхн байгууллагч Харс: судлаач Энхлөгч Ургамал судлаач  Э.Солонго О.Азана А.Сүмбэрж Б.Батцэцэг Н.Энхтүл Улаанбаатар 2024 он
---	---	-----------------	--	--

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

5	Байгаль хамгаалахад сум багийн холбогдох ажилтнуудын оролцоог идэвхижүүлэх, уулзалт зөвлөгөөг жил бүр зохион байгуулах, тэдний санал зөвлөмжийг БОМТ-нд тусгах	Бүрэн хэрэгжсэн	Сум багийн холбогдох ажилтнуудын санал зөвлөмжийг авч ажилласан.
6	Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөл сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө	Бүрэн хэрэгжсэн	ХАБЭА-н сайжруулах арга чиглэлээр ажиллагсдад хяналт тавьж ажилласан.
7	Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах сургалт зохион байгуулах, галын аюулгүй ажиллагааны талаар дүүргийн ГТТХХэлтэстэй хамтран галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзүүлэх сургууль хийх	Бүрэн хэрэгжсэн	Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах сургалтыг нийт ажилчдад зохион байгуулсан.
8	ХАБЭА дүрмийн дагуу үзлэг, шалгалтыг тогтмолжуулж илэрсэн зөрчлийг тухай бүр арилгах ажлыг зохион байгуулах	Бүрэн хэрэгжсэн	ХАБЭА дүрмийн дагуу үзлэг, шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн.



Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт байрлах “Терра виста” ХХК-ийн MV-022056 тоот ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Шарангатай” хайлуур жоншны ордын 2024 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайлан

				
9	Ажилчдыг шаардлагатай хувцас, тусгай хамгаалах, амны хаалт, малгай зэргээр хангах	Бүрэн хэрэгжсэн	Төслийн ажлын үеүдэд шаардлагатай хувцас, тусгай хамгаалах, амны хаалт, малгай зэргээр хангаж ажилласан.	

14. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 15. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт

№	БОМТ, БОМТ-ийн хэрэгжилтийг тайлагнахад оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээний агуулга	Тайлбар
1	БОМТ-ний биелэлтийн үр дүнгийн тайланг төсөл хэрэгжиж буй Дундговь аймгийн Өлзийт сумын иргэдэд танилцуулж хэлэлцүүлнэ.	БОМТ-ний биелэлтийн тайлан боловсруулж сумдын засаг захиргаанд хүргүүлнэ.	БОМТ-ний биелэлт	2024 оны БОМТ-ийн биелэлтийн тайланг боловсруулж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10 сарын 29-ний өдрийн А/618 тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу 11 дүгээр сарын 01-ний дотор хүлээлгэн өгч ажиллаж байна.
2		Нутгийн оршин суугчдад БОМТ-ний биелэлтийг тайлагнах		
