



**БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭТ ОНГИ-У ТАЛБАЙ**

**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН НУТАГТ ГАЗРЫН  
ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ВЕЛОСИРАПТОР-1 ЦООНОГИЙН ӨРӨМДЛӨГ**

**2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ**

**БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

**/ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: 736/**

**/АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН РЕГЕСТРИЙН ДУГААР: 5077982/**

Хянасан:

Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн:

.....Б.Болдбаатар

Биелэлтийг тайлагнасан:

Капкорп Монголиа ХХК-ийн ХАБЭАБО-ны хэлтсийн дарга:

.....Гэйри Нийл

Капкорп Монголиа ХХК-ийн ХАБЭАБО-ны хэлтсийн байгаль орчны  
мэргэжилтэн:.....

.....Д.Буянзул



**БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭТ ОНГИ-V ТАЛБАЙ**  
**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН НУТАГТ ГАЗРЫН**  
**ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ВЕЛОСИРАПТОР-1 ЦООНОГИЙН ӨРӨМДЛӨГ**

2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

/ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: 736/

/АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН РЕГЕСТРИЙН ДУГААР: 5077982/

Хянасан:

Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн:  
.....Б.Болдбаатар

Биелэлтийг тайлагнасан:

Капкорп Монголиа ХХК-ийн ХАБЭАБО-ны хэлтсийн дарга:  
.....Гэйри Нийл

Капкорп Монголиа ХХК-ийн ХАБЭАБО-ны хэлтсийн байгаль орчны  
мэргэжилтэн:..... Д.Буянзул



## Агуулга

1. 2023 ОНЫ ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА .....	3
1.1. Төслийн товч танилцуулга .....	4
1.2. Гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын товч танилцуулга .....	5
1.3. Өрөмдлөгийн талбайн бэлтгэл ажил .....	9
2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	16
3. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ .....	24
4. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ .....	30
5. ОСОЛ ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ .....	32
6. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ .....	40
7. ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ..	47
8. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР .....	52
9. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ .....	53
10. БОМТ -НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨХ ОРШИН СУУГЧИД, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ .....	55
11. 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардлын хураангуй .....	61
Дүгнэлт.....	62

## Тайлангийн зургийн жагсаалт

Зураг 1. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт Онги-V талбайн байршлын зураг .....	4
Зураг 2. Онги-V талбайн засаг захиргааны зураг.....	5
Зураг 3. Тээврийн хэрэгслийн нүүдлийн үед хатуу хучилттай замаас шороон зам руу салах хэсгээс машин тус бүрийг тосч талбай хүртэл дагуулан явсан.....	7
Зураг 4. Нүүдлийн үед тээврийн хэрэгслүүдийг дагуулан явсан байдал .....	8
Зураг 5. Өрөмдлөгийн талбайн ерөнхий төлөвлөлт.....	9
Зураг 6. Өрөмдлөгийн талбайн бэлтгэл ажил эхлэхээс өмнөх өрөмдлөгийн талбайн ерөнхий харагдах байдал .....	10
Зураг 7. Өрөмдлөгийн талбайгаас 44 загийг нүүлгэн шилжүүлсэн .....	10
Зураг 8. Өрөмдлөгийн талбай дээр шингэн хаягдлын сан байгуулахаар хэмжилт хийж буй байдал .....	11
Зураг 9. Өрөмдлөгийн талбай болон кемпийн харагдах байдал (2023.7 сар).....	11
Зураг 10. Өрөмдлөгийн талбайн харагдах байдал (2023.7 сар) .....	12
Зураг 11. Кемпийн төлөвлөлт.....	13
Зураг 12. Кемпийн талбай дээрх зураг .....	13
Зураг 13. Талбай дээрх кемпийн харагдах байдал .....	14
Зураг 14. Техникийн усан хангамжийн худгийн тоолууржуулалт ба баталгаажуулалт .....	15



Зураг 15. Усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээ ..... 15

### Тайлангийн хавсралтын жагсаалт

Хавсралт 1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ .....	68
Хавсралт 2. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл .....	69
Хавсралт 3. Газар ашиглах зөвшөөрөл.....	70
Хавсралт 4. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газрын хилийн заагтай давхцалгүй болох тухай лавлагаа.....	71
Хавсралт 5. Байгаль орчны барьцаа хөрөнгө байршуулсан тооцооны үлдэгдлийн баталгаа .....	73
Хавсралт 6. Ус ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлт.....	74
Хавсралт 7. Ус ашиглуулах дүгнэлт .....	77
Хавсралт 8. Ус ашиглах зөвшөөрөл, гэрээ .....	80
Хавсралт 9. Гучин-Ус сумын засаг даргын худаг ашиглах зөвшөөрөл .....	85
Хавсралт 10. Худгийн паспорт .....	86
Хавсралт 11. Өрөмдлөг, ахуйн хэрэглээнд худгаас авч ашигласан усны бүртгэл .....	88
Хавсралт 12. Ус ашигласны төлбөрийн баримт .....	89
Хавсралт 13. Кемпийн ахуйн хог хаягдлыг зохицуулах гэрээ.....	90
Хавсралт 14. Ахуйн хог хаягдлын зөөвөрлөсөн бүртгэл .....	92
Хавсралт 15. Ахуйн хог хаягдлын төлбөр төлсөн баримт.....	93
Хавсралт 16. Ахуйн бохир ус нийлүүлэх гэрээ (кемпийн үйлчилгээний гэрээт Геомин ХХК).....	94
Хавсралт 17. Ахуйн бохир ус зөөвөрлөж нийлүүлсэн бүртгэл (кемпийн үйлчилгээний гэрээт Геомин ХХК) .....	97
Хавсралт 18. Велосираптор -1 цооногийн өрөмдлөгийн ажлын үед дагаж мөрдсөн “Нэг замын бодлого” .....	98
Хавсралт 19. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт.....	101
Хавсралт 20. Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК-ний ВР-1 цооногийн үед хэрэгжүүлж ажиллах БОМТ .....	102
Хавсралт 21. Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК-ний Химийн бодисын ашиглах тусгай зөвшөөрөл.....	103
Хавсралт 22. Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК-ний Аюултай хог хаягдал шилжүүлэх гэрээ .....	106
Хавсралт 23. Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК-ний Аюултай хог хаягдлыг шилжүүлсэн дагалдах бичиг .....	109
Хавсралт 24. Өрөмдлөгийн гэрээт компанийн ажилчдын химийн бодистой харьцаж ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны сургалтын сертификат.....	110
Хавсралт 25. Агаарын түр зурвас тогтоосон акт.....	112
Хавсралт 26. Баруунбаян-Улаан сумын засаг даргын тодорхойлолт .....	114
Хавсралт 27. Гучин-Ус сумын засаг даргын тодорхойлолт.....	115
Хавсралт 28. Яаралтай үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө.....	116
Хавсралт 29. Эрүүл мэндийн яаралтай нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө.....	116
Хавсралт 30. Үйл ажиллагааны өмнөх орчны хяналт шинжилгээний ажлын тайлан .....	116
Хавсралт 31. Үйл ажиллагааны үеийн орчны хяналт шинжилгээний ажлын тайлан .....	116
Хавсралт 32. Үйл ажиллагааны дараах үеийн орчны хяналт шинжилгээний ажлын тайлан .....	116
Хавсралт 33. Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан .....	116
Хавсралт 34. Цацраг үүсгүүр ашиглалтын талаарх тайлан.....	116




## 1. 2023 ОНЫ ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

### 1.1. Төслийн товч танилцуулга

“Сентрал Азиан Петролеум Корпорэйшн Лимитед” компани нь 2009 оны 7 дугаар сард Монгол Улсын Засгийн газартай газрын тосны хайгуулын Онги V талбайд “Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ” /БХГ/ байгуулан газрын тосны хайгуул, судалгааны ажлыг 14 дэх жилдээ явуулж байна.

“Капкорп Монголиа” ХХК нь “Сентрал Азиан Петролеум Корпорэйшн Лимитед” компанийн охин компани бөгөөд эх компанийн өмнөөс Монгол дахь үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг. Газрын тосны хайгуулын БХГ-т Онги-V талбай нь Монгол орны баруун урд хэсэгт, Улаанбаатар хотоос баруун урагш 450 орчим километрт орших бөгөөд нийт талбайн хэмжээ 32, 030 км<sup>2</sup> байснаас БХГ-ний 7.1 –ийн а/ заалт болон “Газрын тосны тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх журмын 14.1 заалтуудыг үндэслэн 2011 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдөр хайгуулын үйл ажиллагаа явуулахгүй талбайн хэсгийг буцааж өгснөөр нийт хайгуулын талбай 21, 100 км<sup>2</sup> болсон ба хамгийн сүүлд 2020 онд хайгуулын талбайг хэсэгчлэн буцааснаар шинэчлэгдсэн талбайн хэмжээ нийт 7936,9 км<sup>2</sup> болсон байна. Хайгуулын талбайн байршлыг Зураг 1-д харуулав.

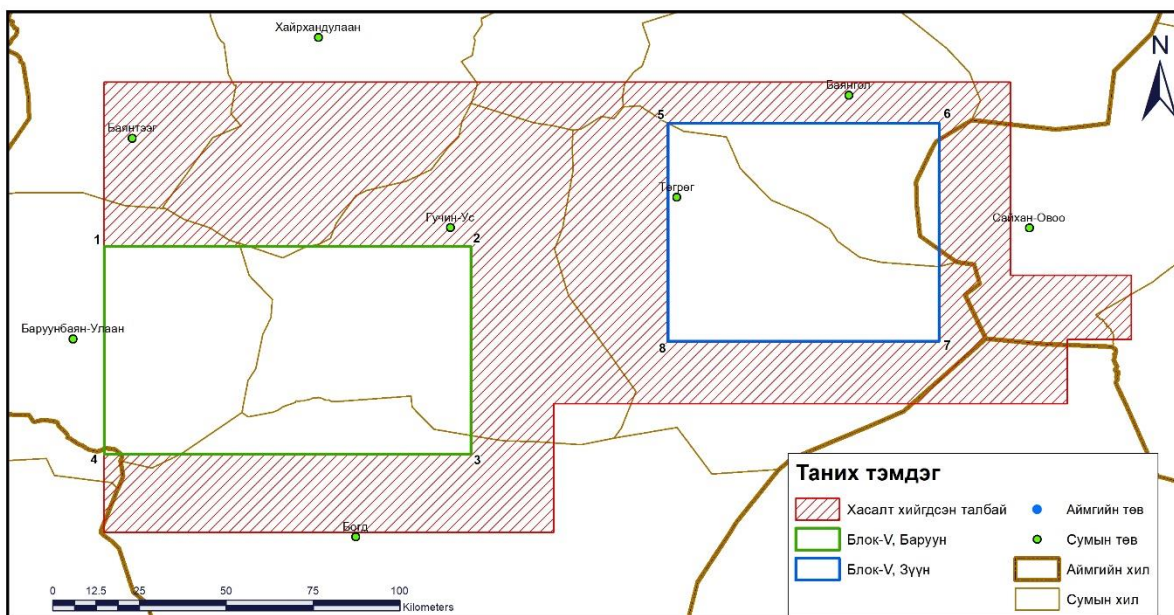


Цэгийн дугаар	Солбицол, WGS 84		Цэгийн дугаар	Солбицол, WGS 84	
	Уртраг	Өргөрөг		Уртраг	Өргөрөг
1	101° 30' 1.775" E	45° 24' 28.800" N	5	102° 57' 48.190" E	45° 43' 35.717" N
2	102° 27' 8.197" E	45° 24' 28.800" N	6	102° 57' 48.190" E	45° 9' 43.200" N
3	102° 27' 8.197" E	44° 52' 12.000" N	7	102° 39' 59.000" E	44° 40' 0.000" N
4	101° 30' 1.775" E	44° 52' 12.000" N	8	102° 39' 59.000" E	45° 0' 0.000" N

Зураг 1. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт Онги-V талбайн байршлын зураг



Онги-V талбай нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Гучин-ус, Богд, Баянгол, Төгрөг, Нарийнтээл, Хайрхандулаан сумдын нутаг дэвсгэр хамрагддаг. Онги-V талбай орших нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны нэгжийг Зураг 1.2-т үзүүлэв.

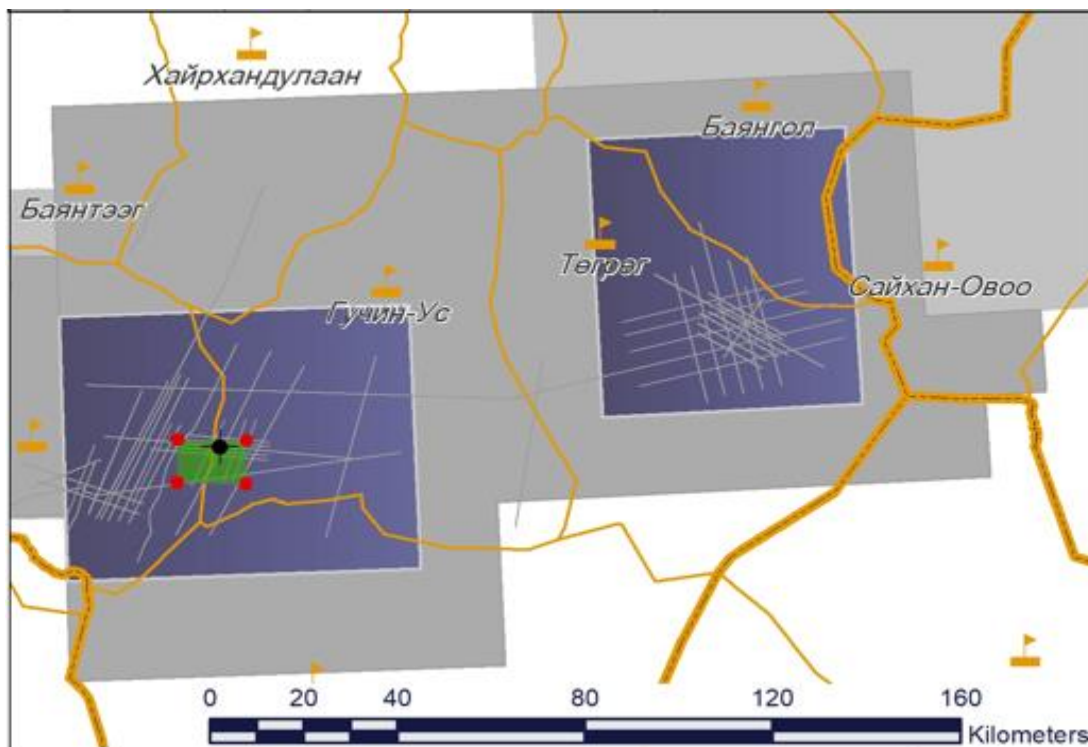

Зураг 2. Онги-V талбайн засаг захиргааны зураг

## 1.2. Гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын товч танилцуулга

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ /БХГ/ -т газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд 2023 онд /гэрээт 14 дэх жил/ газрын тосны хайгуулын ажлын хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Гучин-Ус сумдын нутагт 150 км<sup>2</sup> талбайг хамарсан 3 хэмжээст чичирхийллийн хайгуул судалгааны ажил, болон Баруунбаян-Улаан сумын нутагт хайгуулын тулгуур 2 цооногийг өрөмдөнө. Өрөмдлөгийн үр дүнгээс хамаарч, өөрөөр хэлбэл газрын тостой эсвэл газрын тостой байх шинж тэмдэг илэрвэл тус цооногуудад цооногийн туршилт, шингэн хагалбар зэрэг өрөмдлөгийн дараах ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байсан.

2023 онд төлөвлөсөн хайгуулын ажлын хүрээнд Баруунбаян-Улаан сумын нутагт Велосираптор-1 газрын тосны хайгуулын цооногийн өрөмдлөгийн ажлыг өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч “Мэжор Дриллинг ХХК” нь 2 ээлж, 24 цагаар ажиллаж 2023 оны 6-р сарын 13-аас 7-р сарын 20 хүртэл нийт 37 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ.

Газар ашиглалтыг зохион байгуулахдаа аль болох бага зай, талбай эзлүүлэн зохистой байршуулах, нөгөө талаар байгаль орчинд учрах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байлгах, өрөмдлөгийн талбайн хашаанаас гадагш ямарваа нэг үйл ажиллагаа явуулахгүй байх зэрэг нөхцлийг хангаж ажиллахыг зорьсон. Төслийн бүх үйл ажиллагааг 0.8 га талбайд багтаан явуулсан. Үүнээс өрөмдлөгийн талбай 0,42 га талбайд (70м х 60м хэмжээтэй торон хашаа бүхий) өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж, өрмийн шингэн хаягдлын сан, химийн бодисын агуулах зэрэг бүрэн багтсан. Хээрийн ангийн кемпийг 0,385 га талбайд байгуулсан ба үүнд ахуйн хог хаягдал цуглуулах цэг, бохирын септик байрлуулсан



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

талбайнууд багтсан. Орон нутгийн төв замаас салаалан өрмийн талбайд хүрэх 370 метр шинэ зам гаргасан.



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Нэг замын зааварчилгааг зураглан боловсруулж Гучин-Ус сум, Баруунбаян-Улаан сумын засаг дарга нарт танилцуулан төсөл хэрэгжих хугацаанд энэхүү замаар тээвэр, ложистикыг зохицуулах талаар харилцан зөвшилцөж, нэг замын маршрутыг дагаж мөрдөж байгаад хяналт тавьсан. Үүнд: өрөмдлөгийн ажлын гэрээт гүйцэтгэгч болох Мэжор Дриллинг ХХК-наас тухай бүр тээвэр хийгдэх төлөвлөгөөг гаргуулан авч манай компаний харилцааны хэлтсийн ажилтан, жолооч нар Арвайхээр хотоос 95 км-т хатуу хучилт бүхий замаас шороон зам руу салах хэсгээс том оврын тээврийн хэрэгслийн ачилт хийсэн тээврийн хэрэгсэл бүрийг тосож аван төслийн талбай хүртэл тогтоосон маршрутын дагуу дагуулан явж байсан.



Зураг 3. Тээврийн хэрэгслийн нүүдлийн үед хатуу хучилттай замаас шороон зам руу салах хэсгээс машин тус бүрийг тосч талбай хүртэл дагуулан явсан





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан




Зураг 4. Нүүдлийн үед тээврийн хэрэгслүүдийг дагуулан явсан байдал



### 1.3. Өрөмдлөгийн талбайн бэлтгэл ажил

Өрөмдлөгийн талбайн бэлтгэл ажлыг ажил эхлэхээс өмнө өрөмдлөгийн гэрээт, өрмийн талбайн бэлтгэл ажил гүйцэтгэх гэрээт, кемпийн үйлчилгээний гэрээт компаниудтай мөн Баруунбаян-Улаан сумын байгаль орчны улсын байцаагчийн хамт өрөмдлөгийн тогтоосон цэгт урьдчилан ирж танилцан кемп байгуулах газрыг тухайн газрын газарзүйн байрлал, байгалийн нөхцөл байдалтай уялдуулан сонгож, мөн өрмийн талбайг аль болох газрын гадаргын эвдрэл бага байлгахад анхааран зохион байгуулалтыг хийж харилцан ярилцаж тохиролцсон (Зураг 5).

Өрөмдлөгийн талбайн хувьд зулзаган заг ( $J c n q z \{ n q p " \}$  зонхилон урсган  $1\text{м}^2$  дахь тусгаг бүрхэцэд 1-2 загийн зүйл тохиолдож байсан. Тиймээс өрөмдлөгийн талбайг 60м x 70м хэмжээтэйгээр хамгийн бага хэмжээнд өрөмдлөгийн талбайг бэлтгэж харин кемпийн талбайг заг бүхий байгалийн тогтоц хэсгээс зайдуу өрөмдлөгийн талбайн баруун урд зүгт ойролцоогоор 300м зайд байгуулсан (Зураг 7).

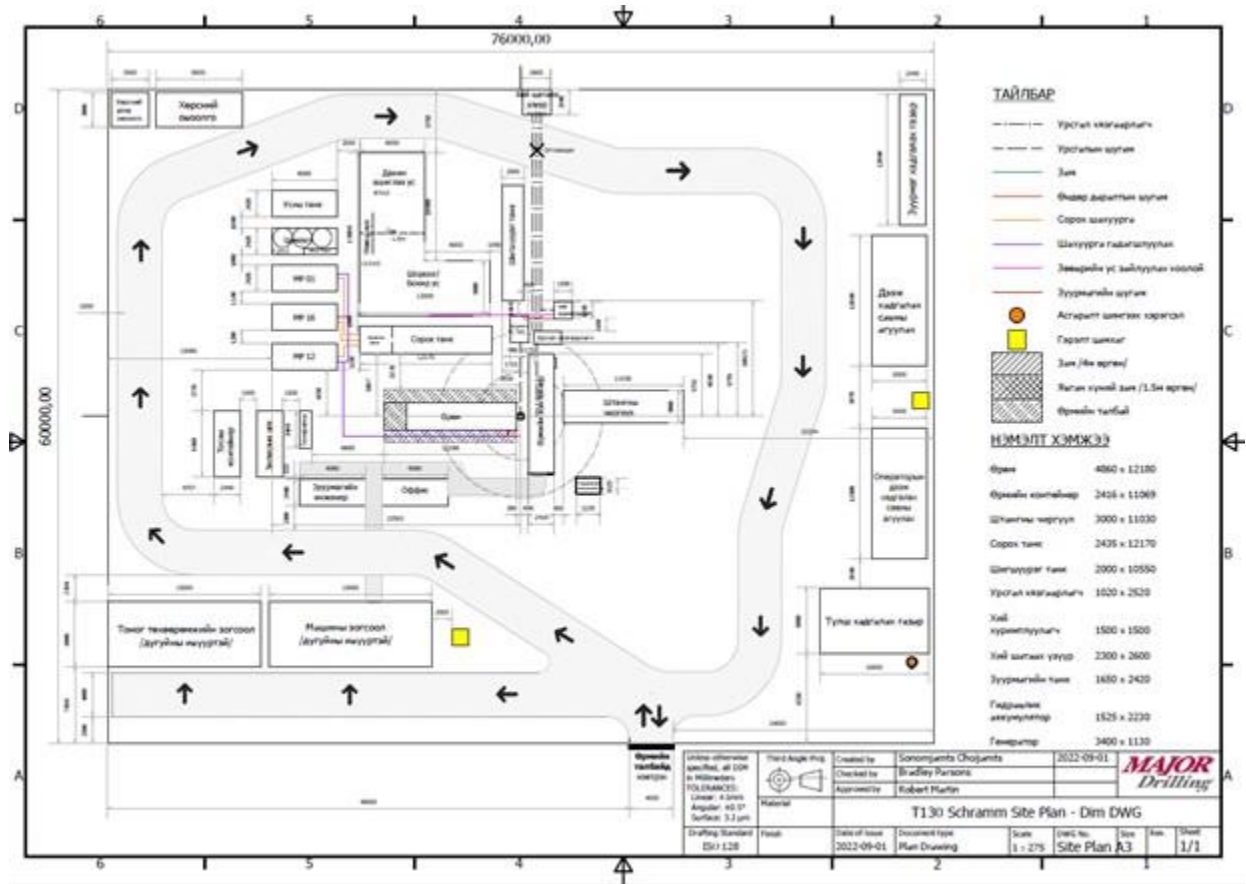


Зураг 5. Өрөмдлөгийн талбайн ерөнхий төлөвлөлт



Зураг 6. Өрөмдлөгийн талбайн бэлтгэл ажил эхлэхээс өмнөх өрөмдлөгийн талбайн ерөнхий харагдах байдал



Зураг 7. Өрөмдлөгийн талбайгаас 44 загийг нүүлгэн шилжүүлсэн

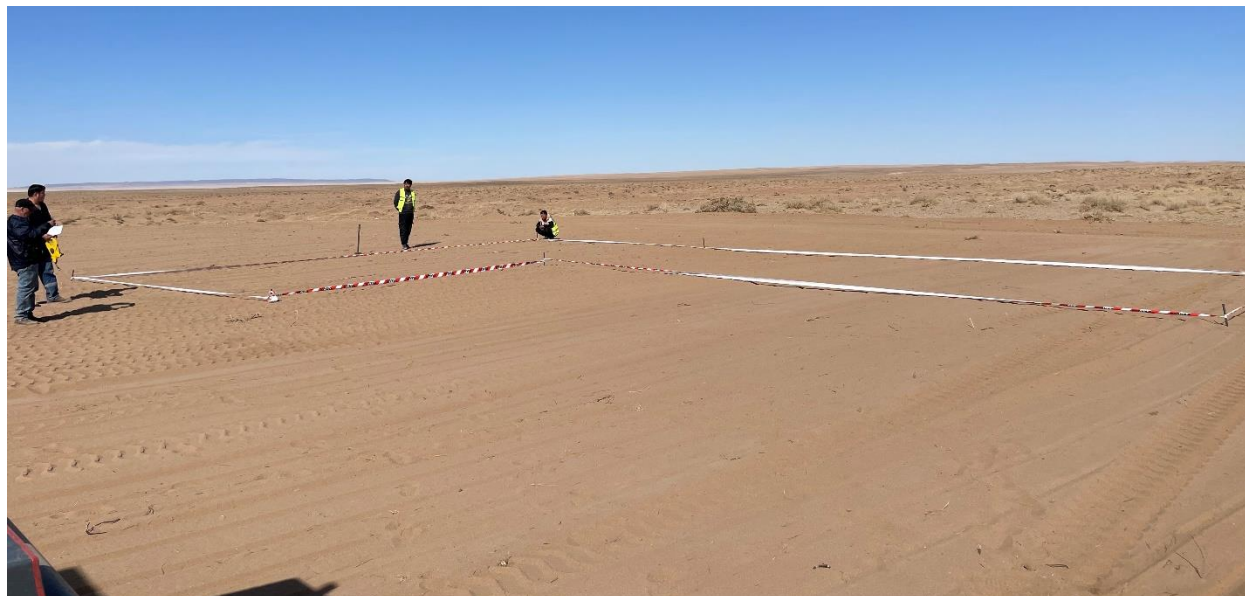

Зураг 8. Өрөмдлөгийн талбай дээр шингэн хаягдлын сан байгуулахаар хэмжилт хийж буй байдал




Зураг 9. Өрөмдлөгийн талбай болон кемпийн харагдах байдал (2023.7 сар)



Зураг 10. Өрөмдлөгийн талбайн харагдах байдал (2023.7 сар)



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

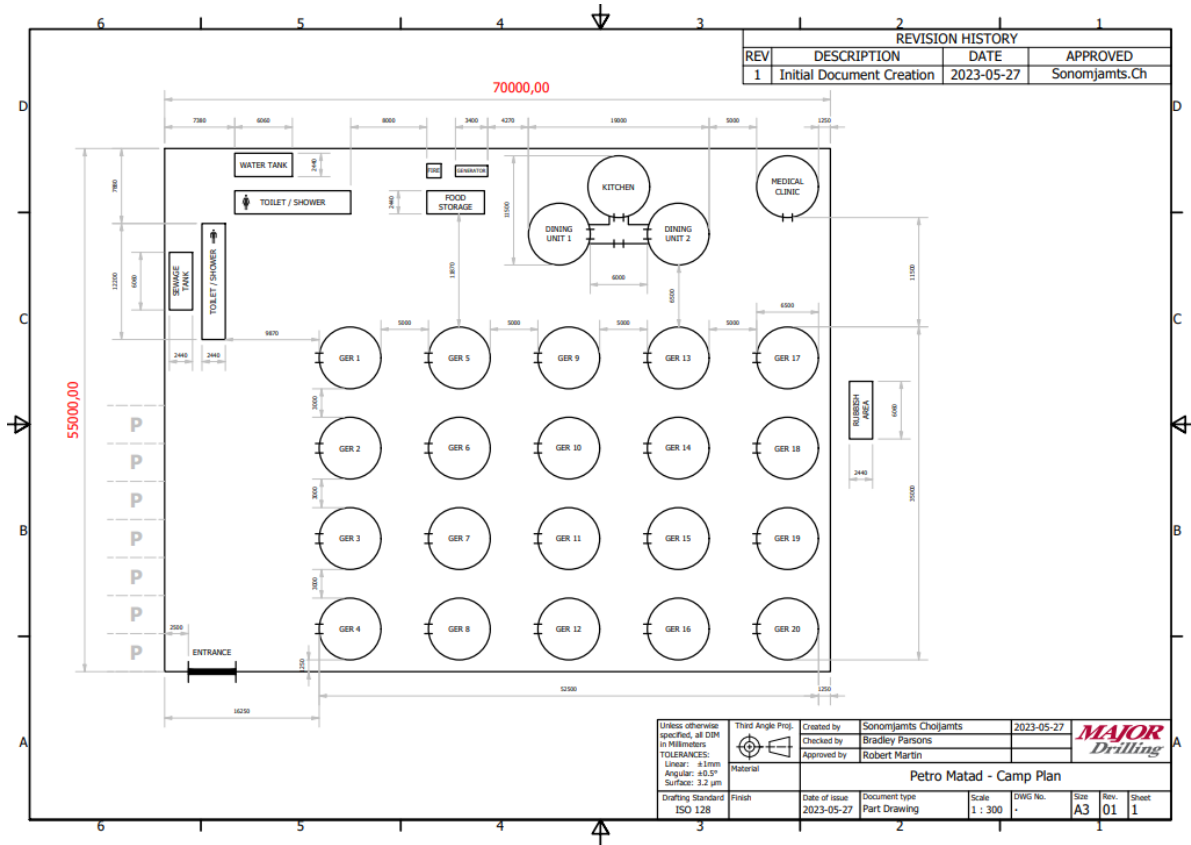

Зураг 11. Кемпийн төлөвлөлт



Зураг 12. Кемпийн талбай дээрх зураг




Зураг 13. Талбай дээрх кемпийн харагдах байдал

**Ус ашиглалт:** Технологийн усны хангамжийг Гучин-Ус сумын нутагт 2018 онд манай компани Эрдэнэдрилинг ХХК-аар гаргуулан орон нутагт гаргаж хүлээлгэн өгсөн худгийг Гучин-Ус сумын Засаг даргаас ашиглах зөвшөөрөл аван ашигласан. Ундны усанд савласан ус зөврөөр ашигласан.

Гучин-Ус сумын байгаль орчны байцаагчийг байлцуулан гүний худагт усны тоолуур суурилуулж (Зураг 14) ашигласан. Өрөмдлөг, ахуйн хэрэгцээнд ашигласан усны хэмжээг өдөр бүр бүртгэж (“Капорп Монголиа” ХХК)-д ирүүлж байв /Хавсралт 11/. Нийт 786м<sup>3</sup> ус ашигласан ба үүнээс 492 тн ус өрөмдлөгт, 294 тн усыг ахуйн хэрэглээнд ашиглаж усны төлбөрт 2,171,673 төгрөг төлсөн (Хавсралт 12).



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

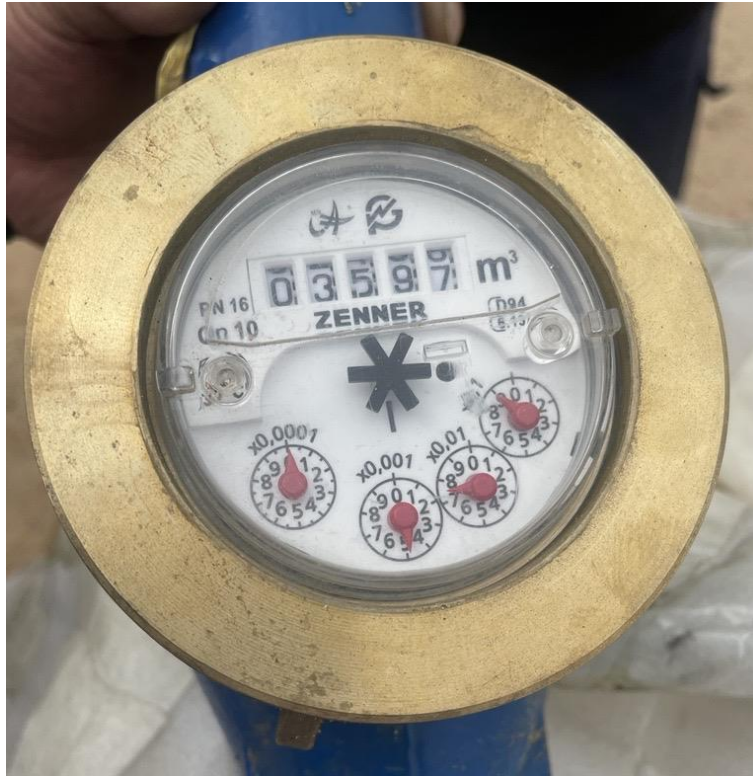

Зураг 14. Техникийн усан хангамжийн худгийн тоолууржуулалт ба баталгаажуулалт

**СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР**  
**MASM**

**УСНЫ ТООЛУУРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ**  
№ ЭУ ...08.1266...

Кафсрт мөн 101 .....-Д  
(хэрэглэгчийн нэр)

ашиглаж байгаа Zenner - 40 (хэрэглэгчийн нэр) загварын 10 ..... М³/ц  
хэмжих хязгаартай, 40 мм-ийн голчтой № 101000135 .....-ын  
халуун, хүйтэн усны тоолуурыг № 015 лацаар битүүмжилж  
(доогуур зураг)

2023 оны 05 -р сарын 18 -ны өдөр хүртэл улсын  
баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгов.

Шалгалтын дараах заалт: 02811 .....М³

Лабораторийн тэмдэг  
2023 оны 05 -р сарын 18 -ны өдөр

Улсын шалгагчийн гарын үсэг, тэмдэг

Зураг 15. Усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээ





## 2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

### Агаарын чанарт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хариуцах эзэн	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Агаар орчин</b>		
Тээврийн хэрэгсэл зорчих нэгдсэн маршрут буюу НЭГ ЗАМЫН БОДЛОГО баримтлах, чанд мөрдүүлэх, тэмдэглэгээ байршуулах	Гэрээт гүйцэтгэгч: “Мон баг” ХХК  Хяналт тавин хамтран ажиллагч: “Капкорп Монголиа” ХХК	<p>Нэг замын маршрутыг гаргаж Гучин-Ус, Баруунбаян-Улаан сумын засаг дарга нарт танилцуулсан. “Нэг замын бодлого маршрут /Хавсралт 18/. Өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмжийг УБ хотоос өрөмдлөгийн талбай руу тээвэрлэх үед тээврийн хэрэгсэлүүдийг Арвайхээр хотоос хатуу хучилттай замаар яван шороон зам руу салах 92 км-тэмдэглэгээнээс манай компаний харилцааны ажилтан, жолооч нар нэг бүрчлэн нэг замын маршрутын дагуу хурдны хязгаартайгаар дагуулан явж өрөмдлөгийн талбайд хүргэж байсан.</p> <div data-bbox="724 618 2053 951"></div>
Хурдны хязгаарлалтын тэмдэглэгээ		Өрөмдлөгийн талбай кемп хоорондох зам дагуу хурдны хязгаарлалтын тэмдэг байрлуулан техникийн хөдөлгөөний улмаас агаар орчинд тоосжилт үүсэх нөхцлийг бууруулах арга хэмжээ авсан.



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

				
<p>Цаг агаар, уур амьсгал, хуурайшилтын нөхцөл байдалтай уялдуулж зам талбайн усалгааг хийж тоосжилт үүсэхийг хязгаарлах</p>	<p>Гэрээт гүйцэтгэгч: “Мэжор дриллинг” ХХК  Хяналт тавин хамтран ажиллагч: “Капкорп Монголиа” ХХК</p>	<p>Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил явагдсан 6-р сарын 10-аас 7-р сарын 20 хүртэлх хугацаанд хур тунадас элбэг үер ус ихтэй байсан тул зам талбайн усалгаа хийх нөхцөл ихээр үүсээгүй. Хэдий тийм ч замын усалгааг шаардлагатай тохиолдолуудад хийж байсан.</p>   		



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг нэгтгэн тайлагнах		Агаар орчны хяналт шинжилгээний ажлыг өрөмдлөгийн талбайд ажил эхлэхээс өмнө 2022 оны 9-р сард болон өрөмдлөгийн ажил явагдаж 2023 оны 7-р сарын 5-нд тус тус мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлсэн (Орчны хяналт шинжилгээний ажлын тайланг энэхүү тайланд хавсаргасан).
--	--	---

**Гадаргын ба газрын доорх усны нөөцөд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт**

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хариуцах эзэн	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Гадаргын болон газрын доорх усан орчин</b>		
Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулан, сумын засаг даргатай ус ашиглах гэрээ байгуулан ажиллах.	“Капкорп Монголиа” ХХК	Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас ус ашиглах дүгнэлт гаргуулан уг дүгнэлтэд үндэслэн Гучин-Ус сумын засаг даргатай ус ашиглах гэрээ байгуулан ажилласан, ус ашиглах дүгнэлт гэрээг Хавсралт 7, 8.
Хөрсөнд ямар нэгэн хаягдал бохир шингэн зүйлс /угаадас, шатах тослох материал, түлш г.м/ ил задгай хаяхгүй байх тал дээр хяналт тавьж ажиллах	<p>Гэрээт гүйцэтгэгч: “Мэжор дриллинг” ХХК</p> <p>Кемпийн гэрээт гүйцэтгэгч Геомин ХХК</p> <p>Хяналт тавин хамтран ажиллагч: “Капкорп Монголиа” ХХК</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>Ахуйн шингэн хаягдал, хар саарал усыг бохирын септик танк байрлуулан тогтмол Хайрхандулаан сумын цэвэрлэх байгууламж руу зөөж байсан. Тиймээс хөрсөнд ахуйн бохироос ямар нэгэн бохирдол төсөл хэрэгжих хугацаанд үүсээгүй. Бохир ус зөөвөрлөлтийн бүртгэлийг Хавсралт 17.</p>



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Усан орчны чанарын хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг нэгтгэн тайлагнах	Гэрээт гүйцэтгэгч: “Мэжор дриллинг” ХХК	Өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа явагдаж байх Орчны хяналт шинжилгээний ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлсэн. Орчны хяналт шинжилгээний ажлын тайланг энэхүү тайланд хавсаргасан.
---	--	---

**Хөрсөн орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт**

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хариуцах эзэн	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Хөрс</b>		
Ил задгай ахуйн хог хаягдал хаяхаас сэргийлэн кемпэд хогийн сав байршуулах	<p>Гэрээт гүйцэтгэгч: “Мэжор дриллинг” ХХК</p> <p>Кемпийн үйлчилгээний гэрээт гүйцэтгэгч: Геомин ХХК</p> <p>Хяналт тавин хамтран ажиллагч: “Капкорп Монголиа” ХХК</p>	<p>Кемпийн талбайд, гал тогоо, шаардлагатай цэгүүдэд хогийн сав байршуулан ил задгай хог хаягдахаас урьдчилан сэргийлсэн.</p> 



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

<p>Өрөмдлөг, хаягдлын сан байгуулах талбайн шимт хөрсийг тусад нь авч хадгалан цооног хаах битүүмжлэх, хаягдлын сангийн нөхөн сэргээлтэд дахин ашиглах зориулалтаар шимт хөрсний овоолго хийнэ</p>	<p>Өрмийн талбайн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэгч Монбаг ХХК,  Хяналт тавьж ажилласан: Мэжор Дриллинг, Капкорп Монголиа</p>	<p>Өрмийн талбайн бэлтгэл ажлын хүрээнд 60x70 харьцаатай талбайд 20 см зузаантай хөрс хуулалтын ажил хийгдсэн. энэхүү шимт хөрсийг өрөмдлөгийн талбайн зүүн урд талд овоолго хийж, стандартын дагуу самбар байршуулан хадгалсан.</p> 
		<p>Өрөмдлөгийн талбайд шатахуун түгээх зориулалтын тээврийн хэрэгслийг зогсоож байрлуулах талбайд хөрсөнд шатах тослох материал асгарахаас урьдчилан сэргийлж геомембран дэвсэж бэлтгэсэн талбайд байрлуулж байсан.</p> 



Кемпийн дизель генераторыг мөн доор нь хөрсөнд бохирдол үүсэхээс сэргийлэн төмөр хаалт хамгаалалт бүхий газар байрлуулсан.






**Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт**

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хариуцах эзэн	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Ургамлан нөмрөг</b>		
Эвдэгдсэн талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг өрөмдлөгийн ажил дууссаны дараа хугацаа алдалгүй хийж гүйцэтгэх	Гэрээт гүйцэтгэгч: “Мэйжор дриллинг” ХХК	Нөхөн сэргээлтийн ажлыг өрөмдлөгийн ажил дууссанаас хойш 1 сарын дараа өрмийн шингэн хаягдлын сан дахь шингэн тодорхой хэмжээгээр уурших нөхцлийг бүрдүүлсний дараа 2023 оны 9-р сард эхлүүлэн хийж гүйцэтгэсэн. Нөхөн сэргээлтийн ажлын тайланг Хавсралт 33-аас үзнэ үү.
	Кемпийн гэрээт гүйцэтгэгч Геомин ХХК  Хяналт тавьж ажилласан: “Капкорп Монголиа” ХХК	Өрөмдлөгийн талбайд заг ихээр ургасан байсан бөгөөд өрөмдлөгийн талбайд өртөж байсан загнуудыг өөр талбайд шилжүүлэн суулгасан. Нийт 44 загийг өөр талбайд шилжүүлэн суулгаж усалгаа хийсэн. Өрөмдлөгийн ажил явагдаж байх 1 сарын хугацаанд өдөр бүр оройн цагаар усалгаа хийж шилжүүлэн суулгасан загийн ургалтыг дэмжсэн. 
Ургамлан бүрхэвчийн мониторингийн судалгаа хийх	Мэргэжлийн байгууллага	Талбайд орчны хяналт шинжилгээний мониторингийн ажлыг 2022 оны 9-р сард, 2023 оны 7-сарын 5-6-нд, 2023 оны 10-р сарын 1-2 нд мэргэжлийн байгууллагаар тус тус хийж гүйцэтгүүлсэн.



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

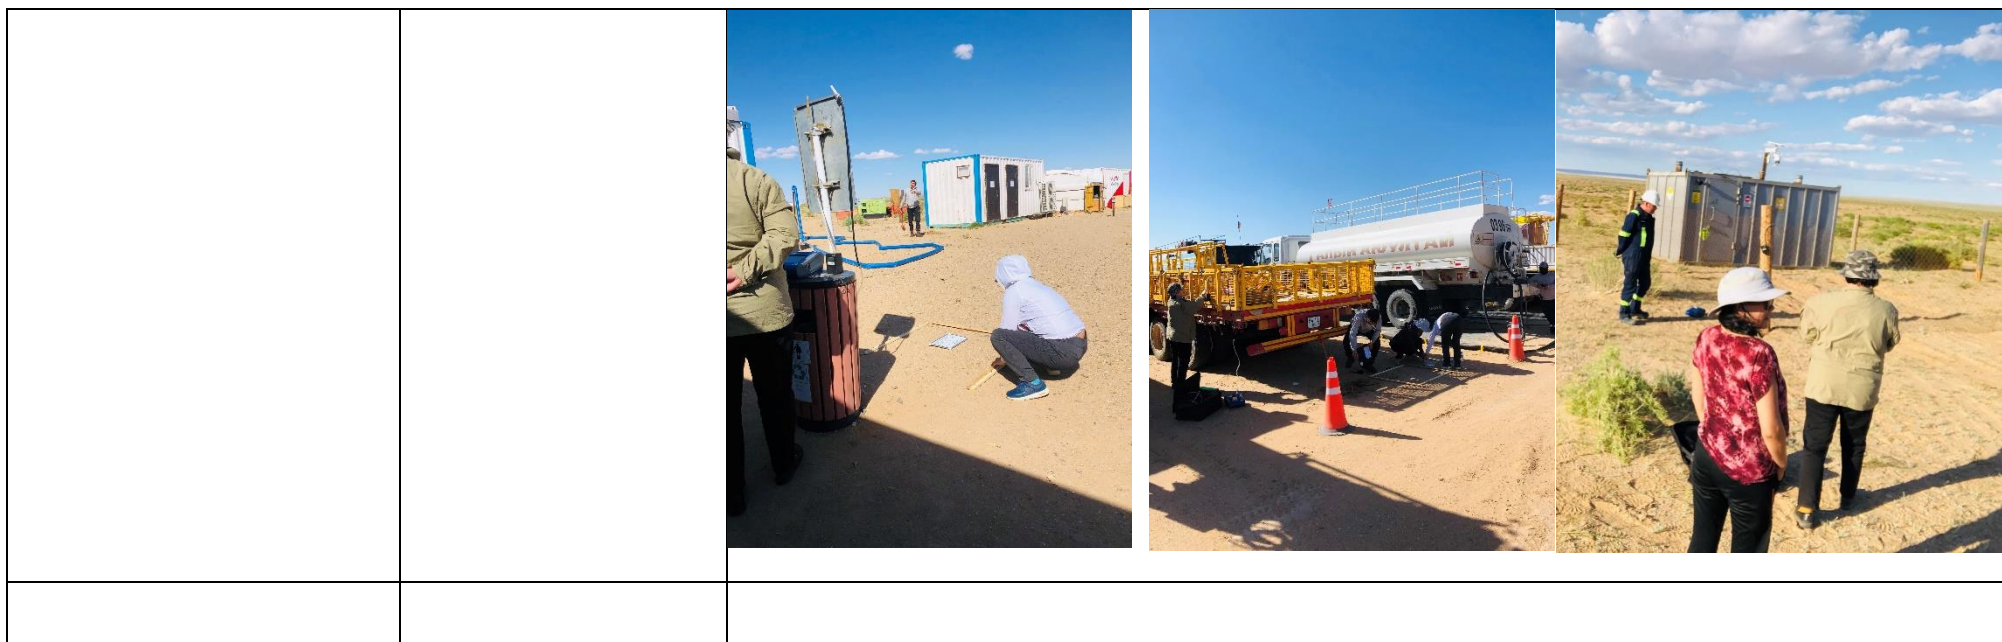

**Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт**

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хариуцах эзэн	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Амьтны аймаг</b>		
Төсөл хэрэгжих талбайн ан амьтдын талаар мэдээлэл судалгааг орчны хяналт шинжилгээний ажлын хүрээнд хийх	Орчны хяналт шинжилгээний ажил мэргэжлийн байгууллага, Капкорп Монголиа ХХК	Төсөл хэрэгжих талбайн орчмын амьтны ажиглалт судалгааны ажлыг өрөмдлөгийн талбайн орчимд ажил эхлэхээс өмнө 2022 оны 9-р сард орчны хяналт шинжилгээний ажлын хүрээнд мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлсэн. Орчны хяналт шинжилгээний ажил нь ВР-1 өрөмдлөгийн ажлын хүрээнд 3 удаагийн давтамжтай хийгдсэн. ОХШ-ний тайланг Хавсралт 30, 31, 32 үзнэ үү. Мөн Капкорп Монголиа ХХК нь 2016 онд газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайн хэмжээнд байгаль орчны хэрийн суурь, сэрэмжлэх байдлын судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлсэн. Энэхүү суурь судалгааны ажлын үр дүн маш сайн байсан тухайн судалгааны ажлын хүрээнд Баруунбаян-Улаан, Гучин-Ус сумын нутаг дахь амьтны аймгийн талаарх судалгааг хийсэн.





### 3. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хариуцах эзэн	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Нөхөн сэргээлтийн ажил</b>		
<p>Өрөмдлөгийн талбайн техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт:</p> <p>Үүнд: өрөмдлөгийн шингэн хаягдлын сан, ахуйн шингэн хаягдлын нүх, тоног төхөөрөмж байрласан талбай, үйл ажиллагааны улмаас талхлагдсан талбай г.м</p> <p><b>Жич:</b> өрөмдлөгийн талбайн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг тухайн цооногт хийгдэх бүх туршилт, судалгаа, шингэн хагалбарын ажлууд хийгдэж дууссаны дараа гүйцэтгэнэ.</p>	<p>Нөхөн сэргээлтийн ажлын гэрээт компани, Капкорп Монголиа ХХК</p>	<p>7-р сарын 20-ны өдөр өрөмдлөгийн ажил дуусаж өрөмдлөгийн талбай дахь тоног төхөөрөмжийг нүүлгэн шилжүүлж, шаардлагатай хэсгүүдэд хөрсний хэлбэржүүлэлт тэгшилгээг хийн өрмийн талбайг хашаатай хэвээр орон нутгаас манаач айл буулган үлдээсэн.</p> <p>Кемпийн талбайг нүүлгэн ойр орчмын хог хаягдлыг түүж цэвэрлэн, бохирын септик танк, шугам хоолойн хэсгүүдийн талбайг тэгшлэх нөхөн дүүргэх ажлуудыг хийж нөхөн сэргээлт хийхэд бэлэн болгож үлдээсэн.</p> <p>Өрөмдлөг, кемпийн талбай дахь нүүдэл хийгдэж дууссаны дараа Баруунбаян-Улаан сумын байгаль орчны улсын байцаагч, сум дундын цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч нар талбай дээр ирж танилцсан. Энэ үед нөхөн сэргээлтийн ажлын талаар харилцан санал солилцож өрөмдлөгийн талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд сумын төвийн мод үржүүлгийн газраас загийн суулгацын тариалалтыг намар хийхээр төлөвлөсөн. Үүнээс хойш нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэх гэрээт байгууллагын сонгон шалгаруулалтыг хийж талбай дээр ажил 9-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 10-р сарын 5-нд хооронд хийж дуусгасан.</p> <p>Талбайн нүүлгэн шилжүүлэлтийн дараах зургийг харна уу. Нөхөн сэргээлтийн ажлын дэлгэрэнгүй тайланг Хавсралт 33.</p> <div data-bbox="711 875 1367 1370"></div> <div data-bbox="1388 875 2043 1370"></div>



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Газрын тосны хайгуул, олборлолт, ашиглалтын үйл ажиллагаанаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт MNS6200:2010 стандартад цооног хаах битүүмжлэхэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон байдаг. Энэ шаардлагын дагуу газрын тосны хайгуул ашиглалтын цооногийг цаашид өөр зориулалтаар ашиглахгүй нөхцөлд цооногийг төмөр бетон хийц ашиглан битүүмжилж, амсрын бэхэлгээний янданг газрын гадаргуутай тэгш түвшинд тайрч, төмрөөр таглаж гагнах ба таган дээр цооногийн нэр, дугаар, хаасан огноог бичиж тэмдэглэх шаардлагатай байдаг. Үүний дагуу Велосираптор-1 цооногийг хааж битүүмжлэсэн. Доорх зураг харна уу.



Нөхөн сэргээлтийн ажлын явцад манай компаниас Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хаягдлын сангийн саармагжуулалтын явцтай танилцах хүсэлтийг хүргүүлснээр тус газрын дарга Г.Баясгалан, Капкорп Монголиа ХХК-ний байгаль орчны мэргэжилтэн Д.Буянзул нар талбай дээр 2023 оны 9-р сарын 28-ны өдөр нөхөн сэргээлтийн ажлын явцтай танилцаж хаягдлын санг өлгийдөх ажлыг үргэжлүүлэн хийхээр тохиролцсон.



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан



Хаягдлын сангийн саармагжуулалт, техникийн нөхөн сэргээлтийн явтай танилцаж буй байдал (нөхөн сэргээлтийн гэрээт гүйцэтгэгч байгууллага, аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчалын газар, Капкорп Монголиа ХХК-ний төлөөлөл нар)



Үүний дараа Баруунбаян-Улаан сумын мод үржүүлгийн газраас загийн суулгац худалдан авахаар төлөвлөсний дагуу тус мод үржүүлгийн газарт нөхөн сэргээлтийн компани хамт очиж танилцан худалдан авалт хийх загийг сонгон харилцан тохиролцсон.




Баруунбаян-Улаан сум дахь мод үржүүлгийн газар



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

9-р сарын 29, 30-ны өдрүүдэд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажил буюу загийн суулгацын тариалалтын ажлыг хийж эхлэсэн. Ингэхдээ загийн суулгац бүрийн нүхийг гараар бэлтгэн тогоо үүсгэж нийт 672 загийг өрөмдлөгийн талбайн хэмжээнд тариалалт, усалгааны ажлыг хийсэн. Баруунбаян-Улаан сумын байгаль орчны улсын хяналтын байцаагч Д.Даваадагва зөвлөн тусалж, Капкорп Монголиа ХХК-аас хяналт тавьж нөхөн сэргээлтийн гэрээт байгууллагатай талбай дээр хамтран ажиллаа.

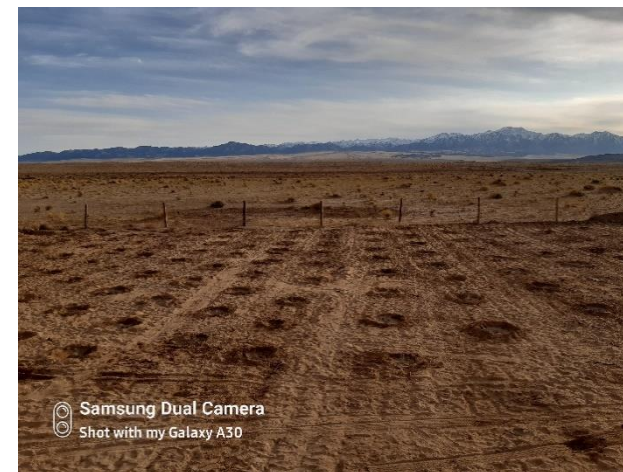



--	--	--

### Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Дүйцүүлэн хамгааллын ажлын хүрээнд төлөвлөсөн ажил	Хариуцах	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт</b>		
Газрын тосны хайгуулын ажлын үед хайгуул явагдсан талбайд тухай бүрт нь нөхөн сэргээлт хийж байх ба хайгуулын ажил дуусч олборлолтын шатанд шилжих үед дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.	Капкорп Монголиа ХХК	<p>БОННУ-д газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа тул дүйцүүлэн хамгаалах ажил төлөвлөгдөөгүй ба хийгдэх шаардлагагүй гэж үзсэн.</p> <p>Төслийн өмнөх үе шатанд, байгаль орчны төлөв байдлын судалгааг хийлгэж, тухайн бүс нутаг, орчны унаган төлөв, нөхцөл байдлыг тодорхойлуулсны дээр тусгай хамгаалалттай газар нутаг, ойн ба усны сан бүхий газруудын хил заагтай давхцаж буй эсэх зэргийн талаарх лавлагааг авч ажилласан /Хавсралт 4/.</p> <p>Хайгуулын ажил дуусч олборлолтын шатанд шилжих үеэс дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор орон нутаг, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчидтай зөвлөлдөн боловсруулж хэрэгжүүлэх юм.</p>

### Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Хийх ажил	Хариуцах	Баримтлах эрх зүйн орчин, шаардлага / тайлбар
Өрөмдлөгийн талбайн нөлөөллийн бүсэд оршин суух иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага тогтоох	“Капкорп Монголиа” ХХК	Төслийн буюу нөлөөллийн бүсэд төслийн өмнөх үе шатны судалгааны үед орон нутгийн удирдлага, ард иргэдтэй уулзаж, тодруулсан ба нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох шаардлага гараагүй болно.
Шаардлагатай иргэдийг нүүлгэн шилжүүлж, нөхөн олговор олгох: - Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор шаардлагатай өрх болон үүнд хамрагдсан өрхийн тоо, хувиар		



#### 4. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Хийх ажил	Хариуцах	Баримтлах эрх зүйн орчин, шаардлага / тайлбар
<p>1. Өрөмдлөг хайгуулын ажлын явцад түүх, соёлын дурсгалт зүйл болон археологи, угсаатан, палеонтологийн олдвор илэрвэл төслийн үйл ажиллагааг зогсоож, энэ тухай сум, дүүргийн засаг дарга, цагдаагийн байгууллагад болон холбогдох эрдэм шинжилгээний байгууллагад нэн даруй мэдэгдэнэ</p>	<p>“Капкорп Монголиа” ХХК</p>	<p>Газрын тосны хайгуулын “Онги V” талбайд байрлах түүх, соёлын дурсгалт зүйлс, археологи, палентологи, угсаатны зүйн олдворыг илрүүлэх, хамгаалах үүднээс ШУА-ын харьяа Түүх, Археологийн хүрээлэн, Плантеологи, Геологийн хүрээлэнгээр холбогдох судалгааг 2018 онд хийлгэж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах, цаашид энэ чиглэлээр баримтлах арга зүйн зөвлөгөөг тус тус авч ажилласан болно. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Капкорп Монголиа” ХХК-ий “Онги V” нэртэй газрын тосны хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай, Археологийн авран хамгаалах судалгааны тайлан”, Түүх, Археологийн хүрээлэн. 2018 он. - (22-31/III, 2018)</li> <li>2. Газрын тосны хайгуулын Онги-V (Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Гучин-Ус, Төгрөг сумд)-н Палеонтологийн судалгааны ажил”, Палеонтологи, Геологийн хүрээлэн, 2015 он. - (21-31/V, 2015),</li> <li>3. “Капкорп Монголиа” ХХК-ний Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл, Хайрхандулаан, Тарагт, Төгрөг, Гучин-Ус, Баруунбаян-Улаан сумдын нутгийг хамрах газрын тосны Онги-V талбайд хийсэн “Угсаатны зүйн авран хамгаалах судалгааны ажлын тайлан”, Түүх, Археологийн хүрээлэн, 2018 он. - (22/III – 01/IV, 2018)</li> </ol>
<p>2. Соёлын өвийн зааварчилгаа</p>		<p><b>Археологи</b> - Баруунбаян-Улаан сумын нутагт 47 Т 721665.8 5002751.1 солбицолд орших өрөмдлөг хийх цэгт очиж шалгалт хийхэд ямар нэгэн дурсгал илрээгүй болно.</p> <p><b>Плантеологи</b> - “Онги-V” талбайн Өвөрхангай аймгийн Нарийн тээл, Баруунбаян улаан, Гучин ус, Богд, Төгрөг сумдын нутагт явуулсан палеонтологийн хайгуул судалгаа, ажиглалтын үр дүнд Баянтээгийн нүүрсний уурхайн орчимд тархсан юрын хурдсаас эртний ургамал, ургамлын үр тоосонцор, Таацын голын районд тархсан палеоген неогений хурдсаас эртний хөхтөн амьтны үлдвэр, Буйлстын худгийн доод цэрдийн хурдсаас үлэг гүрвэл, ургамлын үр тоосонцор, Андай худаг орчим тархсан доод цэрдийн хурдсаас ургамал, ургамлын үр тоосонцор, загас, Зүүн Хөөвөрөөс үлэг гүрвэл, хөхтөн, Ахар уулын орчмын доод цэрдийн хурдсанд эртний ургамлын үлдэгдэл тус тус олддог ба энэ удаагийн хайгуул судалгаагаар Буйлстын худаг, Зүүн Хөөвөр олдворт газруудаас үлэг гүрвэлийн ясны үлдэгдлийг олсон болно.</p> <p>Дээрх олдворт газруудыг агуулсан уулархаг болон өндөрлөг газруудаас бусад палеонтологийн эрэл хайгуул хийсэн хөндий, голын сав газруудаар эртний амьтан ургамлын үлдэгдэл ажиглагдаагүй болно.</p> <p>Иймд дээрх газруудыг хөндөхгүйгээр тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд хайгуулын ажлыг гүйцэтгэх боломжтой гэж үзэж байна.</p> <p>Цаашид хайгуулын ажлын явцад сонирхолтой үлдвэр илэрсэн тохиолдолд ШУА-ийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэнд хандаж, “Соёлын өвийг хамгаалах хууль”-ийн дагуу авран хамгаалах малтлага хийлгэх ажил зохион байгуулахыг санал болгож байна.</p>





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

		<p><b>Угсаатны зүй</b> – Баруунбаян-Улаан сум. Монгол Алтайн нурууны үргэлжлэл Бага Богд, Арц Богдын уулсын хооронд завсар хөндий дагуу байрлах сум. Хангай, говь хосолсон зэрлэг амьтан элбэг байгалийн үзэсгэлэнт газар ихтэй. Жинст овоо, Бор овоо зэрэг тахилгат газруудтай. Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Гучин-Ус сумууд нь Сайн ноён хан аймгийн Сайн ноёны хошуунд хамаарагдаж байв. Дурдсан бүх сумд нь бүгд таван хошуу мал тэр дотроо тэмээ өсгөхөд нэн тохиромжтой говь, тал хээрийн бүс нутаг юм. Эндээс гарах дүгнэлт нь, говь нутгийн малчид иргэдийн ахуй соёлын онцлог, бэлчээр-усны асуудал, тахилгат онгон дагшин байдлыг хүндэтгэж үйл ажиллагаагаа явуулах нь уул уурхай, ашигт малтмал эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн нийгмийн том үүрэг хариуцлагын нэг болохын хувьд компанийн зүгээс үйл ажиллагаа явуулахдаа иргэдийн үе дамжин шүтэж ирсэн овоодыг уул уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөллөөс аль болох хол байлгах, говь-хээрийн бүсийн малчин айл өрхийн амьдралын хэв маяг, ёс заншил, газар усаа хүндэтгэх сэтгэлгээ зэргийг хүндэтгэн үзэж компанийн зүгээс шаардлагатай мэдээллээр байнга хангаж (ялангуяа усны), бэлчээр усны хохиролгүй гэсэн баталгааг тайлбарлан таниулж малчин өрх, компанийн хоорондын харилцан зэрэг харилцааг бий болгож чадвал компанийн талаас монголын уламжлалт ахуй соёлыг хүндэтгэх, малчдын зүгээс улс орны бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааг дэмжих хоёр талын ач холбогдолтой тул энэ тал дээр анхаарч ажиллахыг зөвлөсөн байсан.</p>
3. Хайгуулын үеэр олдвор, үлдвэр илэрсэн тохиолдолд авран хамгаалах малтлага хийлгэх ажлыг зохион байгуулах		Төслийн үйл ажиллагааны үеэр ямар нэг зүйл илрээгүй тул аль нэг мэргэжлийн байгууллагад хандаж, авран хамгаалах үйл ажиллагаа зохион байгуулах шаардлага гараагүй.





## 5. ОСОЛ ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хариуцах	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Үүсэж болзошгүй байгалийн, биологийн болон технологийн гаралтай осол эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ</b>		
<p>Орон нутгийн иргэд болон талбай дээр ажиллаж буй ажиллагсад тухайн бүс нутагт тохиолддог байгалийн гаралтай осол үүсэх нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл өгөх, энэ үед хувь хүн болон хээрийн ажлын үед авах арга хэмжээний талаарх зөвлөмж өгөх</p>	<p>Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч, Капкорп Монголиа ХХК</p>	<p>Талбай дээр ажиллаж байсан нийт ажилчид, орон нутгийн иргэдэд төслийн талбайн бүс нутагт тохиолддог байгалийн гаралтай үүсэж болзошгүй осол эрсдлийн талаар танилцуулга мэдээлэл өгч, түүнээс хэрхэн сэргийлэх, тохиолдсон үед авах арга хэмжээний талаар заавар зөвлөмж өгч ажилласан.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p>Төсөл хэрэгжих явцад тухайн бүс нутаг болон ОУ, Монгол улсыг хамарсан өвчлөл гарч байгаа эсэхэд байнга анхаарч, гарсан тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах</p>	<p>Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч, Капкорп Монголиа ХХК</p>	<p>Өрөмдлөгийн ажил үргэлжлэх хугацаанд улс орон нутгийн хэмжээнд биологийн гаралтай ямар нэгэн халдварт өвчин дэгдэлт гарч хориг хязгаар тавигдаагүй.</p>



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Ажиллагсдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр бүрэн ханган ажиллуулах

Code: PM-FRM-001 PPE Hand over sheet  
Version: 2.0

Хүлээн авсан:  
Received by: *M. Amur*  
Шалгалсан:  
Checked by: *M. Amur*  
Баталсан:  
Approved by: *M. Amur*

**PEPROMATA**

HEXX ОЛГОСОН МАРТИ  
HAND OVER SHEET  
Onion/Date: *2023, 6, 13*

No	Нэр/Description	Тоо ширээ/Quantity	Үнэ/Price
1	Бас	1	
2	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	4	
3	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	4	
4	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	4	
5	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	4	
6	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	4	
7	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	4	
НИЙТ/ TOTAL /Summa		28	

No	Зориулалт/Intended use	Өгөгдсөн/Issued by	Хүлээн авсан/ Received by
1	Зориулалт/Intended use	Block V VRI	PPE
2	Ажилтны нэр/Employee name	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	
3	Адрес/Address/Position	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	
4	Утасны дугаар/Phone number	9902996	
5	Гарын үсэг/Signature	<i>M. Amur</i>	<i>M. Amur</i>

Талбай дээр өрөмдлөгийн ажил явагдах хугацаанд ажилчдад хувийн хамгаалах хэрэгсэлийг ажил үүргийн хуваарьт заагдсан ажил үүрэгтэй уялдуулан хангаж байсан. Ажилчдын нэг бүрийн хамгаалах хувцас хэрэгслээр хангаж, тус бүр хүлээлгэн өгч гарын үсэг зуруулан бүртгэл хийж байсан.



Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК нь мөн өрмийн талбай дээр ажиллаж байгаа нийт инженер техникийн ажилчиддаа хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр бүрэн хангаж ажилласан.





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Хөдөлмөр хамгаалал болон болзошгүй осол, аюулаас урьдчилан сэргийлэх, осол аваарын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган цаг үеийн байдалтай уялдуулан тодотгол хийж, ажиллагсад энэ үед хэрхэн ажиллах талаар мэдээлэл сургалт хийх

Компани ажилчдын дотоод сургалтын төлөвлөгөөг гаргаж батлуулан ажилчдыг болзошгүй осол, аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай сургалтуудыг тогтмол хийдэг. Үүнд: шинээр ажилчд орж байгаа ажилтнуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хүрээнд зайлшгүй шаардлагатай сургалт, нийт ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, эрүүл мэндийн эргономик, гар ажиллагаа, алжаал ядаргаа хянах, сэтгэцийн эрүүл мэнд сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Мөн түүнчлэн өндөр эрсдэлтэй ажлын байрны сургалтууд болох H<sub>2</sub>S, аюулгүйн жолоодлого, химийн бодистой харьцах ажилтны сургалтууд, анхны тусламж үзүүлэх сургалтуудыг нийт ажилчид болон шаардлагатай ажилтнуудад явуулсан байна.




Галын аюулгүй байдлын сургалт



Галын аюулгүй байдлын практик сургалт



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан



Аюулгүйн жолоодлогын сургалтанд жолооч нарыг хамрагдсан байдал-тайлан



Химийн бодистой харьцах ажилчдын сургалт







Анхны тусламж үзүүлсэн сургалт



Нийт ажилчдын ХАБЭА-н сургалт





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

		<p>Инженер техникийн ажилтнуудыг хүхэрт ус төрөгчийн аюулгүй ажиллагааны сургалтанд хамруулсан</p>  	 	
<p>Яаралтай үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ажилчдад хэрхэн ажиллах талаарх мэдээлэл, зааварчилгаа өгсөн эсэх</p>		<p>Компани төсөл хэрэгжих үеийн онцгой байдлын үед авах хариу хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан удирдлага, инженер техникийн ажилчдаа хариуцсан ажил үүргийг нь тодорхойлж танилцуулсан. Гамшгийн эрсдлийн үнэлгээг Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн дагуу мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлэн үүнд үндэслэн өрөмдлөгийн үйл ажиллагааны явцад авч хэрэгжүүлэх гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын ерөнхий газарт батлуулахаар хүргүүлсэн. Аймгийн онцгой байдлын газраас манай өрөмдлөгийн ажлын үргэлжлэх хугацаа богино түр зуурынх тул гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө батлуулах шаардлагагүй гэж үзсэн. Аймгийн Онцгой байдлын газраас галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан/Хавсралт 19/.</p>		



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

		 <p style="text-align: center;"><b>Петро Матад ХХК</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД АВАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>ГАРЧИГ</b></p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>Зорилго</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>Хамрах хүрээ</td><td>3</td></tr> <tr><td>3</td><td>Тодорхойлолт/ангилал</td><td>4</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>Тодорхойлолт</td><td>4</td></tr> <tr><td>3.2</td><td>Ангилал</td><td>4</td></tr> <tr><td>4</td><td>Онцгой байдлын үед холбоо барих ажиглнууд</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>Хүлээх үүрэг, хариуцлага</td><td>5</td></tr> <tr><td>5.1</td><td>Урьдчилсан онцгой байдлын зохицуулах хороо – Улаанбаатар дахь оффис</td><td>5</td></tr> <tr><td>5.2</td><td>Талбайн үйл ажиллагааны онцгой байдлын баг</td><td>6</td></tr> <tr><td>5.2.1</td><td>Талбайн яаралтай тусламжийн зохицуулагч (ТЯТЗ)</td><td>6</td></tr> <tr><td>5.2.2</td><td>Бүртгэлийн ажилтан (талбайн) (талбайн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны ажилтан)</td><td>7</td></tr> <tr><td>5.2.3</td><td>Зөвлөх</td><td>7</td></tr> <tr><td>5.3</td><td>Яаралтай тусламжийн баг</td><td>7</td></tr> <tr><td>5.3.1</td><td>Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний зохицуулагч - Улаанбаатар дахь оффис</td><td>8</td></tr> <tr><td>5.3.2</td><td>Талбай харуулсан яаралтай тусламжийн зохицуулагч - Улаанбаатар дахь оффис (ОБ/ААХ)</td><td>8</td></tr> <tr><td>5.3.3</td><td>Үйл ажиллагааны туслах ажилтан - Улаанбаатар дахь оффис</td><td>9</td></tr> <tr><td>5.3.4</td><td>Бүртгэлийн ажилтан - Улаанбаатар дахь оффис - Үйл ажиллагааны зохицуулагч</td><td>9</td></tr> <tr><td>5.3.5</td><td>Аяллын менежер / диспетчер - Улаанбаатар дахь оффис</td><td>9</td></tr> <tr><td>5.3.6</td><td>Байгаль орчны мэргэжилтэн - Улаанбаатар дахь оффис</td><td>10</td></tr> <tr><td>5.4</td><td>Онцгой байдлын менежментийн баг</td><td>10</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>Өрөмдлөгийн ажлын гэрээт гүйцэтгэгч</td><td>11</td></tr> <tr><td>5.6</td><td>Гар утгаар холтос</td><td>11</td></tr> <tr><td>5.6.1</td><td>Эрэн хаях хэсэг</td><td>11</td></tr> <tr><td>5.6.2</td><td>Авах баг /АХН-ы тусламжийн баг</td><td>11</td></tr> <tr><td>5.6.3</td><td>Бүх ажиглнууд</td><td>12</td></tr> <tr><td>6</td><td>Ажлын үе шат</td><td>12</td></tr> <tr><td>6.1</td><td>Нүүлэн шилжүүлэх журам</td><td>12</td></tr> <tr><td>6.2</td><td>Зөвлөмж/гаг</td><td>13</td></tr> <tr><td>6.3</td><td>Төривөрлөлт</td><td>13</td></tr> <tr><td>6.4</td><td>Түшгүүрийн дохио дуугаргах</td><td>14</td></tr> <tr><td>6.5</td><td>Цугларгах цэг</td><td>15</td></tr> <tr><td>6.6</td><td>Ослын дараа</td><td>15</td></tr> </table>	1	Зорилго	3	2	Хамрах хүрээ	3	3	Тодорхойлолт/ангилал	4	3.1	Тодорхойлолт	4	3.2	Ангилал	4	4	Онцгой байдлын үед холбоо барих ажиглнууд	5	5	Хүлээх үүрэг, хариуцлага	5	5.1	Урьдчилсан онцгой байдлын зохицуулах хороо – Улаанбаатар дахь оффис	5	5.2	Талбайн үйл ажиллагааны онцгой байдлын баг	6	5.2.1	Талбайн яаралтай тусламжийн зохицуулагч (ТЯТЗ)	6	5.2.2	Бүртгэлийн ажилтан (талбайн) (талбайн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны ажилтан)	7	5.2.3	Зөвлөх	7	5.3	Яаралтай тусламжийн баг	7	5.3.1	Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний зохицуулагч - Улаанбаатар дахь оффис	8	5.3.2	Талбай харуулсан яаралтай тусламжийн зохицуулагч - Улаанбаатар дахь оффис (ОБ/ААХ)	8	5.3.3	Үйл ажиллагааны туслах ажилтан - Улаанбаатар дахь оффис	9	5.3.4	Бүртгэлийн ажилтан - Улаанбаатар дахь оффис - Үйл ажиллагааны зохицуулагч	9	5.3.5	Аяллын менежер / диспетчер - Улаанбаатар дахь оффис	9	5.3.6	Байгаль орчны мэргэжилтэн - Улаанбаатар дахь оффис	10	5.4	Онцгой байдлын менежментийн баг	10	5.5	Өрөмдлөгийн ажлын гэрээт гүйцэтгэгч	11	5.6	Гар утгаар холтос	11	5.6.1	Эрэн хаях хэсэг	11	5.6.2	Авах баг /АХН-ы тусламжийн баг	11	5.6.3	Бүх ажиглнууд	12	6	Ажлын үе шат	12	6.1	Нүүлэн шилжүүлэх журам	12	6.2	Зөвлөмж/гаг	13	6.3	Төривөрлөлт	13	6.4	Түшгүүрийн дохио дуугаргах	14	6.5	Цугларгах цэг	15	6.6	Ослын дараа	15
1	Зорилго	3																																																																																																	
2	Хамрах хүрээ	3																																																																																																	
3	Тодорхойлолт/ангилал	4																																																																																																	
3.1	Тодорхойлолт	4																																																																																																	
3.2	Ангилал	4																																																																																																	
4	Онцгой байдлын үед холбоо барих ажиглнууд	5																																																																																																	
5	Хүлээх үүрэг, хариуцлага	5																																																																																																	
5.1	Урьдчилсан онцгой байдлын зохицуулах хороо – Улаанбаатар дахь оффис	5																																																																																																	
5.2	Талбайн үйл ажиллагааны онцгой байдлын баг	6																																																																																																	
5.2.1	Талбайн яаралтай тусламжийн зохицуулагч (ТЯТЗ)	6																																																																																																	
5.2.2	Бүртгэлийн ажилтан (талбайн) (талбайн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны ажилтан)	7																																																																																																	
5.2.3	Зөвлөх	7																																																																																																	
5.3	Яаралтай тусламжийн баг	7																																																																																																	
5.3.1	Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний зохицуулагч - Улаанбаатар дахь оффис	8																																																																																																	
5.3.2	Талбай харуулсан яаралтай тусламжийн зохицуулагч - Улаанбаатар дахь оффис (ОБ/ААХ)	8																																																																																																	
5.3.3	Үйл ажиллагааны туслах ажилтан - Улаанбаатар дахь оффис	9																																																																																																	
5.3.4	Бүртгэлийн ажилтан - Улаанбаатар дахь оффис - Үйл ажиллагааны зохицуулагч	9																																																																																																	
5.3.5	Аяллын менежер / диспетчер - Улаанбаатар дахь оффис	9																																																																																																	
5.3.6	Байгаль орчны мэргэжилтэн - Улаанбаатар дахь оффис	10																																																																																																	
5.4	Онцгой байдлын менежментийн баг	10																																																																																																	
5.5	Өрөмдлөгийн ажлын гэрээт гүйцэтгэгч	11																																																																																																	
5.6	Гар утгаар холтос	11																																																																																																	
5.6.1	Эрэн хаях хэсэг	11																																																																																																	
5.6.2	Авах баг /АХН-ы тусламжийн баг	11																																																																																																	
5.6.3	Бүх ажиглнууд	12																																																																																																	
6	Ажлын үе шат	12																																																																																																	
6.1	Нүүлэн шилжүүлэх журам	12																																																																																																	
6.2	Зөвлөмж/гаг	13																																																																																																	
6.3	Төривөрлөлт	13																																																																																																	
6.4	Түшгүүрийн дохио дуугаргах	14																																																																																																	
6.5	Цугларгах цэг	15																																																																																																	
6.6	Ослын дараа	15																																																																																																	
		<p><b>БАТЛАВ:</b> Корпорат Монголиа ХХК Гүйцэтгэх захирал .....А.Гэрэлт-Од</p> <p><b>ЗӨВШӨӨРӨВ:</b> Өвөрхангай аймгийн Онцгой Байдлын Газрын дарга Дэд Хурандаа .....Д.Одонбаяр</p> <p style="text-align: center;"><b>ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭТ ОНГИ V ТАЛБАЙН ГАМШИГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ</b></p> <p><b>Төлөвлөгөө боловсруулсан:</b> ХАБЭА-н ажилтан ..... С. Нарансаргал</p> <p><b>Төлөвлөгөөг хянасан:</b> ХАБЭА-БОН-ы хэлтсийн дарга ..... Гэйри Найл ОБГ-ын аллах байцаач хошууч ..... Г. Ганбаатар</p> <p style="text-align: center;">2023 он</p>	<p style="text-align: center;"><b>Корпорат Монголиа ХХК</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭТ ОНГИ V ТАЛБАЙН ХАЙГУУЛЫН ӨРӨМДЛӨГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕИЙН ГАМШИГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ</b></p>																																																																																																



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Өрөмдлөгийн ажил эхлэх үеэс өрөмдлөгийн ажил дуусах бүхий л хугацаанд эмнэлгийн яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх амбулатори, эмч, эмнэлэгийн тэрэг кемп дээр байрлаж ажилласан.



Талбай дээр эмч ажиллах үедээ өрөмдлөгийн талбайн ойр орчимд байгаа малчин айл өрхүүдэд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг мөн үзүүлж ажиллаж байсан.





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

<p>Олон улсын СОС-байгууллагаас эмнэлгийн яаралтай тусламжийн агаараар нүүлгэн шилжүүлэлт хийх</p>		<p>Талбай дээр ажил үргэлжлэх хугацаанд гэнэтийн болзошгүй осол аваарь гарч хүнд гэмтэл бүхий өвчтөн гарсан тохиолдолд агаараар нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгууллахаар ОУ-ын СОС байгууллагатай хамтран ажиллахаар төлөвлөсөн. Үүний тулд бид УБ хотын Иргэний нисэхийн төвд хүсэлт гарган Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сумын нутагт нислэгийн түр зурвасыг Геосан ХХК-ний Агаарын хөлгийн 2-р нисгэгч Э.Амгаланбаатар, Өвөрхангай аймгийн нисэх буудлын аэродромын техникч Ч.Баттулга нартай талбай ажиллаж нислэгийн түр зурвасыг сонгон акт үйлдсэн /Хавсралт 23/. Эрүүл мэндийн агаараар нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө /Хавсралт 27 /</p>
--	--	---





## 6. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн байдал	Хариуцах эзэн	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ</b>		
Шингэн хаягдал, ариун цэврийн байгууламж /септик танк байршуулах/, эсвэл ахуйн шингэн хаягдлын танк суурилуулна	Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч, Капкорп Монголиа ХХК	<p>Өрөмдлөгийн талбай дахь ажилчдын суурьшсан кемпед ахуйн шингэн хаягдал, хар саарал усыг цуглуулах зориулалттай 6 тн багтаамжтай септик танк байршуулсан. Септик танк дахь бохирыг 3 хоногт нэг удаагийн давтамжтайгаар бохир сорох зориулалттай машинаар соруулан тээвэрлэсэн. Кемпийн үйлчилгээний гэрээт гүйцэтгэгч Геомин ХХК нь “Онги-Ус Суваг” ОНӨААТҮГ-тай бохир ус нийлүүлэх гэрээ хийсний дагуу Хайрхандулаан сумыг бохир цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлж ажилласан. Өрөмдлөгийн ажил үргэлжилсэн 30 хоногийн хугацаанд нийт 13 удаагийн зөөвөрлөлт хийж 198 м<sup>3</sup> бохир усыг нийлүүлсэн байна Хавсралт /17/.</p> <div data-bbox="716 735 1104 1255"></div> <p data-bbox="701 1273 1241 1304">Септик танкийг газар байршуулсан байдал</p> <div data-bbox="1339 735 2045 1268"></div> <p data-bbox="1392 1273 2028 1336">Өрөмдлөгийн ажил дууссаны дараа септик танкыг буцааж гаргаж авсан</p>



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Төслийн талбайн нэр: Project site name:		CAP CORP							
Ахуйн шингэн хаягдал зөөвөрлөлтийн бүртгэл / Grey & Black Water Tank Log									
Ансан огноо/date	Бохир септик/Sewage Septic	Соруулсан бохир хамнаа /Sucked out (m3)	Бохирг тээвэрлэн хургах цаг / Transport destination	Бохирг соруулсан тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар / vehicle plate no	Бохирг хүлээн авч тээвэрлэсэн жолоочийн нэр, холбоо барих дугаар / Driver's name and signature	Бохирг соруулан хүлээлгэн өгсөн хэврийн анги дээрх ажилтны нэр /signature of person/ entity who receives handover of sewage waste	Тайлбар/Comment	Бохирг соруулан тээвэрлүүлсэн фото бүртгэлийн баримтжуулалт/Photographic documentation of sewage waste disposed of	
1	23/06/02	Grey/саарал ус, Black/тунасан бохир	6м3	Гарсан цаг 09:30 Ирсэн цаг 19:40	86-35UEA	Б.Батгэрлэнэ	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	Эхний ажилт зам шалгах, турналтын журмаар тал буюу 6м3 бохир тунасан	<i>Handwritten signature</i>
2	23/06/06	Grey/саарал ус, Black/тунасан бохир	12м3	Гарсан цаг 09:20 Ирсэн цаг 18:30	86-35UEA	Б.Батгэрлэнэ	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	12 м3	<i>Handwritten signature</i>
3	2023.6.10	Бохир ус	12 м3	08:10-11:20	86-35UEA	<i>Handwritten signature</i>	Солсёрдсат	12 м3	<i>Handwritten signature</i>
4	2023.6.12	Бохир ус	18 м3	08:50-18:00	86-35	<i>Handwritten signature</i>	Солсёрдсат	18 м3	<i>Handwritten signature</i>
5	2023.6.17	Бохир ус	20 м3	11:57-01:00	00-740MT	<i>Handwritten signature</i>	Солсёрдсат	20 м3	<i>Handwritten signature</i>
6	2023.6.21	Бохир ус	12 м3	07:45-01:00	98-740MT	<i>Handwritten signature</i>	Лувсанболор	12 м3	<i>Handwritten signature</i>
7	2023.6.21	Бохир ус	12 м3	07:45-01:00	98-740MT	<i>Handwritten signature</i>	Загарбат	12 м3	<i>Handwritten signature</i>
8	2023.6.22	Бохир ус	18 м3	07:30-17:30	98-740MT	<i>Handwritten signature</i>	Лувсанболор	18 м3	<i>Handwritten signature</i>
9	2023.6.22	Бохир ус	18 м3	07:30-17:30	98-740MT	<i>Handwritten signature</i>	Солсёрдсат	18 м3	<i>Handwritten signature</i>
10	2023.7.5	Бохир ус	18 м3	14:40-15:40	98-740MT	<i>Handwritten signature</i>	Сунраг тарагч	18 м3	<i>Handwritten signature</i>
11	2023.7.11	Бохир ус	18 м3	14:00-16:40	98-740MT	<i>Handwritten signature</i>	Шивсэндэв	18 м3	<i>Handwritten signature</i>
12	2023.7.11	Бохир ус	18 м3	06:30-14:00	98-740MT	<i>Handwritten signature</i>	Сунраг тарагч	18 м3	<i>Handwritten signature</i>
13	2023.7.12	Бохир ус	18 м3	08:40-16:40	98-740MT	<i>Handwritten signature</i>	Сунраг тарагч	18 м3	<i>Handwritten signature</i>
14	2023.7.12	Бохир ус	10 м3	08:40	98-740MT	<i>Handwritten signature</i>	Сунраг тарагч	10 м3	<i>Handwritten signature</i>

Бохирын зөөвөрлөлтийн бүртгэл, хүлээлгэн өгсөн баримт

Хатуу хог хаягдлыг түр ангилан хадгалах зориулалтын савнуудыг гадаргын ус зайлуулах суваг, усны орчинд шууд урсах талбайгаас хол байрлуулах,

Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК, Капкорп Монголиа ХХК

Ахуйн хатуу хог хаягдлыг цуглуулахдаа кемийн баруун хойно буюу тухайн талбайн газрын гадарга тогтоц байршил харгалзан үзэж суваг шуудуйн дагуу түр зуурын урсац үүсэхээргүй өндөрлөг газрын сонгон авч ахуйн хог хаягдлыг түр цуглуулах цэгийг байгуулсан.



Хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөлөлгүйгээр хогийг төрөлжүүлэн цуглуулж түр цэгт байршуулж орон нутагтай гэрээ байгуулсны дагуу сум орон нутгийн төвлөрсөн хогийн цэг рүү зөөвөрлөн хаяна. Хог хаягдлын бүртгэл хөтлөнө

Кемпийн талбай дээр ахуйн хог хаягдлыг цаас, шил лааз, хуванцар, хоол хүнсний, бусад хог хаягдал гэж ангилахаар төлөвлөн хогийн цэгийн зохион байгуулалтыг хийсэн. Хогийн цэгээс хөрсөнд бохирдол нэвчил үүсэх зэргээс хамгаалан хогийн цэгийн шал суурь хэсэгт геомбран хамгаалалт хийж, мөн салхинд хийсэж тухайн орчинд тархахаас урьдчилан сэргийлж торон хашаа татаж хамгаалсан.

Хог хаягдлыг тээвэрлэхдээ Баруунбаян-Улаан сумын энгийн хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх эрх бүхий тээврийн хэрэгсэлтэй сумын иргэнтэй хог тээврийн гэрээ байгуулан, хогны ачилт хийх шаардлагатай үед ачилтыг тухай бүр хийлгэн ажилласан.

Хог хаягдлын гэрээг Баруунбаян-Улаан сумын засаг даргатай гэрээ байгуулан тухайн Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 10/1 дүгээр тогтоолын дагуу сумын хог хаягдлын үйчилгээний хураамжид тооцсоны дагуу төлбөр тооцоог шилжүүлсэн.



Ахуйн хог хаягдлын цэг



Ахуйн хог хаягдлыг цуглуулж хадгалсан байдал



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан



Ахуйн хогийг сумын төвийн төвлөрсөн хогийн цэгт ачиж буулгасан байдал





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

VR-18 Major Drilling										
Уламчар / <i>Amount</i> (хэмжээ, quantity)	Цаас / <i>Amount</i>	Шил / <i>Case</i>	Бусад / <i>Other</i> (хэмжээ, quantity)	Хог хаягдлыг дахин ашиглах цэг, дахин боловсруулах газар / хүлээлгэн эгсэн эсэх / <i>recycle point / yes or no</i>	Дахин ашиглагдаггүй хог хаягдлыг тээвэрлэн хуртга цэг / <i>waste recycling point</i>	Хог хаягдлыг өгсөн тээврийн хэрэгслийн уясын дугаар / <i>Trailer number</i>		Хог хаягдлыг хүлээн авч тээвэрлэсэн малочийн нэр, холбоо барих дугаар / <i>name of contractor who handles waste</i>	Хог хаягдлыг хүлээлгэн эгсэн тээврийн ажилч амьдралын нэр / <i>name of driver who handles waste</i>	Хог хаягдлын ачилт хийж тээвэрлүүлсэн фото зургийн баримтнуулалт / <i>Photographic documentation of waste disposed of</i>
15one	15KG	3KG	1KG	20KG	40KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	Бат-Эрдэнэ	ATTACHED
8 June 23	10 KG	—	1 KG	30 KG	25 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	Бат-Эрдэнэ	ATTACHED
16 June	13 KG	3,5 KG	—	25 KG	41,5 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	Бат-Эрдэнэ	ATTACHED
23 June	25 KG	4 KG	1 KG	20 KG	48 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	Бат-Эрдэнэ	ATTACHED
—	10 KG	2 KG	—	15 KG	27 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	Бат-Эрдэнэ	ATTACHED
30 June	5 KG	2 KG	—	25 KG	30 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	Бат-Эрдэнэ	ATTACHED
08 July	10 KG	2 KG	—	20 KG	25 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	Бат-Эрдэнэ	ATTACHED
17 July	13 KG	3 KG	—	25 KG	41 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	Бат-Эрдэнэ	ATTACHED
09 July	500m	—	—	30m	—	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	Бат-Эрдэнэ	ATTACHED
23 July	250m	2m	—	200m	—	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	Бат-Эрдэнэ	ATTACHED

Өрөмдлөгийн ажил үргэлжлэх хугацаанд ахуйн хог хаягдлын ачилт хийгдэх бүрт хийсэн бүртгэл Энгийн хог хаягдлыг 10 удаагийн зөөлтөөр 1.4-1.5 тн хог хаягдлын сумын төвийн хогийн цэгт төвлөрүүлсэн байна.



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

		<div data-bbox="764 188 1887 708" style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <p style="text-align: right;"><b>Цахим гүйлгээний баримт</b></p> <hr/> <p>Хүсэлтийн лавлах дугаар: 189271220 <span style="float: right;">Татсан огноо: 2023-06-06 17:21</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Шилжүүлэгчийн дансны дугаар</th> <th style="width: 25%;">Хүлээн авагчийн данс</th> <th style="width: 25%;">Гүйлгээний дүн</th> <th style="width: 25%;">Гүйлгээний төлөв</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>8145100130</b> IBAN: MN78 0015 0081 4510 0130</td> <td><b>1165117377</b> IBAN: MN03 0015 0011 6511 7377</td> <td><b>885,500.00 MNT</b></td> <td><b>Амжилттай</b></td> </tr> <tr> <td>Шилжүүлэгчийн нэр <b>КАПКОРП МОНГОЛИА ХХК</b></td> <td>Хүлээн авагчийн нэр <b>TAX</b></td> <td colspan="2">Гүйлгээний утга <b>2230600238654;51101241315001;5077982;51101241315001;88786124</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Хүлээн авагчийн банк</td> <td colspan="2">Гүйлгээний огноо <b>2023-06-06</b></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт</p>	Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв	<b>8145100130</b> IBAN: MN78 0015 0081 4510 0130	<b>1165117377</b> IBAN: MN03 0015 0011 6511 7377	<b>885,500.00 MNT</b>	<b>Амжилттай</b>	Шилжүүлэгчийн нэр <b>КАПКОРП МОНГОЛИА ХХК</b>	Хүлээн авагчийн нэр <b>TAX</b>	Гүйлгээний утга <b>2230600238654;51101241315001;5077982;51101241315001;88786124</b>			Хүлээн авагчийн банк	Гүйлгээний огноо <b>2023-06-06</b>	
Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв															
<b>8145100130</b> IBAN: MN78 0015 0081 4510 0130	<b>1165117377</b> IBAN: MN03 0015 0011 6511 7377	<b>885,500.00 MNT</b>	<b>Амжилттай</b>															
Шилжүүлэгчийн нэр <b>КАПКОРП МОНГОЛИА ХХК</b>	Хүлээн авагчийн нэр <b>TAX</b>	Гүйлгээний утга <b>2230600238654;51101241315001;5077982;51101241315001;88786124</b>																
	Хүлээн авагчийн банк	Гүйлгээний огноо <b>2023-06-06</b>																
<p>Өрөмдлөгийн шингэн хаягдлын сан (зумп)-д хуримтлуулж ууршуулах, саармагжуулах, арга хэмжээ авна.</p>		<p>Өрөмдлөгийн талбайн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд шингэн хаягдлын сангийн шингэн хаягдлын саармагжуулан хатууруулах арга хэмжээг авч техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын хийж гүйцэтгэсэн. Нөхөн сэргээлтийн ажлын тайланг /Хавсралт 33/.</p>																
<p>Өрмийн үйл ажиллагаанд хэрэглэсэн химийн /органик, органик биш бодис, түүний нэгдлүүд/, тэсэрч дэлбэрэх шинж бүхий бодис болон цацраг идэвхит бодис, тэдгээрийг агуулж байсан сав, ажилласан тос, масло, хаягдал</p>	<p>Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК, Капкорп Монголиа ХХК</p>	<p>Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК нь өрөмдлөгийн ажилд ашигласан химийн бодисын шуудай, ашигласан техникийн тос масло зэргийн сав баглаа боодол зэргийг эх үүсвэр дээр нь түр хадгалсан. Үүний дараа аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах эрх бүхий байгууллага болох Цэцүүх Трейд ХХК-д хүлээлгэн өгсөн. Хавсралт 22, 23 аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэх гэрээ болон дагалдах бичгийг харна уу.</p>																



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

дугуй гэх зэрэг орно. Тусгай зөвшөөрөлтэй гэрээт гүйцэтгэгчтэй байгуулах гэрээний дагуу шийдвэрлэнэ

Байгаль орчин, ахуйн жижигчлэлийн сайдын  
2018 оны 02 сарын 02-ны өдөр /2018.02.02/ А.21-дугаар  
тушаалын 1 дүгээр хэсгээр

**АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ХАЯГДЛЫН ДАГАЛДАХ БИЧИГ**  
№ **0000589**

Дагалдах бичгийн дугаар:  
/шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хуудас хэрэглэнэ./

**1. Үүсгэгчийн талаарх мэдээлэл:**  
Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн бүртгэлийн дугаар:  
Аюултай хог хаягдал үүсгэгч байгууллагын нэр: Мейфор Энжинериинг компани ХХК

**2. Аюултай хог хаягдлыг хүлээлгэн өгсөн:**  
Овог нэр: С. Салансүхбаяр Албан тушаалтан: Хүний нөөц хэлтэс Гарын үсэг: \_\_\_\_\_ Огноо: 2023 он 08 сар 03 өдөр

**3. Тээвэрлэгчийн талаарх мэдээлэл:**  
1/ Тээврийн сэрэгслийн урсгын дугаар: 85-17400 Тээвэрлэгчийн бүртгэлийн дугаар: \_\_\_\_\_

**4. Аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээлэл:**

Аюултай хог хаягдлын нэр	Аюулын ангиллын зэрэглэл	Савлаганы бүлэг	Савны дугаар		Хэмжээ	Нэгж /кг Эсвэл/м	Аюултай хог хаягдлын код
			Төрөл	Төрөл			
1 <u>Каншир/30</u>	x	<u>Билшүү</u>	<u>100E</u>	<u>15</u>	<u>кг</u>	<u>150109</u>	
2 <u>Шүүрээ</u>	x	<u>Билшүү</u>	<u>140D</u>	<u>1Г</u>	<u>кг</u>	<u>150109</u>	
3							
4							

**3. Тээвэрлэх үед анхаарах нэмэлт зааварчилгаа, мэдээлэл:**

**5. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан тээвэрлэгч:**  
1. Овог нэр: С. Салансүхбаяр Гарын үсэг: \_\_\_\_\_ Огноо: 2023 он 08 сар 08 өдөр

**6. Үл зохихлол:**

**7. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл:**  
Аж ахуйн нэгжийн нэр: ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК  
Цэцүүх трейд ХХК бүртгэлийн дугаар: У-001123

Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан.  
Овог нэр: Ц. Дэлгэрсүх Албан тушаал: Хүний нөөц Гарын үсэг: \_\_\_\_\_ Огноо: 2023 он 08 сар 03 өдөр



## 7. ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хариуцах	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Химийн бодисын эрсдлийг бууруулахаар урьдчилан сэргийлж авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ</b>		
<p>Тээвэрлэх, хадгалах, хэрэглэх үед алдагдах, хүн, мал, байгальд хор хөнөөл учруулахаас бүрэн сэргийлнэ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Агуулах нь үйл ажиллагаа явуулах шаардлага хангасан дүгнэлттэй байна. Өрөмдлөгийн гэрээт байгууллага химийн бодисын агуулахын дүгнэлттэй байна.</li> <li>- Химийн аюултай бодисыг түүний онцлог шинж чанарыг нь харгалзан агуулахад журмын дагуу хадгална.</li> <li>- Химийн бодистой харьцан ажиллах ажилтан шаардлага хангасан ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангагдсан байна</li> <li>- Агуулахад аюул ослын үед хэрэглэх асгаралтын цомог, саармагжуулах бодис шаардлагатай, гал унтраах хэрэгслүүдийг ойр байлгана.</li> <li>- Химийн бодис тээвэрлэх үед химийн бодис</li> </ul>	<p>Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК, Петро Матад ХХК</p>	<p>Химийн бодисын хадгалалт ба ашиглалтад Монгол улсын холбогдох хууль, журмууд болон олон улсын стандартад нийцсэн компанийн дотоод журам, төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавьж ажиллалаа. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажилд ашиглагдсан химийн бодисыг өрмийн ажлыг гүйцэтгэх гэрээнд тусгагдсаны дагуу Мэжор Дриллинг ХХК-ний химийн бодис ашиглах тусгай зөвшөөрлийн дагуу химийн бодисын ашиглалт зохицуулагдсан. Мэжор Дриллинг ХХК нь Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах үйл ажиллагааны 0002148 тоот тусгай зөвшөөрлийг 2022-04-04 өдөр, 3 жилийн хугацаатай (2025-12-31 хүртэл) авсан /Хавсралт 20/.</li> <li>- Газрын тосны өрөмдлөгийн үйл ажиллагаанд нийтлэг ашиглагддаг Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээг БОНБНУ-ний хүрээнд хийгдсэн.</li> <li>- Химийн бодис хадгалах агуулах нь стандартын шаардлага хангасан зөөврийн контейнерт химийн бодисыг хадгалж ашигласан. /Химийн бодистой харьцан ажиллах журам, асгаралтын үед мөрдөх журмыг мөрдлөг болгон ажилласан/.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>






Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

<p>алдагдахад авах арга хэмжээг төлөвлөх, хоргүйжүүлэх зааварчилгааг холбогдох хүмүүст өгч ажиллах</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Хадгалж байгаа хорт болон аюултай бодисын сав баглаа боодол нь тухайн бодисын нэр, анхааруулах тэмдэг, аюулын шинж чанарыг тодорхой бичсэн шошготой байна.</li><li>- Ашиглалтаас гарсан химийн бодисын сав баглаа боодлыг бүртгэлжүүлж гэрээт байгууллагад нийлүүлнэ.</li><li>- Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй химийн бодисын бүртгэл хөтөлж, ХАЛМ бэлэн байлгана.</li><li>- Химийн бодистой харьцан ажиллах сургалт зааварчилгаа өгөх</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Химийн бодис хадгалж буй талбай тус бүрт хадгалагдаж буй бүтээгдэхүүнтэй холбоотой анхааруулах болон дагаж мөрдөх журмуудыг байршуулж өгсөн.</li><li>- Агуулахын нярав болон харуул хамгаалалтын ажилтантай, химийн бодисын бүртгэл, хаяг шошго, уут баглаа боодлын бүрэн байдлыг хянаж ажилладаг.</li><li>- Асгаралт зохицуулах иж бүрдэл, саармагжуулах бодис, тосгуурыг асгаралт үүсч болзошгүй газруудад байршуулсан.</li><li>- Хээрийн түр сууринд орон тооны эмч, эмнэлэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба нийт ажилтнууд анхны тусламж үзүүлэх сургалтанд хамрагдсан.</li><li>- Ноцомхой, шатамхай шинж чанартай бодисын хадгалалтын аюулгүй байдлыг хангасны дээр гал унтраах хэрэгслүүдийг тохирох цэгүүдэд байршуулж, ажиллагааны бүрэн бүтэн байдлыг хянаж ажилласан.</li><li>- Химийн бодисын эрсдлийн менежмент бүлэгт хяналтын арга хэмжээнүүдийг дэлгэрэнгүй оруулсан ба шатах, тослох материалын агуулахыг зохих шаардлагын дагуу байгуулж, тухайн үйл ажиллагааг эрх бүхий хүн байнгын хяналтан дор явуулж байсан.</li><li>- Хамт хадгалахыг хориглосон химийн бодисыг тус тусад нь, химийн хорт болон аюултай химийн бодисыг зориулалтын агуулахад, хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан нөхцөлд хадгалж байна.</li><li>- Ашиглалтаас гарсан химийн бодисын шуудайг Аюултай хог хаягдал шилжүүлэх гэрээний дагуу Цэцүүх трейд ХХК-д шилжүүлсэн /Хавсралт 22/</li><li>- НБХХ-ээр ажилчдыг бүрэн хангаж, холбогдох сургалтуудыг зохион байгуулснаас гадна эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулсан.</li><li>- Химийн бодистой харьцах, түүнийг тээвэрлэх, хадгалах мэргэжлийн сургалтыг “Хэрлэн Эрдэс, Хими” ХХК-ий харьяа “Монголын Ур Чадвар Сургалт” сургалтын төв ажлын оффис дээр 2022-05-30 өдөр зохион байгуулсан.</li><li>- Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК нь мөн өөрсдийн химийн бодистой харьцаж ажиллах ажилчдыг химийн бодистой харьцах мэргэжлийн сургалтанд хамруулан сертификатжуулсан байсан /Хавсралт 23/.</li></ul>
---	--	---



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

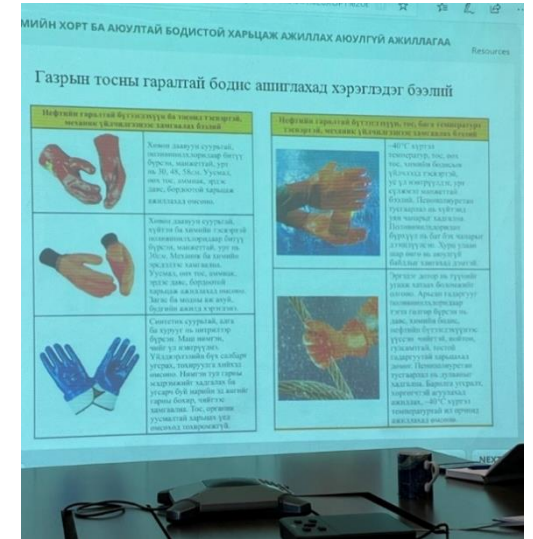



7.1. “Химийн бодисын эрсдлийн менежмент”-ийн төлөвлөгөө “Цацрагийн үүсгүүр”

Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хариуцах	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Химийн бодисын эрсдлийг бууруулахаар урьдчилан сэргийлж авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тусгай зориулалтын хадгалах сав, агуулахтай байна</li> <li>- Цацрагийн үүсгүүртэй харилцан ажиллах үнэмлэхтэй томилогдсон ажилтантай байна.</li> <li>- Цацрагийн үүсгүүр хариуцсан ажилтнуудад шаардлага хангасан ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангах ба хувцас солих байртай байна</li> <li>- Цацрагийн үүсгүүрийн хөдөлгөөн хийхдээ 2-оос доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байлцаж хөдөлгөөний тухай бүртгэлийн дэвтэрт нарийн тэмдэглэж, гарын үсэг зурж баталгаажуулж гаргана.</li> </ul>	<p>Петро Матад ХХК</p>	<p style="text-align: center;">" " " "</p> <p>Петроматад ХХК-ний нефтийн хайгуулын 5-р талбайд өрөмдсөн цооногт хийгдсэн цооногийн геофизикийн судалгаанд ашигласан цацрагийн үүсгүүрүүдийг “DQE INTERNATIONAL” ХХК болон “МОНКАРОТАЖ” ХХК -уудын хооронд байгуулсан гэрээний дагуу “Монкаротаж” ХХК -ний Цацрагийн хяналтын ажилтан Б.Болорхүү болон жолооч Б.Мөнхбаатар нар 2023 оны 6 сарын 28 нд Улаанбаатар хотоос гарч Дорнод аймгийн Халх Гол сумын нутагт байрлах “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ний 21-р талбайд байрлах Цацрагийн үүсгүүр хадгалах байрнаас / тайланд дурьдсан цацраг идэвхт үүсгүүрүүдийг, Дорнод аймгийн ЦЕГ-р болон холбогдох бусад байгууллагуудад мэдэгдэл хүргүүлж доорхи хүснэгтэд цөмийн цацрагийн үүсгүүрүүдийг өөрийн компаний зориулалтын дагуу бэлтгэсэн зөөврийн хадгалах контейнэрт байршуулан үүсгүүр хүлээлцэх акт үйлдэн хүлээн авч Цөмийн энергийн комиссийн батлагдсан маршрутын дагуу тээвэрлэлтийг хийж Өвөрхангай аймгийн Баруун баян-Улаан сумын нутаг дахь ВР-1 өрөмдлөгийн талбайд цацрагийн үүсгүүрүүдийг ашигласан болно. Ингэхдээ тээвэрлэлтэд 5 хоног, хадгалалтад 6 хоног зарцуулсан Хавсралт /34/ дэлгэрэнгүй тайлан харна уу.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="699 829 1331 1305"> </div> <div data-bbox="1346 829 1978 1305"> </div> </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span data-bbox="699 1325 1125 1357">Цацраг үүсгүүрийг хадгалах байр</span> <span data-bbox="1335 1325 2028 1357">Ионжуулагч цөмийн цацрагийн үүсгүүрийн тээвэрлэлт</span> </p>



## 7.2. “Химийн бодисын эрсдлийн менежмент”-ийн төлөвлөгөө “Тэсрэх бодис”

Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хариуцах	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Химийн бодисын эрсдлийг бууруулахаар урьдчилан сэргийлж авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ</b>		
Тэсрэх бодис хүлээн авах, олгох, ашиглах, хадгалах ажлыг хариуцсан тэсрэх бодистой харьцах үнэмлэхтэй ажилтантай байна.	Петро Матад ХХК	Өрөмдлөгийн үйл ажиллагааны явцад тэсрэх бодис ашиглах технологийн шаардлага байхгүй тул энэ төрлийн бодис хэрэглээгүй. Жич: хэрэв, өрөмдлөгөөр тосны илэрц ажиглагдсан бол, технологийн дараагийн үе шатанд бага хэмжээний тэсрэх бодис ашиглах шаардлага гардаг онцлогтой.
Тэсрэх бодис хариуцсан ажилтан, ачигч нарыг шаардлага хангасан ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангасан байна.		
Тэсрэх бодисын хөдөлгөөн хийхдээ 2-оос доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байлцаж орлого, зарлагын тухай акт үйлдэж, бүртгэлийн дэвтэрт гарын үсэг зурж баталгаажуулж байх.		



## 8. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Төслийн хэрэгжилтээс байгаль орчинд учирсан сөрөг нөлөөллийг үнэн зөв, бодитой үнэлэх үүднээс орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг, өрөмдлөгийн үйл ажиллагааны өмнөх, үйл ажиллагааны үеийн болон дараах үеийн гэсэн 3 үе шаттай хэрэгжүүлэхээр, байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээний мэргэжлийн байгууллага болох “Санлотус” ХХК, үйл ажиллагааны дараах хяналт шинжилгээний ажлыг гүйцэтгүүлэхээр “Эко Натур” ХХК-тай тус тус байгуулсан гэрээний дагуу хийж гүйцэтгүүлсэн байна.



“Санлотус” ХХК, Эконатур ХХК-ууд нь орчны хяналт-шинжилгээний ажлын үе шат бүрд хамаарах сорьц, дээжлэлт болон бусад хэмжилтүүдийг газар дээр нь хийж, үр дүнг гадаад болон дотоодын итгэмжлэгдсэн лабораториудад батлагдсан аргазүй, стандартын дагуу шинжлүүлэн, холбогдох тайлангуудыг тухай бүр нь ирүүлж ажилласан /Хавсралт 26, 27, 28/ болно. Үүнд:

- Үйл ажиллагааны өмнөх үе шатны орчны хяналт шинжилгээ – “Велосираптор-1” талбайн өрөмдлөг 2023-06-10-ны өдрөөс эхэлсэн ба уг үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх орчны хяналт-шинжилгээний ажлыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд гүйцэтгэж, холбогдох тайланг 2022-10-07-ны өдөр өгсөн,
- Үйл ажиллагааны үеийн орчны хяналт шинжилгээ – энэ судалгааг 2023 оны 07 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд гүйцэтгэсэн.
- Үйл ажиллагааны дараахь орчны хяналт шинжилгээ – тус талбайн өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа 2023-07-20 өдөр дууссан ба энэхүү 3 дахь үе шатны судалгааг, талбайн нөхөн сэргээлт бүрэн хийгдэж дууссаны дараа буюу 2023 оны 10-р сарын 3-5-ны хооронд хийж гүйцэтгэх тайланг 2023 оны 10-р сарын 25-нд хүлээлгэн өгсөн.




### 9. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ	Хариуцах	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ</b>		
Байгаль хамгаалах ажлын барьцаа хөрөнгө	Капкорп Монголиа ХХК	Онги V газрын тосны хайгуулын ажлын хүрээнд нийт байгаль орчны барьцаа хөрөнгө болгон байршуулсан 88,377,550 төгрөг байна. БОАЖЯ-ны нийт тооцооны үлдэгдлийн баталгааг /Хавсралт 5/-аас харна уу.
Байгаль хамгаалах ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх		2023 оны хайгуулын ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн боловсруулагдаж батлагдсан Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллахын зорилт болгон гэрээт байгууллагуудад БОМТ-ний хүрээнд хийгдэх ажлуудыг тодорхойлон байгууллагын дотоод БОМТ батлуулан хэрэгжүүлж ажиллах шаардан, хяналт тавьж ажилласан.
Ажилчдад байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг хамгаалах талаар сургалт зохион байгуулах		Талбай дээр ажиллах ажилчдад байгаль орчныг хамгаалах талаарх сургалт мэдээллийг өгч ажилласан. Сургалт мэдээллийг <ul style="list-style-type: none"><li>- Компаний байгаль орчны талаарх бодлого,</li><li>- Усны бохирдлоос сэргийлэх</li><li>- Орчны тоосжилт, хөрсний элэгдэл эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх</li><li>- Хөрсийг бохирдуулахаас сэргийлэх</li><li>- Ургамал амьтан хамгаалах</li><li>- Хог хаягдлын хяналт</li><li>- Химийн бодисын хяналт</li><li>- Түүх, соёлын өвийг хамгаалах</li><li>- Байгаль орчны зөрчлийг мэдээлэх</li></ul>
Болзошгүй осол аюулын үед орон нутгийн эмнэлгийн болон бусад холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэж хамтран ажиллах		Болзошгүй аюул осол үүссэн холбогдон хамтран ажиллахаар “Яаралтай үед хариу арга хэмжээ авах” төлөвлөгөөнд шаардлагатай үед холбогдох аймгийн онцгой байдлын газар, сум орон нутгийн эмнэлгүүдтэй холбогдохоор холбоо барих, хамтран ажиллахаар төлөвлөсөн байсан. Мөн хээрийн анги дээр эмнэлгийн тусламж үзүүлэхээр эмч, түргэн тусламж, эмчилгээний гэр амбултори, түргэний тэрэг байнга байрлаж ажилласан. Компани нь агаараар нүүлгэн шилжүүлэлт, яаралтай түргэн тусламж үзүүлэхээр ОУ-ын СОС байгууллагатай гэрээ хийж болзошгүй осол аваарийн үед хүндээр бэртсэн хүмүүсийг тээвэрлэхээр төлөвлөсөн. /Хавсралт 27/. Өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа талбай дээр явагдах үед талбай дээр ямар нэгэн осол аваар гараагүй болно.



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

<p>Гал түймрийн үед хэрхэн ажиллах талаар ажиллагсдын дунд сургалт зохион байгуулах</p>		<p>Гал түймрийн үед хэрхэн ажиллах талаарх сургалтын ажилчдад өгч шаардлагатай төлөвлөгөөнүүдэд тусган ажилласан. Болзошгүй осол аваарийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт хэсгээс дэлгэрэнгүй харна уу.</p>
<p>Ажлын байр, зам талбайд ХАБЭА-ны ба замын хөдөлгөөний дүрмийн тэмдэг, дохио, санамжуудыг хийж тавих</p>		<p>Ажлын байрны аюулгүйн тэмдэг тэмдэглэгээ, санамж, замын хөдөлгөөний зохицуулах тэмдэг тэмдэглэгээг ажил явагдах үед байрлуулан ажилласан.</p> 
<p>БОМТ-нд тусгагдсан ОХШХ -ийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, үр дүнгийн тайлангийн уулзалт хийж, гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах</p>		<p>ОХШХ-ийн тайлан Хавсралтаас харна уу.</p>
<p>Капкорп Монголиа ХХК нь үндсэн захиалагчийн хувьд туслан гүйцэтгэгч, гэрээлэгч нартай байгуулах гэрээнд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг байнга тусгаж өгнө.</p>		<p>Манай компани нь үндсэн захиалагчийн хувьд өрмийн гэрээт байгуулагчтай байгуулах гэрээний үед ХАБЭАБО-ны нэгдсэн хамтын баримт бичгийг боловсруулан гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлж ажиллахад хяналт тавьж ажилласан. ВР-1 талбайн нөхөн сэргээлтийн ажлыг манай компани өөрсдөө хариуцан хийхээр төлөвлөсөн. Тиймээс гэрээт байгууллагад үйл ажиллагааны үед байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх аливаа бохирдол доройтлоос урьдчилан сэргийлж ажиллахад анхаарал хандуулсан.</p>



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Сейсмийн хайгуул судалгаа, өрөмдлөгийн ажлын үеийн хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуй, байгаль орчны хамгаалалд, туслан гүйцэтгэгч нарт хяналтыг тогтмол тавьж ажиллана		Энэ жилийн хайгуул судалгааны ажлын хүрээнд сейсмийн ажил хийгдээгүй.
Капкорп Монголиа ХХК нь тухайн үйл ажиллагаа явагдах орчны баг, сум, аймгийн БО-ны газар, засаг дарга, ИТХ тэргүүлэгч, газрын даамал зэрэгтэй үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө уулзалт хийж, хийгдэх ажлын танилцуулга, холбогдох зөвшөөрөл, төлөвлөгөө, арга хэмжээнүүдийг танилцуулан, үйл ажиллагааг эхлүүлэх зөвшөөрөл мэдэгдлийн дагуу ажлыг эхлүүлэх ба үйл ажиллагааны явцад тогтмол мэдээ мэдээллээр хангах, хяналт шалгалт тавих нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллана.		Манай компаний зүгээс ажил эхлэхээс өмнө сумын засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өрөмдлөгийн ажлын талаар холбогдох мэдээлэл танилцуулгыг тухай бүр хийж харилцан зөвшилцөх шаардлагатай зүйлсийг хэлэлцэж шийдвэрлэж, шаардлагатай зөвшөөрлийг авч ажилласан.

**10. БОМТ -НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨХ ОРШИН СУУГЧИД, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ**

<b>БОМТ -ний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөх оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах ажлын хэрэгжилт</b>	Хариуцах	Хэрэгжүүлсэн байдал
<b>БОМТ-ний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөх оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах ажлын хэрэгжилт</b>		
Сум орон нутгийн төрийн байгууллагуудад (Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, орон нутагт – ажил эхлэхийн өмнө танилцуулах уулзалт)	Капкорп Монголиа ХХК	Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 2022 оны сүүлээр төслийн талаар танилцуулга уулзалт, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан ажлын хүрээнд багийн иргэдийн хуралд танилцуулгыг тус тус хийсэн.





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан



- ◁ 2023 оны 5-р сарын 12-14-ний хооронд Капкорп Монголиа ХХК-ний Орон нутгийн хэлтэсийн ажилтанууд Баруунбаян-Улаан сум, Багийн Засаг дарга Г.Пүрэвсүрэнгийн хамт өрөмдлөгийн талбай орчмын малчин өрх болох Н.Бэгзсүрэн, Н.Бямбадорж, П.Молом, С.Бямбасүрэн нартай уулзаж “Онги V” талбайд хийгдэх хайгуулын ажлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулж харилцан санал солилцон, өргөн хүрээтэй ярилцлаа.



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан



Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яам

БОМТ-ний биелэлтийн тайланг холбогдох хууль журмын хугацаанд БОАЖЯ-нд илгээж тайлагнана.



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Ашигт Малтмал Газрын Тосны Газар,  
Уул Уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн Яам

Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, АМГТГ-ын хамтран, БХГ-т Онги V талбайн жилийн уулзалтын хүрээнд хайгуулын ажлын төлөвлөгөө төсвийг танилцуулсан.





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

ВР-1 өрөмдлөгийн ажлын явагдаж байх хугацаанд сум орон нутгийн удирдлагууд, АМГТГ-ын холбогдох хүмүүс талбай дээр ирж ажлын явц байдалтай тухай бүр танилцаж байсан.



Баруунбаян-Улаан сумын засаг дарга, сумын байгаль орчны улсын байцаагч, цагдаа нар өрөмдлөгийн үйл ажиллагаатай танилцсан.



АМГТГ-ын Газрын тосны хайгуулын хэлтсийн мэргэжилтнүүд өрөмдлөгийн талбай, ажилтай танилцсан.



## 11. 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардлын хураангуй

“Капкорп Монголиа” ХХК нь жил бүрийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ)-ний хүрээнд хүрээлэн буй орчныг сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнүүдийг тус тус төлөвлөж, хэрэгжүүлж ирсэн ба доорхи хүснэгтэд эдгээр үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал, зарцуулсан төсвийн хураангуйг үзүүлэв.

№	Арга хэмжээ	БОМТ нийт төсөвлөсөн зардал төг 2023	Төсвийн гүйцэтгэл, төг	Тайлбар
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө	13,000.0	13,000.0	Гэрээт гүйцэтгэгч “Мэжор Дрилинг” ХХК, өрмийн талбайн бэлтгэл ажлын Монбаг ХХК, кемпийн үйлчилгээний гэрээт гүйцэтгэгч Геомин ХХК-д байнгын хяналт тавьж, хамтарч ажиллав.
2	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө	74,492.0	78,000.0	Баянтал Энержи ХХК-тай гэрээ байгуулан, хяналт тавьж нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэв.
3	Болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	4,000.0	4,000.0	Аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг боловсруулан гэрээт байгууллагуудад хэрэгжүүлэх үед хяналт тавьж ажилласан.
4	Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	8,000.0	8,000.0	Хог хаягдлын төлбөр, бохир ус зайлуулсан төлбөр, бохирын септик систем г.м ажлын зардлууд гэрээний дагуу эдгээр ажлын зардлууд нь өрөмдлөгийн гэрээний тусгагдсны дагуу шийдэгдсэн.
5	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө	4,340.0	4,340.0	АМГТГтай хамтарсан жилийн уулзалт, сум орон нутагтай хийсэн уулзалтууд
6	Тухайн жилийн БОМТ, түүний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч, сонирхогч талуудад тайлагнах, хэлэлцүүлэх хуваарь	2,000.0	15,000.0	Нөлөөллийн бүс дэх малчин айл өрхүүдтэй хийсэн уулзалтын зардал
7	Химийн бодисын эрсдлийн менежмент	4,000.0	4,000.0	Өрмийн гэрээт компанид хяналт тавьж ажилласан
8	Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр	40,520.0	28,000.0	3 удаагийн давтамжтайгаар хийж гүйцэтгэсэн.
<b>Нийт зардал</b>		<b>150,352.0</b>	<b>154,340</b>	



## Дүгнэлт

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн энэхүү тайлан нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/618 дугаар тушаалын хавсралт болох “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө /БОМТ/ боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ыг удирдамж болгон боловсруулагдсан ба 1-р бүлэгт “Петро Матад” ХХК-ий хайгуулын өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа, дараагийн бүлгүүдэд менежментийн төлөвлөгөөний 11 зүйл зорилтот ажлын биелэлтийг багцлан хүргэж, зураг ба хавсралтаар тус тус харуулав.

“Капкорп Монголиа” ХХК нь Монгол улсын Засгийн газартай 2009 онд байгуулж, 2018 онд шинэчлэн баталсан “Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ” /БХГ/ бүхий “Онги-V” блокод газрын тосны хайгуулын өрөмдлөгийн ажлыг Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан сумын Өлзийт хошуу 3-р багийн нутагт “Велосираптор-1” цооногийг өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч “Мэжор Дрилинг” ХХК-тай хамтран, 2023 оны 6 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2023 оны 07 дугаар сарын 20-ний өдөр хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэж, төслийн үйл ажиллагааг дуусгасан болно. Дээрх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх явцдаа, өрөмдлөгийн ажлыг олон улсын чанар стандартад нийцүүлэн, байгаль орчинд учрах сөрөг нөлөөллийг аль болох бага байлгах, ажилчдын эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн дүүрэн сахиулах, орон нутгийн засаг захиргаа, иргэдтэй нягт хамтарч, холбогдох мэдээ мэдээллийг солилцож, дэмжин ажиллахыг зорьж ирсэн ба үүний тулд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн биелэлтдээ байнга анхаарч, хяналт тавьж байв.

Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчин, нийгэмд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, хор хохирлыг бодитоор, хараат бусаар үнэлж, дүгнэх, хөндлөнгийн хяналт-шинжилгээний ажлыг “Санлотус” ХХК, Эконатур ХХК-иар 3 үе шаттай (үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө, дунд ба дараа гэсэн) гүйцэтгүүлж, тээврийн хэрэгслийн нүүдэл шилжилт хөдөлгөөнд нэг замын бодлогыг чанд баримталж ажиллав. /Хавсралт 18/.

Төслийн хэрэгжилтээс, байгаль орчинд учирч болох гол сөрөг нөлөөлөлд хог хаягдал (хуурай, шингэн ба химийн болон аюултай хог хаягдал), хөрс ба ургамал (хөрсний бохирдол, ургамлын талхлагдал), болзошгүй сөрөг нөлөөлөлд агаарын бохирдол (тоос ба дуу шуугиан), ус ашиглалт (гүний ус), гал түймэр зэрэг хүчин зүйлүүд тус тус хамаарах /1 ба 2/ нөхцөлтэй ба хог хаягдлуудыг тусгаарлагч бүхий зориулалтын сав, агуулах талбайд тусад нь ангилан ялгаж, цаг тухай бүр гэрээний дагуу ачуулах буюу хүргэхээс гадна агаарын бохирдол, хөрс, ургамлын талхлагдлаас сэргийлэн нэг замаар зорчих, зам талбайг тэмдэгжүүлэх, сул явалтыг зогсоох зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн нь дээрх төрлийн бохирдлыг хязгаарлах хүчин зүйл болсон.

Ажилчдын ундны усыг зөөврөөр буюу савласан усаар хангаж байсан ба технологийн хэрэгцээний гүний худагт усны тоолуур суурилуулж, сумын байгаль орчны байцаагчаар баталгаажуулан (хяналтын лац тавиулан) ашигласан нь усны нөөцийг арви гамтай зарцуулах нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. Усны төлбөрийг тоолуурын заалтаар төлж ирсэн ба ахуйн хэрэглээний бохир усыг Онги-Ус сувгийн харьяа Хайрхандулаан сумын бохир ус цэвэрлэх байгууламж руу нийлүүлж байсан нь усны нөөц, хөрсийг бохирдлоос сэргийлсэн чухал арга хэмжээ болсон юм.

Байгаль орчныг хамгаалах ажилд зориулан 150,352,000 төгрөг төлөвлөснөөс нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгийн дансанд өмнөх хайгуулын ажлын үе шатанд байршуулсан 88,377,550 сая төгрөг байршуулсан, бусад төлөвлөгөөт арга хэмжээний хүрээнд нийт 154,340,000 төгрөг буюу 100% гүйцэтгэлтэй гарав.

Мөн, ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэг, хяналтыг тогтмол хийж ирсэн ба “БОМТ-2023”-д тусгасан нийт 11 бүлгийн 60 гаруй ажлыг энэхүү тайлант хугацаанд амжилттай хийж гүйцэтгэв.



### Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажлын хүрээнд орон нутгийг дэмжих, нийгмийн хариуцлагийн хүрээнд хийгдсэн ажил


Капкорп Монголиа ХХК-ниас энэ онд өрөмдсөн Велосираптор цооногийн өрөмдлөгийн ажлын хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус, Баруунбаян-Улаан сумдад орон нутгийг дэмжих ажлууд, төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байна. Эдгээр ажлууд нь компаний орон нутгийг дэмжих сангаас санхүүжүүлэгддэг. Үүнийг доор дэлгэрүүлбэ.

1. Гучин-Ус сумын 2-р сургуулийн анги танхим, тэр дундаа физикийн танхим, номын санд орчин үеийн электрон ухаалах самбар дэлгэц, сурагчийн ширээ сандал, проектор, ангид шкаф, багшийн ширээ зэргээр бүрэн тохижуулсан. Нийт санхүүжилт нь 55,845,800 төгрөг.



Ухаалаг дэлгэцээр ангиудыг тохижуулсан байдал



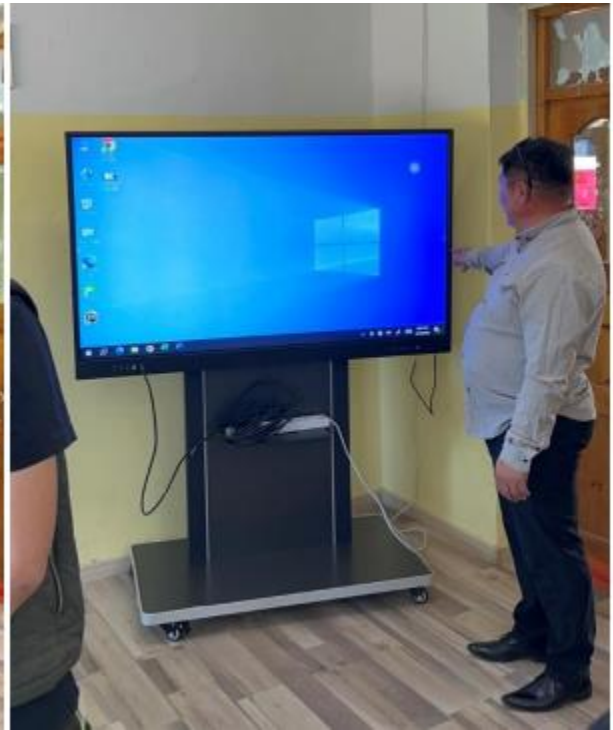

Физикийн анги танхимыг ширээ сандалаар тохижуулсан байдал



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан



Шкаб, паркетан шал



Номын сангийн тохижилт



2. Баруунбаян-Улаан сум, Гучин-Ус сумдын нутагт бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2 гүний худаг гаргасан. Нийт санхүүжилт 70,000,000 төгрөг.



Гучин-Ус суман дахь худаг



Баруунбаян-Улаан суман дахь худаг



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан


# ХАВСРАЛТ



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан


Хавсралт 1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

УБ-2 Монгол Улсын Засгийн газрын  
2004 оны 29 дугаар тогтоолоор батлав.




## МОНГОЛ УЛС

# УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ



2006.08.15 <i>/Бүртгэсэн өг. сар, өдөр/</i>	9019014069 <i>/Улсын бүртгэлийн дугаар/</i>	
	5077982 <i>/Регистрийн дугаар/</i>	
Си Эй Пи Си <i>/Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр/</i>	ХХК - Гадаадмж хөрөнгө оруулагчтай <i>/Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр/</i>	
Дүрэм <i>/Үүсэн байгуулах баримт бичиг/</i>		
Тушаал <i>/Лийдгээрийн нэр/</i>	А-2464 <i>/Дугаар/</i>	2006.08.14 <i>/он, сар, өдөр/</i>
511000 <i>/код/</i>	Гадаад худалдаа <i>/Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/</i>	
/код/	/Туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл/	
1 <i>/хугацаа/</i>	1 <i>/гшүүдийн тоо/</i>	11,600.0 <i>/өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгсөр/</i>
Баянзүрх, 1-р хороо, 12-р хороолол, Нисова цамхиг - 902, утас1:463763, утас2:463761, факс: <i>/Хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг/</i>		



Улсын бүртгэлийн алба  
*/Бүртгэсэн өг.с/ууллагайн нэр/*  
УХА0175



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Хавсралт 2. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл

МОНГОЛ УЛС  
УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ



**АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ**

20 . . 21 . . 09 . . 09 . . 09 өдөр      Дугаар . . . . . 736      Улаанбаатар хот

<i>Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл</i>	Газрын тос хайх
<i>Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр</i>	“Капкорпмонголиа” ХХК
<i>Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг</i>	Улаанбаатар, Сүхбаатар, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө 17, Блю Скай Тауэр, 508 тоот
<i>Регистрийн дугаар</i>	5077982
<i>Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа</i>	2 /хоёр/ жил. 2023.07.29 хүртэл
<i>Тусгай нөхцөл, шаардлага</i>	

Холбогдох хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангаж, Газрын тосны тухай хууль, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр хүлээсэн үүрэг болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үүргээ биелүүлж ажиллах.

*Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн Сайдны 2023.09.09 өдрийн А/242 дугаар тушаалыг үндэслэн олгов.*

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,  
УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД




Г.Бендон



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Хавсралт 3. Газар ашиглах зөвшөөрөл

  
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ  
БАРУУНБЯАН-УЛААН СУМЫН  
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2022 оны 05 сарын 11 өдөр      Дугаар 4/60      Баруунбаян-Улаан сум


Гэрээ байгуулан хяналт тавьж ажиллах тухай


Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.13, 59.1.16, 59.1.18, 66 дугаар зүйлийн 66.1, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.2, Газрын тосны тухай хууль 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.3.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуралдааны 25 дугаар тэмдэглэлийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Монгол Улсын засгийн газрын 2009 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 235 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын "ОНГИ V" талбайд газрын тосны хайгуулийн өрөмдлөгийг 3 сарын хугацаатай хийж хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахыг "Капкорп Монголиа" ХХК болон туслан гүйцэтгэгч компанид зөвшөөрсүгэй.

2. Дээрхи ажлын хүрээнд хээрийн анги байрлах газар болон зам ашиглалтанд зөвшөөрөл олгосугай.

3. Хог хаягдал, технологийн болон ундны усны ашиглалтын гэрээг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу байгуулан үйл ажиллагаа явуулах хугацаанд хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч (Б.Даваадавга)-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА  Д.БААТАРЧУЛУУН




622211128

D/My doc alban bichig Zahiramj A4.doc



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Хавсралт 4. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газрын хилийн заагтай давхцалгүй болох тухай лавлагаа

  
**МОНГОЛ УЛСЫН  
БАЙГАЛЬ ОРЧИН,  
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ**  
15180 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  
Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр,  
Утас: 28 19 66, Факс: (976-51) 28 61 71,  
И-мэйл: contact@mne.gov.mn, Вэбсайт: www.mne.mn

2022.06.07 № 06/3178  
Танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т


**"КАПКОРП МОНГОЛИА" ХХК-НЫ  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  
А.ГЭРЭЛТ-ОД ТАНАА**

Танай компаниас ирүүлсэн 018/022 тоот албан бичигт дурдсан өрөмдлөгийн талбай нь Засгийн газрын 2012 оны 194 дүгээр тогтоолоор баталсан Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газрын хилийн зааг, Засгийн газрын 2015 оны 289 дугаар тогтоолоор баталсан Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүстэй тус тус давхцалгүй байна.

Зурган мэдээллийг хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай.

ХҮРЭЭЛЭН БҮЙ ОРЧИН,  
БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН  
УДИРДЛАГЫН  
ГАЗРЫН ДАРГА

  
А.ГАНБАТ

15170050





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан



ЛАВЛАГАА

"КАПКОРП МОНГОЛИА" ХХК



<p><b>Таних тэмдэг</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Гадаргын ус</li> <li>Гол</li> <li>Тур урсгалтай гол</li> <li>Нуур</li> <li>Байгалийн шаргадэг</li> <li><b>Хамгаалалтын бүсүүд</b></li> <li>Хамгаалалтын бүс (Засаг даргын захирамжаар)</li> <li>Сэргэсэн голын хамгаалалтын бүсийн хил (хууль 200 метр)</li> <li>Гол мөрний урсац бүрэлдэх зөвийн хил</li> <li>Нуурын хамгаалалтын бүсийн хил (хууль 200 метр)</li> <li>Голын хамгаалалтын бүс (хууль 200 метр)</li> <li>Бүтэйн хамгаалалтын бүс (хууль 200 метр)</li> </ul>	<p><b>Засаг захиргааны хил</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Аймагын тус</li> <li>Сумын төв</li> <li>Сумын хил</li> <li>Аймагын хил</li> <li><b>Улсын ТХГН -ийн сүлжээ</b></li> </ul>
--	--

МАСШТАБ 1:8,750

**ХҮРЭЭЛЭН БҮЙ ОРЧИН, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ГАЗАР**  
**Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын хэлтэс**



Засгийн газрын 2012 оны 194, 2015 оны 289-р тогтоолоор батлагдсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газар, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, орон нутгийн усны энгийн болон онцгой хамгаалалтын бүстэй тус тус давхцалгүй байна.

Боловсруулсан: мэргэжилтэн Х.Номин

Огноо: 6/6/2022



Хавсралт 5. Байгаль орчны барьцаа хөрөнгө байршуулсан тооцооны үлдэгдлийн баталгаа

<b>НХМаягт Т-3</b>		Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны тоот тушаалын хавсралт	
<b>ТООЦООНЫ ҮЛДЭГДЛИЙН БАТАЛГАА №</b>			
<b>Нэхэмжлэгч:</b>	<b>Төлөгч:</b>		
Байгууллагын нэр: Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яам	Байгууллагын нэр: Капкорп Монголиа ХХК		
Хаяг: Улаанбаатар 15160, Чингэлтэй дүүрэг Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр	Хаяг: Улаанбаатар 15000, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Блю скэй тауэр, 508		
Утас, факс: (976-51) 261966 Э-шуудан: _____	Утас, факс: 70141099 Э-шуудан: _____		
Банкны нэр: БО нөхөн сэргээх баталгаа Банкны дансны дугаар: 100900013406	Банкны нэр: Капкорп Монголиа ХХК Банкны дансны дугаар: 5003 245 443		
<b>ТООЦОО НИЙЛСЭН ДАНСНЫ №</b>			
<p>Нэхэмжлэгчийн нэрийн өмнөөс ерөнхий нягтлан бодогч ажилтай Оюунчимэг нь төлөгчийн нэрийн өмнөөс нягтлан бодогч ажилтай Ширдорж овогтой Мөнхнарантай тус хоёр байгууллага хооронд 2015 оны 01 сарын 01 өдрөөс 2022 оны 05 сарын 04 өдрийг дуустал хугацаанд өгч авалцсан зүйлээ хоёр байгууллагад хөтлөгдөж буй нягтлан бодох бүртгэлийн дэлгэрэнгүй ба хураангуй бүртгэлийн бичилтээр нэг бүрчлэн нийлж үзэхэд Капкорп Монголиа ХХК нь БО нөхөн сэргээх баталгааны 100900013406 тоот дансанд 88,377,550 төгрөг (наян найман сая гурван зуун далан долоон мянга таван зуун тавин төгрөг 00 мөнгө) төлж байршуулсан нь үнэн болохыг харилцан батлав.</p>			
(Тэмдэг)	Нэхэмжлэгч байгууллагын нягтлан бодогч	 <i>А. Оюунчимэг</i> 2022.04.18.	
	Төлөгч байгууллагын нягтлан бодогч	<i>Ш. Шотнарал, Ш. Илж</i> 2022.05.09 эцэст авсан.	



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Хавсралт 6. Ус ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлт

  
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ  
**УСНЫ ГАЗАР**  
Чингүнжавын гудамж, 2 дугаар хороо,  
Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, 16050  
Утас/Факс: (976-51) 26 55 78, (976-51) 26 55 36,  
Цахим шуудан: office@water.gov.mn,  
Цахим хуудас: www.water.gov.mn

2023.05.05 № 01/595  
танай 2023.04.21-ны № 038/023-Т

\*КАПКОРП МОНГОЛИА\* ХХК-Д

"Усны тухай" хуулийн 16.4.10 дахь заалтыг үндэслэн Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан сумын нутагт танай компанийн хэрэгжүүлэх "Газрын тосны хайгуулын цооног өрөмдөх" төслийн ус хангамжийн эх үүсвэр өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, холбогдох бусад материалыг судлан үзээд усны ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлтийг дахин гаргаж хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт: 2 хуудастай.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ  
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  Я.БОЛДБААТАР



162331275



### УСНЫ АШИГЛАХ БОЛОМЖИТ НӨӨЦИЙН ДҮГНЭЛТ

2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр

Дугаар-65

Улаанбаатар хот Утас: 51-265526, 265528

**1. Төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага:**

"Капкорп монголиа" ХХК, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, "НИК" ХК-ий байр, 406-407 тоот. Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019014069, Регистрийн дугаар: 5077982. Утасны дугаар: 331099, 321799

**2. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ боловсруулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага:**

"Эконатур" ХХК,

**3. Төслийн нэр, байршил:**

"Газрын тосны хайгуулын цооног өрөмдөх" төсөл нь Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан сумын нутагт хэрэгжих бөгөөд Таац голын сав газарт хамаарна.

**4. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэр, төрөл, зориулалт:**

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2021 оны 09 сарын 09-ний өдрийн 736 дугаартай аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлтэй.

**5. Төслийн хүчин чадал, ажиллах горим:**

Төсөл нийт 1 жилийн хугацаанд хэрэгжих бөгөөд жилд 6,000.0 тууш метр өрөмдөхөөр төлөвлөсөн. Төсөлд 80 ажилтан, жилд 120 хоног ажиллана.

**6. Усны эх үүсвэр, байршил:**

Төслийн усны хэрэглээг 2018 онд Гучин-ус сумын Аргалант багт гаргасан өөрийн эзэмшлийн гүний худгаас хангана. Худгийн байршил  $101^{\circ} 50' 0.75''$ ,  $45^{\circ} 10' 25.19''$ , ундарга 3.0 л/сек.

**7. Ашиглах усны хэмжээ:**

Төслийн жилийн усны хэрэглээг БОНХАЖ-ын Сайдын 2015 оны А/301 дүгээр тушаалаар баталсан "Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм"-оор тооцоход:

Ажилчдын ундны усны хэрэглээ:

$$80 \text{ хүн} \times 30 \text{ л/хон} = 2.4 \text{ м}^3/\text{хон} (288.0 \text{ м}^3/\text{жил});$$

Өрөмдлөгийн ажлын технологид:

$$\text{Шавар уусмал хэрэглэн өрөмдөхөд } 43 \text{ м}^3 \times 60 \text{ хон} = 2,580.0 \text{ м}^3/\text{жил};$$

Туршилтын ажлын технологид: Нэг цооногт 3 давхар туршилт хийхэд (өрөмдлөгийн хайгуул хийж гүйцэтгэсний дараа туршилт хийгдэх эсэх тодорхойлогдоно)

$$74 + 3 \times 36 + 3 \times 4 = 192 \times 2 \text{ (нийт 2 цооног)} = 388.0 \text{ м}^3/\text{жил} (12.93 \text{ м}^3/\text{хон})$$

Шингэн хагалбарын ажлын технологид: (өрөмдлөгийн хайгуул хийж гүйцэтгэсний дараа шингэн хагалбар хийгдэх эсэх тодорхойлогдоно)

$$2 \times 1,470.0 \text{ м}^3 = 2,940.0 \text{ м}^3/\text{жил} \text{ (жилд 39 хоног ажиллана)}$$

Зам талбайн тоосжилт дарах усалгаанд:

$$5,000.0 \text{ м}^2 \times 2 \text{ л} = 10.0 \text{ м}^3/\text{хон} \times 12 \text{ (жилд услах хоногийн тоо)} = 120.0 \text{ м}^3/\text{жил};$$

**Нийт усны хэрэглээ  $143.71 \text{ м}^3/\text{хон} (6,316.0 \text{ м}^3/\text{жил})$**





**8. Дүгнэлт:**

Төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардагдах ажилчдын унд ахуй, технологи, туршилтын технологи, зам талбайн усалгааны  $143.71 \text{ м}^3/\text{хон}$  усны хэрэглээг  $3.0 \text{ л/сек}$  ( $259.2 \text{ м}^3/\text{хон}$ ) ундаргатай гүний худгаас хангахад усны ашиглах боломжит нөөцийн хэмжээ хүрэлцээтэй байна.

**9. Тавих шаардлага, цаашид авах арга хэмжээ, зөвлөмж:**

-Төслийг хэрэгжүүлэхдээ "Усны тухай" хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, 24.4, 28 дугаар зүйлийн 28.4, 28.9, 30 дугаар зүйлийн 30.1 дэх заалтуудын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;


-Төслийн ус хангамжийн эх үүсвэрт ашиглах худгийн мэдээллийг Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгахыг "Капкорпмонголиа" ХХК-д зөвлөж байна.

УСНЫ НӨӨЦИЙН  
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Б.МӨНГӨНТУУЛ



Хавсралт 7. Ус ашиглуулах дүгнэлт

  
**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ  
ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР  
ДҮГНЭЛТ**

Нутгийн удирдлагын ордон, П.Гэндэнгийн гудамж,  
5 дугаар баг, Арвайхээр сум, Өвөрхангай аймаг, 52173.  
Утас: (976) 7032 3260,  
Цахим шуудан: Uvurkhangainature@gmail.com  
Цахим хуудас: www.Uvurkhangai-baigal\_orchin.com

2023.05.12 № 05/05  
танай 2023.04.25-ны № 040/025 -Т

Ус ашиглуулах дүгнэлт  
хүргүүлэх тухай

1. **Аж ахуйн нэгж байгууллага, захирлын нэр, хаяг, утас, факс, улсын бүртгэлийн дугаар болон регистрийн дугаар:** "Капкорп Монголиа" ХХК, улсын бүртгэлийн дугаар 9019014069, регистрийн дугаар 5077982, гүйцэтгэх захирал А.Гэрэлт-Од, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Энхтайваны өргөн 17, Блюскай Тауэр, 508 тоот. Улсын бүртгэлийн дугаар 9019014069, реистрийн дугаар: 5077982. Утасны дугаар: 331099, 321799

2. **Төслийн байршил, харъяалагдах сав газар:** Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан сумын нутаг, Таац голын сав газар.

3. **Төсөл хэрэгжүүлэгч:** "Капкорп Монголиа" ХХК

4. **Тусгай зөвшөөрлийн дугаар болон талбайн хэмжээ, координат (X,Y):** Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2021 оны 09 сарын 09-ний өдрийн 736 дугаартай аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлтэй. Цооногт шингэн хагалбар хийх тохиолдолд өрөмдлөгийн үед ашиглагдаж байсан 150м х 200м буюу 3 га талбай/2 өрөмдлөгт адил хэмжээний газрын хуваарилалттай тул үндсэндээ 6 га талбай хамрагдана,

101° 75' 078"	45° 11' 918"
101° 75' 282"	45° 06' 313"
101° 89' 685"	45° 12' 174"
101° 87' 456"	45° 06' 584"

5. **Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэр төрөл, зориулалт:** Газрын тосны хайгуул, судалгааны ажил.

6. **Үйлдвэрийн техник, технологи, ажиллах горим, хүчин чадал:** Өрөмдлөгийн ажилд өрмийн цамхаг, титэм блок, өргөх төхөөрөмж, вертлюк сальник, ротарын тавцан зэрэг тоног төхөөрөмж ашиглана. Нийт 80 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 60 хоногийн хугацаанд 2 цооног өрөмдөх ба өрмийн цамхагийг буулгах, зөөвөрлөх, буцаан барих зэрэг нэг цооноогоос нөгөөд шилжих хугацаа 60 хоногт, нийт 120 хоногийн хугацаанд цооног өрөмдлөгийн ажил явагдана.

7. **Үйлдвэрлэх, боловсруулах бүтээгдэхүүний хэмжээ:** Ордыг ашиглалтанд бэлтгэх зорилгоор өрөмддөг, хайгуулын цооноогоос ордын горимын үзүүлэлтүүд, агуулагч чулуулгийн шинж чанар, давхаргын нефть, хий, усны шинж чанар зэргийг тодорхойлох зорилгоор ашигт үе давхаргаас гулууз дээж авна.

8. **Усны эх үүсвэр, нөөц, хоногт ашиглах хэмжээ:** Төслийн усны хэрэглээг 2018 онд Гучин-Ус сумын Аргалант багт гаргасан 101° 50' 0,75" 45° 10' 25,19" цэгт байрлах гүний худгаас хангана. Усны газрын 2023 оны 05 сарын 05-ны өдрийн 65 дугаартай усны ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлтийг хайгуулын үйл ажиллагаанд хоногт 143,71 м³/хон ашиглахад хүрэлцээтэй гэж үзсэн байна.

9. **Усны барилга байгууламжууд /нэр, хүчин чадал, хэмжээ, хийц, дамжуулах шугам сүлжээний урт, диаметр/:**



10. Худаг, өргөлтийн станцууд, усны тоолуур /насосны хүчин чадал, марк/:  
Тоолуур суурилуулаагүй.

11. **Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, нөхцөл:** Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан 2022 онд "Эко натурл" ХХК-р хийлгэсэн.

**Дамжуулах байгууламж /шугам сүлжээний урт, диаметр/:** Гүний усны машинаар зөөвөрлөн ашиглана.

12. **Онцгой нөхцөл:** Цэвэр, бохир ус шугамнаас шүүрэлтээр алдагдахаас сэргийлэх, хяналт байнга тавих.

13. **Холбогдох хууль, дүрэм, журам, норм стандартын дагуу усны зарцуулалтыг тооцох:**

- Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/301 дугаар тушаалаар баталсан "Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны түр норм"-оор тооцоход:

Ажилчдын унд, ахуйд:

$$245 \text{ хүн} \times 20 \text{ л/хон} = 4,9 \text{ м}^3/\text{хон} \times 60 \text{ хон} = 294,0 \text{ м}^3/\text{жил}$$

Өрөмдлөгийн ажлын технологид:

$$43,0 \text{ м}^3 \times 60 \text{ хон} = 2580,0 \text{ м}^3/\text{жил}$$

Туршилтын ажлын технологид:

$$37 + 3 \times 27 + 3 \times 4 = 130 \times 2 \text{ цооног} = 260,0 \text{ м}^3/\text{жил}$$

Шингэн хагалбарын ажлын технологид:

$$2 \times 350,0 \text{ м}^3 = 700,0 \text{ м}^3/\text{жил}$$

Олборлолтын туршилтын үед:

$$2 \times 15 = 30,0 \text{ м}^3/\text{жил}$$

Зам талбайн тоосжилт дарах усалгаанд:

$$2500,0 \times 2 \text{ л} = 5,0 \text{ м}^3/\text{хон} \times 12 \text{ (услах хоногийн тоо)} = 60,0 \text{ м}^3/\text{жил}$$

**Нийт усны хэрэглээ:**

$$294,0 + 2580,0 + 260,0 + 700,0 + 30,0 + 60,0 = 3924,0 \text{ м}^3/\text{жил} \text{ ус шаардлагатай}$$

байна.

14. **Холбогдох хууль, тогтоол шийдвэрийн дагуу оногдуулах усны нөөцийн төлбөрийг урьдчилсан байдлаар тооцоход:** Үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд ашиглах **3924,0 м<sup>3</sup>** усны төлбөрийн хэмжээг Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоолоор Онги голын сав газарт тогтоосон газрын доорх усны экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээ, "Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай" Засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолд заасан ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр, "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай" Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар тогтоосон усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг ашиглан тооцож, тогтоосон хэмжээгээр "Төсвийн тухай" хуулийн 23.6.5-д заасны дагуу ус ашиглах гэрээнд заасан хугацаанд аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх нь зүйтэй.

15. **Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд усны нөөцийг хэмнэх эргүүлж ашиглах даалгавар:** Усны нөөцийг хэмнэх зүй зохистой ашиглах үүднээс усыг дахин ашиглах дэвшилтэт технологийг судалж нэвтрүүлэх. Усны алдагдлыг багасгах зорилгоор шугам хоолой болон хаалт, насосын үзлэг, үйлчилгээг тогтмол хийж байх.

16. **Тавигдах шаардлага, цаашид авах арга хэмжээний талаарх зөвлөмж**

- Энэхүү дүгнэлтийг үндэслэн Усны тухай хуулийн 13.1.5-д заасны дагуу Гучин-Ус сумын Засаг даргаас ус ашиглах зөвшөөрөл авах;

- Мөн хуулийн 19.1.4-д зааснаар Гучин-Ус сумтай ус ашиглах гэрээ байгуулж, эрхийн бичиг авч, гэрээг аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт бүртгүүлэх;


- Ус ашиглах зөвшөөрөл, гэрээнд заасан хэмжээнээс хэтрүүлэн ашиглахгүй байх;



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

- Хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрөл авах, төвлөрсөн ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх;
- Усны нөөц ашигласны болон ус бохирдуулсны төлбөр төлөх;

ХЯНАСАН: ДАРГА  БАЯСГАЛАН


ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН: УСНЫ НӨӨЦИЙН  
АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫН АСУУДАЛ  
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН  Б.ЭНХСҮРЭН





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Хавсралт 8. Ус ашиглах зөвшөөрөл, гэрээ


  
**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ  
ГУЧИН-УС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ЗАХИРАМЖ**


2023 оны 05 сарын 17 өдөр  
Дугаар А/73  
Гучин-Ус сум

**Ус ашиглах зөвшөөрөл олгож  
гэрээ байгуулах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1, Усны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.5, 28 дугаар зүйлийн 28.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх хэсэг, аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 03/03 дугаартай дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

- 1."Капкорн Монголиа" ХХК-ийн хайгуулын өрөмдлөгт зориулж  $45^{\circ}10'13.58"N$ ;  $101^{\circ}57'38,29"E$  солбилцол бүхий худгаас ус ашиглах зөвшөөрөл олгосугай.
- 2."Капкорн Монголиа" ХХК-тай ус ашиглах гэрээ байгуулан, эрхийн бичиг олгон бүртгэж, мэдээллийн сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хүргүүлж ажиллахыг Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч (М.Долгорсүрэн)-д үүрэг болгосугай.
- 3.Энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч (М.Долгорсүрэн)-д даалгасугай.

**ЗАСАГ ДАРГА**  **У.ЭНХТАЙВАН**



My doc.D.Zahiramj



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

**УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭ**

2023 оны 05 сарын 12-ний өдөр № Гучин-Ус сум

Усны тухай Монгол Улсын хуулийн 19, 20 дугаар зүйл, Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2023 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 03/03 тоот ус ашиглуулах дүгнэлт, ус ашиглах зөвшөөрлийг үндэслэн Ус ашиглуулагчийг төлөөлж Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сумын Засаг дарга Х. Энхтайван, Ус ашиглагчийг төлөөлж "КАПКОРП МОНГОЛИА" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал А.Гэрэлт-Од нар ус ашиглах талаар тохиролцон энэ гэрээг байгуулав.

**Гэрээний нөхцөл:**

**1. Ус ашиглах зориулалт:**

Газрын тосны хайгуулын өрөмдлөг

**2. Ашиглах усны хэмжээ:**

а/ Ахуйн зориулалтаар:  $245 \text{ хүн} \times 20 \text{ л/хон} = 4,9 \text{ м}^3/\text{хон} \times 60 \text{ хон} = 294,0 \text{ м}^3$

б/ Өрөмдлөгийн ажлын технологид:

$43,0 \text{ м}^3 \times 60 \text{ хоног} = 2580,0 \text{ м}^3/\text{жил}$

в/ Туршилтын технологи

$37+3 \times 27+3 \times 4=130 \times 2$  хоног= $260,0 \text{ м}^3/\text{жил}$

Шингэн хагалбарын ажлын технологид:

$2 \times 350,0 \text{ м}^3 = 700,0 \text{ м}^3/\text{жил}$

Олборлолтын туршилтын үед:

$2 \times 15 = 30,0 \text{ м}^3/\text{жил}$

Зам талбайн тоосжилт дарах усалгаанд:

$2500,0 \times 2 \text{ л} = 5,0 \text{ м}^3/\text{хоног} \times 12 (\text{услах хоногийн тоо}) = 60,0 \text{ м}^3/\text{жил}$

Нийт усны хэрэглээ:

$294,0 + 2580,0 + 260 + 700 + 30 + 60 = 3924,0 \text{ м}^3/\text{жил}$  ус шаардлагатай байна.

**3. Ус ашиглах гэрээний хугацаа:**

а/ эхлэх 2023 он 05 дугаар сарын 15 өдөр

б/ дуусах 2024 он 05 дугаар сарын 15 өдөр

**4. Усны эх үүсвэрийн байршил, барилга байгууламж, тоног тохөөрөмж,**

**тэдгээрийн хүч чадал, төсөвт өртөг, ус хэмжих хэрэгслийн нэр, төрөл, тоо:**

Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сумын 3 дугаар багт байрладаг. Худгийн байргүй, насосны марк 7 квт, 8-10 тн.



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

5. Усны эх үүсвэрийн төлөв байдал, найрлага, чанар: Гүний худаг, цэнгэг

6. Бохир ус зайлуулах цэг: Байхгүй

7. Ус ашигласны төлбөр:

Д/д	Ус ашиглалтын төрөл	<sup>1</sup> Экологи эдийн засгийн суурь үнэлгээ төгрөг/шоо метр/	<sup>2</sup> Ус ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ /20%/	<sup>3</sup> Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр /	1 м <sup>3</sup> усны үнэ/төг
1	Ахуйн хэрэглээний ус	1939	-	0.5	969.5
2	Технологийн хэрэглээний ус	1939	0.2	2.1	3,255.0

<sup>1</sup> Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоолоор Таац голын сав газар тогтоосон газрын доорх усны суурь үнэлгээ

<sup>2</sup> Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай” Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар тогтоосон усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ

<sup>3</sup> Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлтөд оруулах тухай Засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолд заасан ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр/газрын доорх усанд/

**а/ ахуйн хэрэглээнд:** Таац голын сав газарт дээрх хүснэгтэд дурьдсан төлбөрийн хувь хэмжээгээр тооцож үзэхэд ахуйн хэрэглээний 1м<sup>3</sup> усны үнэ 1939 төгрөг байна

**б/ үйлдвэрлэлд :** Таац голын сав газарт дээрх хүснэгтэд дурьдсан төлбөрийн хувь хэмжээгээр тооцож үзэхэд технологийн хэрэглээний 1м<sup>3</sup> усны үнэ 3,255.0 төгрөг байна.

Д/д	Ус ашиглах төрөл	1 м <sup>3</sup> усны үнэ/төг	Ашиглах усны хэмжээ	Нийт
1	Ахуйн хэрэглээнд	969.5	30 м <sup>3</sup>	294,0m3 x 1939.5 = 570,066 төг
2	Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар	4071.9	Хэрэглээг тоолуурын заалтаар тооцно.	..*..



8. Төлбөр төлөх хугацаа, данс: Төслийн талбайд ажил эхэлснээс хойш ажлын 15 хоногийн дотор Төрийн сан ..... тоот дансанд төвлөрүүлнэ.
9. Ус ашиглах эрх дуусгавар болоход худгийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, бусад эд хөрөнгийг хэрхэх тухай тохиролцоо:  
Ус ашиглах гэрээний хугацаа дуусгавар болоход худагт байгаа насос, ус өргөх хоолойг худагт анх байсан хэвээр үлдээх ба насосыг цахилгаан үүсгүүрт холбоход бүрэн ажиллаж байхаар Ус ашиглуулагчид хүлээлгэн өгнө.
10. Бусад зүйл:
- 10.1. Ус ашиглах явцын зардлыг ус ашиглагч хариуцна.
  - 10.2. Гэрээ байгуулагч талууд Монгол Улсын Усны тухай хуулийн 7.5, 18.1.4, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 31.1-дзвасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
  - 10.3. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
  - 10.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.
  - 10.5. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
  - 10.6. Гэрээний нөхцөлийг биелүүлээгүй, дутуу биелүүлсэн бол буруутай тал холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

УС АШИГЛУУЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:  
ГУЧИН УС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА  
Х. ЭНХТАЙВАН

УС АШИГЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:  
КАПКОРП-МОНГОЛЫН ХХК-  
ГҮЙЦЭГЦЭХ ЗАХИРАЛ



8. Төлбөр төлөх хугацаа, данс: Төслийн талбайд ажил эхэлснээс хойш ажлын 15 хоногийн дотор Төрийн сан ..... тоот дансанд төвлөрүүлнэ.
9. Ус ашиглах эрх дуусгавар болоход худгийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, бусад эд хөрөнгийг хэрхэх тухай тохиролцоо:  
Ус ашиглах гэрээний хугацаа дуусгавар болоход худагт байгаа насос, ус өргөх хоолойг худагт анх байсан хэвээр үлдээх ба насосыг цахилгаан үүсгүүрт холбоход бүрэн ажиллаж байхаар Ус ашиглуулагчид хүлээлгэн өгнө.
10. Бусад зүйл:
- 10.1. Ус ашиглах явцын зардлыг ус ашиглагч хариуцна.
  - 10.2. Гэрээ байгуулагч талууд Монгол Улсын Усны тухай хуулийн 7.5, 18.1.4, 19.1.2, 19.1.4, 26.1, 30.1, 31.1-дзвасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
  - 10.3. Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
  - 10.4. Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба бичгээр үйлдэнэ.
  - 10.5. Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
  - 10.6. Гэрээний нөхцөлийг биелүүлээгүй, дутуу биелүүлсэн бол буруутай тал холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

УС АШИГЛУУЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:  
ГУЧИН УС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА  
Х. ЭНХТАЙВАН

УС АШИГЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:  
КАПКОР-МОНГОЛЫН ХХК-  
ГҮЙЦЭГЦЭХ ЗАХИРАЛ



Хавсралт 9. Гучин-Ус сумын засаг даргын худаг ашиглах зөвшөөрөл

  
**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ**  
**ГУЧИН-УС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА**

4 дүгээр баг, Гучин-Ус сум, Өвөрхангай аймаг, 62185,  
Утас: (976) 7032 6702, Цахим хаяг: guchin-us@ov.gov.mn,  
Цахим хуудас: www: guchin-us.ov.gov.mn

2023.04.18 № 164

танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-г


**КАПКОРП МОНГОЛИА ХХК-Д**

Тус сумын 3 дугаар багийн Зүүн нүхт гэдэг газар  
45°10'13.58"N; 101°57'38.29"E солбилцол бүхий унд,  
ахуйн зориулалттай худгийг ашиглахыг зөвшөөрч байна.

  
**Х.ЭНХТАЙВАН**



Хавсралт 10. Худгийн паспорт

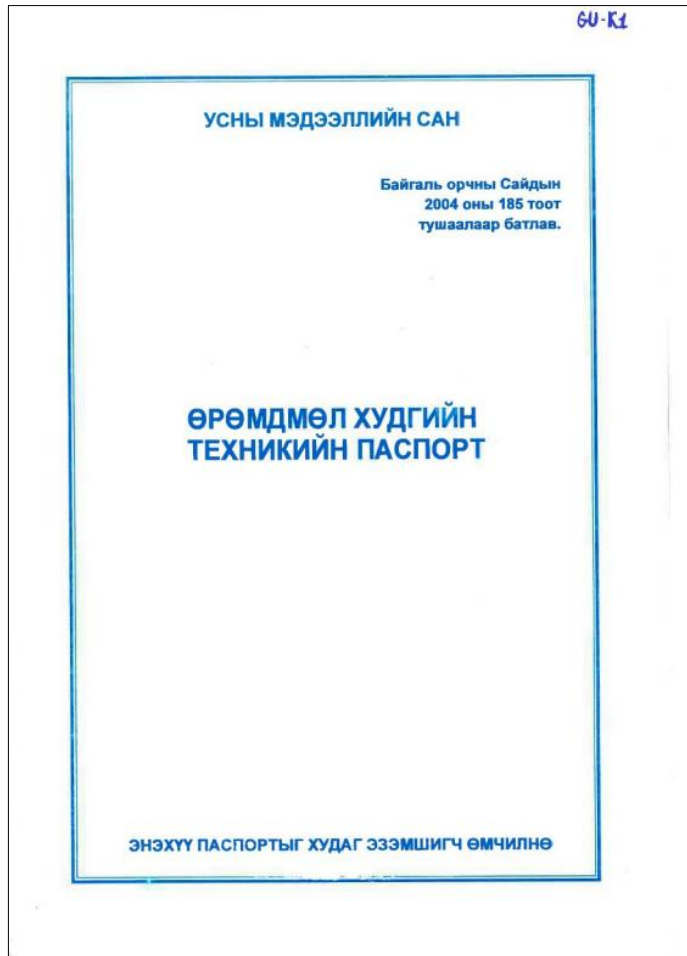



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Сум, дүүрэг, хороо Ворхангай аймаг, Гучи-Ус сум  
 Эзэмшигч иргэн, байгууллагын нэр "Кинкор-Мандал" ХХ  
 Өрөмдмөл худгийн нэр .....

Улсын №  
 Байршиж буй газрын нэр, хаяг Ворхангай  
 .....

Усны ашиглах гэрээний №  
 Ус ашиглах эрхийн бичгийн нэр №

Худаг гаргасан (ажлын нэгж) "Эрмэгэрийн" ХХ  
 тамга  
 Захирал [Signature]  
 2023 он 06 сар 20 өдөр

Баталгаажуулсан/  
Өвөрхангай аймаг (нийслэл)-ийн Байгаль орчны албаны  
 тамга  
 Дарга [Signature]  
 2023 он 07 сар 20 өдөр

Худгийн байршлын солбилцол

Уртраг: 722.650.22  
 Өргөрөг: 50.064.9.0  
 Үнэмлэхүй өндөр: 15.68 м,  
 АЙМГИЙН КОД Сумын код Худгийн зориулалтын код

Аймгийн код	Сумын код	Худгийн зориулалтын код

Ворхангай аймгийн, хотын Гучи-Ус сумын  
 дүүргийн, хорооны, багийн Арслант Эрдэнэ гэдэг газарт,  
Ус зүйл  
 (усжуулалт, усан хангамж г.м)  
 .....

Мандвагсар аймгийн, (хотын)  
Эрмэгэрийн компанийн Арслант менежер  
 ахлагчтай анги, бригад Салтан Т.Б.С.У.С маркийн  
 станскоор Мавран эрэмтэй аргаар уул  
 худгийн цооногийг 20 23 он 05 сарын 12 өдрөөс 20 23 он  
06 сарын 08 өдөр хүртэл өрөмдөж гаргав.





Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Хавсралт 11. Өрөмдлөг, ахуйн хэрэглээнд худгаас авч ашигласан усны бүртгэл

WATER USAGE LOG FOR VR - 1B TECHNICAL WATER CONSUMPTION										
Date	Day No.	Beginning Balance (m <sup>3</sup> )	Daily Usage (m <sup>3</sup> )	Ending Balance (m <sup>3</sup> )	From Block V (m <sup>3</sup> )	For Camp Use (m <sup>3</sup> )	For Mud Tanks and Rig Water	Cement Jobs (m <sup>3</sup> )	Road Watering (m <sup>3</sup> )	Comments
<b>Prepared and Recorded by Major Drilling - Audited and Verified by Capcorp Senior Drilling Engineer</b>										
5/31/2023	Wed		15			4	11			
6/1/2023	Thu		31				31			
6/2/2023	Fri		45			9	36			
6/3/2023	Sat		40				40			
6/4/2023	Sun		40				40			
6/5/2023	Mon		54			5	49			
6/6/2023	Tue		30			10	20			
6/8/2023	Thu		20				20			
6/9/2023	Fri		30			10	20			
6/10/2023	Sat		4				4			
6/13/2023	Thu		10			10				
6/15/2023	Thu		7				7			
6/16/2023	Fri		10				10			
6/17/2023	Sat		10				10			
6/18/2023	Sun									
6/19/2023	Mon		39.5			9.5	30			
6/20/2023	Tue		30				30			
6/21/2023	Wed									
6/22/2023	Thur		40			10	30			
6/23/2023	Fri		34				34			
6/24/2023	Sat		27			10	17			
6/25/2023	Sun									
6/26/2023	Mon									
6/27/2023	TUE		44			10	34			
6/28/2023	WED									
6/29/2023	THU		37			10	18		9	
6/30/2023	FRI		18				18			
7/1/2023	SAT		10			10				
7/2/2023	SUN		36				36			
7/3/2023	MON		46			10	36			
7/4/2023	TUE		18				18			
7/5/2023	WED		28			10	18			
7/6/2023	THU									
7/7/2023	Fri		10			10				
7/8/2023	Sat									
7/9/2023	Sun		10			10				
7/10/2023	Mon									
7/11/2023	TUE		28			10	18			
7/12/2023	Wed		15				15			
7/13/2023	Thu									
7/14/2023	FRI		37			10	27			
7/15/2023	SAT		9				9			
7/16/2023	SUN		18				18			
7/17/2023	MON		28			10	18			
7/18/2023	TUE		28			10	18			
<b>TOTALS</b>			<b>937</b>		<b>0</b>	<b>188</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>					<b>936.5</b>					
		181,781.25		усны тоолуурын заалт						
		2,408,700.00		ажил дуусан тоолуур салгах үед	3597					
		2,590,481.25		ажил эхэлж тоолуур лавдах үед	2811					
				нийт хэрэглэсэн ус тоолуурын заалтаар	786					
				гэвчээнд заагчдаа ахуйн хэрэглээнд						
								ус ашигласны талбарийг тооцвол		
								294	285,033.00	



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Хавсралт 12. Ус ашигласны төлбөрийн баримт




Цахим гүйлгээний баримт

Хүсэлтийн лавлах дугаар: 202459804

Татсан огноо: 2023-10-10 12:21

Шилжүүлэгчийн дансны дугаар	Хүлээн авагчийн данс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
<b>8145100130</b> MN780015008145100130	<b>1165117377</b>	<b>2,171,673.00 MNT</b>	<b>Амжилттай</b>
Шилжүүлэгчийн нэр <b>КАПКОРП МОНГОЛИА ХХК</b>	Хүлээн авагчийн нэр <b>ТАХ</b>	Гүйлгээний утга <b>2230801204893;51101241315;5077982;51101241315;86102118</b>	
	Хүлээн авагчийн банк	Гүйлгээний огноо <b>2023-08-15</b>	



Гүйлгээг шивсэн хэрэглэгч	Гүйлгээг хянасан хэрэглэгч	Гүйлгээг баталсан хэрэглэгч
<b>М. Нямсүрэн</b>	<b>Б. ТАМИР</b>	<b>ж. Майкл</b>



Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. © Голомтбанк ХХК.



Хавсралт 13. Кемпийн ахуйн хог хаягдлыг зохицуулах гэрээ



**БАТЛАВ**  
КАПКОРП МОНГОЛИА ХХК  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  
АГЭРЭЛТ-ОД

**БАТЛАВ**  
БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА  
Д.БУЯНЗУЛ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ТАМГЫН ГАЗАР, ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН КАПКОРП-ХХК-ТАЙ  
БАЙГУУЛСАН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ АЖЛЫН ГЭРЭЭ

**Гэрээний зорилго**

Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар, 3 дугаар багийн нутаг дахь "Онги 5" гэрээт талбайд газрын тосны хайгуулын ажил гүйцэтгэх "Капкорп Монголиа" ХХК-ний Хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилан ялгах хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино.

Нэг талаас Баруунбаян-Улаан сумын 3 дугаар багийг төлөөлж Багийн Засаг дарга ажилтай Г.Пүрэвсүрэн нөгөө талаас "Капкорп Монголиа" ХХК-ийг төлөөлж Байгаль орчны мэргэжилтэн ажилтай Д.Буянзул нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

**Гэрээний хугацаа**

2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2023 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр хүртэл 60 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.

Талууд гэрээний хугацааг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр сунгаж болно.

**Сумын удирдлага болон багийн удирдлагуудаас хүлээх үүрэг**

- 1.Тус сумын 3 дугаар багийн нутаг "Ботиулын доод хөл" хэмээх газар байршилтай Газрын тосны хайгуулын "Капкорп Монголиа" ХХК-ний туслан гүйцэтгэгч "Майжер" ХХК-ний хайгуулын өрөмдлөгийн болон суурьшлын бүсэд энгийн хог хаягдлыг хадгалах түр цэг байгуулах ажилд хяналт тавих
- 2.Тус компаний энгийн хог хаягдлаа цэвэрлэх, ангилан ялгах, хадгалах, тээвэрлэх, сумын төвийн нийтийн хогийн цэгт төвлөрүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих
3. Орон нутгийн чанартай авто зам, гадаргын ус, ой, ургамлын бүрхэвч, суурьшлын бүс болон өрөмдлөгийн талбайд ил задгай хог хаягдал хаяхгүй байхыг анхааруулах байгаль орчныг бохирдлоос хамгаалах
4. Хог хаягдлын талаар иргэдээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэх
5. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авахгүй байх
6. Хайгуулийн ажил дуусахад талбайг хүлээн авах

**Капкорп Монголиа ХХК-ний хүлээх үүрэг**

- 1.Тус сумын 3 дугаар багийн нутаг "Ботиулын доод хөл" хэмээх газар байрласан Газрын тосны хайгуулын "Капкорп Монголиа" ХХК-ний туслан



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

гүйцэтгэгч Майжер ХХК-ний хайгуулын өрөмдлөгийн болон суурьшлын бүсэд энгийн хог хаягдлыг хадгалах түр цэг байгуулна.

2. Түр цэг нь хог хаягдал байгаль орчинд салхиар зөөвөрлөгдөж тархахгүй байхаар хийгдсэн байх

3. Түр цэгт хадгалсан хогийг сумын төвийн нийтийн хогийн цэгт 7 хоногт 1 удаа зөөвөрлөж төвлөрүүлнэ.

4. Хог хаягдлыг гаргахдаа ангилан ялгаж уут, саванд хийж битүүмжилсэн байна.

5. Хог хаягдлыг тээвэрлэх ажлыг тус сумын малчид иргэдтэй гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлнэ.

6. Орон нутгийн чанартай авто зам, гадаргын ус, ой, ургамлын бүрхэвч, суурьшлын бүс болон өрөмдлөгийн талбайд ил задгай хог хаягдал хаяхгүй байх, орчныг бохирдлоос хамгаалах

7. Хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу хог хаягдал гаргасны хураамжийг сумын татварын албанаас тогтоосон тарифын дагуу холбогдох төсвийн дансанд тэлж барагдуулна.

8. Жорлон, бохирын цооногийг байгуулахдаа байгаль орчинд ээлтэй жорлонгийн шинэ шийдлийг ашиглах бөгөөд хөрсний бохирдол үүсгээгүй байна.

9. Стандартын хог ангилан ялгах зориулалтын савнуудыг тодорхой газруудад байрлуулах

10. Аюултай хог хаягдал гаргасан тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагад хүргүүлж устгуулах

11. Хайгуулийн ажил дуусахад талбайг хүлээлгэн өгөх

#### Хариуцлага

Гэрээ байгуулагч талууд өөрсдийн хариусан үүргийг биелүүлэх бөгөөд хог хаягдлын талаар гарсан гомдол мэдээллийг холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

#### Гэрээ хүчин төгөлдөр болох

Гэрээ байгуулагч талууд гэрээнд гарын үсэг зурснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно

#### Гэрээ байгуулсан:

Баруунбаян-Улаан сумын  
3-р багийн Засаг дарга

Г.Пүрэвсүрэн

2023 оны ..... сарын ..... ний өдөр

Капкорп Монголиа\* ХХК-нийг  
Байгаль орчны мэргэжилтэн  
Д.Буянзул

2023 оны 5... сарын 24 ний өдөр



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан


Хавсралт 14. Ахуйн хог хаягдлын зөөвөрлөсөн бүртгэл

VR-18 Major Drilling										
Хувиар / piece (quantity)	Цаас/Brand	Цаас/Brand	Бусад/ other (quantity)	Хог хаягдлыг дахин ашиглах цаг, дахин боловсруулах газар / reuse or recycling place	Дэвн шигшээдэгүй хог хаягдлыг тээвэрлэн кулгас цаг / waste (kg)	Хог хаягдлыг өрсөн тээврийн хэрэгсэлд уусгах дугаар / (kg)	Хог хаягдлыг хуулан авч тээвэрсэн мөргөчийн нэр, халбоо барих дугаар / (kg)	Хог хаягдлыг күүзэлэн өрсөн газрийн ажилчны нэр / person who received the waste	Хог хаягдлыг өмгөт хийж тээвэрлүүлсэн фото зургийг баримтлуулах / Photograph documentation of waste disposal	
15 June	15 KG	3 KG	1 KG	20 KG	40 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	From app	ATTACHED
85 June 23	10 KG	—	1 KG	30 KG	25 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	From app	ATTACHED
16 June	13 KG	3.5 KG	—	25 KG	41.5 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	From app	Attached.
23 June	23 KG	4 KG	1 KG	20 KG	48 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	From app	attached.
—	10 KG	2 KG	—	15 KG	27 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	From app	attached.
30 June	5 KG	2 KG	—	25 KG	30 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	From app	ATTACHED
08 July	10 KG	2 KG	—	20 KG	25 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	From app	
17 July	13 KG	3 KG	—	25 KG	41 KG	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	From app	attached.
22 July	500 m	—	—	30 m	—	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	By the team	attached
23 July	250 m	2 m	—	200 m	—	BBU Saam	0278080	B. Bat-Erdene	From app	attached



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Хавсралт 15. Ахуйн хог хаягдлын төлбөр төлсөн баримт

 <b>ГОЛОМТ БАНК</b> <i>Сайн сайхныг санхүүжүүлнэ</i>		<b>Цахим гүйлгээний баримт</b>	
Хүсэлтийн давлах дугаар: <b>189271220</b>		Татсан огноо: <b>2023-06-06 17:21</b>	
Шилжүүлэгчийн давсны дугаар	Хүлээн авагчийн давс	Гүйлгээний дүн	Гүйлгээний төлөв
<b>8145100130</b> IBAN: MN78 0015 0081 4510 0130	<b>1165117377</b> IBAN: MN03 0015 0011 6511 7377	<b>885,500.00 MNT</b>	<b>Амжилттай</b>
Шилжүүлэгчийн нэр <b>КАПКОРП МОНГОЛИА ХХК</b>	Хүлээн авагчийн нэр <b>TAX</b>	Гүйлгээний утга <b>2230600238654;51101241315001;5077982;51101241315001;88786124</b>	
	Хүлээн авагчийн банк	Гүйлгээний огноо <b>2023-06-06</b>	



Хавсралт 16. Ахуйн бохир ус нийлүүлэх гэрээ (кемпийн үйлчилгээний гэрээт Геомин ХХК)

БАТЛАВ: "ОНГИ-УС СУВАГ" ОНӨААТҮГазар ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ц.ХОРОЛСҮРЭН	БАТЛАВ: "ГЕОМИН" ХХК-НИЙ ЗАХИРАЛ Г.БАТ-ЭРДЭНЭ
--	--

**БОХИР УС НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ**

2022.05.31

Энэхүү Гэрээг нэг талаас "ОНГИ-УС СУВАГ" ОНӨААТҮГ, түүнийг төлөөлөн Ерөнхий инженер Б.Даваадавга (цаашид "Хангагч" гэх), нөгөө талаас "ГИОМИН" ХХК-ийг төлөөлөн Менежер Б.Мөнхбат (цаашид "Хэрэглэгч" гэх) нар (хамтад нь "Талууд" гэх) Иргэний хууль, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд харилцан тохиролцож, хангагч нь унд - ахуйн стандартын шаардлага хангасан хэрэгцээний усаар хангах, хэрэглэгч нь хэрэглэсэн хэрэгцээний усны төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулах үүрэг хүлээж энэхүү гэрээг байгуулав.

**НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**


- 1.1. Хангагч хэрэглэгчийн хооронд үүссэн харилцааг зохицуулах, гэрээний нөхцөл, тавигдах шаардлага, үйлчилгээний түвшин, бохир усны найрлаг, тоо хэмжээ, төлбөр тооцооны нөхцөл, хангагч хэрэглэгчийн эрх, үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэхэд гэрээний зорилго оршино.
- 1.2. Талууд Монгол Улсын Иргэний хууль, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын тухай хууль, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль, ХСУХАТАУ33өвлөлөөс баталсан үнэ тариф зэргийг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.
- 1.3. Хэрэглэгч нь зохих журмын дагуу тогтоосон цэгт бохир усыг батлагдсан хугацаанд нийлүүлэх, төлбөрийн үлдэгдэлгүй байна.
- 1.4. Энэхүү гэрээгээр хэрэглэгч нь 2023 оны 06 дүгээр сарын 02 ний өдрөөс эхлэн 2023 оны 12 дугаар сарын 31-нийг дуустал хүчин төгөлдөр болно.

**ХОЁР. ХАНГАГЧИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ**

- 2.1. Монгол Улсын Иргэний хууль, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын тухай хууль, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль, хангагч хэрэглэгчийн хооронд байгуулсан аж ахуйн гэрээ болон бусад хууль, тогтоомж, дүрэм журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
- 2.2. Хангагч нь хэрэглэгчээс нийлүүлсэн бохир усны төлбөрийг хугацаанд нь бүрэн төлөхийг шаардах эрхтэй.
- 2.3. Хангагч нь хэрэглэгчийн эзэмшлийн шугамын ашиглалт, тооцооны хэмжүүрийн үнэн зөв эсэхийг шалгах зорилгоор хэрэглэгчийн төлөөллийн хамт барилга байгууламжид нь нэвтрэн орох, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар хугацаатай шаардлага, мэдэгдэл өгөх, акт тавих эрхтэй.
- 2.4. Хангагч нь цэвэрлэх байгууламж болон шугам сүлжээний төлөвлөгөөт болон урьдчилан сэргийлэх засвар, үйлчилгээ хийх, хэрэглээг хязгаарлах бол хязгаарлалтын талаар хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдэх, шаардлагатай арга хэмжээ авна.
- 2.5. Хангагч нь хэрэгцээний усны чанар стандарт, түүнээс холбогдон гарсан аливаа асуудалд хариуцлага хүлээхгүй.
- 2.6. Хангагч нь хэрэглэгчээс гарсан санал хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай барагдуулах үүрэгтэй.
- 2.7. Хангагч үнэ тарифыг өөрчилсөн тухай бүрд хэрэглэгчид энэ тухай албан ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй.
- 2.8. Хангагч нь өөрийн эзэмшлийн дамжуулах шугам, тоноглолд төлөвлөгөөт таслалт хийх шаардлага гарсан үед 72 цагийн өмнө хэрэглэгчид мэдэгдэх үүрэгтэй.



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан







Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

"ОНГИ-УС СУВАГ" ОНӨААТҮГ-ээр

Барьцаа мөнгийг усны төлбөрт тооцохгүй, зөвхөн хөрөнгийн баталгаа болгох ба гэрээ цуцалсны дараа эргүүлж олгоно.

- 4.7 Тооцооны хэмжих хэрэгсэл болон тооцоо хийдэг ажилтны буруугаас гарсан зөрүүг гэрээт талууд харилцан тохиролцож, дараа сарын тооцоонд тайлбартайгаар тусгаж нөхөн тооцоог хийнэ.
- 4.8 Төлбөр тооцротой холбоотой асуудлын талаар хэрэглэгч нь хангагчид 48 цагийн дотор албан ёсоор мэдэгдэнэ. Заасан хугацаанд асуудлаа тавиагүй тохиолдолд хөөн хэлэлцэхгүй. Хангагч нь мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор асуудлыг шийдвэрлэнэ.
- 4.9 Хангагчаас хэрэглэгчид үзүүлэх зарим үйлчилгээг батлагдсан тарифын дагуу төлбөртэй гүйцэтгэнэ.

**ТАВ. ГЭНЭТИЙН БОЛОН ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС**

- 5.1 Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас талууд Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд Гэрээний үйлчлэх хугацааг тухайн нөхцөл байдлыг арилгах хүртэл хойшлуулж болно.
- 5.2 Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас гэрээний үүргийн хугацаа 30 хоногоос дээш хугацаагаар хойшлогдсон тохиолдолд талууд Гэрээг цуцлах эрхтэй.

**ЗУРГАЙ. БУСАД ЗҮЙЛ**

- 6.1. Энэхүү гэрээ нь талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болох ба талууд гэрээний үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэснээр гэрээний үйлчлэл дуусгавар болно.
- 6.2. Талууд энэхүү гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох ба санаачлагч нь албан ёсоор нөгөө талдаа мэдэгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор харилцан тохиролцож нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулна. Талууд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг байна.
- 6.3. Аль нэг тал гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах тохиолдолд энэ тухай нөгөө талдаа 14 хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.4. Гэрээтэй холбогдож үүссэн маргаантай асуудлыг харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд зөвшилцөлд эс хүрвэл шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
- 6.5. Хэрэгцээний усны хангамж, төлбөр тооцоо, хэмжих хэрэгсэл, бусад асуудлаар хэрэглэгчдээс ирүүлсэн санал гомдлыг журмын дагуу шийдвэрлэж хариу мэдэгдэнэ.
- 6.6. Харилцагч талууд гэрээний үүргээ хангалттай сайн биелүүлсэн компани, хувь хүмүүсийг харилцан шагнаж урамшуулж болно.
- 6.7. Гэрээний хугацаа дуусгавар болоход талууд гэрээний үүргийн биелэлтийг хамтран дүгнэж акт үйлдэнэ.
- 6.8. Гэрээг Монгол хэл дээр 2% үйлдэж, талууд тус бүр 1%-ийг авах бөгөөд хувиуд ижил тэгш хүчинтэй байна.

**ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:**

**Захиалагчийг төлөөлж:**

ОНГИ-УС СУВАГ ОНӨААТҮГ-ын

Б.ДАВААДАВГА /ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР/

Гар утас: 99291447

**Гүйцэтгэгчийг төлөөлж:**

"ГИОМИН" ХХК-ийн

Б.МӨНХБАТ /МЕНЕЖЕР/

Гар утас: 88620888



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Хавсралт 17. Ахуйн бохир ус зөөвөрлөж нийлүүлсэн бүртгэл (кемпийн үйлчилгээний гэрээт Геомин ХХК)

Төслийн талбайн нэр: Project site name:		CAP CORP								
Ахуйн шингэн хаягдал зөөвөрлөлийн бүртгэл /Grey & Black Water Tank Log										
№	Анхны огноо/date	Бохир галт/Усны нэр: Bohior galт/Усны нэр: Septic	Соруулсан бохир замын /Sucked out (m3)	Бохир тээвэрэн зургийн нэр / Transport & destination	Бохир тээвэрэн хэрэгслийн үлдсэн дугаар / Vehicle plate no	Бохир тээвэрэн зохиогчийн нэр, холбоо барих дугаар / Driver's name and signature	Бохир тээвэрэн анги дээрх ажлын нэр /Signature of person/entity who receives handover of sewage waste	Тайлбар /Comments	Бохир хүчин ажил хариуцаж байгууламжийн цахилгаан	Бохир тээвэрэн анги дээрх ажлын нэр /Signature of person/entity who receives handover of sewage waste
1	23/06/02	Грей/саарал ус, Вилк/тунасан бохир	6м3	Гарсан цаг 09:30 Ирсэн цаг 19:40	86-35VEA	Б.Батгэрэнэ	"Геомин"ХХК-ийн ХАБ-н ажилтан Б.Баясгалан	Эхний ажилт зам шалгах, тургалтын журмаар тал буюу 6м3 бохир тусна	А.Загарбат	
2	23/06/06	Грей/саарал ус, Вилк/тунасан бохир	12м3	Гарсан цаг 09:20 Ирсэн цаг 18:30	86-35VEA	Б.Батгэрэнэ	"Геомин"ХХК-ийн ХАБ-н ажилтан Б.Баясгалан	Бүтэн гачилт буюу 12м3	А.Загарбат	
3	23/06/10	Грей/саарал ус, Вилк/тунасан бохир	12м3	Гарсан цаг 09:20 Ирсэн цаг 18:30	86-35VEA	Б.Батгэрэнэ	"Геомин"ХХК-ийн ХАБ-н ажилтан Б.Баясгалан	Бүтэн гачилт буюу 12м3	А.Загарбат	
4	23/06/12	Грей/саарал ус, Вилк/тунасан бохир	12м3	Гарсан цаг 09:50 Ирсэн цаг 18:25	86-35VEA	Б.Батгэрэнэ	"Геомин"ХХК-ийн ХАБ-н ажилтан Б.Баясгалан	Бүтэн гачилт буюу 12м3	А.Загарбат	
4	23/06/17	Грей/саарал ус, Вилк/тунасан бохир	20м3	Гарсан цаг 12:50 Ирсэн цаг 01:00	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	"Геомин"ХХК-ийн Комп менежер Б.Мөнхбат	Бүтэн гачилт буюу 20м3	Б.Тувсанцэцэг	
5	2023.06.21	Грей/саарал ус, Вилк/тунасан бохир	18м3	Гарсан цаг 09:30 Ирсэн цаг 20:00	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	"Геомин"ХХК-ийн Комп менежер Б.Мөнхбат	Бүтэн гачилт буюу 18м3	А.Загарбат	
6	2023.06.25	Грей/саарал ус, Вилк/тунасан бохир	18м3	Гарсан цаг 09:45 Ирсэн цаг 17:30	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	"Геомин"ХХК-ийн Комп менежер Б.Мөнхбат	Бүтэн гачилт буюу 18м3	Б.Тувсанцэцэг	

Төслийн талбайн нэр: Project site name:		CAP CORP							
Ахуйн шингэн хаягдал зөөвөрлөлийн бүртгэл /Grey & Black Water Tank Log									
№	Анхны огноо/date	Бохир өгтмн/Sewage Septic	Соруулсан бохир замын /Sucked out (m3)	Бохир тээвэрэн зургийн нэр / Transport destination	Бохир тээвэрэн хэрэгслийн үлдсэн дугаар / Vehicle plate no	Бохир тээвэрэн зохиогчийн нэр, холбоо барих дугаар / Driver's name and signature	Бохир хүчин ажил хариуцаж байгууламжийн цахилгаан /Signature of person/entity who receives handover of sewage waste	Тайлбар /Comments	Бохир тээвэрэн анги дээрх ажлын нэр /Signature of person/entity who receives handover of sewage waste
1	23/06/02	Грей/саарал ус, Вилк/тунасан бохир	6м3	Гарсан цаг 09:30 Ирсэн цаг 19:40	86-35VEA	Б.Батгэрэнэ	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	Эхний ажилт зам шалгах, тургалтын журмаар тал буюу 6м3 бохир тусна	А.Загарбат
2	23/06/06	Грей/саарал ус, Вилк/тунасан бохир	12м3	Гарсан цаг 09:20 Ирсэн цаг 18:30	86-35VEA	Б.Батгэрэнэ	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	12м3?	А.Загарбат
3	2023.6.10	Бохир ус	12м3	08:10-11:30	86-35VEA	Б.Батгэрэнэ	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	12м3	А.Загарбат
4	2023.6.12	Бохир ус	12м3	08:55-18:0	86-35VEA	Б.Батгэрэнэ	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	12м3	А.Загарбат
5	2023.6.17	Бохир ус	20м3	17:57-01:00	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	20м3	Б.Тувсанцэцэг
6	2023.6.21	Бохир ус	18м3	09:30-20:00	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	18м3	А.Загарбат
7	2023.6.25	Бохир ус	18м3	09:30-17:30	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	18м3	Б.Тувсанцэцэг
8	2023.6.25	Бохир ус	18м3	09:30-17:30	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	18м3	Б.Тувсанцэцэг
9	2023.6.25	Бохир ус	18м3	09:30-17:30	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	18м3	Б.Тувсанцэцэг
10	2023.6.25	Бохир ус	18м3	09:30-17:30	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	18м3	Б.Тувсанцэцэг
11	2023.6.25	Бохир ус	18м3	09:30-17:30	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	18м3	Б.Тувсанцэцэг
12	2023.6.25	Бохир ус	18м3	09:30-17:30	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	18м3	Б.Тувсанцэцэг
13	2023.6.25	Бохир ус	18м3	09:30-17:30	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	18м3	Б.Тувсанцэцэг
14	2023.6.25	Бохир ус	18м3	09:30-17:30	92-74 уйт	Т.Мөнхзориг	Цэвэрлэх байгууламжийн ажилтан Загарбат	18м3	Б.Тувсанцэцэг




Хавсралт 18. Велосираптор -1 цооногийн өрөмдлөгийн ажлын үед дагаж мөрдсөн “Нэг замын бодлого”



### ВЕЛОСИРАПТОР-1В (VR-1В) ӨРӨМДЛӨГИЙН ТАЛБАЙ ХҮРЭХ НЭГ ЗАМЫН МАРШРУТЫН ЗААВАРЧИЛГАА

Манай компани өөрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлийг багасгах үүрэг хариуцлагын хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан сумын нутагт өрөмдлөг хийхээр төлөвлөөд байгаа Велосираптор-1В өрөмдлөгийн талбайд хүрэх замын маршрутыг зурагласан. Энэхүү маршрут нь Арвайхээр хотын төвөөс эхлэх ба нийт замын урт 197,4 км үүнээс 95 км хатуу хучилттай зам (саарал өнгөөр тэмдэглэгдсэн), 102,4 км шороон замаас (улбар шар өнгөөр тэмдэглэгдсэн) бүрдэнэ (Зураг-1-ээс харна уу). Замын саад бартаанууд нь хүнд даацын машин явах замыг хязгаарлах, саатуулах хүчин зүйлс болж болзошгүй тул замын маршрутыг гаргахдаа аливаа саад бартаа болох дов толгод ухаа гүвээ, голын сайр, орон нутгийн сууршлын бүсээс зайдуу явахаар замыг сонгон гаргасан.

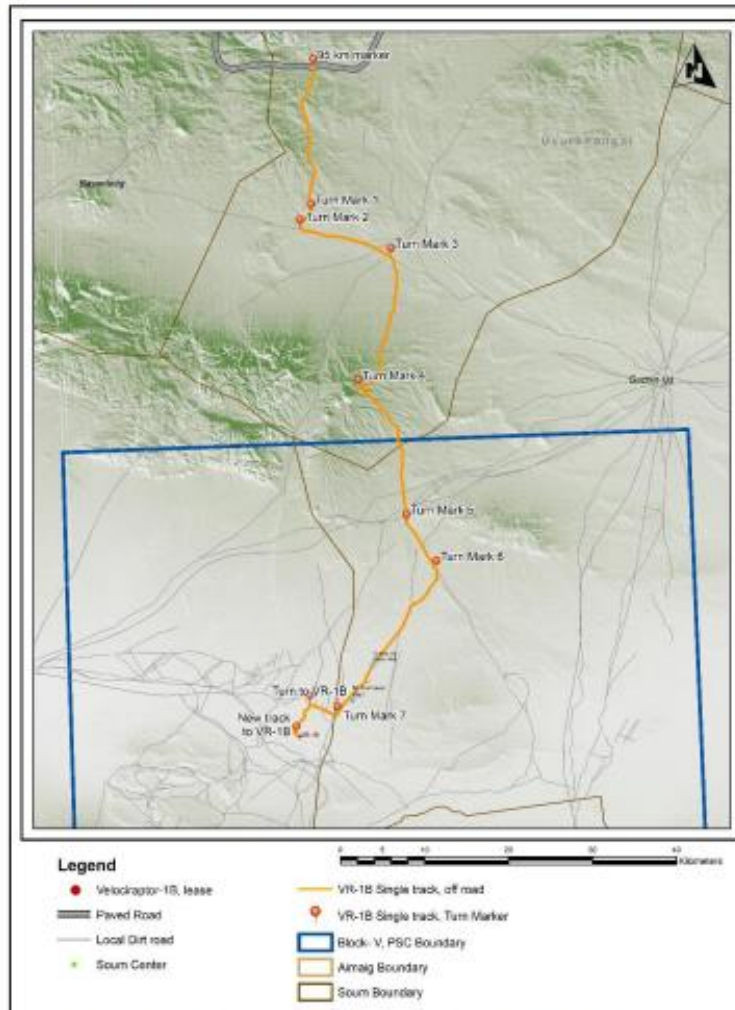

Зураг 1: Нэг замын маршрутын зураг (зургийн тайлбарыг доор үзүүлэв)



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан



- VR-1B өрөмдлөгийн талбай
- Хатуу зучилттай зам
- Шороон зам
- Сумын төв

- VR-1B хүртээх нэг замын маришрут
- VR-1B хүртээх нэг замын маришрутын эргэлтийн цэгийн тэмдэглэгээ
- Бүтээгдэхүүн Хуваах Гэрээт, Онги-V талбайн хил
- Аймгийн хил
- Сумын хил

- VR-1B хүртээх нэг замын маришрут
- VR-1B хүртээх нэг замын маришрутын эргэлтийн цэгийн тэмдэглэгээ
- Бүтээгдэхүүн Хуваах Гэрээт, Онги-V талбайн хил
- Аймгийн хил
- Сумын хил

Хүснэгт 1: Нэг замын маришрутын хүрэн дэх шороон замын гол эргэлтийн цэгүүдийн координат


Нэр	Өргөрөг	Уртраг
95 км-ын тэмдэглэгээ (хатуу зучилттай замаас шороон зам руу орох)	45°48' 33.960" N	101°54' 8.760" E
Эргэлтийн цэг 1	45°39' 17.280" N	101°53' 27" E
Эргэлтийн цэг 2	45°38' 19.400" N	101°52' 21.90"E
Эргэлтийн цэг 3	45°36' 17.220" N	102°0' 38.160"E
Эргэлтийн цэг 4	45°27' 55.800"N	101°57'10.92"E
Эргэлтийн цэг 5	45°19' 13.320"N	102°1' 7.500"E
Эргэлтийн цэг 6	45°16' 9.464"N	102°3' 42.290"E
Эргэлтийн цэг 7	45° 7' 4.663"N	101°54' 11.60"E
Ирвэс -1 Төхнийн хууд	45° 7.991"N	101° 55.615"E
VR-1B-рүү эргэх эргэлтийн цэг	45°7'50.539"N	101°51' 45.15"E
Орон нутгийн шороон замаас салж VR-1B өрөмдлөгийн цэг рүү эргэх цэг (өрөмдлөгийн цэгээс 370 м)	45° 5'53.330"N	101° 50' 27.08"E



Зураг 2: Арвайхээр хотоос 95 км-ын тэмдэглэгээ хүртээх замын маришрут



Зураг 3: 95 км-ын тэмдэглэгээнээс эргэлтийн цэг 3 хүртээх нэг замын маришрут (Эргэлтийн цэг 1 болон 2-ыг оруулсан)

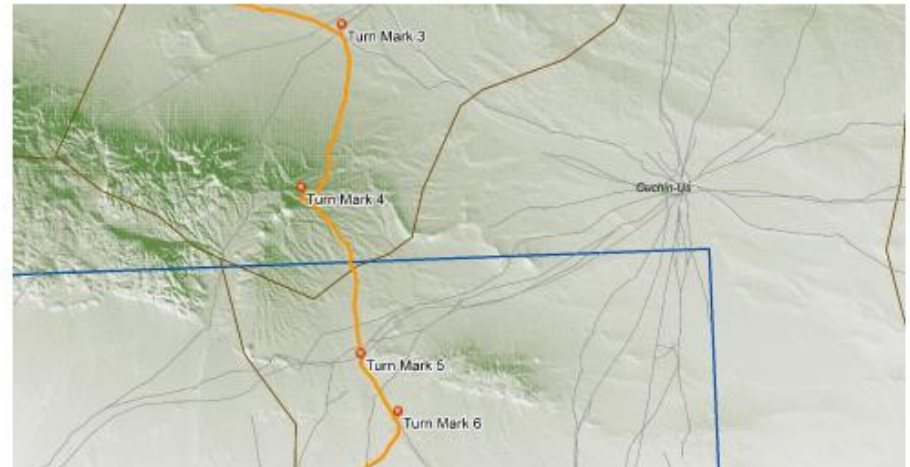

Зураг 4: Эргэлтийн цэг 4-өөс эргэлтийн цэг 6 хүртээх нэг замын маришрут (Эргэлтийн цэг 5-ыг оруулсан)



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан



Зураг 5: Эргэлтийн цэг 6-аас эргэлтийн цэг 7 хүртэлх нэг замын марирурт



Зураг 6: Эргэлтийн цэг 7-оос VR-1B рүү эргэх эргэлтийн цэг хүртэлх нэг замын марирурт



Зураг 7: Орон нутгийн замаас салж шинэ зам үүсгэх цэгээс VR-1B өрөмдлөгийн цэг хүртэлх нэг замын марирурт

(Тайлбар: Улаанаар тэмдэглэгдсэн шинэ зам үүсгэх цэг хүртэл одоо байгаа орон нутгийн зам ашиглах ба энэ цэгээс өрмийн талбай хүртэл 370м шинэ зам үүсэхээр байна)

Хүснэгт 2: Нэг замын марирутын хүрэн дэх шороон замын гол эргэлтийн цэгүүдийн хоорондын зай

Хаанаас	Хүртэлх	Зай (Ойролцоогоор)
95 км-ын эргэлтийн цэг	Эргэлтийн цэг 1	17.7 км
Эргэлтийн цэг 1	Эргэлтийн цэг 2	2.3 км
Эргэлтийн цэг 2	Эргэлтийн цэг 3	11 км
Эргэлтийн цэг 3	Эргэлтийн цэг 4	17 км
Эргэлтийн цэг 4	Эргэлтийн цэг 5	18 км
Эргэлтийн цэг 5	Эргэлтийн цэг 6	6.83 км
Эргэлтийн цэг 6	Эргэлтийн цэг 7	21 км
Эргэлтийн цэг 7	VR-1B- рүү эргэх эргэлтийн цэг	3.5 км
VR-1B-рүү эргэх эргэлтийн цэгээс	VR-1B өрөмдлөгийн талбайд хүрэх шинээр зам үүсэх цэг хүртэл	4.7 км
Шинээр зам үүсэх цэгээс	VR-1B Өрөмдлөгийн талбай хүртэл	0.37 км
Нийт шороон замын хэмжээ		102.4 км



Хавсралт 19. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргад  
2023 оны 07 дугаар сарын 07-нд өргөнө  
А/154 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт



## ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮГНЭЛТ

Дугаар 0005771

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: *"Колворд Монголиа" ХХБ*

Хаяг: *Өвөрхангай борчун багш урагн сум, 5-р баг*

Ажлын байрны зориулалт, үйл ажиллагааны чиглэл:

*Газрын тосны хайгуулын өрөмдлөл*

Барилга байгууламжид гал унтраах тоног төхөөрөмж, /гал унтраах автомат болон дохиоллын систем, утаа зайлуулах систем, усан хангамж/ анхан шатны багаж хэрэгсэл, бодис материал зэргийг байрлуулан ашиглахад энэхүү дүгнэлтийг олгоно.

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3, 19 дүгээр зүйлийн 19.2

Олгосон *2023* он *06* сар *22* өдөр

Хүчинтэй хугацаа *2024* он *06* сар *22* өдөр хүртэл

Дүгнэлт олгосон *Өвөрхангай* аймаг нийслэлийн Онцгой байдлын газар /хэлтсийн/ дарга *Дорж Сүрэнжав* цолтой

Дүгнэлт гаргасан *Өвөрхангай* аймаг нийслэлийн Онцгой байдлын газар /хэлтсийн/ Гал тиймрийн улсын хяналтын байрны дарга *Армаг* цолтой *6 Балжент нвс*

Гэмдэг дарга







Хавсралт 20. Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК-ийн ВР-1 цооногийн үед хэрэгжүүлж ажиллах БОМТ



**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАРУУНБЯАН-УЛААН СУМЫН ӨЛЗИЙТ ХОШУУ БАГИЙН НУТАГТ ОРШИХ “ОНГИ-V” ТАЛБАЙД “ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛЫН ЦООНОГ ӨРӨМДӨХ” ТӨСЛИЙН ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ “МЭЙЖОР ДРИЛЛИНГ МОНГОЛ” ХХК-ИЙН 2023 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ДОТООДЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

/Газрын тосны хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 736/

/Регистрийн дугаар: 5077982/

/Мэйжор Дриллинг Монгол ХХК-ийн регистрийн дугаар: 2704358/

БОМТ-г боловсруулсан, хамтран хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн:

“Мэйжор Дриллинг Монголиа” ХХК-ийн ХАБЭАБО-ны хэлтсийн менежер

DocuSigned by: /Ч.Өлзийсайхан/  
*Ulyii Olsiiyan*  
498343897C1D486

БОМТ-г боловсруулсан, хамтран хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн:

“КАПКОРП МОНГОЛИА” ХХК-ИЙН ХАБЭАБО-ны хэлтсийн менежер

DocuSigned by: /Гари Нийл /  
*Gary Niiil*  
E3C018508404481

2023 он



Хавсралт 21. Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК-ний Химийн бодисын ашиглах тусгай зөвшөөрөл

**ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫГ ЭКСПОРТЛОХ,  
ИМПОРТЛОХ, ХИЛ ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ, ҮЙЛДВЭРЛЭХ,  
АШИГЛАХ, ХУДАЛДАХ, УСТГАХ АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ  
ЗӨВШӨӨРӨЛ**


Огноо: 2022-04-04                      Дугаар: 0002148                      Улаанбаатар хот


Аж ахуйн нэгжийн нэр: Мэйжордриллинг монгол ГХО ХХК  
Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний дугаар: 9019012091  
Регистрийн дугаар: 2704358  
Хаяг: Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, чингисийн өргөн чөлөө, Бармаш барилга

Утас: 70119952, 70119952  
Дараах химийн хортой, аюултай бодис:  
Ашиглах    аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг                      2022.04.01-2025.12.31                      хүртэл хугацаагаар олгов.

№	Бодисын нэр		Томьёо	Олон улсын бүртгэлийн дугаар /CAS/	Ангилал	Үйлдвэрлэсэн улс	Хэмжээ
	Монгол	Олон улсын					
1	Хавсралтад дурдсан 62 нэр төрлийн бодис						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Улсын хилээр нэвтрүүлэх боомт: ---

Зөвшөөрөл олгосон: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам  
Төрийн нарийн бичгийн дарга  
 Э. БАТТУЛГА

Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн  
 Ц. БАТЖАРГАЛ





Химийн хорт болон аюултай бодисыг  
Ашиглах 0002148 дугаартай  
тусгай зөвшөөрлийн хавсралт

№	Монгол нэр	Олон улсын нэршил	Томъёо	CAS дугаар	Зөвшөөрсөн хэмжээ, тн
1	Өрмийн алхны тос	Hammer oil 150	Highly refined paraffinic oil>60%	5500-88	3
2	Өрмийн алхны тос	Hammer oil 320	Highly refined paraffinic oil>60%	5500-88	3
3	Өрмийн штангийн тос	Amc liquid rod grease	CH <sub>2</sub> -O-C(O)-R1 CH-O-C(O)-R2 CH <sub>2</sub> -O-C(O)-R3	7641-44	6
4	Өрмийн штангийн тос /өндөр идэвхт/	Amc rod grease xtra tacky	Barium, acetate tallow fatty acid complex hydrocarbon mineral oil (70-80%)	64742-52-5	12
5	Өрмийн хошууны тос	Ep bit lube		6921-10-3	12
6	Ургамлын гаралтай тастагчийн тос	Amc universal	Refined Vegetable oil	7639-46	15
7	Ургамлын гаралтай өрөмдлөгийн тос	Penetrol xtra	CH <sub>2</sub> -O-C(O)-R1 CH-O-C(O)-R2 CH <sub>2</sub> -O-C(O)-R3	7639-46	2.4
8	Ургамлын гаралтай өрөмдлөгийн тос	Torque-free xtra		7177-11	2.4
9	Органик полимер	Austrol	[C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>2</sub> (OH) <sub>2</sub> -X(OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub> )X] <sub>n</sub> 100% ethylcellulose	9004-57-3	15
10	Шингэн полимер	Amc-liquid pol	Drilling fluid additive	60815	15
11	Сэргээх полимер	Amc-cr-650	Drilling fluid additive, 100%	4902-92	15
12	Полимер, өсдөг	Amc-aus plug	Cross-linked polyacrylamide, 100%	9003-05-8	6
13	Нийлэг ко-полимер	Aus-floc		4902-93	2.4
14	Нийлэг ко-полимер	Aus-floc blocks	Co-Polymer	6089-06	2.3
15	Цэвэрлэгч полимер	Well clean	Sodium carboxymethyl cellulose, 100%	7758-16-9	1.44
16	Полимер, цавуулаг	Amc pac-l			2.3
17	Полимер, цавуулаг	Amc pac-r	Sodium carboxymethyl cellulose, 100%	9004-32-4	9
18	Полимер, цавуулаг	Ezee pac-r			9
19	Өрөмдлөгийн цемент	Gyp-set 15	Calcium sulfate hemihydrate	10034-76-1	8
20	Өрөмдлөгийн цемент	Gyp-set 30		10034-76-1	6
21	Шингэн цемент	Fr-100l	Naphthalenesulfonic acids	68153-01-5	2.4
22	Цементийн нэмэлт	Amc xxx 10	Calcium chloride 80%	10043-52-4	1
23	Цементийн нэмэлт	Amc xxx 15	fly ash-low quartz 20%	68131-74-8	1.4
24	Өрөмдлөгийн хөөс	Super foam	Anionic surfactants, 60%	7177-08	2.4
25	Өрөмдлөгийн нийлэг хөөс	Aus grip a eco	Polyethylene polypropylene glycol glyceryl ether	9082-00-2	1.6



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

			determined not to be hazardous >60		
50	Усан суурьтай өрөмдлөгийн шингэнд хэрэглэх зориулалттай силикон суурьтай бүх төрлийн хөөс арилгагч	AUS Defoamer S	-	26-5533	3
51	Цардуул	AMC Aus Dex	Холимор >60	9005-25-8	3
52	Органик полимер	AMC Ezee trol	Sodium carboxymethyl cellulose (>60%); sodium carbonate (<5%)	-	3
53	Нимбэгийн хүчил	Citric Acid	Citric acid > 96	77-92-9	3
54	Өндөр чанарын занарын урвал саармагжуулах	Sinomud Kla- stab	Полиамин	9046-10-0	3
55	Өрөмдлөгийн шингэний нэгдэл.	AMC Ben Viscosifier.	Bentonite, >94 %	1302-78-9	3
56	Өрөмдлөгийн шингэн нэмэлт	AMC Glute 9 AMC Glute 50	Глутаральдегид 50%, үс 50%	111-30-8 7732-18-5	3
57	Натрийн сульфит	Sodium Sulphite Sodium Sulfate Anhydrous	Sodium Sulphite >95	7757-83-7	3
58	Өрөмдлөгийн нэмэлт шингэн	AMC Quick Seal	Найрлагыг аюулгүй гэж тодорхойлсон, 100 %	62-2620	3
59	Сийл лац	Sinomud Seal	Шааран ноосон эслэг 60-100 %	65996-69-2	3
60	Натрийн бикарбонат	AMC Sodium bicarbonate	Sodium bicarbonate >99	144-55-5	3
61	Цемент түргэн хатаагч, үсгүйжүүлэгч нэмэлт	BASF MasterRheobuild 1000NT	Calcium naphthalene sulphate - formaldehyde condensate (25 - 50%)	37293-74-6	3
62	Магнийн оксид	Magnesium Oxide	Магнийн оксид >65 %, кальцийн оксид 1-3 %, үлдсэн аюулгүй найрлага.	-	3



Хавсралт 22. Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дриллинг ХХК-ний Аюултай хог хаягдал шилжүүлэх гэрээ



## АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ШИЛЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

---

**Огноо:** 2023 оны 06 сарын 05  
**Гэрээний дугаар:** Ш-23/079

---

 <p><b>Хүлээн авагч:</b> <b>“Цэцүүх Трейд” ХХК</b> <b>Хаяг:</b> Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо /16010/, Энхтайваны өргөн чөлөө 64/2 тоот “Цэцүүх” оффис, үйлчилгээний төв <b>Утас:</b> +976 70179777, +976 70180632 <b>Цахим хаяг:</b> <a href="http://www.tssetsuuh.mn">www.tssetsuuh.mn</a> <b>Регистрийн дугаар:</b> 2066521 <b>Цахим шуудан:</b> <a href="mailto:info@tssetsuuh.mn">info@tssetsuuh.mn</a></p>	<p><b>Үүсгэгч:</b> <b>“Мэйжор Дриллинг Монгол” ХХК</b> <b>Хаяг:</b> Мэйжордриллинг Монгол ХХК, Улаанбаатар Хан-Уул 3-р хороо, ажилчны гудамж, Шингэст JSI Барилга <b>Утас:</b> 77119950 <b>Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар:</b> 00017603 <b>Регистрийн дугаар:</b> 2704358 <b>Цахим</b> <span style="float: right;"><b>шуудан</b></span> <a href="mailto:solungobuyar.samdantsodol@majordrilling.com">solungobuyar.samdantsodol@majordrilling.com</a></p>
--	--



БАТЛАВ.  
“ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД” ХХК  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  
.../Н.БИЛГҮҮН/

БАТЛАВ.  
“МЭЙЖОР ДРИЛЛИНГ МОНГОЛ” ХХК  
ЗАХИРАЛ  
СЭМЮЭЛ ВИЛИАМС

**АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ШИЛЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ**

2023 оны 06 сарын 05 өдөр

№ Ш-23/076  
Ү-

Улаанбаатар хот

Нэг талаас **Цэцүүх трейд ХХК** /цаашид “Хүлээн авагч” гэх/ төлөөлж Үйлдвэрийн дарга албан тушаалтай Б.Дарамбазар, Нөгөө талаас .. нөгөө талаас “Мэйжор Дриллинг Монгол” ХХК-г /тээвэрлүүлэгч гэх/ төлөөлж Хүний нөөцийн ажилтан албан албан тушаалтай Самданцоодол овогтой Солонгобаяр бид харилцан тохиролцож Монгол улсын Иргэний хууль, Хог хаягдлын тухай хууль Засгийн газрын **2018 оны 116-р тогтоолын 1, 2-р хавсралт болох “Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон бүртгэх тайлагнах журам”, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 02-р сарын 02-ны өдрийн А/21 тоот тушаал** болон Байгаль орчны аюулгүй байдалтай холбогдох хууль, журмыг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.

**Нэг. Гэрээний агуулга**

- 1.1. Энэхүү гэрээгээр Аюултай хог хаягдал үүсгэгчээс аюултай хог хаягдлын дагалдах бичгийн дагуу түүнээс гарч байгаа аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагч нь хүлээн авч хадгалах, дахин боловсруулах, устгалд оруулах, үүсгэгч нь хүлээн авагчид тохиролцсон үнийг төлөх болон талуудын эдлэх эрх, үүрэг хариуцлагын талаар зохицуулна.
- 1.2. Эл гэрээгээр шууд зохицуулагдаагүй бусад харилцааг Монгол улсын Хог хаягдлын тухай хууль, Иргэний хууль болон бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.
- 1.3. Аюултай хог хаягдлын тоо хэмжээ, төрөл болон үнийн талаар гэрээний Хавсралт 1-т тусгах ба талууд гэрээний хугацаанд аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэх бүртгээ дагалдах бичгийг гэрээнд хавсаргах ба энэ нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

**Хоёр. Аюултай хог хаягдалд тавигдах шаардлага**

- 2.1. Аюултай хог хаягдлыг ангилан ялгаж “Аюултай хог хаягдал” гэсэн тэмдэглэгээтэй байна.
- 2.2. Аюултай хог хаягдал савласан сав бүр нь ямар химийн бодис хадгалж байсан тухай нэр шошготой байна.
- 2.3. Үүсгэгч нь аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэх бүртгээ үүсээн болон хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээний талаарх бүртгэлийг хүлээн авагчид шилжүүлнэ.
- 2.4. Аюултай хог хаягдлыг шилжүүлэхдээ **БОАЖЯ Сайдын 2018 оны 02-р сарын 02-ны өдрийн А/21 тоот тушаалын 1-р хавсралтад заасан маягтын дагуу дагалдах бичгийг** бүрдүүлж өгнө.
- 2.5. Аюултай хог хаягдлын савыг суллаж онц хорттой, тэсрэмтгий, шатамхай бодис /тухайлбал цианид натри гэх мэт/ -г тухайн бодисын шинж чанарт тохирсон уусмалаар ивэрлэсэн байна. Хоосон сав нь ЗГ-н 2018 оны 116-р тогтоолын 1-р хавсралтын 5.7-5.9-д заасан шаардлагыг хангасан байвал зохино.
- 2.6. Үүсгэгч Аюултай хог хаягдлыг “Аюултай хог хаягдал” тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий Аж ахуй нэгжийн тээврийн хэрэгсэлээр ачиж, тээвэрлүүлж хүлээн авагчид шилжүүлнэ.

Хуудсыг баталгаажуулсан:

Хуудас 2/10



- 8.3. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас бараа материал утсан, дутсан тохиолдолд шилжүүлэн хүлээлгэн өгөх хүртэлх эрсдэлийг үүсгэгч, шилжүүлэн хүлээн авснаас хойших эрсдэлийг хүлээн авагч хариуцна.
- 8.4. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлыг зохиомлоор буюу болгоомжгүйгээр бий болгосноос бусад тохиолдолд форс мажорын нөхцлөөс шалтгаалан учирсан хохирлыг хариуцах үүргээс талууд чөлөөлөгдөнө.

#### Ес. Бусад зүйл

- 9.1. Энэхүү гэрээний хэрэгжилтийн явцад гэрээнд аливаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тохиолдолд бичгээр үйлдэж эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 9.2. Гэрээнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвхөн бичгээр оруулах ба талуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 9.3. Энэхүү гэрээг Монгол хэл дээр хоёр хувь үйлдэж, Үүсгэгч тал 1 хувь, Хүлээн авагч тал 1 хувийг тус тус хадгалсан нь хуулийн ижил хүчинтэй.

#### ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

##### Үүсгэгч талыг төлөөлж:

“Мэйжор Дриллинг Монгол” ХХК-ийн  
Хүний нөөцийн  
ажилтан..... / Солонгобаяр  
..... /

Суурин утас: (976) 77119950  
Гар утас: 94212040  
Регистер: 2704358  
УБ гэрчилгээний дугаар: 000176030  
Химийн бодис ашиглах, импортлох тусгай  
зөвшөөрлийн дугаар: 00025148  
Хаяг: Мэйжордриллинг Монгол ХХК,  
Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, ажилчны  
гудамж, Шинэст JSC Барилга

Хог хаягдал үүсэх хаяг: Өвөрхангай  
аймаг, Баруун Баян-Улаан сум болон  
Өмнөговь аймаг, Номгон сум  
Email хаяг:  
[solongobayar.samdantsoodol@majordrilling.com](mailto:solongobayar.samdantsoodol@majordrilling.com)

##### Хүлээн авагч талыг төлөөлж:

Цэцүүх Трейд ХХК-ийн  
Үйлдвэрийн дарга  
..... / Б.Дарамбазар /

Нягтлан:  
..... / Т. Буяндэлгэр /

Суурин утас: 70189778  
Гар утас: 99057786  
Регистер: 2066521  
УБ гэрчилгээний дугаар: 9011026056  
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: Б-000001  
Хаяг: Баянгол дүүрэг, 5-р хороо,  
Энхтайвны өргөн чөлөө – 64/2, Цэцүүх  
Трейд ХХК-ийн оффис, үйлчилгээний байр  
Email хаяг: [Darambazar@tsetsuuh.mn](mailto:Darambazar@tsetsuuh.mn)  
Шуудангийн хаяг: ШХ-1138

Хуудсыг баталгаажуулсан:

Хуудас 6/10



Хавсралт 23. Өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч Мэжор Дрилинг ХХК-ний Аюултай хог хаягдлыг шилжүүлсэн дагалдах бичиг

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын  
2018 оны 02 сарын 02-ны өдрийн А/21 дугаар  
тушаалын 1 дүгээр хавсралт

**АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ХАЯГДЛЫН ДАГАЛДАХ БИЧИГ**

№ **0000589**

Дагалдах бичгийн дугаар:  
/шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хуудас хэрэглэнэ./

<b>1. Үүсгэгчийн талаарх мэдээлэл:</b>								
Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн бүртгэлийн дугаар:								
Аюултай хог хаягдал үүсгэгч байгууллагын нэр: <u>Мэжор Дрилинг мангол ХХК</u>								
<b>2. Аюултай хог хаягдлыг хүлээлгэн өгсөн:</b>								
Овог нэр		Албан тушаалтан		Гарын үсэг:		Огноо:		
<u>С. Саланбаатар</u>		<u>Хүний нөөц ажилтан</u>				2023 он 08 сар 03 өдөр		
<b>3. Тээвэрлэгчийн талаарх мэдээлэл:</b>								
1/ Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар: <u>85-17 УНО</u> Тээвэрлэгчийн бүртгэлийн дугаар: .....								
<b>4. Аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээлэл:</b>								
	Аюултай хог хаягдлын нэр	Аюулын ангилалын зэрэглэл	Савлагааны бүлэг	Савны		Хэмжээ	Нэгж /кг Эсвэл/ш	Аюултай хог хаягдлын код
				дугаар	Төрөл			
1	<u>Канисур/20/</u>	<u>x</u>	<u>Билүүц</u>		<u>НОРЕ</u>	<u>15</u>	<u>ц</u>	<u>150109</u>
2	<u>Шүүдэс</u>	<u>x</u>	<u>Билүүц</u>			<u>1700</u>	<u>кг</u>	<u>150109</u>
3								
4								
<b>3. Тээвэрлэх үед анхаарах нэмэлт зааварчилгаа, мэдээлэл:</b>								
<b>5. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан тээвэрлэгч:</b>								
1. Овог нэр: <u>С. Саланбаатар</u>		Гарын үсэг: .....		2023 он 08 сар 03 өдөр				
<b>6. Үл зохицол:</b>								
<b>7. Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл:</b>								
Аж ахуйн нэгжийн нэр: <b>ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК</b>								
Цэцүүх трейд ХХК бүртгэлийн дугаар: <b>У-001123</b>								
Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авсан.								
Овог нэр: <u>Цэцүүх трейд ХХК</u>		Албан тушаал: <u>Мэжор</u>		Гарын үсэг/тамга:		Огноо: 2023 он 08 сар 03 өдөр		



Хавсралт 24. Өрөмдлөгийн гэрээт компаний ажилчдын химийн бодистой харьцаж ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны сургалтын сертификат



/Тусгай зөвшөөрөл: 17100326/

## ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар № 23/С-502

Хүндэт *Б.Цогбаяр* танд

“Химийн хорт бодистой харьцаж ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа” нь сэдэвт ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан тул ГЭРЧИЛГЭЭ олгов.



“МКЛ” ХХК-ийн дэргэдэх  
сургалтын төвийн захирал

*Д.Хоролсүрэн*

Д.ХОРОЛСҮРЭН

Олгосон: 2023.06.09



/Тусгай зөвшөөрөл: 17100326/

## ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар № 23/С-506

Хүндэт *Ж.Жанарбаатар* танд

“Химийн хорт бодистой харьцаж ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа” нь сэдэвт ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан тул ГЭРЧИЛГЭЭ олгов.

“МКЛ” ХХК-ийн дэргэдэх  
сургалтын төвийн захирал



Д.ХОРОЛСҮРЭН

Олгосон: 2023.06.09





Хавсралт 25. Агаарын түр зурвас тогтоосон акт

ХЭЭРИЙН ТҮР ЗУРВАС СОНГОСОН АКТ

"Геосон" ХХК-ны 2023.03.31 өдрийн Иргэний нисэхийн үндэсний төвд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу:

Өвөрхангай нисэх буудлын аэродромын техникч Ч.Баттулга, "Геосон" ХХК-ны Агаарын хөлгийн 2-р нисгэгч Э.Амгаланбаатар нар Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сумын нутагт орших "Үзүүрийн хөндий" гэх газарт түр зурвас сонгож тогтоосон нь.

**Нэг. Түр зурвас, талбайн байрлал**

Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сумын төвөөс баруун урд зүгт 52 км зайд байрлана.

**Хоёр. Түр зурвас, талбайн техникийн тодорхойлолтууд**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Хөөрч буух зурвасны урт               | 1000 метр                                    |
| Өргөн                                    | 50 метр                                      |
| 2. Нислэгийн зурвасын хэмжээ             | 1100x100 метр                                |
| 3. Төгсгөлийн аюулгүйн зурвас урт        | 50x200 метр                                  |
| 4. Хөөрөлт буултын чиглэл                | 90/270 градиус                               |
| 5. Өндөр                                 | 27 талдаа 1324 метр<br>09 талдаа 1329 метр   |
| 6. Газар зүйн байрлал                    | N450842.8 E1015603.7<br>N450842.2 E1015512.5 |
| 7. Хөрсний төрөл                         | Элсэрхэг бор шороон хөрстэй                  |
| 8. Хучилт хөрсний даац / хуурай нөхцөлд/ | Дунд   |
| 9. Ойртолт, оролт, гаралтын нөхцөл       | Чөлөөтэй                                     |

**Гурав.Түр зурвас, талбайн тоноглол**

1. Салхи заагчийг байрлуулна.
2. Байнгын болон түр тэмдэг дохио тэмдэгт байрлуулна.
3. Агаарын хөлгийн бэхэлгээг байрлуулна.
4. Холбоо нагивацийн тоноглол: Онгоцны КВ холбоо, Иридиум сансарын утас, гар утас / Мобисом, Жи-Мобайл, Юнител, Скайтел/
5. Хөөрч буух зурвасын ил харааны тэмдэгтүүдийг 100 метр тутамд тэгш хэмжээтэйгээр байрлуулна.

**Дөрөв. Орчмын саадууд**

№	Саадын төрөл	Өндөр / м/	Зай /км/	Чиглэл
1	Бага богд уул	3590	39	220
2	Хар шил	1850	25	48

**Тав. Орчны тухайн үеийн цаг агаарын онцлог**

Баруун, баруун хойноос зонхилох салхитай.

**Зургаа. Нислэгийн хангалт**



Газрын тосны хайгуулын Онги-V талбайд өрөмдсөн Велосираптор-1 цооногийн өрөмдлөгийн ажил – 2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

1. Нислэгийн удирдлага: Нислэгийг онгоцны даргын шийдвэрийн дагуу зөвхөн ил хараагаар өдрийн гэрэлтэй цагт нислэг үйлдэж Улаанбаатар хотоос КВ станц, Иридум утас болон гар утсаар холбоо барина.
2. Цаг агаарын хангалт: Тус бүс нутгийн цаг агаарын мэдээг Өвөрхангай аймгийн Гучин-ус сумын ус цаг уур орчны төвөөс КВ станц, сансрын утас болон гар утсаар авна.
3. Хамгаалалт: Захиалагч байгууллага хариуцна. Гадны хүн, мал амьтан, машин механизм нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх.
4. Нислэгийн хязгаарлалт: Хөндлөнгийн болон арын салхи зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтэрсэн, цас орсон болон тадаргууд эвдрэл үүссэн мөн харагдах орчин хязгаарлагдмал үед нислэг үйлдэхийг хориглоно. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 04 сарын 30 өдөр баталсан А/270 тушаалын нэгдүгээр хавсралт дахь Түр зурвас, талбай сонгох, бүртгэх журмын 2.1-д заасны дагуу нислэг үйлдэнэ.
5. Хийгдэх ажлууд: Хөөрч буух зурвас дээрх гадны биет, жижиг хог хаягдлыг түүж цэвэрлэх. Мөн нислэг үйлдэх үед хамгаалалт гаргаж хүн болон мал, амьтны аюулаас сэргийлэх. Хөөрч буух зурвасын зүүн талд бүдгэрсэн авто замын ховилыг шороогоор дүүргэж нягтруулах, хөрч буух зурвасын суларсан гадаргууг талбайг индүүдэж нягтруулах. Нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах.
6. Түр зурвас талбайг хариуцах ажилтан:  
Нэр: Капкорп Монголиа компани Байгаль орчны мэргэжилтэн  
Д.Буянзул Утас:99700075

Өвөрхангай аймгийн Гучин-ус сумаас 52 км зайд орших "Үзүүрийн хөндий" гэдэг газарт түр зурвас, талбайг "Cessna-208B" төрлийн агаарын хөлгийг нислэгт 2023 оны ... сарын ....-ны өдрөөс 2023 оны ... сарын ....-ны өдөр хүртэл .... хоног /өдрийн цагаар/ ашиглаж болно.

Өвөрхангай нисэх буудлын аэродромын техникч: Ч.Номиня

Ч.Баттулга

"Геосан" ХХК-ийн Агаарын хөлгийн 2-р нисгэгч: Э.Амгаланбаатар

Э.Амгаланбаатар

Долоо, Агаарын тээвэрлэгч байгууллагын гүйцэтгэх захирлын мэдэгдэл

Нармандал овогтой Мөнхжаргал миний бие энэхүү сонгосон түр зурвас, талбайг Иргэний нисэхийн тухай Монгол улсын хууль, иргэний нисэхийн багц дүрэм, Аэродром төлөвлөлт ба ашиглалтын техникийн баримт бичгийн холбогдох журамд нийцүүлэн ашиглаж, нислэгийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хариуцаж ажиллахаа баталж байна. Мөн Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 04 сарын 30 өдөр баталсан А/270 тушаалын нэгдүгээр хавсралт дахь Түр зурвас, талбай сонгох, бүртгэх журмын 4.1.2-д заасны дагуу "Бизнес захиалгат" нислэг үйлдэнэ.


Баталгаа гаргасан: Геосан ХХК үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Н.Мөнхжаргал

Гарын үсэг: Н.Мөнхжаргал тамга

Огноо: 2023 оны с.Н. сарын .Н. өдөр



Хавсралт 26. Баруунбаян-Улаан сумын засаг даргын тодорхойлолт

  
**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГАТ  
БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН  
ЗАСАГ ДАРГА**

**АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН  
ТОСНЫ ГАЗАРТ**


2023.09.22 № 1/46  
Танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

**Тодорхойлолт**

Засгийн газрын бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт /БХГ/ "Онги-V" талбайд Петро Матад группийн охин компани болох "Капкорп Монголиа" ХХК нь АМГТГ-аас баталсан 2023 оны хайгуулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан сумын нутагт "Велосираптор-1" хайгуулын цооногийн өрөмдлөгийн ажлыг 2023 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2023 оны 7 дугаар сарын 25-ны хооронд амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.

"Капкорп Монголиа" ХХК нь хайгуулын ажлын гүйцэтгэхдээ Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа холбогдох хууль тогтоомжууд, ISO 14001 байгаль орчны менежментийн системийн стандарт, ХАБЭА-н менежментийн тогтоолцооны MNS ISO 45001:2018 стандарт, IOGP олон улсын газрын тос, байгалийн хий олборлогчдийн холбооны зөвлөмж, IDAC олон улсын өрөмдлөгийн компаниудийн холбооноос гаргасан зөвлөмжүүдийг дагаж мөрдөн, БХГ-ний дагуу орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийг Баруунбаян-Улаан суманд хэрэгжүүлж ажилласныг тодорхойлж байна.


Хайгуулын цооногийн өрөмдлөгийн төслийн хугацаанд тус компани "Нэг замын бодлого" баримтлах, байгаль орчноо хамгаалах, сум орон нутаг, малчин ард иргэдтэй харилцах, улмаар тэднийг бүхий л талаар дэмжих ажлыг маш сайн зохион байгуулж хариуцлагатай уул уурхайн компани гэдгээ батлан харуулсан гэдгийг онцгойлон дурьдаж байна.

ДАРГА  Д.БААТАРЧУЛУУН

D:\My doc alban bichig ZD A4.doc  
692019030



Хавсралт 27. Гучин-Ус сумын засаг даргын тодорхойлолт

  
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ  
ГУЧИН-УС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА  
4 дугаар Сан Гучин-Ус сум Өвөрхангай аймаг 02155  
Утас: 676 7032 6702 Цалин хаяг: гучинус@gov.mn  
Цэвэр хуудас: www.guchinus.gov.mn


2023.09.21 № 1/115  
ТАНГАЙ \_\_\_\_\_ -1111 № \_\_\_\_\_ -1

**ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Петро Матад группийн охин компани болох "Капкорп Монголиа" ХХК нь АМГТГ-аас баталсан 2023 оны хайгуулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу Засгийн газрын бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт /БХГ/ "Онги-V" талбайд "Велосираптор-1" хайгуулын цооногийн өрөмдлөгийн ажлыг 2023 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2023 оны 7 дугаар сарын 25-ны хооронд амжилттай хийж гүйцэтгэсэн билээ.

"Капкорп Монголиа" ХХК нь хайгуулын ажлын гүйцэтгэхдээ Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа холбогдох хууль тогтоомжуудийн бүрэн хэрэгжүүлж, байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийг БХГ-ний дагуу жил бүр хэрэгжүүлэн ажилласан.

Тус компани хайгуулын цооногийн өрөмдлөгийн төслийн хугацаанд "Нэг замын бодлого" баримтлах, байгаль орчноо хамгаалах, сум орон нутаг, малчин ард иргэдтэй харилцах, улмаар тэднийг бүхий л талаар дэмжих ажлыг маш сайн зохион байгуулж хариуцлагатай уул уурхайн компани гэдгээ батлан харуулсан гэдгийг онцгойлон дурьдаж байна.



My.Doc.D.Alban bichig



Хавсралт 28. Яаралтай үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө

Хавсралт 29. Эрүүл мэндийн яаралтай нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө

Хавсралт 30. Үйл ажиллагааны өмнөх орчны хяналт шинжилгээний ажлын тайлан

Хавсралт 31. Үйл ажиллагааны үеийн орчны хяналт шинжилгээний ажлын тайлан

Хавсралт 32. Үйл ажиллагааны дараах үеийн орчны хяналт шинжилгээний ажлын тайлан

Хавсралт 33. Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан

Хавсралт 34. Цацраг үүсгүүр ашиглалтын талаарх тайлан
