

**ЗАВХАН АЙМГИЙН ТӨВ УЛИАСТАЙ ХОТОД БАРИГДАХ 30 ГКАЛЦ ХУЧИН
ЧАДАЛТАЙ ДУЛААНЫ СТАНЦ, 5.851 М ШУГАМ ХООЛОЙ, 8 ТҮГЭЭХ ТӨВҮҮДИЙГ
БАРЬЖ АШИГЛАХ ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

/АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР: 5638089/

ХЯНАСАН:

ЗАВХАН АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

.....

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН:

“БЬЮКСАН ИНЖЕНЕРИНГ”

компаний захирал

ЧОЙ САНГ

БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАСАН:

“БЬЮКСАН ИНЖЕНЕРИНГ” компанийн

ХАБЭАБО хариуцсан менежер

А.АНДБАЯР

ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Завхан аймгийн Улиастай хотод баригдах 30 Гкал/ц хүчин чадалтай дулааны станц, 5.851 метр шугам хоолой, дулаан дамжуулах 8 төвийг барьж ашиглах төслийг “МЭЗ” ХХК компани гүйцэтгэж байна.

Завхан аймгийн дулаан хангамжийг сайжруулах төслийн ажлын гүйцэтгэгч “МЭЗ” ХХК нь төслийн талбайд 2023.04 сард эхэлсэн бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд доорх ажлуудыг гүйцэтгээд байна.

2023 оны 05 -р сараас барилгын суурийн ажил, конвейер I, II, бутлуурын барилгын суурийн ажлууд эхэлсэн.

Конвейер I, II, бутлуурын барилга, харуулын байрны суурь, түлш хүлээн авах барилга, утаа сорогчийн барилгын суурь, цахилгааны барилгын суурь зэрэг үндсэн барилга угсралтын ажил 30 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Зуух угсралтын ажил нь 2023 оны 04 -р сарын 10 -нд эхэлсэн. Одоогийн байдлаар зуух 1,2,3-ын экран хоолой, циклон, эканомайзер, агаар халаагч зэрэг тоноглолуудыг угсарч дуусаад байна.

2023 онд төслийн гүйцэтгэл

Барилга угсралт 21 %

Зураг төсөв 70 %

Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэлт 60 %

Нийт гүйцэтгэл 40 % тай явж байна.

2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд “МЭЗ” ХХК-ийн зүгээс доорх үндсэн чиглэлийг голлон хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

- Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд
- Осол, эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд
- Хог хаягдлын менежментийн хүрээнд
- Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд

СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД:

2018 онд батлагдсан 10 аймгийн төвийн дулаан хангамжийг сайжруулах төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтэд тулгуурлан байгаль орчны бүрдэл хэсгүүд бүрт тодорхойлсон сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацаа, үндэслэл, баримтлан ажиллах дүрэм, стандартууд, зардлын хамт оруулсныг мөрдөж ажилласан.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД:

Газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр				
Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Авч хэрэгжүүлсэн ажлууд	Хугацаа	Зарцуулсан зардал	Хариуцан ажилласан
Дулааны станцын барилгын ажилд ашиглаж байгаа бараа материал, тоног төхөөрөмжийн сав, баглаа, боодол, материалын ашиглахгүй болсон хэсэг, ажиллагсадын ахуйн гаралтай хол хаягдлаар газрын гадарга бохирдож болзошгүй.	Барилгын талбайд хог хаягдал хадгалах түр хогийн цэг байгуулсан. Хог хаягдлыг зориулалтын тээврийн хэрэгслээр төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэж хаяж байна.	Төслийн хугацаанд	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөвт багтсан	ХАБЭАБО алба
Барилгын ажлын үед ашиглаж байгаа тээврийн хэрэгслээс тос, шатахуун асгарч газрын гадарга, хэвлийг бохирдуулж болзошгүй.	Төслийн талбайд зогсоол байгуулж тээврийн хэрэгслийг байрлуулж байна. Төслийн талбайд автомашины засвар үйлчилгээ хийхийг хориглосон. Хэрэв ШТМ асгарсан тохиолдолд саарамгжуулах арга хэмжээг хурдан шуурхай авч хэрэгжүүлнэ.	Төслийн хугацаанд	Үйл ажиллагааны зардал	ХАБЭАБО алба
Дулааны станц, дулаан дамжуулах шугам болон дулаан дамжуулах төвүүдийг барих явцад нийт 3.39 га талбайгаас нийт 2.4 тн ялзмагийн нөөц бүхий 2031 м ³ үржил шимт хөрс хуулагдаж, эвдэрнэ.	Барилгын ажил эхлэхийн өмнө хуулж авсан шимт хөрсийг овоолгын талбайд хадгалан, нөхөн сэргээлтийн ажилд эргүүлэн ашиглахаар хадгалж байна.	Төслийн хугацаанд	Үйл ажиллагааны зардал	ХАБЭАБО алба

Барилгажилтын үе: Жижиг хөхтөн амьтад, тэдгээрийн нүх, оромж нөлөөлөлд өртөж болзошгүй.	Барилгажилтын явцад амьтад устахаас урьдчилан сэргийлж, газар хөндөлтийн өмнө амьтад өртөх эсэхийг шалгах, амьтдыг эрсдэх орчноос үргээж холдуулах ажлыг хийсэн.		Үйл ажиллагааны зардал	ХАБЭАБО алба
Дүн				

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛУУД

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд				
Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Авч хэрэгжүүлсэн ажлууд	Хугацаа	Зарцуулсан зардал	Хариуцан ажилласан
Хог хаягдлыг ангилан ялгаж шаардлага хангасан хогийн цэг байгуулан түр хадгалах	Хог хаягдлыг зориулалтын тээврийн хэрэгслээр зөвшөөрөгдсөн хогийн цэг дээр хаяж байна.	Төслийн хугацаанд	800.000	-ХАБЭАБО алба
Дүн			800.000	

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ТОХИЖУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД;

Барилгын ажил дууссаны дараа нөлөөлөлд өртсөн газрыг тэгшилж, дулааны станцын барилга хоорондын талбайг тохижуулах, хөрс хуулалтаас хадгалсан өнгөн хөрсөөр ургамал ургах нөхцөлийг бүрдүүлэх, нөхөн сэргээлт, орчны тохижуулалт болон явган хүний зам, автозамыг хатуу хучилттай болгох ажил хийгдэнэ.

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД;

Судалгааны хүрээнд тус аймагт дулааны станцын төсөлтэй холбоотой нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох айл өрх, хувь хүн, аж ахуйн нэгж байхгүй болно.

Төслийг хэрэгжүүлэх хугацаанд аймаг, сум, аж ахуйн нэгж, иргэдийн зүгээс нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага хүргүүлээгүй тул нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаа гараагүй.

ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД;

Завхан аймгийн Улиастай хотод баригдах дулааны станцын төслийн үйл ажиллагаанд хамаарах талбай болон түүний орчмын нутагт нь түүх соёлын дурсгалд тооцож болохуйц газар, археологийн болон палеонтологийн олдвор одоогоор тохиолдоогүй.

Цаашид үйл ажиллагааны явцад түүх, соёлын дурсгалт зүйл илэрсэн үед “Монгол Улсын Үндсэн хууль”-ийн I бүлгийн 7-р зүйлд “Монголын ард түмний түүх, соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв төрийн хамгаалалтад байна” гэж заасны дагуу түүх, соёлын өвийг эрэн сурвалжлах, бүртгэх, судалж шинжлэх, зэрэглэл тогтоох, үнэлэх, хадгалж хамгаалах, сурталчлах, сэргээн засварлах, өвлүүлэн уламжлуулахтай холбоотой үүрэг хариуцлагаа мөрдөж ажиллах нь зүйтэй гэсэн үүрэг хүлээн ажиллаж байна.

ОСОЛ ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД:

Төслийн бүхий л үе шатанд учирч болзошгүй аюул, осол эрсдлүүдийг урьдчилан тодорхойлох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхаарч ажиллаж байна.

Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Авч хэрэгжүүлсэн ажлууд	Хугацаа	Зарцуулсан зардал	Хариуцан ажилласан
Төслийн талбайд гал түймрээс сэргийлэх, боломжит бүх арга хэмжээг авах, Нийт ажилчдыг гал унтраах сургалтад хамруулах, Галын дохиолол, гал унтраагуур, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг байрлуулах, Төслийн талбайд галын дохиолол, аюулын гарц байрлалыг заасан самбар байрлуулах, галын дохиолол, гал унтраах хэрэгслийн тэмдэг санамж байрлуулах,	Галын аюулгүй байдлыг хангаж MNS 5566:2020 стандартын дагуу В ангиллын галын хор, галын сарайг хийж байршуулсан. Мөн төслийн барилгын шаардлагатай газруудад галын хор байршуулсан. Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, анхааруулах, санамж тэмдэг, самбаруудыг барилгын талбайд байрлуулсан.	Төслийн хугацаанд	1.200.000	ХАБЭАБО алба
Төслийн талбайд аюулгүй ажиллагааны бүх дүрэм журам болон аюултай бодистой холбоотой бусад бүх журмыг дагаж мөрдөх	Төслийн талбайд аюултай бодистой холбоотой бүх дүрэм журмыг мөрдөж, гэсэрч дэлбэрэх аюултай хийн баллонуудыг зориулалтын хадгалах саванд хийн аюулгүй байдлыг хангасан. Бусад бүх журмыг дагаж мөрдөн ажиллаж байна.	Төслийн хугацаанд		ХАБЭАБО алба
Ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн тандалт судалгаа хийх	Яаралтай үед ашиглах анхны тусламжийн хайрцагийг байршуулж, шаардлагатай эм, тариа бусад хэрэглэлүүдээр хангасан.	Төслийн хугацаанд	300.000	ХАБЭАБО алба
Автомашины осол	Автомашины осол гэмтэл гарахаас урьдчилан сэргийлж тээврийн хэрэгслийн авто зогсоол байгуулсан. Барилгын ажлын үед зорчих замыг засч замын хөдөлгөөний дүрмийн дагуу тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулсан.	Төслийн хугацаанд	Үйл ажиллагааны зардал	ХАБЭАБО алба

Ажиллагсдын эрүүл мэнд	Ажиллагсдыг хүнс болон хэрэглээний усны чанарт анхаарч эрүүл ахуйн шаардлага хангасан цэвэр усыг хэрэглэж байна. Хэрэглээний цэвэр усыг 2023 оны 4 сард Завхан аймгийн стандарт хэмжил зүйн итгэмжлэгдсэн лабораторид нянсуудлал, хими, хор судлалын шинжилгээнд хамруулсан.	Жилд 1 удаа	Орчны хяналт шинжилгээний зардалд багтсан	ХАБЭАБО алба
			Дүн	1.500.000

ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД:

“МЭЗ” ХХК-ийн Завхан аймгийн Улиастай хотын нутагт хэрэгжүүлж буй дулааны станц барьж ашиглах төслийн орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 оны БОМ-н төлөвлөгөөний дагуу хөрс, агаар, тоосны, шинжилгээг жилд 1 удаа авч Завхан аймгийн УЦУОШ газрын лабораторт, ундны уснаас хагас жил тутам дээж авч итгэмжлэгдсэн лабораторт шинжлүүлж байнгын хяналт тавин ажиллаж байна.

Газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах				
Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Авч хэрэгжүүлсэн ажлууд	Хугацаа	Зарцуулсан зардал	Хариуцан ажилласан
Хөрс				
Ерөнхий хими болон элементийн шинжилгээ	Завхан Аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газарт төслийн барилгын талбайн 2 цэгээс дээж авч хөрсний шинжилгээ хийлгэсэн.	2023/05 сард	250.000	Завхан аймгийн УЦУОШ Газар ХАБЭАБО
Дүн			250.000 төгрөг	
Ус				
Усны ерөнхий химийн шинжилгээ	Завхан аймгийн стандарт хэмжил зүйн итгэмжлэгдсэн лабораторт усны шинжилгээ өгсөн.	1 удаа	65.000	Завхан аймгийн хэмжил зүйн лаборатори ХАБЭАБО
Хүнд элементийн шинжилгээ				
Бактериологийн шинжилгээ				
Дүн			65.000 төгрөг	
Агаар				
Тоос PM10, PM2.5	Завхан Аймгийн Усцаг уур, орчны шинжилгээний газарт дээж авч агаарын шинжилгээ хийлгэсэн.	2023.05 сард	250.000	Завхан аймгийн УЦУОШ Газар ХАБЭАБО
Дуу чимээ				
Дүн			250.000 төгрөг	
Нийт дүн			565.000 төгрөг	

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НИЙТ ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН

№	Менежментийн төлөвлөгөөний зардлын агуулга	Зарцуулсан зардлын хэмжээ, мян.төг
1	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардал	800.000
2	Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний зардал	1.500.000
3	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зардал	565.000
Нийт		2.865.000

Дүгнэлт

Завхан аймгийн төвийн дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл эхэлснээс хойш аюул осолгүй, байгаль орчинд ээлтэй ажилласан байна. Энэ хугацаанд байгаль орчны эсрэг гарсан үл тохирол, зөрчилгүй ажилласан.

БОМ- н төлөвлөгөө боловсруулснаар хүн болон байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх нөлөөллийг цаг алдалгүй хариу арга хэмжээ авч аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.

- Байгаль орчинд сөрөг нөлөөллийг бууруулах, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах орчныг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.
- Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл болон үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.
- Байгаль орчны тухай хууль тогтоомжыг мөрдүүлэн ажиллаж байна.

Завхан аймгийн УЦУОШ газарт өгсөн агаарын шинжилгээний хариу

Маягт 7.8.1

ЦУОШГ-ын Даргын 2020 оны
А/54 тоот тушаалын 2-р хавсралтУС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИЗавхан аймаг Улиастай хот, Өлзийт баг,
Өгөөмөр хэсэг, Утас/Факс: 70-46-22-06
E-mail: zavkhan_tsaguur@yahoo.com

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар: № 2023/239

Сорьц ирүүлсэн байгууллагын нэр, хаяг, утас: МЭЗ ХХК

Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал: Лабораторийн ахлах техникч, Б.Ганлхагва

Сорьц авсан газрын нэр: Улиастай сум

Сорьцын төрөл, хэмжээ, тоо: Агаарын хяналт шинжилгээ, 3

Сорьц авсан огноо: 2023 оны 07 сарын 25

Лабораторид ирсэн огноо: 2023 оны 07 сарын 25

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2023 оны 07 сарын 26

Шинжээчийн код: 01

№	Шинжилгээний арга, стандарт	Агаарын шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS4585:2016	Үр дүн
1	MNS 0017-2-5-12:2021	Хүхэрлэг хий/ SO_2 /	мкг/м ³	450	34.0
2	MNS 0017-2-5-11:2021	Азотын давхар исэл/ NO_2 /		200	25.0
3	MNS 4048-88	Нийт тоосонцор		500	16.0

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ИНЖЕНЕР

БАТАЛГААЖУУЛСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ



/Б.МЯГМАР/

/Б.БАЛЖИННЯМ/

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд үүчинтэй

8116400378

Завхан аймгийн УЦУОШ газарт өгсөн хөрсний шинжилгээний хариу

Маягт 7.8.1

ЦУОШГ-ын Даргын 2020 оны
А/54 тоот тушаалын 2-р хавсралтУС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИЗавхан аймаг Улиастай хот, Өлзийт баг,
Өгөөмөр хэсэг, Утас/Факс: 70-46-22-06
E-mail: zavkhan_tsaguur@yahoo.com

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар: 2023/240, 241

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газар, хүний нэр хаяг: "МЭЗ" ХХК
Улиастай сум

Шинжээчийн код: 03

Шинжилгээний аргын стандарт: MNS 3310:1991

Сорьцын тодорхойлолт

Сорьцын нэр	Сорьц авсан он, сар, өдөр	Хүлээн авсан он, сар, өдөр	Шинжилсэн он, сар, өдөр	Шинжилгээнд ирүүлсэн сорьцын тоо хэмжээ
МЭЗ ХХК-ийн объект	2023.07.25	2023.07.25	2023.07.25	2

№	Сорьцын нэр	Чийг %	SO ₄ мг/кг	Ялзмаг %	pH	NH ₄ мг/кг	NO ₃ мг/кг	P ₂ O ₅ мг/кг
240	Хөндөгдөөгүй хөрс	6.42	613.63	3.105	7.75	3.84	7.85	139.07
241	Үйлдвэрийн хойд талаас	1.27	227.60	0.216	7.13	1.46	37.29	135.74

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ИНЖЕНЕР

/Б.МЯГМАР/

БАТАЛГААЖУУЛСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ




/З.БАЛЖИННЯМ/

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

8116400379

Завхан аймгийн стандарт хэмжил зүйн лабораторид хийсэн усны шинжилгээний хариу

4/27/23, 12:28 PM GASI-LIMS



Хүнсний Аюулгүй Байдлын
Үндэсний Лабораторийн
өрөнхий захирлын 2023 оны 01 сарын
02-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалын
1 дүгээр хавсралт Мянгт 00-59

**ЗАВХАН АЙМГИЙН СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СОРИЛТЫН
ЛАБОРАТОРИ**
Завхан аймаг, Жинст баг, Явуугийн гудамж
Утас:70461010, Факс: 70461010

**ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Бүртгэлийн дугаар : 23-130
Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МЭЭ ХХК

Дэд лабораторийн нэр : Эрүүл ахуйн хими, хор судлалын
хяналтын лаборатори

Дээжийн тодорхойлолт					
Дээжийн дугаар	Дээжийн нэр	Цувралын дугаар	Үйлдвэрлэсэн улс	Бүтээгдэхүүний хүчинтэй хугацаа	Дээжийн тоо хэмжээ
330	Завхан аймгийн Улиастай сумын шивнээр баригдаж байгаа Дулааны цахилгаан станцын шивнээр гаргасан худгийн ус		Монгол Улс	Тодорхойгүй	1750.0 мл

Хүлээн авсан огноо	Шинжилгээ дууссан огноо	Хэвлэсэн огноо
2023 он 04 сар 24 өдөр	2023 он 04 сар 26 өдөр	2023 он 04 сар 27 өдөр

Дээжийн дугаар	Шинжилгээний аргын стандарт	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Шаардлага	Шинжилгээний дүн
330	MNS ISO 7150:2006	Аммоний	1.5 мг/л	0.147 мг/л
	ХХСЛ.7.2.86	Кальци	100.0 мг/л	19.2 мг/л
	ХХСЛ.7.2.86	Магни	30.0 мг/л	10.2 мг/л
	MNS ISO 7890.3:2001	Нитрат	50.0 мг/л	0.33 мг/л
	MNS 4431:2005	Нитрит	1.0 мг/л	0.001 мг/л
	MNS ISO 10523:2001	pH	6.5-8.5	6.04
	MNS 6271:2011	Сульфат	500.0 мг/л	1.5 мг/л
	MNS ISO 8467:1999	Фосфат	1.0 мг/л	0.002 мг/л
	MNS ISO 6059:2001	Хатуулаг	7.0 мг-экв/л	1.80 мг-экв/л
	MNS 4424:2005	Хлорид	350.0 мг/л	1.4 мг/л
MNS 4430:2005	Төмөр	0.3 мг/л	0.03 мг/л	

Санал тайлбар:

БАТАЛСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ:

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.

/Б.ЛХАМСҮРЭН/

gasi.stinji@gee.mn/generalTestPage?sid=0# 1/1

Завхан аймгийн стандарт хэмжил зүйн лабораторид хийсэн усны шинжилгээний хариу



Хүнсний Аюулгүй Байдлын
Үндэсний Лавлагаа Лабораторийн
өрөнхий захирлын 2023 оны 01 сарын
02-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалын
1 дүгээр хавсралт Майт 00-59

**ЗАВХАН АЙМГИЙН СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СОРИЛТЫН
ЛАБОРАТОРИ**

Завхан аймаг, Жинст баг, Явуугийн гудамж
Утас:70461010, Факс: 70461010

**ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Бүртгэлийн дугаар : 23-129
Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МЭЗ ХХК

Дэд лабораторийн нэр : Эрүүл ахуйн нян судлалын хяналтын лаборатори

Дээжийн тодорхойлолт					
Дээжийн дугаар	Дээжийн нэр	Цувралын дугаар	Үйлдвэрлэсэн улс	Бүтээгдэхүүний хүчинтэй хугацаа	Дээжийн тоо хэмжээ
329	Завхан аймгийн Улиастай сумын шингэр баригдаж байгаа Дулааны цахилгаан Станцын шингэр гаргасан худалын ус		Монгол Улс	Тодорхойгүй	250.0 мл
Хүлээн авсан огноо		Шинжилгээ дууссан огноо		Хэвлэсэн огноо	
2023 он 04 сар 24 өдөр		2023 он 04 сар 27 өдөр		2023 он 04 сар 27 өдөр	
Дээжийн дугаар	Шинжилгээний аргын стандарт	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Шаардлага	Шинжилгээний дүн	
329	MNS ISO 6222:1998	55ET	1мл-д Нянгийн тоо-100	1мл-д Нянгийн тоо-24	
	MNS ISO 19250:2017	Salmonella spp	25мл-д Salmonella spp илрэхгүй.	25мл-д Salmonella spp илрээгүй.	
	MNS ISO 6222:1998	Escherichia coli	100мл-д Escherichia coli илрэхгүй.	100мл-д Escherichia coli илрээгүй.	

Санал тайлбар:

**БАТАЛСАН: ЛАБОРАТОРИЙН
ЭРХЛЭГЧ:**

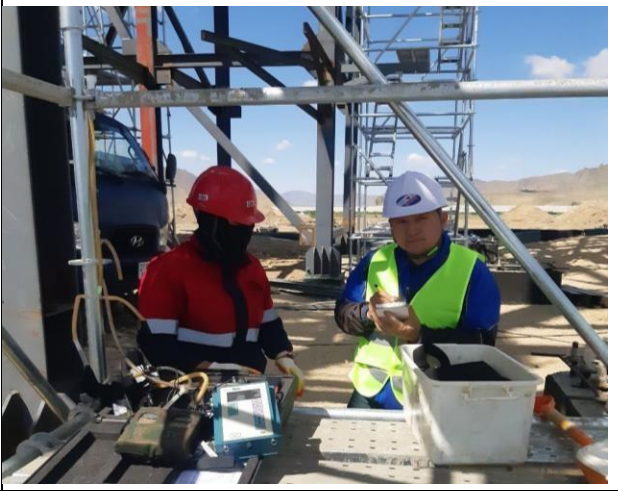







/Б.ЛХАМСҮРЭН/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

<p>1</p>	<p>2023 оны 7 сард Завхан аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний лабораторт хөрсний шинжилгээ өгсөн.</p>	
<p>2</p>	<p>2023 оны 7 сард Завхан аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний лабораторт хөрсний шинжилгээ өгсөн.</p>	
<p>3</p>	<p>2023 оны 7 сард Завхан аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний лабораторт хөрсний шинжилгээ өгсөн.</p>	

<p>4</p>	<p>2023 оны 7 сард Завхан аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний лабораторт агаарын шинжилгээ өгсөн.</p>	
<p>5</p>	<p>2023 оны 4 сард Завхан аймгийн стандарт хэмжил зүйн итгэмжлэгдсэн лабораторт усны шинжилгээ өгсөн.</p>	
<p>6</p>	<p>Хог хаягдал түр хадгалах цэг</p>	
<p>7</p>	<p>Төслийн талбайгаас гарч буй хог хаягдлыг тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэн зориулалтын хогийн цэгт хаяж байна.</p>	<p>Хот тохижилт үйлчилгээний газартай хог хаягдал тээвэрлэх, хамтран ажиллах талаар ярилцаж байна.</p>

<p>8</p>	<p>Барилгын ажилд зориулсан тээврийн хэрэгслийг зорчих зам талбайг сайжруулж зассан.</p>	
<p>9</p>	<p>Барилгын ажилд ашиглах тээврийн хэрэгслүүдийг нэгдсэн зогсоол байрлуулж байна.</p>	
<p>10</p>	<p>Барилгын талбайд галын аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх, гал унтраах зориулалтаар галын хор, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлүүд байрлуулсан.</p>	
<p>11</p>	<p>Барилгын ажилд ашиглаж байгаа техникийг хуваарийн дагуу үзлэгт оруулж, тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулан ажиллаж байна.</p>	<p>2023 оны 4 сард төлөвлөгөөт засварт орсон байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх асгаралт гоожилт бүртгэгдээгүй.</p>
