

ГАРЧИГ

1	ТУХАЙН ОНЫ УУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ	
	ТАНИЛЦУУЛГА	2
2	СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ	
	ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	3
3	НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	5
4	БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА	
	ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	5
5	НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА	
	ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	7
6	ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ	
	ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	7
7	ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ..	7
8	ХОГ, ХАЯГДАЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	8
9	ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ	11
10	АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШААРДЛАГААР БИЕЛҮҮЛСЭН	
	АРГА ХЭМЖЭЭ	15
11	ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН	
	ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН	
	ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	16
12	ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН	
	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ	
	ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	17
13	ДҮГНЭЛТ	20
14	ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТУУД	Error! Bookmark not defined.

1 ТУХАЙН ОНЫ УУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Талст молор” ХХК нь 2013 онд Геологийн суурь судалгаа хийх үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлтэйгээр байгуулагдсан. 2015 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 886 тоот шийдвэрээр XV-019692 тоот хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 3 жилийн хугацаатай олгогдсон. Улмаар талбайн хэмжээнд судалгаа хийж Хар дав гэх нэртэй гянтболдын хэтийн төлөв сайтай илрэл дээр үндсэн хайгуулын ажлыг 2015-2017 онуудад өөрийн хөрөнгөөр хайгуул хийж гянтболдын үндсэн ордыг нээн илрүүлж гянтболдын нөөцийг үйлдвэрлэлийн “В” зэргээр бодитой нөөцийг 0.36% -ийн дундаж агуулгатайгаар 147.4 тн, “С” зэргээр боломжтой нөөцийг 0.49% -ийн дундаж агуулгатайгаар 312.5 тн, “P₁” зэргээр илрүүлсэн баялгийг 0.28% -ийн дундаж агуулгатайгаар 386.46 тн, “P₂” зэргээр таамгалсан баялгийг 0.89% -ийн дундаж агуулгатайгаар 21.47 тн –оор, нийт В+С зэргээр 459.90 тн, баялгийг P₁+P₂ зэргээр 407.93 тн –оор тооцон “Оцог хад”-ны гянтболдын ордын нөөцийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар батлуулж, эрдэс баялгийн нэгдсэн санд бүртгүүлсэн.

2017 оны 09 сарын 28-ны өдөр Ховд аймгийн Алтай сумын нутагт орших 407.99 га бүхий “Богоч” нэртэй талбайд АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын шийдвэрээр MV-020930 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгогдсон.

Тус ордыг ашиглах “Техник эдийн засгийн үндэслэл” /ТЭЗҮ/-ийг “ЖИ ЭМ ПРОЖЕКТ” ХХК боловсруулсан байна. Тус ТЭЗҮ-ийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 14-10-06 тоот дүгнэлтээр баталгаажуулсан байна. Монгол улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7-р зүйлд заасны дагуу тус төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг БОАЖЯ-аас 2017 оны 09-р сарын 05-ны өдөр гаргасан байна.

Төслийн гол зорилго нь “Оцог хад нэртэй гянтболдын үндсэн ордыг далд аргаар ашиглах” техник эдийн засгийн үндэслэлээр тус ордыг байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатайгаар далд аргаар олборлох, зах зээлд борлуулахад тус төслийн зорилго оршино. Төслийн үргэлжлэх хугацаа 7 жил болно.

“Талст молор” ХХК –ийн “Оцог хад” уурхайн үйл ажиллагаа нь цаг агаар, газарзүйн онцлогоос шалтгаалж хавар дулааны урь орохоос эхлэж намар хүйтний улирал эхлэх хүртэл 4 сарын 20 –оос 10 –р сарын 1 хүртэл жилд 5 сар хугацаанд үйл ажиллагаа явуулдаг. 2024 онд тус уурхайн үйл ажиллагаа 2024 оны 06 –р сарын 10 –аас эхлэж 10 –р сарын 05 хүртэл хугацаанд багахан хүчин чадлаар богино хугацаанд ажилласан ч бид БОМТөлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг шат дараатай хийж гүйцэтгэсэн.

2024 оны ашиглалтын үйл ажиллагаагаар тус төсөл нь далд уурхайн штрек малталтыг 2х2.2 м хөндлөн огтлолоор 700 у.м нэвтрэлт гүйцэтгэхээс 0 у.м, налуу малталтыг 1.5х2.3 м хөндлөн огтлолоор 100 у.м нэвтрэлт гүйцэтгэхээс 0 у.м, уулын цул нураалтыг 33,999 мян.м³ нураалт хийж гүйцэтгэхээс 12998 мян.м³ нураалт зэрэг далд уурхайн нэвтрэлт, олборлолтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

2 СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Төслөөс байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг БОННУ – нд тусгагдсанаар дараах үе шатаар хэрэгжүүлж ажилласан болно.

Хүснэгт 1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Сөрөг нөлөөллийг арилгаж, бууруулсан арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал, төг	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлсэн хугацаа, давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Агаарын чанар	Агаарын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор замыг тогтмол усалгаа хийсэн	Зам талбай	төгрөг	30,000	15	450,000	Тогтмол	Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2016
		Автотээврийн улсын үзлэг оношлогоог хийлгэж хүнд даацын тээврийн хэрэгслүүдэд засвар үйлчилгээг хийсэн	Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл	төгрөг	1,500,000	1	1,500,000	Тогтмол	
		Ил задгай хог хаягдлыг шатаахыг хориглож, ахуйн хог хаягдал болон бохирын цооногт ариутгал халваргүйжүүлэлтийг хийсэн	Уурхайн нутаг дэвсгэрт	төгрөг	100,000	4	400,000	8 ба 9-р сард	
		Дотоод тээвэрлэлтийн замд хайрган хучилтыг хийсэн	Зам талбай	төгрөг	500,000	1	500,000	2024 онд	

2.	Гадаргын ба газрын доорх усны нөөц	Төслийн хэрэгцээт усны ашиглах гэрээг байгуулж төлбөрийг төлсөн	Усны төлбөр	төгрөг	2,790,825	1	2,790,825	2024 онд	“Усны чанар, хаягдал ус. Техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 4943- 2015.
3.	Хөрсөн бүрхэвч	Газар ашиглах гэрээ байгуулж холбогдох төлбөрийг барагдуулсан.	Уурхайн нутаг дэвсгэрт	төгрөг	960,500	1	960,500	Жил бүр	Хөрс бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS 5850:2008
		Шимт хөрсний овоолгыг технологийн дагуу хадгалж, шимт чанарыг сайжруулсан	Овоолго	төгрөг	500,000	1	500,000	Тогтмол	
		Хөрсөн дээр тос масло асгарсан тохиолдолд асгарсан хэсэгт элс асган саармагжуулан, бохирдсон хэсгийг хаягдал руу ачуулсан	Хөрсөн бүрхэвч	төгрөг	300,000	1	300,000	Тогтмол	
	Нийт						7,401,325		

3 НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 2. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Нөхөн сэргээлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлсэн хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Техникийн нөхөн сэргээлт /уурхайн бүс/	Ухсан газрыг шимт хөрсөөр дүүргэж, ашиглагдахгүй байгаа зам талбайг нөхөн сэргээсэн	төгрөг	1	1,000,000	1,000,000	2024 онд	
2.	Биологийн нөхөн сэргээлт /уурхайн бүс/	Зүлэг тарьсан	төгрөг	1	1,000,000	1,000,000	2024 онд	Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах, техникийн ерөнхий шаардлага. MNS5918:2008
		Мод, бутыг арчилсан	төгрөг	1	500,000	500,000	2024 онд	
3.	Татан буулгах, хаалтад бэлтгэх	-	-	-	-	-	-	-
	Нийт					2,500,000		

4 БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Тус төсөл нь далдаар олборлолт явагддаг учир тухайн бүс нутгийг төлөөлж чадахуйц газар нутгийг сонгон дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг орон нутгийн саналыг хүлээн авч хамтран хэрэгжүүлсэн. Тухайн орон нутгийн саналаар тус сумын нутаг дэвсгэр дээр хууль бус ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанд өртөж эвдрэлд орсон талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг 0,8 га талбайд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж 1,6 га орчим талбайд хийж гүйцэтгэсэн.

Хүснэгт 3. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

№	Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт	Хамгаалах арга, хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хүрээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлсэн хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
---	----------------------------	------------------------	---------------------------	------------	---------------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Төслөөс үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг арилгах, багасгах арга хэмжээ авсны дараа үлдэж байгаа нөлөөллийг арилгах	Тухайн орон нутгийн төр захиргааны саналыг үндэслэн техникийн нөхөн сэргээх ажил хийгдсэн.	/Алтай сумын Бодонч багийн нутаг дэвсгэр-т Ендэрт булаг гэх газарт	0,8	6,800,000	6,800,000	2024 онд	
		Бодонч багийн нутагт /Уудавын булаг/ эх хамгаалсан	Уудавын булагийн эх хамгаалсан	1	1,000,000	1,000,000	2024 онд	
2.	Алтай сумын төвд мод бут тарих	Тэрбум мод хөтөлбөрийн хүрээнд Алтай сумын төв зам дагуу 1,5 га талбайд 1000 ш мод /бургас/ тарихаар төлөвлөсөн	Алтай сумын төвд 1500 ш мод /бургас/ 300 ш хайлаас мод тарьсан	1800 ш	14,700,000	14,700,000	2024 онд	
3.	Бодонч голын онцгой болон энгийн хамгаалалын бүсийн тэмдэгжүүлэлт хийх	Тус онцгой бүсэд 16 ш самбар хийж өгөхөөр төлөвлөсөн	Бодонч голын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс-д	16	160,000	2,560,000	2024 онд	

4	Монитори нг судалгаа хийх	2024онд нүцгэний голд монитори нг судалгаа хийхээр төлөвлөс өн	-	2 удаа	1,000,0 00	2,000,0 00	2024 онд	
	нийт					27,060, 000		

**5 НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны явц, түүний үр дүнд хөндлөнгийн хяналт тавихын зэрэгцээ төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс тэдгээр хяналтын тайлан, мэдээнд үндэслэн нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны дотоод хяналтын тогтолцоо, хөрөнгө зарцуулалтын зориулалтад хяналт тавих замаар үр дүнг хангана.

Хүснэгт 4. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээ

№	Хийгдсэн ажил	Хариуцах эзэн	Төсөв
1	Нүүлгэн суурьшуулах хороо байгуулсан.	Уурхайн дарга олон нийтийн алба	Үйл ажиллагааны зардалд тусгах
2	Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны цар хүрээг тодорхойлоход нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагаа явагдахгүй.		
3	Нөхөн олговрын үнэлгээ байхгүй.		
	Нийт		-

**6 ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

Ховд аймгийн Алтай сумын нутагт орших Богоч хэмээх ашигт малтмалын ашиглалтын талбайд түүх, археологийн дурсгалуудыг археологийн судалгааны орчин үеийн арга зүйн дагуу нарийвчилсан хайгуулыг гүйцэтгэсэн боловч ямар нэгэн түүх, археологийн дурсгал илэрч мэдэгдээгүй байна.

Уурхайн ашиглалтын талбай нь Алтайн нурууны уулархаг хэсгээс бүрдсэн, хойт талаараа их уулстай тэдгээр уулсын дамнан байрлах учир хүмүүсийн оршуулгын болоод ахуйн үйл ажиллагааны ул мөр харьцангуй бага хадгалагджээ. Тус компани одоогоор тус ашиглалтын талбайд ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын далд малталтын хэвтээ амны 2.0х2.2 м хөндлөн огтлолтой уулын далд малталт /штолнь/ нэвтэрсэн байна. Түүнийг түүх, археологийн дурсгал дайрагдсан өртөгдсөн эсэхэд нарийвчилсан шалгалт хийсэн бөгөөд энэхүү уулын далд малталтанд ямарваа нэгэн түүх, археологийн дурсгал өртөгдөөгүй болно. Хэрэв уурхайн үйл ажиллагааны үед Археологийн болон палеонтологийн ховор түүх соёлын дурсгалт олдворууд гарч ирэхэд төрийн холбогдох байгууллагуудад заавал мэдэгдэх ёстой үүргээ биелүүлэн ажиллана.

7 ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Тухайн төсөл хэрэгжих хугацаанд өрөмдлөг-тэсэлгээний ажилд жилд энгийн найрлагат “эмульс” тэсрэх бодис ашиглана. Энэ тэсрэх бодисын найрлагад ордог химийн хортой ба

аюултай бодисуудын эрсдэлийн үнэлээг БОННУ хийсэн. Уурхайн тэсрэх бодис, шатах тослох материалаас өөр химийн аюултай бодис хэрэглэхгүй.

Тиймээс ажилчидад аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол өгч ажилласан.

Хүснэгт 5. Осол, эрсдэлийн менежмент

№	Болзошгүй аюул осол, сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга, хэмжээ	Арга хэмжээн ий цар, хүрээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлсэн хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Түймэр, гал түймэр гарах	Гал түймэртэй тэмцэх багаж хэрэгсэл бэлдэх	Ажлын байр	18	30,000	540,000	2024 онд	
2.	Ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах	Болзошгүй аваар ослын үед яаралтай хэрэглэх анхны тусламжийн багаж хэрэгсэл, эм тариаг бэлэн байлгах эм эмнэлгийн зардал	Нийт ажилчид	4	230,000	920,000	Тогтмол	
	Нийт					1,460,000		

8 ХОГ, ХАЯГДАЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хог хаягдлын анхан шатанд нь ангилан ялгаж, хаях ажлыг хэвшүүлж, дахин ашиглах хог хаягдлын хувь хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Хог хаягдлыг зохистойгоор хаяж байгаа эсэхэд тогтмол хяналт хийж, ажлын байрны шалгалт тогтмол явуулсан.

Нийт ажилласан хугацаа буюу 1 сарын хугацаанд нийт 48 ажилчдаас 960 кг буюу 1 тн ахуйн хог хаягдал гарсан байна. 1 сард 1 тн ахуйн хатуу хог хаягдал гарсан ба үүнийг 330 кг-аар сард 3 удаа өөрсдийн тээврийн хэрэгслээр Алтай сумын төвлөрсөн хогийн цэг рүү нийлүүлсэн.

Хүснэгт 6. Хог хаягдлын менежмент

№	Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал, төг	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, төг	Хэрэгжүүлсэн хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ахуйн	Ахуйн хог хаягдлыг ангилан ялгаж, тогтоосон цэгт зориулалтын саванд хадгалах	Хатуу хог хаягдал	төгрөг	2,000,000	1	2,000,000	2024 онд	“Хог хаягдлын тухай” хууль -
		Холбогдох байгууллагатай шинэчлэгдсэн хууль, журмын дагуу гэрээ байгуулж, тээвэрлэсэн		төгрөг	500,000	3	1,500,000	Жил бүр	
2.	Үйлдвэрийн	Дугуй, төмөр зэрэг үйлдвэрийн хог	Үйлдвэрийн хог хаягдал	төгрөг	1,000,000	1	1,000,000	Жил бүр	

		хаягдлыг гэрээгээр тээвэрлүүлэх							
	Нийт						4,500,000		

9 ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

2022 онд тус компани нь БОМТ –нд тусгагдсан орчны хяналт шинжилгээний ажлуудыг тухай бүрт нь хийж гүйцэтгэсэн.

“Талст молор” ХХК-ийн Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зорилго:

о БОНБНУ-ний судалгаагаар урьдчилан гаргасан нөлөөллүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн хэмжээнд байлгах

о Уурхайн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй болон хяналтын байршилд мониторинг хийх цэгүүдийг сонгож байгалийн өөрийн өөрчлөлт ба уурхайн нөлөөллөөс үүсэх өөрчлөлтийг харьцуулан судлах бололцоо олдохуйц мэдээлэл бүрдүүлэх


о Байгаль орчны стандарт, хууль, эрх зүйн баримт бичгийн өөрийн фондтой болж, хэлтсүүдийг бодит мэдээллээр шуурхай хангаж байдлыг сайжруулна.

Мониторингийн ажлын үр дүнг байгаль орчны менежментийн үйл ажиллагаатай уялдуулан хэрэгжүүлэх 2022 оны байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг ус, агаар, хөрс гэх мэт судалгааны хүрээнд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хийсэн.

Хүснэгт 7. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

№	Хяналт шинжилгээ хийгдсэн үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хугацаа ба давтамж	Давтамжийн тоо	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг	Тайлбар	Баримтлах стандарт, арга аргачлал
	1	2	3	4	5	6	7	8
Агаар	Агаар дахь тоосжилтын хяналт: Нийт тоос PM2.5, PM10 Тоосны уналт Бохирдлын цэгэн эх үүсвэр: SO2, NOx Тоосжилтын бохирдлын хэмжээ	- Уурхайн гадаад тээврийн замаас салхины доод талд - Уурхайн агааржуулалтын амны хэсгээс - Уурхайн ажилчдын кемпийн орчимд - Хаягдал чулуулгийн талбай орчимд талбайгаас салхины доод талд	Жилд 2 удаа	2	300,000	600,000	Уурхайн дотоод зам талбайн тоосжилтын байдалд өдөр бүр нүдэн баримжаагаар ажиглалт явуулж, зам талбайн тоос дарах ажилд хяналт тавих	MNS 4048-88. Тоосны хэмжээг тодорхойлох жингийн арга. MNS 3384-82. Сорьц авахад тавих ерөнхий шаардлага MNS 4585-2016. Агаар орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага MNS 12.055-91. Ажлын

								байрны агаар дахь тоосны хэмжээг тодорхой лох
Хөрс	- Хөрсний агрохими, нийт азот,хөдөлг өөнт фосфор, солилцох кали, карбанат, хүнд металл (Cr, Pb, Ni, Zn) бактери	-Шимт хөрсний овоолгоос -Уурхайн 2- р ам орчимоос -Ажилчдын тосгоноос	Жилд 2 удаа	2	150,0	300,00 0		Хөрсний агрохим ийн үзүүлэлт ийг тодорхой лох MNS 3310-91
Ус	- Усны ерөнхий химийн шинжилгээ, бактериоло гийн шинжилгээ. (рН, ЕС, TDS-ийн нийт шүтлэг, хатуулгын хэмжээ гэх мэт) - Ахуйн хаягдал усны ерөнхий химийн шинжилгээ бактериоло гийн шинжилгээ. (рН, ЕС, TDS-ийн нийт шүтлэг, хатуулагын хэмжээ гэх мэт)	-Ахуйн хэрэглээни й усанд -Ус хуримтлуул ах нуур -Голын усанд	Жилд 2 удаа	2	200,00 0	400,00 0		Усны чанарыг тодорхой лох MNS 4586:199 8.
	Нийт					1,300, 000		

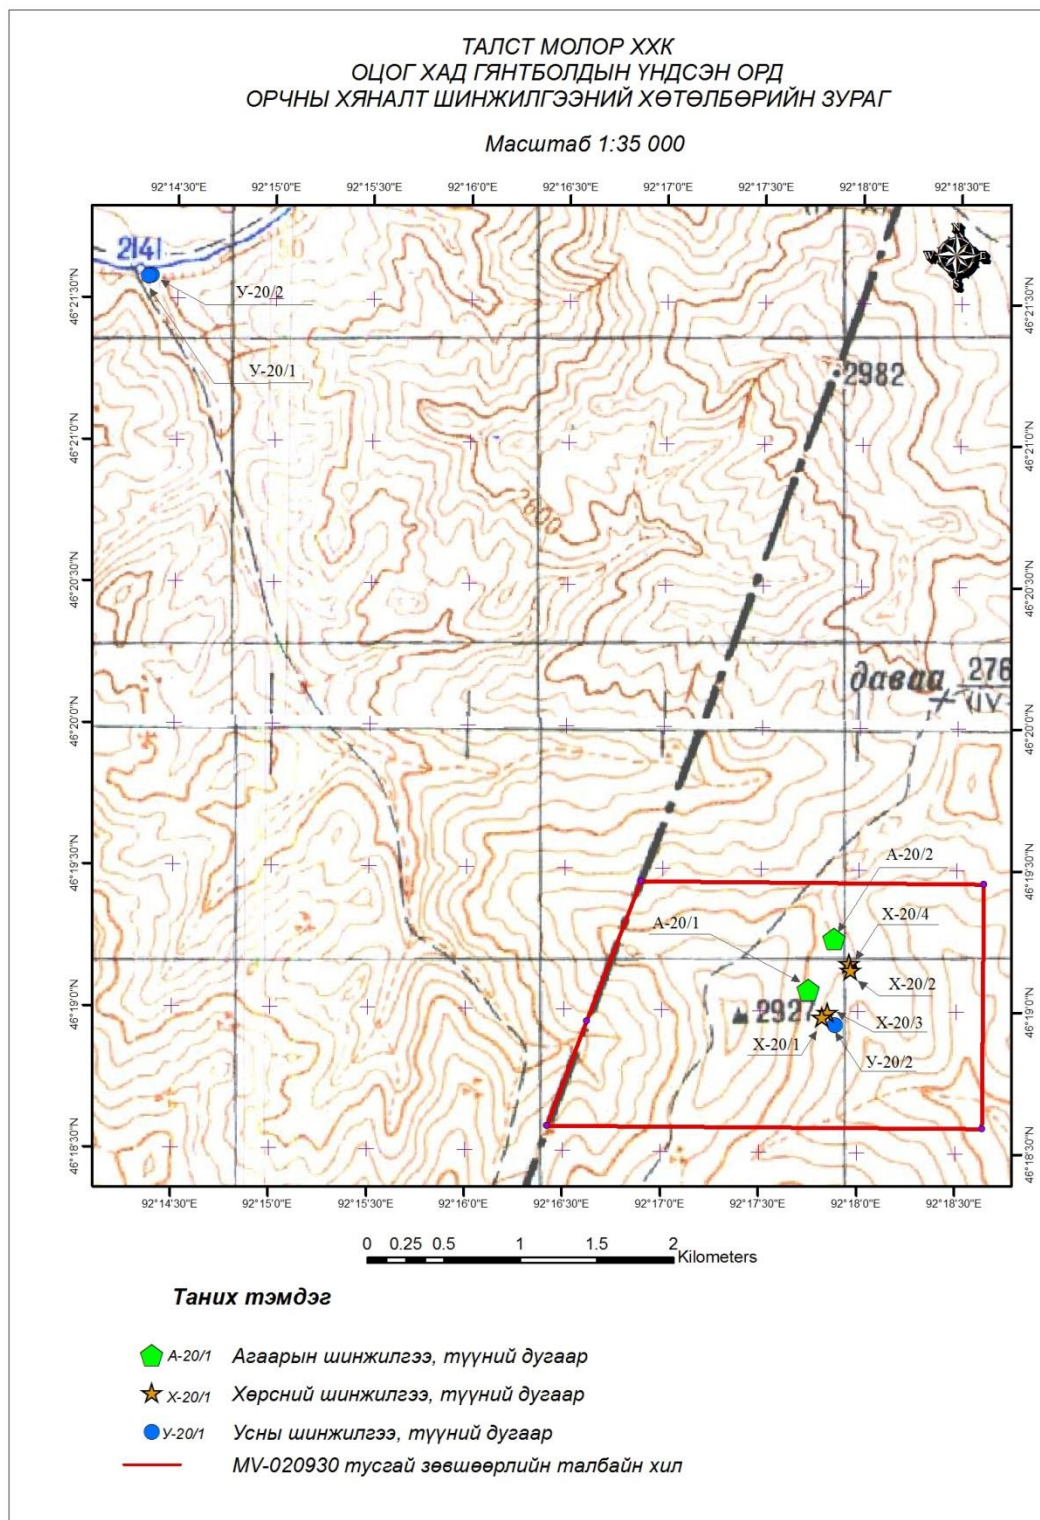

Зураг 1. Орчны хяналт шинжилгээний зураг

Хүснэгт 8. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дээж авсан цэгүүдийн мэдээлэл

<u>Д/Д</u>	<u>ОХШ -ий хөтөлбөр</u>	<u>Дээжийн дугаар</u>	<u>Уртраг</u>	<u>Өргөрөг</u>	<u>Өндөржилт, м</u>	<u>Тодорхойлолт</u>	<u>Тайлбар</u>
1	Хөрс	Хөрс дээж №Х-24/1	92°17'50.8"	46°18'59.7"	2755	~0-20 см гүн бор шаргал шавранцар.	
2		Хөрс дээж №Х-24/2	92°17'58.1"	46°19'10.1"	2724	~20-30 см гүн бор шаргал шавранцар.	
3		Хөрс дээж №Х-24/3	92°17'57.4"	46°18'57.8"	2755	~10-50 см гүн, бор шаргал өнгийн шавранцар.	
4		Хөрс дээж №Х-24/4	92°17'57.4"	46°19'10"	2727	~20-30 см гүнээс бор шаргал шавранцар.	
5	Ус	Ус дээж №У-24/1;	92°14'21.5"	46°21'34.8"	2145	Нүцгэний голын ус нь өнгөгүй, тунгалаг, амтгүй, үнэргүй.	Гадаргын ус
6		Ус дээж №У-24/2	92°17'53.8"	46°18'57.2"	2728	Цайвар бор өнгийн, булингартай ус.	Үйлдвэрлэлийн эргэлтийн усан сан
7		Ус дээж №У-24/3	92°14'21.0"	46°21'34.5"	2145	Нүцгэний голын ус нь өнгөгүй, тунгалаг, амтгүй, үнэргүй.	Гадаргын ус
8	Агаар	Агаар шинжилгээ №А24/1	92°17'44.9"	46°19'04.4"	2791	Уурхайн 1-р ам орчим.	Уурхайн бүс
9		Агаар шинжилгээ №А24/2	92°17'52.8"	46°19'15.3"	2754	Уурхайн кемпээс БХ -д зүгт 300 м.	Уурхайн бүс

Орчны хяналт шинжилгээний дүнгээс харахад:

Агаар – Дээж авсан 2 байршил болох ажилчдын тосгон болон уурхайн бүсэд хийсэн агаарын сорьц шинжилгээгээр хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, тоос тоосонцорын хэмжээ нь “Агаарын чанар техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 4585:2016 стандартад заасан хүлцэх агууламжаас даваагүй байна /Шинжилгээний дүнг хавсралтад хавсаргав/.

Ус – Гадаргын уснаас авсан 2 дээжинд хийсэн усны химийн задлан шинжилгээний дүнгээр “Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага” MNS 4586:1998 болон MNS 6148:2010 стандартын шаардлага хангаж байна /Шинжилгээний дүнг хавсралтад хавсаргав/.

Хөрс – Хөрснөөс авсан 4 дээжинд хөрсний химийн шинжилгээ, хөрсний механик бүрэлдэхүүн, хөрсний хүнд металлыг шинжилсэн /Шинжилгээний дүнг хавсралтад хавсаргав/.

10 АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШААРДЛАГААР БИЕЛҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

2021 оны БОМТ –ний биелэлтийг дүгнэх үйл ажиллагааны дараагаар тус сумаас тус сумын нутаг дэвсгэрт хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэдийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас ухаж эвдрэлд оруулсан газрыг техникийн нөхөн сэргээлтэд оруулах саналыг манай компанид тавьсан. Мөн тухайн орон нутгийн малчдын мал хувиараа ашигт малтмал олборлосон нүх, шурф /4-8 м гүн/ -нд өвлийн ид цастай үед мал унаж үхэх аюул олон тооны мал үхэж үрэгдсэн тул нэн түрүүнд “Ендэрт ус”гэх газарт ухсан нүх ихтэй газрыг техникийн нөхөн сэргээлтэд оруулах хүсэлт тавьсан.

Эдгээр саналыг үндэслэж бид 2024 оны дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг Ховд аймгийн Алтай сумын Бодонч багийн нутаг дэвсгэр “Ендэрт ус” гэдэг газар техникийн нөхөн сэргээх ажлыг 1,6 га талбайд хийж гүйцэтгэсэн.

“Талст молор” ХХК –ийн “Оцог хад” уурхайн үйл ажиллагаа нь цаг агаар, газарзүйн онцлогоос шалтгаалж хавар дулааны урь орохоос эхлэж намар хүйтний улирал эхлэх хүртэл 4 сарын 20 –оос 10 –р сарын 01 хүртэл жилд 5 сар гаруй хугацаанд үйл ажиллагаа явуулдаг. 2024 онд тус уурхайн үйл ажиллагаа 2024 оны 06 –р сарын 05 –аас эхлэж 10 –р сарын 05 хүртэл хугацаанд багахан хүчин чадлаар ажилласан.

2024 онд дүйцүүлэн хамгаалах ажлаар техникийн нөхөн сэргээлтийг-1,6 га, “Тэрбум мод” арга хэмжээний хүрээнд Алтай сумын төвд 1,5 га талбайд 1800 ш мод /бут/,тарих, мөн Орон нутагийн сав газрын санаачлагаар онцгой болон энгийн бүсд 16 ш самбар хийх ажлыг хийж гүйцэтгэн тухайн орон нутгийн засаг даргын тамгын газраас томилогдсон нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайг хүлээн авах комисст хүлээлгэн өгч акт үйлдсэн болно.

**11 ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН
БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

“Талст молор” ХХК-ийн Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зорилго:

- о БОНБНУ-ний судалгаагаар урьдчилан гаргасан нөлөөллүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн хэмжээнд байлгах
- о Уурхайн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй болон хяналтын байршилд мониторинг хийх цэгүүдийг сонгож байгалийн өөрийн өөрчлөлт ба уурхайн нөлөөллөөс үүсэх өөрчлөлтийг харьцуулан судлах бололцоо олдохуйц мэдээлэл бүрдүүлэх
- о Байгаль орчны стандарт, хууль, эрх зүйн баримт бичгийн өөрийн фондтой болж, хэлтсүүдийг бодит мэдээллээр шуурхай хангаж байдлыг сайжруулна.
- Мониторингийн ажлын үр дүнг байгаль орчны менежментийн үйл ажиллагаатай уялдуулан хэрэгжүүлэх 2024 оны байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг ус, агаар, хөрс гэх мэт судалгааны хүрээнд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хийгээд байна.

Хүснэгт 9. Удирдлага зохион байгуулалт

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Урьдчи лан тооцсон төсөв	Хэрэгжүүлсэн хуваарь			Хариуцсан албан тушаалтан	Тайлбар
			2024 он				
			6 Сар	9 Сар	10 Сар		
	1	2	3	4	5	6	7
1.	71 хүнийг ажлын хувцсаар хангаж ажилласан	20,000,000	20,000,000	8,000,000		Ерөнхий захирал	
2.	хүний хөдөлмөр хамгаалах хэрэгслээр хангаж ажилласан	2,000,000	2,000,000			Байгаль орчны мэргэжилтэн	
3.	Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмын талаар тайлбарлаж таниулах, сургалт зохион байгуулсан	500,000	500,000			Ерөнхий захирал	
	Нийт	22,500,000	22,500,000	8,000,000			

**12 ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД
ӨРТӨГЧ ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТ**

“Талст молор” ХХК-ийн “Оцог хад” нэртэй гянтболдын үндсэн ордыг далд аргаар ашиглах төслийн үндсэн үйл ажиллагаа буюу ашигт малтмал ашиглах лицензтэй талбай нь Ховд аймгийн Алтай сумын нутагт байрладаг. Тиймээс энэхүү төслийн нөлөөлөлд өртөгчид мөн төсөлд оролцогч талууд нь сумын иргэд, малчид болох юм. 2024 онд сумтай холбоотой асуудлаар дараах хүснэгтэнд үзүүлснээр хамтран ажиллахаар төлөвлөн ажилласан.

Хүснэгт 10. БОМТ, түүний хэрэгжилтийг талуудад тайлагнах

№	БОХТ-ний биелэлтийг тайлагнахад оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Зохион байгуулсан хугацааны тов	Тайлаг насан зардал, төг	Хариуцан зохион байгуулсан албан тушаалтан, ажилтан	Зохион байгуулсан газар
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Харьяалагдах аймаг нийслэлийн Байгаль орчны газар	3-аас доошгүй хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр	БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаарх бүрэн тайлан	11-р сарын 1-ний дотор	100,000	Төсөл хэрэгжүүлэгч	Ховд аймаг, БОАЖГ
2.	БОМТ-н хэрэгжилтийг хянах ажлын хэсэг	Төслийн талбайд	БОМТ-н хэрэгжилтийг газар дээр нь хянуулж, үнэлэлт дүгнэлт авах	11-р сарын 30-ны дотор	900,000	Төсөл хэрэгжүүлэгч	Ховд аймаг, Алтай сум, Оцог хадны уурхай
3.	Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллага	Тайлангаа танилцуулж бичгээр санал авна	Тухайн оны БОМТ-ний хэрэгжилт танилцуулж, дараа жилийн БОМТ-г батлуулах	12-р сарын 30ны дотор	100,000	Төсөл хэрэгжүүлэгч	Ховд аймаг, БОАЖГ
4.	Баг /сум/ -ийн иргэдэд тайлагнасан	Багийн даргад тайлагнасан.	БОМТ-ний хэрэгжилтийн талаарх бүрэн тайлан	11-р сарын 1-ний дотор	100,000	Төсөл хэрэгжүүлэгч	Ховд аймаг, Алтай сум, Бодонч баг
	Нийт				1,200,000		

	БОМТ-нд тусгагдсан ажлууд	Биелэлтийн байдал	Тайлбар
1	Усны төбөр	Төлөгдөж биелэгдсэн	Хавсралт хэсэгт төлсөн баримтыг хавсаргасан
2	Газар ашиглах гэрээний төлбөр	Төлөгдөж биелэгдсэн	Хавсралт хэсэгт төлсөн баримтыг хавсаргасан
3	Гадаад болон доторх зам талбайг тогтмол усалгаа хийх	Тогтмол хийгдэж байсан	
4	Гадаад замуудад хайрган хучилт хийх	Хийгдсэн	Кетпээс 1 болон 2 -р амуудруу чиглэсэн замд хийгдсэн
5	Шимт хөрсний овоолгыг технологийн дагуу хадгалах, яанарыг сайжруулах	хийгдсэн	Хашаалж, тогтмол усалгаа үрсэлгээ хийгдэж байсан
6	Ухсан газрыг шимт хөрсөөр дүүргэх, ашиглагдахгүй байгаа зам талбайг янзлах	Ашиглагхгүй байсан зам дээх хийгдсэн	Уурхайн бүсэд агааржуулалт гаргах зорилгоор 2 газар ухаш үүссэн энэ цаашид хэрэглэгдэнэ хэрэглэгдэхээ больвол төлөвлөгөөнд тусгаж нөхөн сэргээлт хийгдэнэ
7	Мод бутыг арчлах	Тогтмол усалгаа арчилгаа хийгдэж байсан	
8	Хууль бус алт олборлох үйл ажилгаанд өртөж эвдрэлд орсон газар 0,8 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж 2 газар нийт 1,6 га тайлбай хамрагдсан	Биелэгдэш хийгдсэн	Төлөвлөгөөнд Ендэрт ус гэх газар хийгдэх байсан орон нутаг өөр санал оруулж өөрчилж Хөндийн Өвөр булаг хэмээх газарт хийгдсэн
9	Булгийн эхийг хамгаалах /Уудавын булаг гэх газар/	Хийгдэж биелэгдсэн	Төлөвлөгөөнд “Цагаан булаг” байсан өөрчлөлт орж “Хараат” булаг болж өөрчлөгдсөн
10	Алтай сумын төвд мод бут тарих 1,5 га талбайд 1800 ш	Хийгдэж биелэсэн	Төлөвлөгөөнд 1000 мод тарихаар төлөвлөгдсөн манай компани нийгмийн хариуцлагийн хүрээнд 1500ш бургас 300ш хайлаас тарьсан
11	Биологийн олон янз байдал дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд Ховд аймгийн Үенч, Алтай сумын Бодонч, Нүцгэний голуудын онцгой болон энгийн	Хийгдэж биелэсэн	Энэ ажил хийгдсэн хавсралт хэсэгт зураг акт байгаа

	хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх зорилгоор нийт 16 ш самбарыг Үенч-Бодонч-Булган голын сав газрын захиргаанд хлээлгэж өгсөн		
12	Гал түймэртэй тэмцэх багаж хэрэгсэл бэлдэх	хийгдсэн	18 байршилд хийгдсэн
13	Ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах	Хийгдсэн	Анхны тусламжын хайгцагийг г 4 газар бэлдэж байршуулах байсан 4 цэгт бэлдэж байршуулсан
14	Ахуйн хог хаягдалыг ангилан ялгаж,тогтоосон цэгт зориулалтын саванд хадгалах	хийгдсэн	Хавсралт хэсэгт зураг хавсаргасан
15	Хог хаягдалын гэрээ байгуулж ажиллах	Гэрээ байгуулж ажилсан	Хавсралт хэсэгт гэрээг хавсаргассан
16	Аюултай хог хаягдалын агуулах барих	хийгдсэн	Хавсралт хэсэгт зургийг хавсаргасан
17	Агаар орчны хяналт жилд 2 удаа	Хийгдсэн	7 болон 10 сард хийгдсэн шижилгээний дүнг хавсаргасан
18	Хөрсний агрохимийн үзүүлэлтийг тодорхойлох	хийгдсэн	7 болон 9 сард хийгдсэн шижилгээний дүнг хавсаргасан
19	Усны чанарыг тодорхойлох	Хэрэглээний ус,ус хуримтлуулах нуур, голын усанл 2 удаа хийгдсэн	7 болон 9 сард хийгдсэн шижилгээний дүнг хавсаргасан
20	71 хүнийг ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэлээр хангах, аюулгүй ажилааны дүрэм журмын талаар тайлбарлаж таниулах сургалт зохион байгуулах	71 хүнээр төлөвлөж биелэлт дээр 120 гаруй хүнд бүх ажлууд хийгдсэн	3 удаа нэгдсэн журмаар сургалтуут хийгдсэн мөн шинээр ажилд орж буй хүн,ажлын байраа сольж буй ажилчнуудад анхан болон давтан зааварчилгааг тогтмол өгч ажилсан

Байгаль орчны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд болон биелэлтийн байдалын хүснэт

2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлсэн нийт зардал

“ТАЛСТ МОЛОР” ХХК

“ОЦОГ ХАД” ГЯНТБОЛДЫН
ҮНДСЭН ОРД

19

Хүснэгт 11. БОМТ хэрэгжилтийн нийт зардал

№	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	Нийт зардал /мян.төг/
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	7,401,325
2	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	2,500,00
3	Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	27,060,000
4	Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	1,4600.00
5	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	4,500.00
6	Орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	1,300.00
7	Аймаг, нийслэлийн засаг даргын шаардлагаар биелүүлсэн арга хэмжээ	-
8	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	-
9	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	1,200.00
	НИЙТ ЗАРДАЛ	45,421,325

13 ДҮГНЭЛТ

Ховд аймгийн Алтай суманд байрлах Оцог хад нэртэй гянтболдын уурхайн 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудын гүйцэтгэл хийгдэж дууссан бөгөөд 2024 онд хийгдсэн ажлууд нь 100% -ын гүйцэтгэлтэй хийгдсэн.

2024 оны байгаль хамгаалах төлөвлөгөө буюу сөрөг нөлөөллийг бууруулах арилгах арга хэмжээний төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө болон дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг бүрэн гүйцэд хийсэн мөн орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг тухай бүрт нь тус тус хийж гүйцэтгэсэн.

2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг 100%-ийн гүйцэтгэлтэй хийсэн бөгөөд нийт **45 421 325 төгрөг** зарцуулсан байна.

Тайлангийн хавсралт зурагнууд



Фото зураг 1. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-ус



Фото зураг 2. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-хөрс



Фото зураг 3. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-агаар



Хавсралт 1
2022.10.10

**“ОЦОГ ХАД”-НЫ ГЯНТБОЛДЫН УУРХАЙ ОРЧИМД
ХИЙГДСЭН АГААРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН**

№	Он, сар, өдөр	Цэгийн нэр	Үзүүлэлтүүд	Шинжилгээний дүн		MNS 4585:2016 стандарт /мг/м³/		
1.	2022 оны 10-р сарын 08-ний өдөр	1-р ам	Хүхэрлэг хий (SO ₂) мг/м³	0.004		0.450		
			Азотын давхар исэл (NO ₂) мг/м³	0.021		0.200		
			Тоос	Утга /мг/м³ /	PM 10.0	PM 2.5	PM 10.0	PM 2.5
				Дундаж	0.016	0.012	0.100	0.050
		Кемп	Хүхэрлэг хий (SO ₂) мг/м³	0.005		0.450		
			Азотын давхар исэл (NO ₂) мг/м³	0.016		0.200		
			Тоос	Утга /мг/м³ /	PM 10.0	PM 2.5	PM 10.0	PM 2.5
				Дундаж	0.088	0.038	0.100	0.050

ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН:

БОШЛ-Н ИНЖЕНЕР *Б.Нансалмаа* Б.НАНСАЛМАА

ХЯНАСАН:

БОШЛ-Н ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *С.Мавзгаа* С.ЖАВЗАНПАГМА

24

9/25/24, 1:18 PM

GASI-LIMS

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
1205	MNS ISO 6777:2001	Нитрит		0,8мг/л
	MNS 6341:2012	Clostridium perfringens		Clostridium perfringens>0.1
	MNS 6341:2011	Гэдэсний бүлгийн нян		Гэдэсний бүлгийн нян=0,0001
	MNS 6341:2012	Эмгэгтөрөгч нян	1г-д илрэхгүй	1г-д Эмгэг төрөгч нян илрээгүй.
	MNS 3242-1989	Нитрат	130мг/кг ихгүй	27,2мг/кг
	MNS ISO 10390:2001	pH	6,3-9,1	7,5
1206	MNS 6341:2012	Clostridium perfringens		Clostridium perfringens>0.1
	MNS 6341:2011	Гэдэсний бүлгийн нян		Гэдэсний бүлгийн нян=0,001
	MNS 6341:2012	Эмгэгтөрөгч нян	1г-д илрэхгүй	1г-д Эмгэг төрөгч нян илрээгүй.
	MNS 3242-1989	Нитрат	130мг/кг ихгүй	34,0мг/кг
	MNS ISO 10390:2001	pH	6,3-9,1	7,0
1207	MNS 6341:2012	Clostridium perfringens		Clostridium perfringens>0.1
	MNS 6341:2011	Гэдэсний бүлгийн нян		Гэдэсний бүлгийн нян=0,001
	MNS 6341:2012	Эмгэгтөрөгч нян	1г-д илрэхгүй	1г-д Эмгэг төрөгч нян илрээгүй.
	MNS 3242-1989	Нитрат	130мг/кг ихгүй	34,7мг/кг
	MNS ISO 10390:2001	pH	6,3-9,1	7,0
1208	MNS 6341:2012	Clostridium perfringens		Clostridium perfringens>0.1
	MNS 6341:2011	Гэдэсний бүлгийн нян		Гэдэсний бүлгийн нян=0,0001
	MNS 6341:2012	Эмгэгтөрөгч нян	1г-д илрэхгүй	1г-д Эмгэг төрөгч нян илрээгүй.
	MNS 3242-1989	Нитрат	130мг/кг ихгүй	32,0мг/кг
	MNS ISO 10390:2001	pH	6,3-9,1	7,6

Санал тайлбар:
Opinions and
interpretation

БАТАЛСАН: ЛАБОРАТОРИЙН
Approved by ЭРХЛЭГЧ:

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.



/М.ОДОНЧИМЭГ/



Фото зураг 4. Дотоод тээвэрлэлтийн замд хайрган хучилт хийсэн байдал

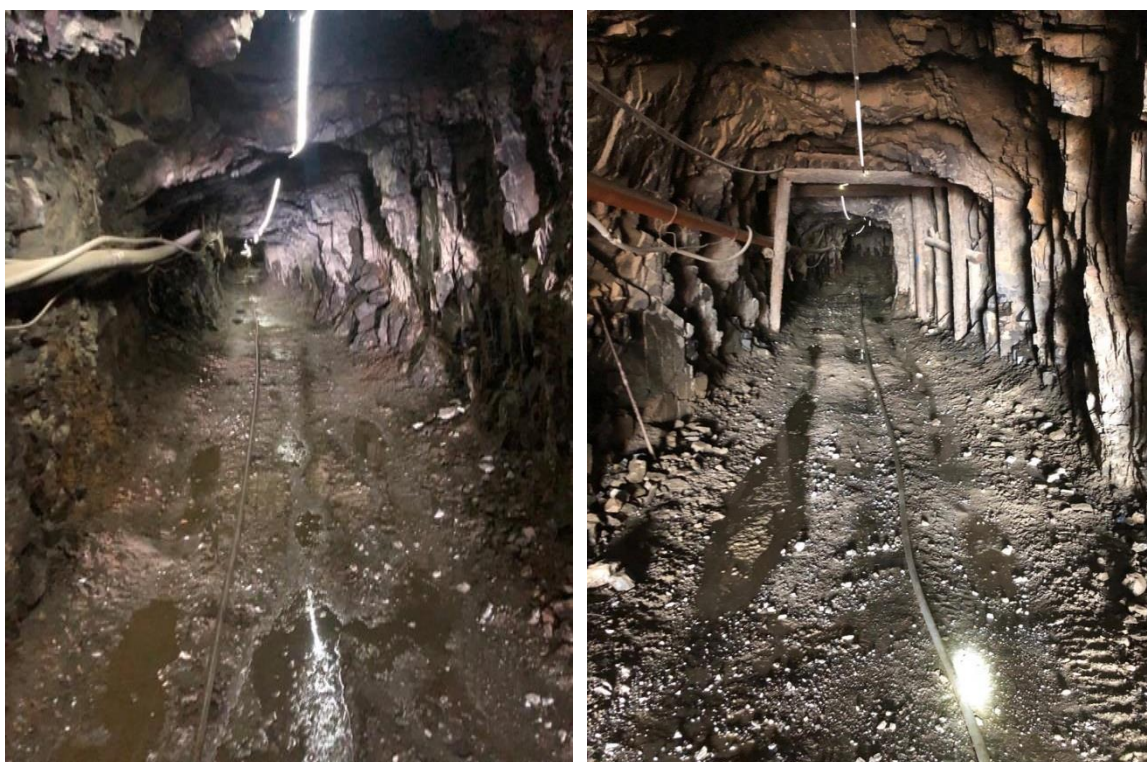


Фото зураг 5. Дотоод тээвэрлэлтэд тоосжилт дарж усалгаа хийгдсэн байдал



Фото зураг 6. Шимт хөрсний овоолго эхний байдал



Фото зураг 7. Овоолго арчилж янзалсаны дараах байдал



Фото зураг 8. Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдэхийн өмнөх зураг





Фото зураг 9. Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдэж буй байдал



Фото зураг 10 нөхөн сэргээлт хийж дууссаны дараах зураг

Фото зураг 12. Мод бутыг усалж арчилж буй байдал ажил





Фото 14. Уудавын булаг хамгаалах ажлын өмнөх үеийн зураг



Фото 15. Булгийн эх хамгаалх ажил хийгдэж байх үеийн зураг



Фото 15. Булгийн эх хамгаалах ажил хийгдэж дууссан үеийн зураг

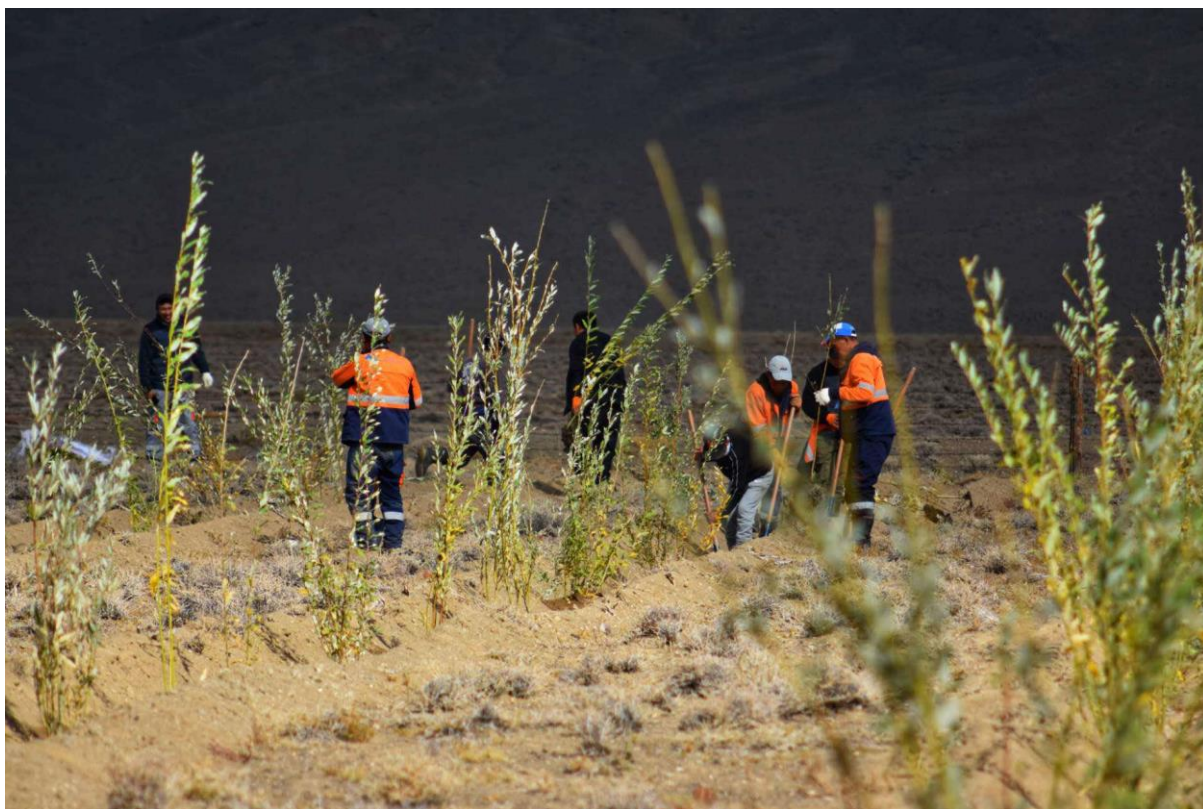


Фото20. Тэрбум мод хөтөлбөрийн хүрээнд Алтай сумын төвд мод тарьж буй байдал



Фото 21 Алтай сумын төвд мод тарьж дууссаны дараах үеийн зураг





АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ
ГАЗРЫН ДАРГЫН
ТУШААЛ

2014 оны 08 сарын 14 өдөр

Дугаар 4/63

Улаанбаатар хот

Нөөцийг хүлээн авч, бүртгэх тухай

Засгийн газрын Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4. дэх хэсэг, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.4 дэх хэсэг, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 23 дугаар тушаалаар батлагдсан Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрмийн 3.1 дэх хэсэг, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2017 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдааны ХХ-13-17 дугаар дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Ховд аймгийн Алтай сумын нутагт орших XV-019692 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн талбайд хамаарах “Оцог хад” нэртэй гянтболдын үндсэн ордын нөөцийг зохиогчийн тооцоолсон хувилбараар хүснэгт №1-ийн дагуу хүлээн авсугай.

2. Хүлээн авсан гянтболдын нөөцийг ашигт малтмалын нөөцийн Улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэхийг Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төв /Г.Золсайхан/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Ховд аймгийн Алтай сумын нутаг дахь “Оцог хад” нэртэй гянтболдын үндсэн ордод 2016 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг, тайлангийн бичвэр дискийн хамт ЭБМЗ-ийн хуралдааны дүгнэлт, тушаалыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 5 өдөрт багтаан Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төвийн архивт хүлээлгэн өгөхийг “Талст молор” ХХК /Б.Мөнхтөр/-д даалгасугай.

ДАРГА



Б.БААТАРЦОГТ

10 0992



УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН
ДҮГНЭЛТ

2018 оны 05 сарын 16 өдөр

Дугаар Т/18-06-05

Улаанбаатар хот

Ховд аймгийн Алтай сумын нутагт орших
MV-020930 тоот ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөлтэй “Оцог хад” нэртэй
гянтболдын үндсэн ордыг далд уурхайн
аргаар ашиглах төслийн техник-эдийн
засгийн үндэслэлийг хэлэлцсэн тухай

“Талст молор” ХХК-ийн захиалгаар Уул уурхайн зураг төслийн “Жи Эм прожект” ХХК боловсруулсан Ховд аймгийн Алтай сумын нутагт орших “Оцог хад” нэртэй гянтболдын үндсэн ордыг далд аргаар ашиглах төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэлд Монгол улсын зөвлөх инженер П.Хангал зөвлөж, Монгол Улсын зөвлөх инженер Б.Магванжав шинжээчийн дүгнэлт гаргасан байна. Техник-эдийн засгийн үндэслэлийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн ТЭЗҮ хэлэлцэх салбар хуралдаанаар авч хэлэлцэж, дараах ДҮГНЭЛТ-ийг гаргаж байна.

1. Техник-эдийн засгийн үндэслэл нь Төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэлийн танилцуулга, Ордын геологийн судалгаа, далд уурхайн нээлт, Үйлдвэрлэлийн нөөц, Олборлолт, Уурхайн засвар механик, Хүний нөөц, Дэд бүтэц, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, Байгаль орчин, Төслийн эдийн засаг зэрэг 13 бүлэг, дүгнэлт, хавсралт материал, хавсралт тооцоо бүхий 170 хуудас тайлбар бичиг, хавсралт 10 зургуудаас бүрдэж байна.

2. MV-020930 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбайн “Оцог хад” нэртэй гянтболдын үндсэн ордын нөөцийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2017 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн хурлын ХХ-13-17 тоот дүгнэлтийг үндэслэн гаргасан АМГ-ын даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн н/63 дугаар тушаалаар бодитой В зэргээр 40943.763 тн гянтболдын хүдэр, 147.4 тн металл, боломжтой (С) зэргээр 64172.995 тн гянтболдын хүдэр, 312.51 тн металл бөгөөд нийт (В+С) зэргээр 105116.76 тн гянтболдын хүдэр, 459.91 тн металл гэж нөөцийг ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгүүлсэн байна.

3. Төсөлд үйлдвэрлэлийн нөөцийг бодохдоо ашиглалтын үеийн бохирдлыг 15.6%-аар, хаягдалыг 24.63%-аар тус тус авч тооцсон ба ордыг 3 жилийн хугацаанд ашиглах бөгөөд энэ хугацаанд 115291.0 м³ уулын цул нурааж, магадласан В' үйлдвэрлэлийн нөөцөд шилжүүлэн 93874.56 м³ хүдэр олборлохоор төлөвлөсөн байна. Жилийн хүчин чадал 34.0 мян.м³ хүдэр байна.

4. “Оцог хад” нэртэй гянтболдын үндсэн ордыг ашиглахад эдийн засгийн үр ашигтай нөөцөд тулгуурлан далд уурхайн зардал, бүтээгдэхүүн борлуулах үнийг 14000 ам.доллар буюу 33.6 сая.төг-өөр борлуулах эдийн засгийн тооцоог хийж ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан байна.

5. Уурхайн ашиглалтын системийн сонголтыг хийхдээ ордын геологийн тогтоц болон байршил, хүдрийн биетийн унал, хүдрийн биетийн дундаж зузаан, уурхайн олборлолтод өртөх нөөцийн доод хил, чулуулгийн шинж чанар, хүдрийн биетийн

000562

сунал ба уналын дагуу хувиралт өөрчлөлт багатай, тасралт эвдрэл бага зэргийг харгалзан үзэж хүдэр хоршоолох ашиглалтын системээр ашиглах нь оновчтой гэж үзжээ.

6. Уурхайд дугуйт ачигч LIUGONG 1ш, тээврийн машин /пад/ TYP1450-12D 3ш, далд уурхайн ачигч JHLTW60 2ш, перфоратор 765D 5ш, перфоратор YSP-45 3ш, ус таталын насос ЦНС-38-176 2ш, ЗМК-1А шпур цэнэглэх машин 1ш, усалгааны машин 1ш, худгийн насос 1ш, тэсэлгээний аппарат 1ш, ачааны машин Foton 1ш, цахилгаан генератор DCA-125K 1ш зэрэг үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглахаар ТЭЗҮ-д тусгажээ.

7. Ордын хүдрийн баяжигдах шинж чанарын судалгаа “Геологийн төв лаборатори”-д хийгдсэн байна. Туршилтын ажлыг “Талст молор” ХХК-ийн Ховд аймгийн Алтай сумын нутагт орших “Оцог хад” нэртэй гянтболдын үндсэн ордоос авсан 350 кг дээжинд хийсэн байна. Технологийн туршилтын ажлыг гравитацийн аргаар хийж гүйцэтгэсэн ба үр дүнд 65.86%-ийн агуулгатай, 81.56%-ийн металл авалттай, 0.47%-ийн гарцтай баяжмал гарган авч болно гэж үзсэн байна.

8. Олборлолтын явцад техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг Монгол улсын стандарт зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэж, уулын ажлын үр дүнд үүссэн ухашийг нөхөн дүүргэж тэгшлэх, тухайн бүсийн уур амьсгалын нөхцөл байдалд тохирсон мод, бутлаг ургамлаар биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр зардлыг төсөлд тусгасан байна.

9. Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээлт ба хаалтын зардалд нийт 68.92 сая төгрөг зарцуулахаар тооцсон байна. Үүнээс байгаль орчин хамгаалах зардалд 7.5 сая.төгрөг, техникийн нөхөн сэргээлтийн зардалд 37.9 сая төгрөг, биологийн нөхөн сэргээлтийн зардалд 23.52 сая.төгрөг, төслийн хаалтын зардалд 64.02 сая.төгрөг зарцуулахаар тусгажээ.

10. Уурхайн нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 567.24 тэрбум төгрөг ба төслийн нийт хугацаанд 9.659 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж, 7.893 тэрбум төгрөгийн зардал гарган, 1.554 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашиг олж, хөрөнгө оруулалтаа ашиглалтын 1.61 жилийн хугацаанд нөхөхөөр тооцжээ.

11. Төслийн хугацаанд нийт 1.366 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал бий болох бөгөөд хорогдуулалтын норм тооцсон өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ NPV (10%)=545.6 сая.төг, NPV (15%)=393.4 сая.төг, NPV (20%)=272.8 сая.төг, өгөөжийн дотоод норм 39% гарсан нь төсөл эдийн засгийн хувьд үр ашигтайгаар хэрэгжих боломжтой гэж үзжээ.

12. Төсөл хэрэгжсэнээр улс, орон нутгийн төсөвт 1.774 тэрбум төгрөгийг татвар төлбөр хэлбэрээр төвлөрүүлэх ба 71 хүний ажлын байр шинээр бий болохоор төсөлд тусгажээ.

13. Төсөлд шаардлагатай мэргэжлээр Монгол улсын иргэдийг бэлтгэх, тэдгээрийг ажлын байраар хангах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаль орчныг нөхөн сэргээх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байхыг ЭБМЗ-өөс даалгаж байна.

14. Техник, эдийн засгийн үндэслэл нь уншихад ойлгомжтой, цэгц дараалал сайтай, мэргэжлийн түвшинд чанартай сайн боловсруулсан, уурхайг эхлэн байгуулж үйлдвэрлэл явуулах бүхий л шат дамжлага буюу үйл ажиллагааг хамарсан, уулын ажлын төлөвлөгөө боловсруулах зэрэгт туслах үндсэн баримт бичиг болжээ.

15. Хөдөрмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, дүрэм журмуудыг чанд мөрдөж ажиллах мөн ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг улсад

хохиролгүйгээр борлуулалтын гэрээнд тусгаж ажиллахыг “Талст молор” ХХК-нд зөвлөмж болгов.

16. Энэхүү техник, эдийн засгийн үндэслэл нь ЭБЭХ-ийн сайдын 2012 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 074-р тушаалаар баталсан “Ашигт малтмалын баялгийн урьдчилсан үнэлгээ, ашигт малтмалын ордын нөөцийг ашиглах боломжийн урьдчилсан үнэлгээ, уул уурхайн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд тавигдах үндсэн шаардлагууд ба техник, эдийн засгийн үндэслэл хүлээн авах журам”-ын дагуу гүйцэтгэгдсэн байна гэж үзлээ.

17. Техник-эдийн засгийн үндэслэлд тусгагдсан техник, технологийн сонголт, уулын ажлын төлөвлөлт, цахилгаан болон усан хангамж, дэд бүтэц, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, төслийн эдийн засгийн үнэлгээг боловсруулсан Уул уурхайн зураг төслийн “Жи Эм прожект” ХХК хариуцах, түүний үнэн бодит байдал, чанарт гаргасан дүгнэлтийг шинжээч Монгол улсын зөвлөх инженер Б.Магванжав хариуцах.

18. Техник-эдийн засгийн үндэслэлд тусгасан уурхайн хүчин чадал, техник тоног төхөөрөмж, технологи, эдийн засгийн тооцоог өөрчлөх тохиолдолд уг техник-эдийн засгийн үндэслэлд тодотгол хийлгэж, ЭБМЗ-ийн салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлж байх нь зүйтэй.

19. Захиалагч компани Техник-эдийн засгийн үндэслэлийг хүлээн авах тухай Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэр гарснаас хойш 5 хоногт багтаан Техник-эдийн засгийн үндэслэлийг Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төвд холбогдох шаардлагад нийцүүлэн хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй. Энэ үүргээ хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны байгууллагын дарга гаргасан шийдвэрээ түдгэлзүүлэх, цуцлах эрхтэйг анхааруулах нь зүйтэй.

Техник-эдийн засгийн үндэслэлд хийсэн шинжээчийн дүгнэлт, зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн Салбар хуралдаанаас Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргад Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.4, 48 дугаар зүйлийн 48.4, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.2 дахь хэсгүүд болон энэ дүгнэлт, холбогдох хуулийн заалтуудыг тус тус үндэслэн “Ховд аймгийн Алтай сумын нутагт орших MV-020930 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Оцог хад” нэртэй гянтболдын үндсэн ордыг далд уурхайн аргаар ашиглах төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэл”-ийг хүлээн авах шийдвэр гаргахыг уламжлахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Б.ДЭЛГЭРЖАРГАЛ

ХУРАЛДААНЫГ УДИРДСАН:

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН
ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Б.ЭЛБЭГЗАЯА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН
ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

С.ГАН-ОЧИР

39



МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 2241200024782

ТТД / Регистр:	87900823981 / 9067035
Татвар төлөгчийн нэр:	Ховд аймгийн Алтай сумын засаг даргын тамгын газар
Татварын төрөл:	01030723 - Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж
Харъяалах татварын алба:	Ховд / Алтай
Төлсөн дүн:	960,000.00
Гүйлгээний огноо:	2024-11-20 10:00:00
Гүйлгээний утга:	195761 - байцаагч үүсгэв;;99999999
Татварын данс:	100160100947 / Хо.Ал Хог хаягдлын хураамж
Төлөлтийн хэлбэр:	МТА



Хог хаягдалын хураамж төлбөрийн баримт



МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 2241102070669

ТТД / Регистр:	37900824131 / 9068007
Татвар төлөгчийн нэр:	Ховд аймгийн Үенч сумын засаг даргын тамгын газар
Татварын төрөл:	01030708 - Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр
Харъяалах татварын алба:	Ховд / Үенч
Төлсөн дүн:	4,683,370.00
Гүйлгээний огноо:	2024-11-21 17:10:47
Гүйлгээний утга:	2241102070669 33101528539 Ховд аймгийн Үенч сумын засаг даргын тамгын газар 474061996;ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК;0
Татварын данс:	100161200944 / Хо.Үе Ус, рашааны төлбөр
Төлөлтийн хэлбэр:	MOST



Ус рашааны төлбөр төлсөн баримт

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 124102409535

ТТД / Регистр: 33101528539 / 5774047

Татвар төлөгчийн нэр: Талстмолор

Татварын төрөл: 01030731 - Газрын төлбөр-Дэд алба

Харъяалах татварын алба: Ховд / Алтай

Төлсөн дүн: 81,290.00 ₮

Гүйлгээний огноо: 2024-12-10 15:00:38.0

Гүйлгээний утга: 124102409535 33101528539 Талстмолор 474061996;ХУДАЛДАА
ХӨГЖЛИЙН БАНК-О

Татварын данс: Хо.Ал Газрын төлбөр - 100160100943

Төлөлтийн хэлбэр: MOST



МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 124102408811

ТТД / Регистр: 33101528539 / 5774047

Татвар төлөгчийн нэр: Талстмолор

Татварын төрөл: 01030731 - Газрын төлбөр-Дэд алба

Харъяалах татварын алба: Ховд / Алтай

Төлсөн дүн: 80,000.00 ₮

Гүйлгээний огноо: 2024-12-10 15:00:43.0

Гүйлгээний утга: 124102408811 33101528539 Талстмолор 474061996;ХУДАЛДАА
ХӨГЖЛИЙН БАНК-О

Татварын данс: Хо.Ал Газрын төлбөр - 100160100943

Төлөлтийн хэлбэр: MOST



МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 124102409306

ТТД / Регистр: 33101528539 / 5774047

Татвар төлөгчийн нэр: Талстмолор

Татварын төрөл: 01030731 - Газрын төлбөр-Дэд алба

Харъяалах татварын алба: Ховд / Алтай

Төлсөн дүн: 79,984.00 ₮

Гүйлгээний огноо: 2024-12-10 15:01:00.0

Гүйлгээний утга: 124102409306 33101528539 Талстмолор 474061996;ХУДАЛДАА
ХӨГЖЛИЙН БАНК-О

Татварын данс: Хо.Ал Газрын төлбөр - 100160100943

Төлөлтийн хэлбэр: MOST



МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 124102409892

ТТД / Регистр: 33101528539 / 5774047

Татвар төлөгчийн нэр: Талстмолор

Татварын төрөл: 01030731 - Газрын төлбөр-Дэд алба

Харъяалах татварын алба: Ховд / Алтай

Төлсөн дүн: 239,304.00 ₮

Гүйлгээний огноо: 2024-12-10 15:01:03.0

Гүйлгээний утга: 124102409892 33101528539 Талстмолор 474061996;ХУДАЛДАА
ХӨГЖЛИЙН БАНК-О

Татварын данс: Хо.Ал Газрын төлбөр - 100160100943

Төлөлтийн хэлбэр: MOST



МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ № - 124102410460

ТТД / Регистр: 33101528539 / 5774047

Татвар төлөгчийн нэр: Талстмолор

Татварын төрөл: 01030731 - Газрын төлбөр-Дэд алба

Харъяалах татварын алба: Ховд / Алтай

Төлсөн дүн: 200,000.00 ₮

Гүйлгээний огноо: 2024-12-10 15:01:07.0


Гүйлгээний утга: 124102410460 33101528539 Талстмолор 474061996;ХУДАЛДАА
ХӨГЖЛИЙН БАНК-О

Татварын данс: Хо.Ал Газрын төлбөр - 100160100943


Төлөлтийн хэлбэр: MOST



Газар ашигласаны төлбөр төлсөн баримт

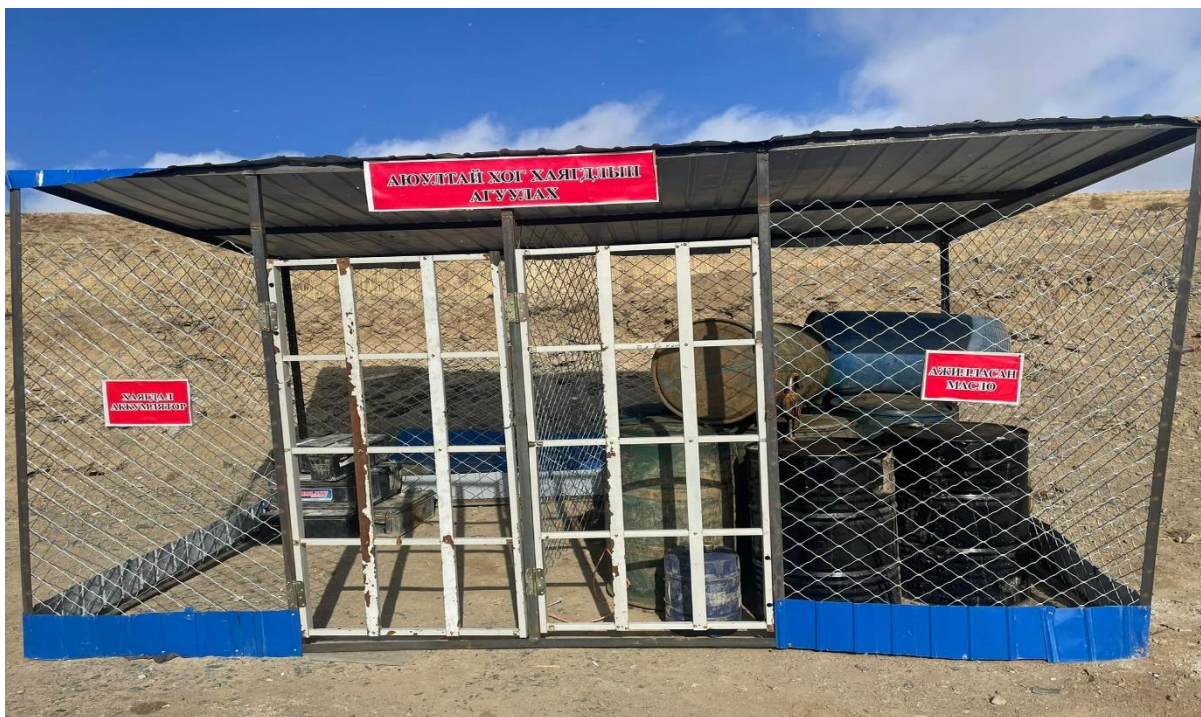

Аюултай хог хаягдал болон ахуйн хогийг ангилан ялгах агуулахын зураг

ХОВД АЙМГИЙН АЛТАЙ СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА  Х.ТҮМЭНДЭЛГЭР
ХОГ ХАЯГДЛЫН ГЭРЭЭ

БАТЛАВ:

“ТАЛСТ.МОЛОР” ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ  Б.МӨНХТӨР


2024.05.20

Алтай сум

Гэрээний зорилго:

Монгол улсын Хог хаягдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлж хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хог хаягдлыг дахин боловсруулах ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, эргүүлэн ашиглах, устгах зорилготой.

Гэрээний эрх зүйн үндэслэл:

-Монгол улсын Хог хаягдлын тухай хууль

-Монгол улсын Ариун цэврийн тухай хууль

Гэрээ байгуулагч талууд:

Нэг талаас Ховд аймгийн Алтай сумын Засаг даргын Тамгын газрыг төлөөлж Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Б.Мөнхцэцэг, нөгөө талаас “Талст молор” ХХК-ийн “Оцог хад” уурхайн дарга Х.Баатаржав нар тохиролцож 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ний өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ийг хүртэлх хугацаагаар энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. ААН байгууллагын эрх үүрэг

1.Монгол улсын Хог хаягдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, 20 дүгээр зүйлийн заалт, Алтай сумын ИТХ-ын 2021 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 3 дугаар хуралдааны 3/05 дугаар тогтоолыг үндэслэн хог хаягдал гаргасны төлбөрт жилд 960.000 төгрөгийг Алтай сумын татварын орлогын 100160100947 тоот дансанд 2024 оны 12 дугаар сарын 10-ны дотор төвлөрүүлэх.

2.ААН, байгууллага өөрийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хогийг тогтсон хугацаанд цэвэрлэх, тээвэрлэх, хог хаягдлын талаарх дүрэм журам, стандартын шаардлагыг хангаж, зориулалтын цэгт хаяж байх.

3.Аюултай хог хаягдлыг аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж эсвэл тогтоосон цэгт зөөн тээвэрлэж булшлах.

4.Үйл ажиллагааны явцад үүсдэг хог хаягдлын хэмжээ түүний тухай мэдээллийг сумын Засаг даргын Тамгын газарт үнэн зөв мэдээлж байх.

5.Хог хаягдлыг ангилан хаях талаар зохих мэдээллийг ажилтнууддаа эзэмшүүлж, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг ханган ажиллах

Хоёр: Сумын ЗДТГ-ын эрх үүрэг

1.Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төлөлтөд хяналт тавих

3.Монгол улсын Хог хаягдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийг үндэслэн ААН, байгууллагаас хог хаядал гаргасан төлбөр нэхэмжлэх

4.Хуулиар олгогдсон эрхийн дагуу ААН, байгууллага өөрийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын хэмжээний талаар өгч буй мэдээлэл, орчны ариун цэврийн байдалд хяналт тавих эрхтэй.

5.Хог хаягдлыг ил асгах, орчин тойрныг бохирдуулах, ариун цэврийн шаардлага хангаагүй нөхцөлд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхгүйгээр Зөрчлийн тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн хүрээнд хариуцлага хүлээлгэнэ.

Гурав. Бусад

3.1.Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

3.2.Гэрээний биелэлтийг тухай бүрд нь дүгнэнэ.

3.3.Талуудын тохиролцсоноор гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

3.4.Талуудын хооронд үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрхэмлэх бөгөөд эс зөвшөөрвөл холбогдох шатны шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

АЛТАЙ СУМЫН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН
УЛСЫН БАЙЦААГЧ  МОНХЦЭЦЭГ

“ТАЛСТ МОЛОР” ХХК-ИЙН
УУРХАЙН ДАРГА  Х.БААТАРЖАВ

Хог хаягдалын гэрээ

“ТАЛСТ МОЛОР” ХХК -НЫ 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД
ТУСГАГДСАН АЖИЛ ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ АКТ

2024.10.2

Тус сумын Бодонч багийн нутагт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг “Талст Молор” ххк ны 2024 оны Байгаль орчныг хамгаалах менежмент төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд дараах ажлуудын хийж гүйцэтгэсэн.

1.Алтай сумын Бодонч багийн нутагт орших “Уудавын булаг”-н эхийг хашиж хамгаалсан

2. 1.5 га талбайд 1500 ш бургас, 300 ш хайлаас тарьсан.

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан дээрх ажлуудыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж ажлын хэсэгт шалгуулан хүлээлгэн өгсөн болохыг гэрчилж энэхүү актыг үйлдэв.

/зургийг хавсралтаар оруулав/

АКТ ГАРГАСАН:

Комисын дарга:

Гишүүд:



Х.Түмэндэлгэр

засаг дарга

Б.Мөнхцэцэг

байгаль хамгаалагч

Хүлээн зөвшөөрсөн:

“Талст Молор” ххк -н

Уурхайн дарга:

Уулын инженер:



Х.Баатаржав

Ж.Мөнхсайхан

АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АКТ

2024.11.04

ТАЛСТ МОЛОР ХХК

№	Асуулт	Хариулт
1	Байршил Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, газрын нэр:	Ховд аймаг Булган сум, Бүрэнхайрхан баг
2	Аж ахуйн нэгжийн нэр хаяг: гэрчилгээний дугаар регистер:	ТАЛСТ МОЛОР ХХК ААН-ийн ГД:9011444150 РД:5774047
3	Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл	MV-020930
4	Талбайн координат	46°18'35.23"N 92°18'38.24"E
5	Голын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсэд байршуулах самбарыг хүлээлгэн өгсөн албан тушаалтан : Овог нэр:	ТАЛСТ МОЛОР ХХК-ийн Менежер ажилтан Г.АЛТАНГЭРЭЛ
6	Зорилго	ТАЛСТ МОЛОР ХХК-ийн Байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний дагуу Нүцгэн, Бодонч, Үенч голуудын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх зорилгоор
7	Ажилласан хоног	5
8	Ажилласан хүний тоо	4
9	Ашиглагдсан материал /төрөл /	128м квадрат төмөр,2мм- ийн зузаантай лист төмөр- 16м²

ХАМГААЛАЛТЫН БҮСИЙН САМБАР ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ НЬ:

ТАЛСТ МОЛОР ХХК-ийн уурхайн 2024 оны Байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө, Биологийн олон янз байдал дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд Ховд аймгийн Үенч, Алтай сумдын Бодонч, Нүцгэний голуудын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх зорилгоор нийт 16ш самбарыг Үенч-Бодонч-Булган голын сав газрын захиргаанд хүлээлгэн өгөв.

Цаашид самбаруудыг байршуулах, түүний бүрэн бүтэн байдлыг Үенч сум, Алтай сум, Үенч Бодонч Булган голын сав газрын захиргаа хяналт тавьж хариуцна .

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨСӨН:

ТАЛСТ МОЛОР ХХК-ийн Менежер: / Г.Алтангэрэл /

ХҮЛЭЭН АВСАН:

Үенч-Бодонч-Булган голын сав газрын захиргааны дарга: / Б.Батзориг /



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил хүлээн авсан тухай акт

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
2023 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/439
дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

ЭВДЭРСЭН ГАЗАРТ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙСЭН ГАЗРЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ АКТ

2024 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр

1. Байршлын мэдээлэл		
1.1.	Аймаг, нийслэлийн нэр	Ховд
1.2.	Сум, дүүргийн нэр	Алтай сум, Бодонч баг
1.3.	Газрын нэр	Ендэрт ус
2. Нөхөн сэргээлт хийсэн байгууллагын мэдээлэл		
2.1	Нөхөн сэргээлт хийсэн аж ахуй нэгжийн нэр, регистр	“Талст молор” ХХК РД: 5774047
2.2	Хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр	“Талст молор” ХХК-ний “Оцог хад” гянтболдын уурхайг далд аргаар ашиглах төслийн 2024 оны байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөний биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд буюу ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хөрөнгөөр
2.3	Тус газрын эвдрэлд өртсөн шалтгаан	Хууль бус ашигт малтмал олборлолтын улмаас эвдрэлд орсон талбай
2.4	Тус талбайд нийт эвдрэлд өртсөн талбайн хэмжээ (га)	0.8 га
2.5	Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй эсэх, зөвшөөрлийн дугаар	Үгүй
3. 2024 онд хүлээлгэн өгч буй нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл		
Техникийн нөхөн сэргээлт Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд туссаны дагуу зөвхөн техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн. - Талбайн хэмжээ (га) -0.8 - Зардлын хэмжээ (төгрөгөөр)- 12.0 сая		Биологийн нөхөн сэргээлт - Талбайн хэмжээ (га) - Биологийн нөхөн сэргээлтэд ашигласан мод, сөөг, ургамлын зүйлийн нэр, ургамалжуулсан байдал - Зардлын хэмжээ (төгрөгөөр)
4. Орон зайн мэдээлэл		

4.1 Нөхөн сэргээлт хийгдсэн газрын фото зураг



4.3 Нөхөн сэргээлт хийсэн газрын солбицол

Жич: 4-өөс доошгүй эргэлтийн цэгийн солбицол байна.

4.2. Хэмжилт, зураглал

- Кадастрын зураглал хийсэн мэргэжлийн байгууллага болон хэмжилт хийсэн хүний нэр:

Б.Ариундолгор

- Хэмжилтэд ашигласан программ, тоног төхөөрөмж,

- ArcGIS 10.8

- GPS-Garmen 32

- Холбогдох утас: 94032727

Гарын үсэг:

№	Өргөрөг	Уртраг
Техникийн нөхөн сэргээлт		
1-р хэсэг		
1	46°19' 35.47"N	92°21'34.79"E
2	46°19' 37.35"N	92°21'35.34"E
3	46°19' 37.60"N	92°21' 37.60"E
4	46°19' 31.41"N	92°21' 38.52"E
5	46°19 '30.89"N	92°21 '37.43"E
6	46°19 '34.23"N	92°21 '36.81"E
2-р хэсэг		
1	46°20'17.32"N	92°21 '39.76"E
2	46°20'16.92"N	92°21 '40.75"E
3	46°20'15.81"N	92°21 '40.76"E
4	46°20'16.09"N	92°21 '39.93"E
3-р хэсэг		
1	46°20'14.22"N	92°21 '38.87"E
2	46°20'13.12"N	92°21 '39.97"E
3	46°20'12.47"N	92°21 '39.75"E
4	46°20'13.12"N	92°21 '38.62"E
4-р хэсэг		
1	46°19'33.95"N	92°21 '41.38"E
2	46°19'33.16"N	92°21 '41.11"E
3	46°19'33.69"N	92°21 '40.28"E
4	46°19'34.40"N	92°21 '40.62"E

Нөхөн сэргээлт хийсэн газарт хэмжилт хийж талбайн хэмжээг тогтоон полигон хэлбэрээр shape.file үүсгэн флаш болон CD-нд хуулж акттай хавсаргана.

5. Мэдээллийн сангийн бүртгэл

Нөхөн сэргээлтийг хүлээн авсан ажлын хэсэг нь Байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eis.mn цахим системийн Нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн дэд санд заавал бүртгүүлнэ.

Мэдээлэл оруулсан хүний нэр, албан тушаал: Б.Ариундолгор, БОГ-ын мэргэжилтэн

Гарын үсэг:

Огноо:

Нэмэлт мэдээлэл:

Тус газар нь хууль бус ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааны улмаас
эвдрэлд орсон.

Нөхөн сэргээлтийн ажил нь холбогдох хууль, журам, стандартад нийцсэн талаарх ажлын
хэсгийн дүгнэлт:

Ажлын хэсгийн зүгээс тус газарт хийгдсэн нөхөн сэргээлтийн ажлыг стандартад
нийцсэн гэж үзэж хүлээн авахаар шийдвэрлэлээ.

Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд орон нутгийн захиргаанаас хяналт тавьж, дахин
олборлолт явуулахгүй байхад анхаарч байгалийн жамаар сэргэн ургах боломж нөхцлийг
бүрдүүлэх.

АКТ ГАРГАСАН:

Комиссын дарга:

Нарийн бичгийн дарга:



Б.Цогзолмаа /Байгаль орчны газрын даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч/

Б.Ариундолгор /Байгаль орчны газрын газар, газрын
хэвлий, түүний баялагийн ашиглалт хамгаалалт, нөхөн
сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн/

Гишүүд:

Б.Мөнхбат /Үенч-Бодонч-Булган голын сав газрын
захиргааны ус ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн/

Б.Наранзул /Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын мэргэжилтэн/

Б.Мөнхцэцэг /Алтай сумын байгаль орчны хяналтын
улсын байцаагч/

Б.Түмэндэмбэрэл /Алтай сумын газрын даамал/

Т.Бат-Ургамал / Сумын иргэдийн төлөөлөл/

ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН:



Б.Мөнхтөр /"Талст молор" ХХК-ний захирал/

нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хүлээлцсэн акт
