



**ГОВЬ- АЛТАЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛАН СУМЫН НУТАГТ
ХЭРЭГЖИХ**

**“ЦАХИР УСЛАЛТЫН СИСТЕМ” ТӨСЛИЙН
2025 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

**“АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН” ХХК
РЕГИСТРИЙН ДУГААР: 5440068**

**ГОВЬ- АЛТАЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛАН СУМЫН НУТАГТ
ХЭРЭГЖИХ
“ЦАХИР УСЛАЛТЫН СИСТЕМ” ТӨСЛИЙН 2025 ОНД
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
“АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН” ХХК
РЕГИСТРИЙН ДУГААР 5440068**

Биелэлтийг тайлагнасан: “Алтайн үндэс констракшн” ХХК-ийн захирал

..... Ц.Батбаясгалан

“Алтайн үндэс констракшн” ХХК-ийн байгаль орчны менежер

.....Д.Мөнх-Өлзий

ГАРЧИГ

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА	3
ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ	6
ДӨРӨВ. ОСОЛ ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ	18
ЗУРГАА. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР	24
6.1 Усны шинжилгээ	24
6.2 Хөрсний шинжилгээ	24
6.3 Агаарын шинжилгээ	24
ДОЛОО. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ	25
НАЙМ. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	25
ЕС. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ	26

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА


Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр ХХААХҮЯмны захиалгаар хэрэгжиж буй “Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй” төслийн хүрээнд услалтын системийн барилга байгууламжийг шинэчлэх сэргээн засварлах зорилгоор Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын нутагт хэрэгжиж байгаа “Цахир дэд төсөл”-ийн барилгын ажил Гүйцэтгэгчээр “Алтайн үндэс констракшн” ХХК шалгарч, ХХААХҮЯ-тай 2021 оны 9 сарын 20-ны өдрийн CW-5-1 тоот хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.

“Цахир услалтын систем” төслийн нийт талбай 200.6 га, барилга угсралтын ажил 2021 оны 3 улирлаас эхэлж 2 жилийн хугацаанд явагдана. Энэ талбай нь Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт “Цахирын тал” нэртэй газар байрлах ба Газар эзэмших гэрчилгээний дугаар нь 000005211, нэгж талбарын дугаар 8211000698 бүхий бүртгэлтэй, Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын Засаг даргын тамгын газрын мэдэлд байна.

“Цахир” услалтын системийн засвар шинэчлэлийн ажлын зургийг “Мөнгөн минж” ХХК, Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг “ГРИЙН НАТУР ЛАНД” ХХК, “НЬЮ ГРИЙН ВОРЛД” ХХК, “ЭКОС” ХХК-ууд хамтран гүйцэтгэж, БОАЖЯ-аар баталгаажуулсан.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ. Тухайн жилийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр тогтоосон төслийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг бууруулах, сөрөг үр дагаврыг арилгах, төсөл хэрэгжих орчинд бий болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх үндсэн зорилготой.

ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ. “Цахир” услалтын системийн төсөл хэрэгжих талбай нь Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын Завхангол (3-р баг) багийн нутаг дэвсгэрт байрлах бөгөөд Улаанбаатар хотоос 1120 км, Жаргалан сумын төвөөс зүүн зүгт 15 км-т байрлана Жаргалан сум нь баруун, баруун хойд талаараа Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул сумтай, зүүн хойд талаараа Завхан аймгийн Улиастай, Цагаанхайрхан сумдтай, зүүн талаараа Завхан аймгийн Цагаанчулуут сумтай, зүүн урд талаараа Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумтай тус тус хиллэдэг.

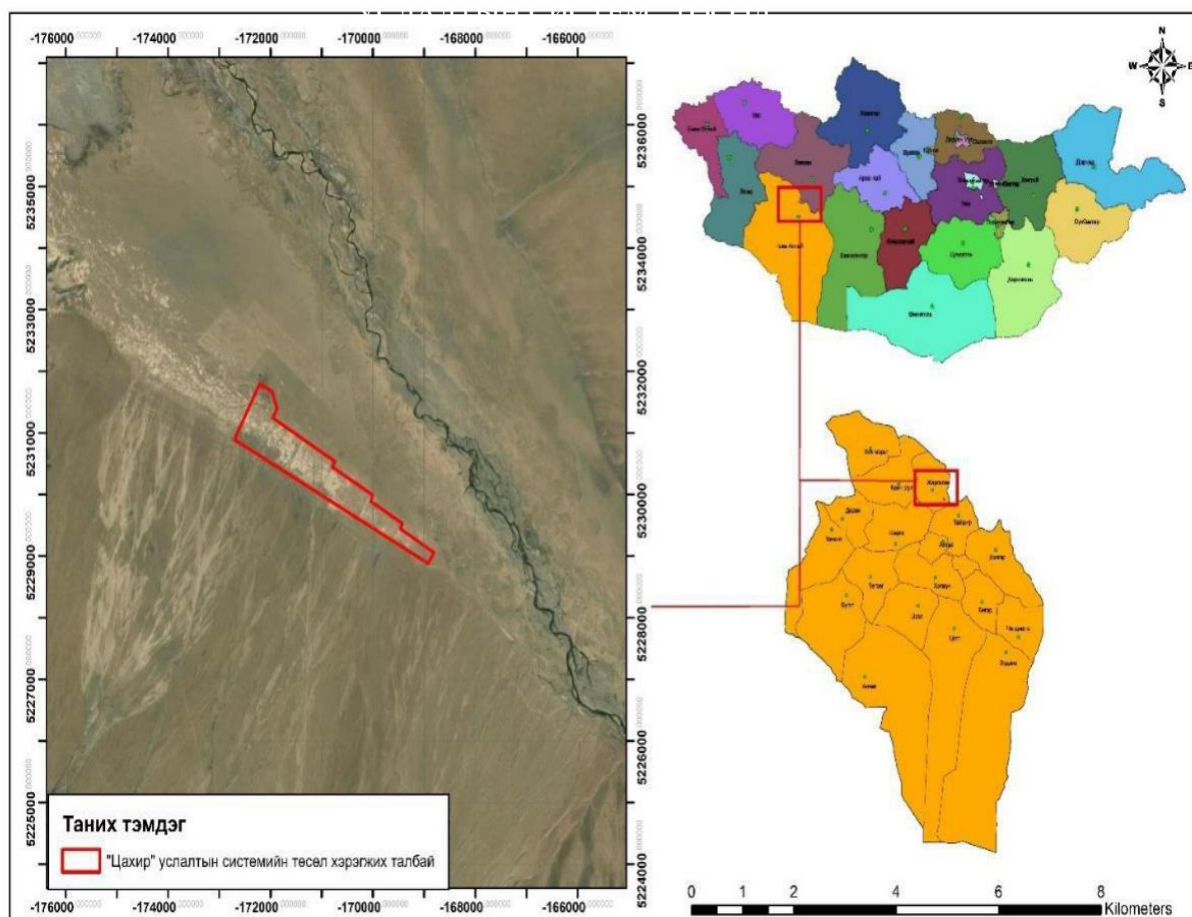

Зураг 1. “Цахир” усалтын системийн төсөл хэрэгжих талбайн байршил

2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕЛЭЛТ

Хуванцар хоолой байрлах шуудууг өнгөн хөрсийг хуулсны дараа экскаватороор ухаж, шуудууны ёроолыг нивелирдэн 20 м тутамд төслийн тэмдэгтэд модон гадас зоож түүнтэйгээ уялдуулан гараар тэгшилгээ хийж янданг оруулж тавьсан. Газар шорооны ажлыг механизмаар гүйцэтгэхэд хэтэрхий гүнзгий ухахгүйгээр төслийн тэмдэгтийн зохих түвшнээс 10 см орчим үе орхин дутуу ухуулж, дараа нь гараар гүйцээж ухуулж байсан

35Кв-ын ЦДАШ-ын ЗБТ35-04.18А маркийн завсрын тулгуур нийт 20ш, У35-1 маркийн төмөр анкер тулгуур 1ш тоноглож босгосон. Нийт 21 тулгуурын цацраг газардуулгыг хийж гүйцэтгэсэн.

ЦДАШ-ын материал тоноглолыг БНХАУ-аас худалдан авалт хийж ажлын талбайд буулгасан.

Төмөр бетон тулгуурийг суулгах нүхийг 3 метр ухаж төмөр тулгуурыг 2025 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэж угсарч булж дуусгасан булагдаа өөрийн хөрсөөр булсан

Хамгаалалтын торон хашааны хувьд 10,2км төмөр утсан торон хашааг засаж сэлбэх ажлыг хийж, 35 шон, 400 метр төмөр торыг шинээр сольсон. Мөн шинээр байгуулсан усан сан, болон дөхүүлэх шуудууг мал амьтан орохоос хамгаалаж 600 метр төмөр торон хашаа шинээр татаж 10 ширхэг шон шинээр сольсон.

Толгойн барилга байгууламжид хаалга цонх хийж, гадна талаар хаяавч хийсэн. Юүлэх худаг, 100*100*3 метрийн хэмжээтэй усан сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 10м³ газар шорооны ажил хийгдсэн зэрэг ажилуудыг амжилттай хийж дуусгасан. Усан сангийн хажуу налуу бэхлэх ажлын бэхэлгээний бетонуудыг ойр орчимын хуучин далангийн бэхэлгээнээс механизмийн тусламжтайгаар ажлын талбайд авчирч далангийн бэхэлгээний ажлыг хийсэн. Бордооны агуулах дээврийг шинээр сольсон. Хаяавч довжоог бүрэн цутгаж дуусгасан.

Усалгааны бороожуулагч машины хувьд 10ш машины төхөөрөмж, материалыг талбай байршуулсанаас 10ш бороожуулагч төхөөрөмжөө төв шугамтай холбох, угсрах ажил дууссан бороожуулагч машиныг иж бүрэн угсарч, суурилуулсан.



ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

2.1 Газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хийгдэх ажлууд

2.1.1 Био ариун цэврийн байгууламж ашиглан, ахуйн шингэн хаягдлыг ил задгай асгахгүй байх

Ариун цэврийн байгууламж болон ахуйн шингэн хаягдал асгах байгууламж хийхдээ хөрсөнд нэвчихээс хамгаалж кольцоо суурилуулж хийсэн байна.



2.1.2 Нөлөөлөлд өртөөгүй эрүүл талбайг хөндөж хөрс хуулах бол өнгөн хөрсийг тусгай талбайд хадгалж, барилгын ажил дууссаны дараа эвдэрсэн талбайг нөхөн сэргээхдээ ашиглах, аль болох богино хугацаанд олон наст ургамлын үр тарих замаар хөрсийг нөхөн сэргээж элэгдлээс хамгаалах.

Энэ онд төслийн талбайд одоогоор хөрс хуулалтын ажил цахилгааны тулгуур босгох ажилтай холбоотойгоор багахан хэмжээгээр хийгдсэн бөгөөд буцааж өөрийн хөрсөөр нь дүүргэлт хийж булсан.



Цахилгааны ажил хийгдсэний дараа буцаан булж тэгшилсэн байдал

2.1.3 Барилга, газар шорооны ажил бүрэн дууссаны дараа нөлөөлөлд өртсөн нийт талбайг нөхөн сэргээж, хуучин төрх байдалд нь оруулах

Газар шорооны суваг шуудуу татах ажил бүрэн дуусж газрыг тэгшлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.



Усан болон дөхүүлэх сувгийн орчиныг тэгшилсэн байдал



Газар шорооны ажил дуусны дараах тэгшилгээний ажил хийгдсэж буй байдал

2.1.4 Төслийн талбайд хурд сааруулагч хийх

Төслийн талбайд хуучины суваг шуудуу олон байдаг учраас тээврийн хэрэгсэл хурдтай явах боломжгүй бөгөөд хурд сааруулагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

2.1.5 Барилгын материал, машин механизмуудыг аль холбох халцгай газарт байрлуулах, байгалийн ургамалтай газарт барилгын материал буулгах, машин механизмын зогсоол болгон ашиглахгүй байх



Барилгын материалыг халцгай газарт буулгасан байдал

Ургамалгүй хэсэгт автомашин байршуулсан нэг цэгт

Энэ онд цахилгааны угсралтын ажил хийгдэж байгаатай холбоотойгоор төмөр бетон тулгуур болон дагалдах материалыг аль болох ашиглах газартаа ойр халцгай газарт буулгаж ашигласан. Төслийн талбай дээр 1 сарын хугацаанд машин механизмыг түрээслэж ажиллуулахдаа ургамалгүй халцгай газарт байршуулж ажилласан.

2.1.6 Шатах тослох материалаар бохирдсон хөрсийг нэн даруй хусаж аван хөрсний гүн рүү нэвчихээс сэргийлэх

Төслийн талбайд энэ онд богино хугацаагаар машин механизмыг ажиллуулсан Шатах тослох материал хөрсөнд асгарсан тохиолдол байхгүй болно.

2.1.7 Шатах тослох материал их хэмжээгээр асгарсан бол элс, даавуу зэрэг шингээгч материалд шингээн авч битүү саванд хийх, асгарсан хэсгийн хөрсийг хуулж авах. Төслийн талбайд шатах тослох материал асгарсан тохиолдол гараагүй болно.

2.1.8 Нийт машин механизмуудыг үзлэг оношилгоонд хамруулж, шаардлагатай бол хөдөлгүүрийг шинэчилж засварлах

Төслийн талбайд энэ онд түлшний машин 0190 УАК, экскаватор 4198 УН, хово 7498 УН, ковш зэрэг машин механизмүүдийг 1 сарын хугацаанд ашигласан эдгээр машин механизмууд нь үзлэг оношилгоонд орсон учраас ажиллах хугацаанд засвар үйлчилгээ хийх шаардлага үүсээгүй болно.

ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГ TECHNICAL INSPECTION			MGL САНАМЖ		МОНГОЛ УЛС MONGOLIA	
Он, Сар, Өдөр YYYY, MM, DD	Техникийн байдал Technical status	Гарын үсэг Тэмдэг Signature Stamp	АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ӨМЧЛӨГЧ ТА		CERTIFICAT D'IMMATRICULATION DU VEHICULE АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ CERTIFICATE OF VEHICLE REGISTRATION MGL	
2024.05.05			- Шинээр автотээврийн хэрэгсэл өмчилж авсан бол 72 цагийн дотор, - Ашиглалтаас хассан бол 1 сарын дотор, - Нэр, хаяг, арлын болон хөдөлгүүрийн дугаар, өнгө өөрчлөгдсөн бол 7 хоногийн дотор тус тус бүртгүүлэх, - Жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамрагдах, - Хуульд заасан хугацаанд албан татвараа төлөх, - Тогтоосон хугацаанд техникийн хяналтын үзлэгт хамруулах үүрэгтэй.		05141776	

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ Technical specifications		MGL		ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОСОН БАЙГУУЛЛАГА Certificate issuing authority	
Улсын дугаар Registration plate number	7466УЕХ	Хөдөлгүүрийн дугаар Engine number	1611H170535	Бүртгэлийн ажилтан Registration officer	Ц. Сэлэ
Марк, загвар Make, model	Shaanxi SX3255-DN384C	Үйлдвэрлэсэн он Year of manufacture	2011	Тэмдэг Stamp	
Ангилал, хөдөлгүүрийн багтаамж Category, engine displacement	9726, C, Евро IV	Импортлосон огноо Date of importation	2012-04-05	Гарын үсэг Signature	2024.05.05
Бүх жин Gross vehicle weight	32100 кг, Ө-жин 12100 кг	Өнгө Color	Ногоон	Тусгай тэмдэглэл Additional note	
Даац, суудлын тоо Loading capacity, number of seats	25000 кг, 3	Тэнхлэгийн тоо Axes			
Төрөл Type	Өөрөө буулгагч	Улсын бүртгэлийн дугаарын өнгө Color registration plate number			
Зориулалт Vehicle designation	Ачаа	Өмчлөгч Owner	НЬЮ БЕСТ ХАУС ХХК		
Арлын дугаар Chassis number	LZGCL2N46BX074568	Хаяг Address	УБ СБД 07 23 тох тауэр 6 данхар		
Бүхээгийн дугаар Cabin number					

2.1.9 Тариалангийн талбайн орчимд 2 хүн зэрэг зөрж болохуйц 1.5-2.0 метр өргөнтэй явган хүний замыг байгалийн чулуугаар хийж услалтын системийн хамт хүлээлгэн өгөх, явган хүний замаас гадуур алхахгүй байхыг нийт ажилчдад анхааруулах

Одоогоор явган хүний зам хийгдээгүй бөгөөд тариалангийн талбайд явган хүний зам хийх нь тохиромжгүй байгаа учир нь тариалангийн талбай учраас дундуур газар хаглах болон тариа хураалтын үед машин механизм явна. Мөн услалтын тоног төхөөрөмж нь эргэх ёстой.

2.2 Гадаргын болон газрын доорх усанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх, бууруулахад хийгдсэн ажлууд

2.2.1 Шүүрэлт үүсгэхгүй байхын тулд гол сувгийг бетоноор доторлох, гол сувгийн эргийн нуралтаас сэргийлэхийн тулд чулуун өрлөг хийх

Далд шугам хоолойг стандартын дагуу суулгаж шүүрэлт үүсэхгүй байхаар наасан. Дөхүүлэх сувгийн эргийн нуралтаас сэргийлэхийн тулд чулуун өрлөг хийсэн. Эргийн бэхлэлтийг хийж байгаа бетонуудыг ойр орчимыг хуучин далангийн бетонуудыг машин механизм ашиглан цэвэрлэж эргүүлэн ашигласан.



2.2.2 Услалтын системийн барилга байгууламжууд буюу усан сан, гол суваг, далд сувгийн битүүмжлэлийг стандартын дагуу хийж, шүүрэлт үүсгэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх.

2.2.3 Тариалангийн талбайгаас гол хүртэлх зайд (Цооног1 46°53'38.28" 96°10'45.97"E, Цооног 2. 46°52'43.66" 96°13'23.83"E) тус бүр шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр тоноглох

Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны газраас цооног өрөмдөх, шуудуу татах зөвшөөрөлийг 2025 оны 6 дугаар сарын 23-ны А/25 тоот тушаалааар авсан бөгөөд 8 дугаар сарын 30-нд мониторингийн 2 цооногийг өрөмдлөгийн компанитай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлсэн болно.



Мониторнгийн цооног өрөмдөх
цэгийг олсон байдал



Цооног дотор суулгах яндан хоолой уртыг харуулсан байдал тус бүр нь 4 метрийн урттай нэг цооногт 5 ширхэг орсон болно.

Өрөмдлөг хийж буй байдал



Цоонгийг өрөмдөж дуусгаж, тагласан байдал

2.2.4 Голын усанд машин угаах, голын ойр орчимд бие засах, хог хаягдал ил задгай хаяхгүй байх талаар барилгын ажилчдад хатуу анхааруулах ба үүнд талбайн инженер хатуу хяналт тавьж ажиллах

Төслийн талбайн инженер хяналт тавин ажиллаж байгаа.

2.2.5 Машин техникийн аюулгүй ажиллагаа, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, шаардлагатай үед засвар үйлчилгээг зориулалтын засварын газарт хийлгэх

Төслийн талбайд үзлэг онишлогоонд орсон машин механизмуудыг 1 сарын турш ажиллуулсан бөгөөд энэ хугацаанд эвдрэл гэмтэл гараагүй учраас засвар үйлчилгээ хийгдээгүй болно.

2.2.6 Ахуйн болон барилгын хатуу, шингэн хаягдлын түр цэгийг усан сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсээс гадагш (Завхан голын эргээс 200 метрээс доошгүй зайд) байрлуулах

Хог хаягдал түр хадгалах цэгийг кемпийг ойролцоо байгуулсан бөгөөд манай кемп нь голоос 2км орчим зайтай байдаг.

2.3.1 Барилгажих талбайд ховор, нэн ховор статустай, эмийн ач холбогдол бүхий хамгаалах шаардлагатай ургамал байвал шилжүүлэн суулгах арга хэмжээ авах, нэн ховор, ховор, эмийн ашигт ургамлуудыг түүж бэлтгэхгүй байх.

Төслийн таблайд ховор, нэн ховор статустай, эмийн ач холбогдол бүхий ургамал тааралдаагүй бөгөөд эмийн ургамал түүн бэлтгэсэн тохилдол байхгүй болно.

2.3.2 Барилгын материал, машин механизмуудыг ургамлан нөмрөг бага буюу аль холбох халцгай газарт байрлуулах, байгалийн ургамалтай газарт барилгын материал буулгах, машин механизмын зогсоол болгон ашиглахгүй байх



5 дугаар сараас цахилгааны угсралтын ажил хийгдэж байгаатай холбоотойгоор төмөр бетон тулгуур болон дагалдах материалыг аль болох ашиглах газартаа ойр халцгай газарт буулгаж ашигласан. Төслийн талбай дээр 1 сарын хугацаанд машин механизмийг түрээслэж ажиллуулахдаа ургамалгүй халцгай газарт байршуулж ажилласан.

2.4.1 Хэрэв барилгын ажлын явцад зэрлэг амьтдын шилжилт хөдөлгөөнтэй таарвал үргээлгүй зам тавьж өгөн өнгөрөөж байх.

Манай барилгын ажил 5 дугаар сарын 15-наас эхлэсэн бөгөөд энэ хугацаанд зэрлэг амьтдын шилжилт хөдөлгөөн болон амьтадтай тааралдаагүй болно.

2.4.2 Нүүдлийн шувууд дайран өнгөрдөг хугацаанд шувуудыг үргээдэг хүчин зүйлүүдэд хяналт тавьж, ажилчдад мэдээлэл өгч шувуудыг аль болохоор үргээж зочоохгүй байх.

Манай ажил 5 дугаар сараас эхлэсэн бөгөөд энэ хугацаанд нүүдлийн шувууд дайран өнгөрөөгүй болно.

2.4.3 Барилгын ажилчдад хууль бус ан агнуур хийхгүй байх, худалдаалахгүй байх талаар анхааруулга өгч, хяналт тавьж ажиллах.

Барилгын ажилчид нь төслийн талбайд байрлаж ажиллаж байгаа бөгөөд кемп рүү ан агнуур хийх хэрэгсэл нэвтрүүлдэггүй бөгөөд тухай бүс нутаг нь малчин айл өрхүүд амьдардаг тул ан амьтан элбэг биш мөн талбайн инженер хяналт тавин ажиллаж байна.

2.4.4 Суваг шуудуу, толгойн барилгын хаалт зэргийг загас өнгөрүүлэх боломжтой байхаар төлөвлөн байгуулах.

Манай гүйцэтгэж буй ажлын зураг төсөлд толгойн барилга байгууламж байхгүй бөгөөд бид насос станцын барилгадаа загас өнгөрөх боломжтой хийхээр нөхцөл боломжийг судлан ажиллаж байна. Одоогоор голоос суваг шуудуу руу ус орж эхлээгүй байгаа болно.

2.4.5 Гол суваг, усан санд загас орвол амьдрах орчны хувьд тохиромжгүй тул толгойн барилгад загас орохоос сэргийлсэн тор тавьж гол суваг руу загас орохгүй дамжин өнгөрөх нөхцлийг бүрдүүлэх.

Манай ажлын зурагт толгойн барилга байгууламж байхгүй бөгөөд бид насос станцын барилгад загас орох боломжгүйгээр хийхээр боломжит нөхцлийг судлан ажиллаж байна. Энэ ондоо бид голоос суваг шуудуу руу голын ус оруулаагүй байгаа.

ГУРАВ. ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ

3.1 Услалтын системийн талбайг тойруулан 10.1га талбайд ойн зурвас байгуулах.

Ойн зурвас байгуулах ажлын хүрээнд Говь-Алтай аймгийн “Алтайн алтан жимс, жимсгэнэ” ТББ-тай 2025 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр суулгац худалдан авах гэрээ байгуулан 1.5 метрээс доошгүй өндөртэй 3000 ширхэг улиас, худалдан авахаар гэрээг байгуулж худалдан авч, тарисан.

3.2 Ойн зурвасыг мэргэжлийн байгууллагын заавар зөвлөмжийн дагуу байгуулах ба орон нутгийн уур амьсгалд тохирсон хайлаас, улиас, харгана, бургас зэрэг цөлийн хээрийн бүсэд тарихад тохиромжтой мод бутыг тарьж, усалгаа, арчилгааг тогтмол хийх, арчилгааг тусгай, мэргэжлийн ажилтнуудад хариуцуулах.

Бид ойн зурвас байгуулах ажлын хүрээнд Сум дундын ойн анги, Алтайн алтан жимс жимсгэнэ, төрийн бус байгууллага, “Нутгийн төгөл” ХХК зэрэг мэргэжлийн байгууллагуудтэй хамтран ажилласан.



Зоорьноос суулгац манай талбай руу ачигдаж буюу байдал Говь-Алтай аймгийн сум дундын ойн ангитай 2025 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдөр суулгац суулгах нүхийг трактороор ухуулах гэрээ байгуулан гэрээний дагуу ажлыг гүйцэтгүүлсэн.



Тариалангийн хашааг дотор талаар нь тойруулан нүхийг ухсан байдал



Суулгац тарьсан байдал

Модны суулгац тарих, усалгаа хийх ажлыг Иргэн Доржсүрэнтэй хийж Алтайн алтан жимс жимсгэнэ ТББайгууллагын ажилчдаар тариулсан энэхүү ажлыг гүйцэтгэхдээ суулгацыг суулгаад шууд усалгаа хийх зарчмаар тарилтыг хийсэн. Усалгааг Завхан голоос ус татаж тэвштэй машин дээр усны 3тн сав тавин 3 машинаар зэрэг услаж тарьсан, тарьж дууссаны дараах усалгааг мөн голоос ачааны машинаар хийж байна. Мөн зуны турш тухайн сумын иргэнээр усалгааг хийж ажилласан. Бид намрын тариалалтаар өмнөх 3000 ширхэг модон дээр 500 ширхэгийг нэмж “Нутгийн төгөл” ХХК-аас суулгац худалдан авч тарилт хийсэн. Энэ онд манай байгууллага нийт 3500 ширхэг суулгац тарьж арчилан нийт 63.500.000 төгрөгийг зарцуулсан байна.



Тарилт усалгаа хийж буй байдал тарьсан



Суулгац нахиалсан байдал



Мод услах усыг Завхан голоос татаж буй байдал

3.3 ойн зурвасын ургалт хэвийн болж тогтворжих хүртэл малын хөлөөс хамгаалж хашаалах

10,2км урттай хашааны засаж сэлбэх шаардлагатай 400 метр тор, 35 ширхэг шоныг шинээр сольсон. Мөн дөхүүлэх шуудууг хамгаалсан 600 метр торон хашааг шинээр хийсэн.



Байршил	ГААймаг Жаргалан сум Цахир дэд төсөл
Захиалагч	ХХААХҮЯ; АDB
Гүйцэтгэгч	"Алтайн Үндэс констракшн" ХХК
Ажлын нэр	Хашааны тор сэргээн засварлаж байгаа нь
Огноо	2025.05.20



Дөхүүлэх шуудууг хашаалсан байдал

3.4 Барилга, газар шорооны ажил дууссаны дараа эвдрэлд орсон талбайг хэлбэршүүлэх, тэгшлэх, үржил шимт хөрсөөр хучих, шаардлагатай тохиолдолд хөрс сайжруулалт хийх зэргээр ургамалжуулах урьдач нөхцөлийг бүрдүүлэх Одоогийн байдлаар газар шорооны ажил бүрэн дуусаагүй үргэлжилж байна.

3.5 Тэгшилж зассан газарт олон наст ургамлын үр цацах, мод, сөөг тарих зэргээр нөхөн сэргээх нөхөн сэргээлт хийх

Хуучин шуудуун дээр бороожуулагчийн дугуй явах боломжтой болгож механизмийн туслажтайгаар тэгшилсэн. Манай төслийн талбай нь газар

тарилангийн талбай учраас биологийн нөхөн сэргээлт хийгдэх шаардлага
үүсэхгүй байна.



ДӨРӨВ. ОСОЛ ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

4.1 Барилгын талбай дээр ажиллах бүх ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр бүрэн хангаж, хэрэглүүлж хэвшүүлэх.



Төслийн талбайд ажилладаг ажилчдыг ажлын хувцасаар хангасан

4.2 Бүх ажилчдад ХАБЭА-н зааварчилгаа өгч гарын үсэг зуруулах, ХАБЭА-н зааварчилгаанд хамрагдаагүй ажилчдыг барилгын талбай дээр 2 ажиллахыг хориглох, үүнд ХАБЭА-н ажилтан байнга хяналт тавьж хариуцлагатай ажиллах.

Манай талбайн инженер ХАБЭА зааварчилгаа өгч хяналт тавин ажиллаж байна. Одоогоор манай төслийн талбай дээр осол авааргүй гараагүй болно.

4.3 Галын аюулгүй байдлыг хангаж, гал унтраах анхан шатны болон суурин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслүүдийг байршуулах, галын хор цэнэгтэй эсэхийг байнга шалгаж, цэнэг нь дууссан бол цэнэглүүлж байх

Химийн бодисын агуулахын дотоод засварын ажил дуусахаар гал унтраах анхан шатны болон суурин тоног төхөөрөмжийг суурилуулна.

4.4 Ажилчдад аливаа болзошгүй аваар ослын үед анхны тусламж үзүүлэх сургалт зааварчилгааг өгч, анхны тусламжийн эм тариа, багаж хэрэгслийг бэлэн байлгах.



/Анх тусламжийн эмийн хайрцаг/

4.5 Барилга, газар шорооны ажил явагдах талбайн орчимд анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ, санамж байрлуулах, хязгаарлалтын бүс тогтоох.

Манай ажил нь бүрэн хашаалсан хязгаарлалтын бүс тогтоосон газруудад явагдсан.



4.6 Шороон шуургатай өдрүүдэд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хурдад хязгаарлалт хийх, сонор сэрэмжлүүлгийг өндөржүүлэн ажиллах.

Манай гүйцэтгэлийн ажил 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 10 дугаар сарыг дуустал үргэлжилсэн энэ хугацаанд шороон шуурга болоогүй бөгөөд манай талбайд 3-4 тээврийн хэрэгсэл машин механизмууд богино хугацаанд ажиллаж байсан төслийн талбай нь өмнө газар тариалангийн талбай байсан учраас тээврийн хэрэгсэл хурдтай явах нөхцөл боломж байхгүй. Гэвч бид талбайд ажиллаж байгаа тээврийн хэрэгсэл ажилчдад хязгаарлалтыг сануулж сонор сэрэмжтэй ажилласан.

ТАВ. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖЕМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

5.1 Орон нутагтайгаа хог хаягдлын гэрээ байгуулж ажиллах

Жил бүр Говь-Алтай аймгийн Жаргалант сумын засаг даргын тамгийн газартай хог хаягдал тээвэрлэх гэрээг 2025 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр байгуулсан. /Гэрээг хавсаргав./

5.2 Дахин боловсруулах боломжтой хаягдлыг нягтаршуулах зориулалт бүхий “Хаягдал пресслэгч машин” худалдан авч ангилан ялгасан хаягдлуудыг нягтаршуулан тээвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх.

10тн даралтаар дарах хүчин чадалтай хог хаягдал пресслэгч 2025 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр Эрээн хот руу захилга өгсөн байгаа. /Төлбөрийн баримт хавсаргав/

5.3 Ахуйн хатуу хаягдлын цэгийг эх үүсвэр дээр нь 4-5 төрөлд ангилан ялгах боломжтой байдлаар, бетон эсвэл төмөр суурьтай, битүүмжлэл сайтай байгуулах ба тариалангийн талбайн орчинд, ялангуяа ажилчид амарч цайлдаг хэсгүүдэд хог хаягдал ангилан ялгах савнуудыг байршуулах



Түр хог хадгалах цэг байгуулах бетон суурь бэлдсэн байдал



Ангилан ялгаах боломжтой түр хогийн сав хийсэн

5.4 Барилгын ажил дуусахад талбай дээр ямар ч хог хаягдал үлдээхгүй цэвэрлэж явах

Барилгын ажлыг бүрэн дуусгахаар ажиллаж байна.

5.5 Нийтийн их цэвэрлэгээ хийх



Байршил	ГААймаг Жаргалан сум Цахир дэд төсөл
Захиалагч	ХХААХҮЯ; ADB
Гүйцэтгэгч	"Алтайн Үндэс констракшн" ХХК
Ажлын нэр	Талбайн хог цэвэрлэгээ хийж байгаа нь
Огноо	2025.06.13



Байршил	ГААймаг Жаргалан сум Цахир дэд төсөл
Захиалагч	ХХААХҮЯ; ADB
Гүйцэтгэгч	"Алтайн Үндэс констракшн" ХХК
Ажлын нэр	Талбайн хог цэвэрлэгээ хийж байгаа нь
Огноо	2025.06.13

Ажлын талбайд ажиллаж буюу ажилчид машин механизмийг ашиглан ойр орчмыг хогийг цэвэрлэж ашиглах боломжтой хаягдалыг буцаан ашигласан

5.6 Хог хаягдлыг хувиарын дагуу ачиж төвлөрсөн хогийн цэгт хаях.

Ажилчидын ахуйгаас гарсан болон барилгын ажлаас гарсан хог хаягдлыг цуглуулан өөрсдийн портер машинаар тээвэрлэн сумын хогийн цэг рүү 1 удаа хаясан.

5.7 60м³ -аас багагүй багтаамжтай бетон доторлогоо бүхий бохирын цооног байгуулж, ахуйн шингэн хаягдлыг хуримтлуулах




Ахуйн шингэн хаягдал хуримтлуулах
бохирын цооног хийж буй байдал



Ахуйн цооногийг тагласан байдал

5.8 Стандартын шаардлагад нийцсэн ажилчдын бие засах газар /Эрэгтэй, эмэгтэй/
буюу арин цэврийн байгууламж байгуулан бохирын цооногтой холбох

Стандартын шаардлага хангасан ажилчдын бие засах газар байгуулсан бөгөөд
бохирын цооногийн хажууд нь хийж өгсөн.

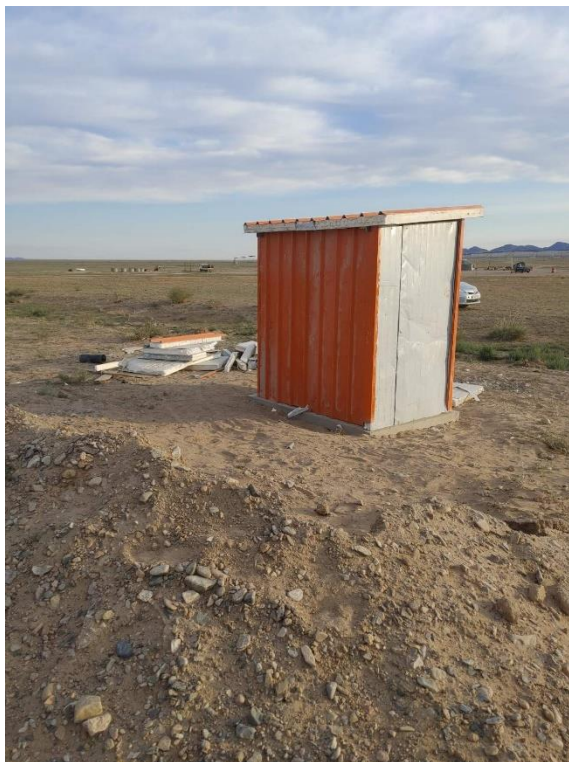

Ажилчдын бие засах газрыг хийсэн байдал



Бохирын цооног хийж буй байдал



Бохирын цооногийг хийж дуусан байдал

5.9 Ажлын хэмжээнээс хамаарч ашиглах материалын орц найрлага, хэмжээг зөв тохируулан аль болох хаягдал үүсгэхгүй байх, хаягдлыг хамгийн бага байхаар төлөвлөж ажиллах.

Зургийн дагуу бараа материалыг захиалдаг учир хог хаягдал бага гардаг.

5.10 Үүссэн хаягдлыг дахин ашиглах боломж бололцоог судлах, ашиглаж болохуйц зуурсан шавар, бетон, модон болон төмөр эдлэхүүн зэрэг хаягдал, үлдэгдэл материалуудыг орон нутгийн иргэдэд өгөх

Ашиглах боломжтой хуучин бетоныг усан сангийн эргийн хамгаалалтанд ашигласан болно. Хог хаягдал цэвэрлэх явцад модны хожуулуудыг цуглуулан хүмүүсд гал түлэхдээ ашигла гэж өгсөн.



Дахин ашиглах боломжтой бетонгийг
цуглуулсан байдал

Усан сангийн эргийг нуралтаас хамгаалсан

5.11 Барилгын материалын хаягдлууд нь гол төлөв аюултай шинж чанар багатай байх тул энгийн хаягдлын хамтаар орон нутгийн төвлөрсөн хаягдлын цэгт 7 хоногт 1-2 удаа зайлуулах арга хэмжээ авах.

Энэ оны хийгдсэн ихэнх ажил нь цахилгааны ажил бөгөөд барилгын материалын хог хаягдал бага гарсан үйл ажиллагааны явцад ашигласан цементийн уутнууд гарсан бөгөөд түүнийг аймаг явахдаа аймгийн хогийн цэгт нийлүүлсэн.

5.12 Машин механизмын засвар үйлчилгээнээс гарсан аюултай хог хаягдлыг тусгай зориулалтын битүүмжлэлтэй саванд (цэг) хадгалж, дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх

Төслийн талбайд 1 сарын хугацаанд машин механизм ашигласан бөгөөд энэ хугацаанд засвар үйлчилгээ хийх нөхцөл байдал үүсээгүй учраас аюултай хог хаягдал гараагүй болно.

ЗУРГАА. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

6.1 Усны шинжилгээ

Усны шинжилгээг 2 удаагийн давтамжтайгаар химийн шинжилгээг хийлгэхээр төлөвлөсөн дээжийг Тайшир сумын Завхан-Тайширын голоос 1 цэгээс, 2 удаагийн давтамжтайгаар буюу 2025 оны 5 болон 7 дугаар сард Говь-Алтай аймгийн ус, цаг уур, орчины шинжилгээний лабораторит шинжлүүлсэн.

Усны шинжилгээний үр дүнгээс харахад MNS4586:2024 Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлагад заасан стандартын шаардлагатай хариуцуулан шинжилэхэд үзүүлэлтүүд нь стандартын шаардлага хангаж байна. /Шинжилгээний хариуг хавсаргав./

	Он сар	Ес	pH	ж/б	Пич	Ca	Mg	Na+K	SO4	CL	HCO ₃	эрдэс	хатуу	NH ₄	NO ₂	NO ₃	P	Fe	F	Si
Завхан гол	07/29	251	8.56	1.4	4.0	30.1	5.0	31.8	54.0	7.1	113.5	241.5	1.91	0.11	0.002	0.04	0.013	0.03	0.38	0.3
	05/20	356	8.06	2.8	3.2	47.3	9.5	32.5	116.1	19.9	89.1	314.4	3.14	0.38	0.002	0.02	0.014	0.06	0.29	0.5
MNS 4586:2024		6.6-8.5	6.5-9.0	50	15	200	50	-	200	350	-	1300	10	0.8	0.12	6	0.2	3	0.5-1.5	-

6.2 Хөрсний шинжилгээ

Хөрсний агар химийн шинжилгээг БОШЛабораторит 2025 оны 05 дугаар сарын 20-н болон 7 дугаар сарын 29-ны өдрүүдэд Байгаль хамгаалал. 3297:2019 Хөрс. Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх стандартын шаардлагатай харьцуулан шинжилэхэд сатндартын шаардлага хангаж байна. Хөрсний хими физик шинж чанар, хүнд металл болон нянгийн шинжилгээг хийж ажилласан. /Шинжилгээний хариуг хавсаргав./

Шинжлүүлсэн огноо	Шинжилсэн цэг	Ялзмаг	РН	Р мг/кг	Чийг %	NH ₄ мг/кг	NO ₃ мг/кг	SO ₄ мг/кг
2025.05.20	Кемпийн хажуу	0.26	8.37	3.822	0.35	196.40	11.040	21.4
2025.05.20	Төслийн талбай	0.13	8.43	3.612	0.02	274.97	12.480	12
2025.07.29	Кемпийн хажуу	0.24	8.63	4.200	0.61	211.34	4.848	17.6
2025.07.29	Төслийн талбай	0.34	8.76	4.587	0.47	53.63	9.120	21.6
	MNS3297:2019						130	160

6.3 Агаарын шинжилгээ

БОШЛабораторид агаарын шинжилгээг 2 цэгээс 2 удаа хийлгэсэн. /шинжилгээний хариуг хавсаргав.

Шинжлүүлсэн огноо	Шинжилсэн цэг	PM-2.5мкг/м ³	PM10 мкг/м ³	SO ₂ мкг/м ³	NO ₂ мкг/м ³
2025-05-20	Бороожуулагч 2	15	12	2	10
2025-05-20	Кемпийн хажуу тал	15	11	1	5
2025-07.29	Кемпийн хажуу тал	37	47	11	23
2025-07.29	Бороожуулагч 2	29	31	12	13
MNS 4585:2016		100	50	450	200

Агаарын шинжилгээг 2 дугаар бороожуулагч, кемпийн хажуу талаас тус тус шинжлүүлсэн “Агаарын чанарыг үнэлэх, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг

тооцохдоо тоосонцрыг 2.5-10 микрометрийн аэродинамик диаметртайгээр тооцдог.” буюу том ширхэглэлт тоосонцор (PM10) ба 2.5 микрометрээс бага буюу нарийн ширхэглэлт тоосонцор (PM2.5), хүхэрлэг хий (SO₂), азотын давхар исэл (NO₂) зэрэг үзүүлэлтүүдийг **MNS 4585:2016 “Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага”** стандарттай харьцуулан шинжлүүлж ажиллахад шинжилгээний үр дүнгүүд стандартад нийцэж байна. /Шинжилгээний хариу хавсаргав./

ДОЛОО. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

БОННУ-ний хээрийн судалгааны ажлын үед төсөл хэрэгжих талбайд нүдэнд ил харагдах түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал, соёлын биет өв илрээгүй болно. Гэвч “Цахир” услалтын системийн барилга, газар шорооны ажлыг анхаарал болгоомжтой явуулж, Монгол Улсын “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд ажиллаж байна.

НАЙМ. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

8.1 БОМТ-ийн төлөвлөгөөг батлагдсан журмын дагуу боловсруулан эрх бүхий байгууллагаар баталуулах тайлагнах.

2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/618 тушаалаар батлагдсан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журмын дагуу боловсруулж байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн ямаар батлуулан ажилласан.

8.2 Ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах /орон нутгаас/

Энэ онд ойн зурвас байгуулах ажлын хүрээнд мод тарьсан түнний усалгаанд шаардлагатай усанд Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах хүсэлтийг 2025 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 25/197 тоот албан хүсэлтээр хүргүүлсэн боловч ус ашиглах зориулалт нь ашиг олох биш учраас дүгнэлт гаргуулах шаардлагагүй гэсэн хариу өгсөн. /Албан бшхүсэлт хавсаргав/.

8.3 Байгаль орчны аудит хийлгэх

Байгаль орчны аудитыг төслийн барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага хийлгэхгүй төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага хийлгэхээр БОННУ-ний тайланд тусгагдсан байна.

8.4 Мониторнгийн цэгийг байгуулах цооног өрөмдөх зөвшөөрөл Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны газраас авах.

Манай байгууллага Мониторнгийг цооног өрөмдөх зөвшөөрлийг Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны газрын даргын 2025 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/25 дугаар тушаалаар авсан.

ЕС. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ

Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөллийн бүсэд оршин суугчдад тайлагнах ажлын хүрээнд 2025 оны БОМТ-ний биелэлтийн үр дүнгийн тайланг eis.mn сайдаар илгээж Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны газарт хүргүүлнэ.

2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/618 тушаалаар батлагдсан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журамын дагуу боловсруулж 2025 оны 11 дүгээр сарын 1-ний дотор Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны газарт хүргүүлэн ажиллана.

ХАВСРАЛТ

БОШЛабораторийн усны шинжилгээний дүн

Дугаар он/№ : 2025/ 01
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, угас : "АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН"
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : 1 ус
Хүлээн авсан огноо : 2025.05.20
Дээжийн тодорхойлолт : /Завхан гол/
Шинжилсэн огноо : 2025.05.20-29
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Сорьцдг нэр	Он,сар, өдөр	E _о μS/cm	pH	ж/б мг/л	мг/л										мг/л					Si
					ПИЧ	Ca	Mg	Na+K	SO ₄	CL	HCO ₃	эрд	хэт мг-эжв/л	NH ₄ ⁺	NO ₂	NO ₃	P	Fe	F	
Завхан гол	2025-05-20	356	8.06	2.8	3.2	47.3	9.5	32.5	116.1	19.9	86.1	314.4	3.14	0.38	0.002	0.02	0.014	0.06	0.29	0.5
MNS 4586:2024		6.5-8.5	-	-	10.0	25	10	-	60	200	10	1000	-	0.20	0.01	1.0	0.05	-	1.5	-

Баталгаажуулсан:
УЦУОШТ-ийн дарга..... Н.Алтантуяа
Хянасан:
ЦУОТХэлтсийн дарга..... Дэлгэрмаа
Шинжилгээ үийцэтгэсэн:
БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа

Шинжилгээний дүн нь зөвхөн тусгай шинжилсэн дээжид хүчинтэй.
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

ЦАХИР УСЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН 2025 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

УС,ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/02
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН"
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : 1.хөрс
Хүлээн авсан огноо : 2025.05.20
Дээжийн тодорхойлолт : /Төслийн талбай/
Шинжилсэн огноо : 2025.05.20-29
Хуудасны тоо : 1/1

➤ Шинжилгээ хийсэн үзүүлэлт-Үр дүн:

№	Сорьцны нэр	Уртраг	Өргөрөг	Ялзмаг %	pH	Чийг %	NH ₄ мг/кг	NO ₃ мг/кг	P мг/кг	SO ₄ мг/кг
2	Төслийн талбай	96.19885	46.88339	0.15	8.43	0.02	274.97	12.480	3.612	12.0
	MNS3297:2019							130		160

Баталгаажуулсан:
УЦУОШТ-ийн дарга...../Н.Алтантуяа/
Хянасан:
БОШЛ-ийн эрхлэгч...../Д.Сарантуяа/
Шинжилгээ үйцэтгэсэн:
БОШЛ-ийн инженер...../Ц.Болормаа/

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Шинжилгээний дүн - тухайн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

УС,ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/01
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "АЛТАЙН ҮНДЭС <ОНСТРАКШН">
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : 1.хөрс
Хүлээн авсан огноо : 2025.05.20
Дээжийн тодорхойлолт : /Кемпийн хажуу талаас/
Шинжилсэн огноо : 2025.05.20-29
Хуудасны тоо : 1/1

➤ Шинжилгээ хийсэн үзүүлэлт-Үр дүн:

№	Сорьцны нэр	Уртраг	Өргөрөг	Ялзмаг %	pH	Чийг %	NH ₄ мг/кг	NO ₃ мг/кг	P мг/кг	SO ₄ мг/кг
1	Кемпийн хажуу талаас	96.21054	46.87919	0.26	8.37	0.35	196.40	11.040	3.822	21.4
	MNS3297:2019							130		160

Баталгаажуулсан:
УЦУОШТ-ийн дарга..... /Н.Алтантуяа/
Хянасан
БОШЛ-ийн эрхлэгч..... /Д.Сарантуяа/
Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:
БОШЛ-ийн инженер..... /Ц.Болормаа/

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Шинжилгээний дүн - тухайн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

УС,ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

АГААРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/12
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН"
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : Агаар-1
Хүлээн авсан огноо : 2025.05.20
Дээжийн тодорхойлолт : /Төслийн талбай/
Шинжилсэн огноо : 2025.05.20
Хуудасны тоо : 1/1

Сорьцын нэр	Өдөр	Цаг	Даралт, мм	Температур, °C	салхи зүг, градус	хурд, м/с	Чийг, %	Цаг агаарын байдал	Их хурд, м/с
Төслийн талбай	2025.05.20	14	843.7	17.5	X	7	29	үзэгдэлгүй	10

Агаар бохирдуулагч бодис	SO ₂ мкг/м ³	NO ₂ мкг/м ³
MNS4585:2016	450	200
дундаж	2	10

Батаалгаажуулсан:
УЦУОШТ-ийн дарга..... Н.Алтантуяа
Хянасан :
БОШЛ-ийн эрхлэгч..... Д.Сарантуяа
Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:
БОШЛ-ийн шинжээч..... С.Янжмаа

Шинжилгээний дүн нь зөвхөн тухайн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй,
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

УС,ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Тоос, тоосонцрын шинжилгээний дүн

Дугаар он/№ : 2025/ 11
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН"
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : 1.Тоос
Хүлээн авсан огноо : 2025.05.20
Дээжийн тодорхойлолт : /Кемпийн хажуу талаас/
Шинжилсэн огноо : 2025.05.20
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Агаар бохирдуулагч бодис	PM10 мкг/м^3
Дундаж	11
Их	729
Бага	26
MNS 4585:2016	100

Агаар бохирдуулагч бодис	PM2.5 мкг/м^3
Дундаж	15
Их	304
Бага	11
MNS 4585:2016	50

Баталгаажуулсан:

УЦУОШТ-ийн дарга..... Н.Алтантуяа

Хянасан :

БОШЛ-ийн эрхлэгч..... Д.Сарантуяа

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

БОШЛ-ийн шинжээч..... С.Янжмаа

Шинжилгээний дүн нь зөвхөн тухайн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй.
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

**УС,ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ**

АГААРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/11
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН"
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : Агаар-1
Хүлээн авсан огноо : 2025.05.20
Дээжийн тодорхойлолт : /Кемпийн хажуу талаас/
Шинжилсэн огноо : 2025.05.20
Хуудасны тоо : 1/1

Сорьцын нэр	Өдөр	Цаг	Даралт, мм	Температур, °C	салхи зүг, градус	хурд, м/с	Чийг, %	Цаг агаарын байдал	Их хурд, м/с
Кемпийн хажуу талаас	2025.05.20	14	843.7	17.5	X	7	29	үзэгдэлгүй	10

Агаар бохирдуулагч бодис	SO ₂ мкг/м ³	NO ₂ мкг/м ³
MNS4585:2016	450	200
дундаж	1	5

Баталгаажуулсан:

УЦУОШТ-ийн дарга..... Н.Алтантуяа

Хянасан :

БОШЛ-ийн эрхлэгч..... Д.Сарантуяа

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

БОШЛ-ийн шинжээч..... С.Янжмаа

Шинжилгээний дүн нь зөвхөн тухайн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй.
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар хот
Утас: 11-341818 И-мэйл: bohzi@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН



Дугаар он/№ : 2025/292-293
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "Алтайн үндэс констракшн" ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Д.Сарантуяа БОШЛ-ийн эрхлэгч
Сорьцын тоо, төрөл : 2 хөрсний сорьц
Сорьц авсан огноо : 2025.05.20
Сорьцын тодорхойлолт : Говь Алтай аймаг
Шинжилгээний аргын стандарт : САЗ А01:2022
Шинжилсэн огноо : 2025.06.10
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн


№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Кадьми (Cd)	Хар тугалга (Pb)	Мөнгөн ус (Hg)	Хром (Cr)	Цайр (Zn)	Зэс (Cu)	Стронци (Sr)
		мг/кг						
1	Кемпийн хажуу талаас	0.2	8	<0.005	<0.5	53	28	449
2	Төслийн талбай	2.4	11	<0.005	<0.5	<0.5	28	485
	MNS 5850:2019/ЗДХ/	3	100	2	150	300	100	800

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:
Хянаж баталгаажуулсан:



Ахлах шинжээч Б.Даваасүрэн
Ахлах шинжээч Б.Алтантуяа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.



ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,
Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Утас: 11-341818
E-mail: bohzt@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН



Дугаар он/№	: 2025/292-293
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: “Алтайн үндэс констракшн” ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Д.Сарантуяа БОШЛ-ийн эрхлэгч
Сорьцын тоо, төрөл	: 2 хөрсний сорьц
Сорьц авсан огноо	: 2025.05.20
Сорьцын тодорхойлолт	: Говь-Алтай аймаг
Шинжигээний аргын стандарт	: MNS 6838 : 2020
Шинжилсэн огноо	: 2025.06.06
Хуудасны тоо	: 1/1
Үр дүн:	

№	Сорьц	Нефтийн бүтээгдэхүүн гр/кг
1	Кемпийн хажуу талаас	0.46
2	Төслийн талбай	0.20

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

Хянаж баталгаажуулсан:



Шинжээч Д.Баярхулан

Ахлах шинжээч Б.Алтантуяа

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцод хүчинтэй.

**УС,ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ**

Тоос, тоосонцрын шинжилгээний дүн

Дугаар он/№ : 2025/ 18
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН"
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : 1.Тоос
Хүлээн авсан огноо : 2025.07.29
Дээжийн тодорхойлолт : /Кемпийн хажуу талаас/
Шинжилсэн огноо : 2025.07.29
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Агаар бохирдуулагч бодис	PM10 мкг/м^3
Дундаж	47
Их	659
Бага	29
MNS 4585:2025	50

Агаар бохирдуулагч бодис	PM2.5 мкг/м^3
Дундаж	37
Их	229
Бага	29
MNS 4585:2025	37.5

Баталгаажуулсан:

УЦУОШТ-ийн дарга..... Н.Алтантуяа

Хянасан:

БОШЛ-ийн эрхлэгч..... Д.Сарантуяа

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

БОШЛ-ийн шинжээч..... С.Янжмаа

Шинжилгээний дүн нь зөвхөн тухайн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй.
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

**УС,ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ**

АГААРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/19
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН"
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : Агаар-1
Хүлээн авсан огноо : 2025.7.29
Дээжийн тодорхойлолт : /Төслийн талбай/
Шинжилсэн огноо : 2025.7.30
Хуудасны тоо : 1/1

Сорьцын нэр	Өдөр	Цаг	Даралт, мм	Температур, °C	Чиглэл	Салхины хурд, м/с	Чийг, %	Цаг агаарын байдал	Салхины их хурд, м/с
Кемпийн хажуу тал	2025.07.29	14	631.1	32.1	3	3	14	үзэгдэлгүй	5

Агаар бохирдуулагч бодис	SO ₂ мкг/м ³	NO ₂ мкг/м ³
MNS4585:2025	450	200
дундаж	11	23

Баталгаажуулсан:

УЦУОШТ-ийн дарга Н.Алтантуяа

Хянасан:

БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

БОШЛ-ийн шинжээч С.Янжмаа

Шинжилгээний дүн нь зөвхөн тухайн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй,
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

**УС,ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ**

АГААРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/18
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : “АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН”
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : Агаар-1
Хүлээн авсан огноо : 2025.7.29
Дээжийн тодорхойлолт : /Кемпийн хажуу тал/
Шинжилсэн огноо : 2025.7.30
Хуудасны тоо : 1/1

Сорьцын нэр	Өдөр	Цаг	Даралт, мм	Температур, °C	Чиглэл	Салхины хурд, м/с	Чийг, %	Цаг агаарын байдал	Салхины их хурд, м/с
Кемпийн хажуу тал	2025.07.29	14	631.1	32.1	3	3	14	үзэгдэлгүй	5

Агаар бохирдуулагч бодис	SO ₂ мкг/м ³	NO ₂ мкг/м ³
MNS4585:2025	450	200
дундаж	12	13

Баталгаажуулсан:

УЦУОШТ-ийн дарга..... Н.Алтантуяа

Хянасан :

БОШЛ-ийн эрхлэгч..... Д.Сарантуяа

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

БОШЛ-ийн шинжээч..... С.Янжмаа

Шинжилгээний дүн нь зөвхөн тухайн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй.
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

УС,ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/04
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН"
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : 1.хөрс
Хүлээн авсан огноо : 2025.07.29
Дээжийн тодорхойлолт : /Кемпийн хажуу талаас/
Шинжилсэн огноо : 2025.07.29-31
Хуудасны тоо : 1/1

➤ Шинжилгээ хийсэн үзүүлэлт-Үр дүн:

№	Сорьцны нэр	Уртраг	Өргөрөг	Ялзмаг %	pH	Чийг %	NH ₄ мг/кг	NO ₃ мг/кг	P мг/кг	SO ₄ мг/кг
1	Кемпийн хажуу талаас	96.21054	46.87919	0.24	8.63	0.61	211.34	4.848	4.200	17.6

Баталгаажуулсан:
УЦУОШТ-ийн дарга...../Н.Алтантуяа/
Хянасан:
БОШЛ-ийн эрхлэгч...../Д.Сарантуяа/
Шинжилгээ үийцэтгэсэн:
БОШЛ-ийн инженер...../Ц.Болормаа/

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Шинжилгээний дүн - тухайн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

УС,ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/05
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, угас : "АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН"
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : 1.хөрс
Хүлээн авсан огноо : 2025.07.29
Дээжийн тодорхойлолт : /Төслийн талбай/
Шинжилсэн огноо : 2025.07.29-31
Хуудасны тоо : 1/1

➤ Шинжилгээ хийсэн үзүүлэлт-Үр дүн:

№	Сорьцны нэр	Уртраг	Өргөрөг	Ялзмаг %	pH	Чийг %	NH ₄ мг/кг	NO ₃ мг/кг	P мг/кг	SO ₄ мг/кг
2	Төслийн талбай	96.19885	46.88339	0.34	8.76	0.47	53.63	9.120	4.587	21.6

Баталгаажуулсан:
УЦУОШТ-ийн дарга /Н.Алтантуяа/
Хянасан
БОШЛ-ийн эрхлэгч /Д.Сарантуяа/
Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:
БОШЛ-ийн инженер /Ц.Болормаа/


Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Шинжилгээний дүн - тухайн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

УС, ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Дугаар он/№ : 2025/ 02
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН"
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : 1 ус
Хүлээн авсан огноо : 2025.07.29
Дээжийн тодорхойлолт : /Завхан гол/
Шинжилсэн огноо : 2025.07.29-31
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Сорьцын нэр	Он,сар, өдөр	Ес μS/cm	pH	CaCO ₃ мг/л	ПИЧ	Ca	Mg	Na+K	SO ₄	CL	HCO ₃	эрд	хат мг-эвб/л	мг/л					Si
														NO ₂	NO ₃	P	Fe	F	
Завхан гол	2025-07-29	251	8.56	1.4	4.0	30.1	5.0	31.8	54.0	7.1	113.5	241.5	1.91	0.002	0.04	0.013	0.03	0.39	0.3
MNS 4586:2024			6.5-8.0	50	15	200	50	-	200	350	-	1300	10	0.12	6	0.2	3	0.5-1.5	-

Баталгаажуулсан:  /Н.Алтантуяа/
УЦУОШТ-ийн дарга
Хянасан:  Д.Сарантуяа/
БОШЛ-ийн эрхлэгч
Шинжилгээ үийцэтгэсэн: 
БОШЛ-ийн инженер  Ц.Болормаа/

Шинжилгээний дүн нь зөвхөн тухайн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй.
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

УС,ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Тоос, тоосонцрын шинжилгээний дүн

Дугаар он/№ : 2025/19
Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : "АЛТАЙН ҮНДЭС КОНСТРАКШН"
Дээжийг авсан хүний нэр, албан тушаал : БОШЛ-ийн эрхлэгч Д.Сарантуяа
Дээжийн тоо, төрөл : 1.Тоос
Хүлээн авсан огноо : 2025.07.29
Дээжийн тодорхойлолт : /Төслийн талбай/
Шинжилсэн огноо : 2025.07.29
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

Агаар бохирдуулагч бодис	PM10 мкг/м³
Дундаж	31
Их	115
Бага	26
MNS 4585:2025	50

Агаар бохирдуулагч бодис	PM2.5 мкг/м³
Дундаж	29
Их	94
Бага	25
MNS 4585:2025	37.5

Баталгаажуулсан:

УЦУОШТ-ийн дарга..... Н.Алтантуяа

Хянасан :

БОШЛ-ийн эрхлэгч..... Д.Сарантуяа

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

БОШЛ-ийн шинжээч..... С.Янжмаа

Шинжилгээний дүн нь зөвхөн тухайн шинжилсэн дээжинд хүчинтэй,
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.

ХОГ ХАЯГДАЛ ТЭЭВЭРЛЭХ ГЭРЭЭ

2025 оны 06 сарын 10 өдөр

№

Жаргалан сум

Нэг талаас Говь-алтай аймгийн Жаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газар /цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх/-ыг төлөөлж Орлогч дарга П.Нэргүй, нөгөө талаас Алтайн үндэс констракшн ХХК /цаашид “Захиалагч” гэх/-ийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал ажилтай Ц.Батбаясгалан нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Монгол улсын “Хог хаягдлын тухай” хуулийн 9.4, 9.5 дугаар зүйл, Монгол улсын “Ариун цэврийн тухай” хуулийн 7.4, 7.5 дугаар заалтууд, Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын ИТХ-ын 2022 оны 12 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолыг тус тус хэрэгжүүлэх, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ахуйн болон, үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, холбогдсон харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.

Хоёр. Төлбөр тооцооны журам

2.1., Говь-Алтай аймгийн Жаргалан сумын ИТХ-ын 2022 оны 12 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолын дагуу 1тн хог хаягдлыг дарж устгах төлбөр **15000 /тоогоор/ арван таван мянган /үсгээр/ тогрог болно.**

2.2. Захиалагч нь хог хаягдлын хэмжээг тусгасан баримтыг үндэслэн төлбөрийг төлбөрийн даалгавар үүгэсэнээс хойш 3 хоног дотор нэхэмжлэлийн дагуу гүйцэтгэгчийн дансанд шилжүүлнэ.

2.3 Гүйцэтгэгчийн төлбөр хүлээн авах дансны мэдээлэл:

Банкны нэр: Төрийн сан ЗДТГ-н нэмэлт санхүүжилтийн данс

Дансны дугаар: 100050755405

Гурав. Гэрээний хугацаа.

3.1 Энэхүү гэрээ нь 2025 оны 06-р сарын 12 ны өдрөөс 2025 оны 10-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл хүчинтэй.

3.2 Энэхүү гэрээний сунгалт:

20.....оны-р сарын - өдрөөс 20....оны-р сарын-ний өдрийг хүртэл

20.....оны-р сарын - өдрөөс 20....оны-р сарын-ний өдрийг хүртэл

Доров. Гүйцэтгэгч байгууллагын эрх, үүрэг

4.1. Буулгасан хог хаягдлын тоо хэмжээг заасан тэмдэг бүхий талоныг хураан авна.

4.2 Хог дарж устгах цэг дээр захиалагчийн хог буулгахад зориулсан талбай бэлтгэнэ.

4.3.Хог хаягдлын талаархи дүрэм, журам, стандартын шаардлагыг хангаж ажиллана.

4.4. Хог хаягдлыг ангилан хаях, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг ханган ажиллана.

4.5. Хог хаягдлыг тухай бүр дарж устгана.

Тав. Захиалагч байгууллагын эрх, үүрэг

5.1. Хог хаягдлыг тогтоосон чиглэлийн дагуу тээвэрлэн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хүргэнэ. /МУ-ын Хог хаягдлын тухай хуулийн 12.1 дэх заалт/

5.2. Хог хаягдлыг тээвэрлэх аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. /МУ-ын Хог хаягдлын тухай хуулийн 12.2 дэх заалт/

5.3. Хогийн цэг дээр хогоо буулгаж буй машины жолоочид хогны хэмжээг заасан цехийн тэмдэг бүхий талоныг гүйцэтгэгчийн холбогдох ажилтанд хүлээлгэж өгнө.

5.4. Хогийн цэгт хогийг буулгахдаа диспетчерийн заасан цэгт хогийг буулгана.

5.5. Зориулалтын цэгээс бусад газарт хог хаягдал хаяхгүй байх. /МУ-ын Хог хаягдлын тухай хуулийн 9.1.3 дахь заалт/

5.6. Хог хаягдлын тухай хууль зөрчсөн бол зөрчлийн тухай хуулийн 6-р зүйл заалтуудыг үндэслэн хариуцлага хүлээлгэнэ. /Зөрчлийн тухай хуулийн 6.1.1/Хог хаягдлыг зориулалтын цэгээс бусад газарт хаясан бол учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулж иргэнийг гучин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Зөрчлийн тухай хуулийн 6.1.2./Хог хаягдлыг ил задгай шатаасан бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж иргэнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Зөрчлийн тухай хуулийн 6.1.3./Хүн амын төвлөрсөн суурьшлын бүс, усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүс, эрүүл ахуйн бүс, ашигт малтмалын нөөц тогтоогдсон газарт зөвшөөрөлгүйгээр, эсхүл хуулиар хориглосон бусад газарт хог хаягдлын төвлөрсөн цэг байгуулсан бол учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулж иргэнийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

Зургаа. Талуудын хүлээх эрх, үүрэг

6.1. Захиалагч нь гэрээнд заасан хугацаанд нэхэмжилсэн төлбөрийг барагдуулаагүй тохиолдолд төлбөрийн үлдэгдэлд хоног тутамд 0.3%-ийн алданги тооцож дараа сарын төлбөрт оролцуулан тооцно.

6.2. Гүйцэтгэгч нь хүндэтгэх шалтгаангүйгээр хог хаягдлыг дарж устгах үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хоног тутамд 0.3% алданги тооцож нэхэмжилсэн төлбөрөөс хасаж тооцно.

6.3. Талууд энэхүү гэрээний биелэлтийг улиралд нэг удаа дүгнэнэ.

6.4. Хэрвээ талуудын хооронд энэхүү гэрээтэй холбогдох асуудлаар маргаан гарвал түүнийг харилцан зөвшилцөх журмаар шийдвэрлэх ба шийдвэрлэж эс чадвал хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцагчийн оршин байгаа газрын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Долоо. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журам.

7.1. Энэхүү гэрээнд аливаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах тухай саналаа нөгөө талд албан бичгээр 14 хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.

7.2. Энэхүү гэрээнд оруулсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэж талуудын гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг байна.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:



Гүйцэтгэгчийн хаяг:
Говь-алтай аймгийн Жаргалан сум
Утас:88623381

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:



Захиалагчийн хаяг:
Улаанбаатар хот, Баянгол
дүүрэг
2-р хороо, Жем паласе, 1307 тоот
Утас:77001281, 89826611

танай _____ -ны № _____ -т

~~ЗАХИРАД~~

Ц.БАТБАЯСГАЛАН





ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

2025 оны 06 сарын 23 өдөр

Дугаар 1/25

Есөнбулаг сум

Зөвшөөрөл олгох тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.5 дахь хэсэг, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1.26 дахь жагсаалт, "Усны тухай" хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Цахирын услалтын системийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд тусгагдсаны дагуу услалтын системийн ус ашиглалт, усны түвшин хянах зориулалтаар "Алтайн үндэс констракшн" ХХК-д өргөргийн 46°53'38.28" уртрагийн 96°10'45.97", өргөргийн 46°52'43.66" уртрагийн 96°13'23.83" цэгүүдэд мониторингийн 2 цооног өрөмдөхийг зөвшөөрсүгэй.

2.Цооног өрөмдөх ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэн, газрын хэвлийг хөндөхдөө хөрсний үржил шимийг алгадуулахгүй, бохирдол үүсгэхгүй байхад анхаарч, мониторингийн 2 цооногийг бүрэн тоноглож, ашиглалтын заавар зөвлөмжийг боловсруулан сум, орон нутагт хүлээлгэж өгөхийг "Алтайн үндэс констракшн" ХХК (Ц.Батбаясгалан)-д үүрэг болгосугай.

3.Цооногийг тус газраас олгосон зөвшөөрлийн дагуу зориулалт өөрчлөхгүйгээр мониторинг хийхэд ашиглахыг Жаргалан сумын Засаг дарга (Р.Мөнхбаяр)-д даалгасугай.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Д.БАТМАГНАЙ

2000001180

