



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ
ЯАМ



**ХОВД, БАЯН-ӨЛГИЙ, УВС АЙМГИЙН НУТАГТ
ХЭРЭГЖИХ “ЭРДЭНЭБҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН
СТАНЦ БАРИХ” ТӨСЛИЙН 2025 ОНЫ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2025 он

АГУУЛГА

1	ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА	3
1.1	Товч танилцуулга	3
1.2	Барилга, байгууламж.....	3
2	ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ НУТГИЙН ОРЧНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.....	4
2.1	Уур амьсгал	4
2.2	Газар ашиглалт.....	4
2.3	Гадаргын ус.....	4
2.4	Газрын доорх ус.....	4
2.5	Хөрсөн бүрхэвч.....	5
2.6	Ургамалжилт	5
2.7	Ойн сан	6
2.8	Амьтны аймаг	6
2.9	Тусгай хамгаалалттай газар нутаг.....	7
2.10	Ус хэрэглээ	7
2.11	Цахилгаан болон дулаан хангамж, агаар сэлгэлт	7
2.12	Хог хаягдал.....	7
3	ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ.....	8
4	БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ.....	10
5	СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	12
5.1	Барилгын бүтээн байгуулалтын ажлын үе шатанд	12
6	ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....	22
7	НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 23	
8	ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	23
9	ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....	23
10	ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	25
11	ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР	27
12	БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....	29
13	БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ХУВААРЬ.....	29

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Төслийн байгаль орчны болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээ	8
Хүснэгт 2. Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө (Барилгын бүтээн байгуулалтын ажлын үед)	12
Хүснэгт 3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө	22
Хүснэгт 4. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	23
Хүснэгт 5. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	23
Хүснэгт 6. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	25
Хүснэгт 7. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	27
Хүснэгт 8. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө	29
Хүснэгт 9. БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч талуудад тайлагнах хэлэлцүүлэх хуваарь	30


ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. Газарзүйн байршил	3
Зураг 2. Ерөнхий төлөвлөгөө	3

1 ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1 Товч танилцуулга

Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн байршил нь Ховд хотын төвөөс баруун хойш 120 км, Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын төвөөс баруун хойш 20.0 км-т орших Шижигтийн хавцалд байрлана. Төсөл нь Монгол улсын ЗГ-ын 2019 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн дугаар 357 тоот тогтоолоор Улсын тусгай хэрэгцээнд авсан 28000 га газрыг хамарна.

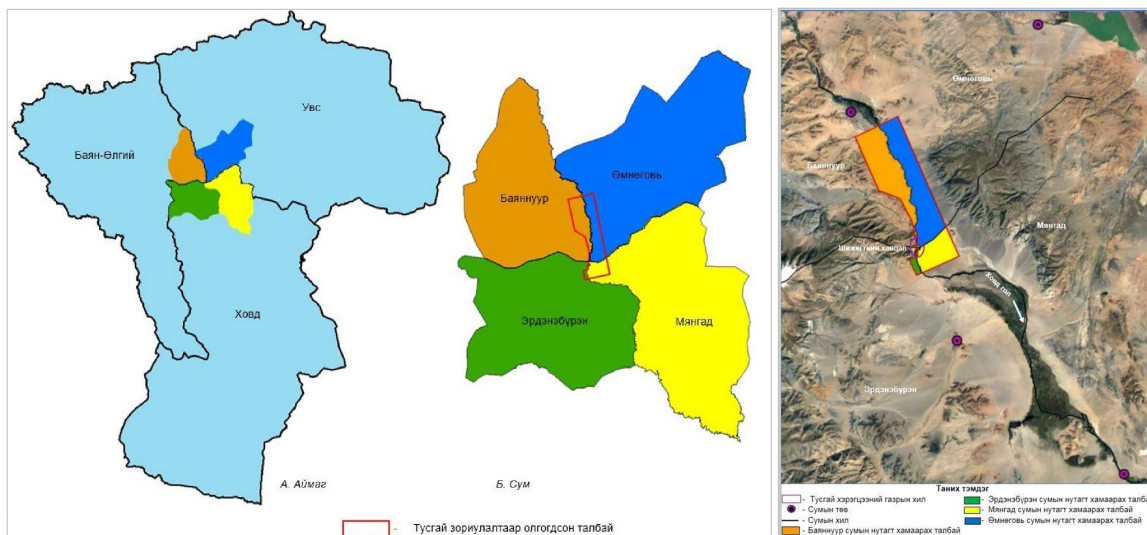


Зураг 1. Газарзүйн байршил

Усан цахилгаан станцын төслийн усны эзлэх талбай 9871.1 га, жилийн дундаж урсац 69 м³/с. Төслийн үндсэн зорилго нь цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх юм. Нуурын усан сангийн бүрэн дүүргэлтийн түвшин 1325 м, ашиглалтын доод түвшин 1305 м, усан сангийн нийт нөөцлөх хүчин чадал 1140 сая м³, ашиглагдах хүчин чадал 1101 сая м³, ус нөөцлөх хүчин чадлын коэффициент 47.05 хувь байна. Усан сан нь олон жилийн турш ашиглагдана. Төслийн нийт суурилагдсан хүчин чадал 90 МВт, 4 турбин суурилагдана. Жилд дунджаар 4061 цаг ажиллаж 366 ГВтц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэнэ.

1.2 Барилга, байгууламж

Төслийн үндсэн барилгад элс-хайрган дүүргэлттэй бетонон хучилттай далан, үерийн усны дээд, доод хаяуур, ус хүлээн авах суваг, цахилгаан станцын барилга орно.

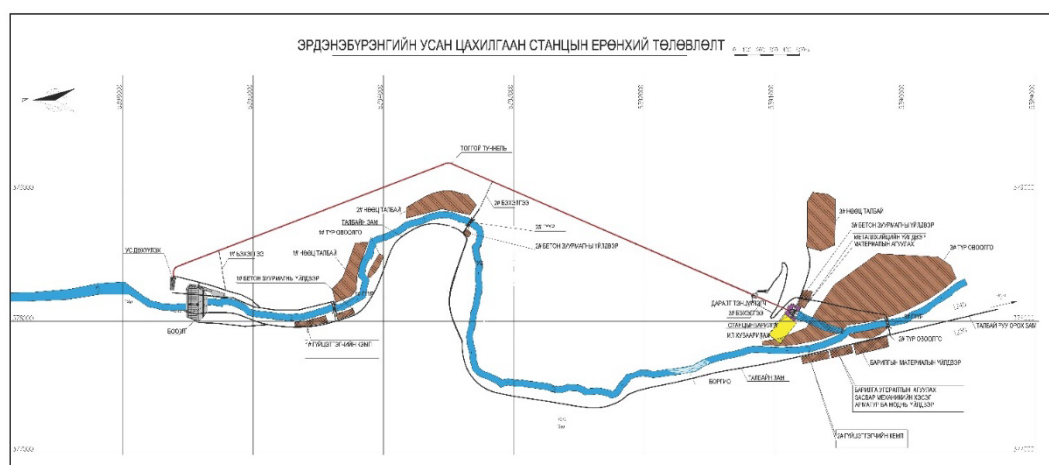

Зураг 2. Ерөнхий төлөвлөгөө

2 ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ НУТГИЙН ОРЧНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2.1 Уур амьсгал

Төслийн бүс нутаг нь хуурай сэрүүвтэр зунтай, хахир өвлийн мужид хамаарна. Төслийн бүс нутагт жилдээ 2700-2900 орчим цаг нар гийгүүлнэ. Жилийн дундаж агаарын температурын олон жилийн дундаж утга буюу хэвийн хэмжээ (норм ч гэдэг) $-0.8^{\circ}\text{C} \dots 1.7^{\circ}\text{C}$ орчим байна. Хамгийн хүйтэн 1 дүгээр сард $(-22.4^{\circ}\text{C}) \dots (-24.7^{\circ}\text{C})$ хүйтэн байх ба хамгийн дулаан 7 дугаар сард $(+17.1^{\circ}\text{C}) \dots (+20.5^{\circ}\text{C})$ дулаан байна. Жилийн дундаж агаарын температурын утга нь $-0.8^{\circ} \div 1.7^{\circ}\text{C}$ орчим байдаг. Хөрсний гадаргын жилийн дундаж температур $0.8^{\circ}\text{C} \dots 4.6^{\circ}\text{C}$ орчим дулаан байна. Жилдээ 75 - 225 орчим мм хур тунадас унах бөгөөд түүний 80-93.0 хувь нь жилийн дулаан улиралд (IV-IX сарын хооронд) орно. Жилдээ Алтан Хөхийн болон Цамбагарав уулын өндөрлөг хэсгээр 200 - 225 мм, захын дундаж өндөрлөг уулсаар 125 – 175 мм, голын хөндийд 75 -100 мм орчим хур тунадас ордог байна. Үнэмлэхүй чийгшил жилийн дундаж байдлаар дунджаар 4.8 гПа. Харьцангуй чийгшил жилийн дундаж байдлаар 55%-60% орчим болно. Жилийн дундаж салхины хурд 1.0-2.9 м/с орчим, хаврын саруудын салхины дундаж хурд 4 м/с хүрдэг боловч Монголдоо хамгийн салхи багатай газрын нэг юм. Салхины хамгийн их хурд 34 м/с-ээс давж болно.

2.2 Газар ашиглалт

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын тусгай хэрэгцээнд авсан 28000 га талбайн 10448 га буюу 37.3 хувь Баяннуур суманд, 12297 га буюу 43.9 хувь Өмнөговь суманд, 4693 га буюу 16.8 хувь нь Мянгад суманд, 545 га 1.9 хувь нь Эрдэнэбүрэн суманд хамаарагдаж байна. Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын усанд автах талбайд нийт 9871.1 га нутаг дэвсгэр хамарч байгаа бөгөөд үүнээс усан сангийн талбайд Өмнөговь суманд 4558.6 га буюу 46.4 хувь, Баяннуур суманд 5176.1 га буюу 52.4 хувь, боомтын талбайд 4 сумын 136.4 га талбай хамаарагдана.

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын төслийн Тусгай хэрэгцээний талбай 28000 га талбайд Өмнөговь сумын нутагт 125 өвөлжөө, Мянгад сумын нутагт 8 өвөлжөө, Эрдэнэбүрэн сумын нутагт 3 өвөлжөө, Баяннуур сумын нутагт 150 өвөлжөө хаваржаа байрлаж байна. Харин усанд автах талбайд Баяннуур сумын 145 айлын өвөлжөө хаваржаа (1 бага сургуулийн барилга), 1 мод үржүүлгийн газар, 22 нэгж талбарт хадлан болон ногооны талбай, 102 гар худаг, Өмнөговь сумын 125 өвөлжөө хаваржаа, 1 багийн төвийн 17 барилга объект, 3 худаг байршиж байгаа бөгөөд тус сумын Мөргөлжин аралд Баяннуур сумын 26 өрх суурьшин амьдарч байна.

2.3 Гадаргын ус

Ховд гол нь Төв Азийн гадагш урсацгүй ай савд багтах бөгөөд Монгол орны цэнгэг устай хамгийн том Таван Богд уулсын мөстлийн массив, мөсөн голуудаас эх аван, Монгол Алтай нурууны өндөр уулс дундуур урсан Хар-Ус нуурт цутгаж, Хар, Ногоон, Дөргөн, Айраг, Хяргас зэрэг Их нууруудын хотгорын нууруудад хүрч, цутгана. Ховд бол 6 дугаар эрэмбийн гол. Ховд голын урт 596 км, хэвгий 0.0035, ус хурах талбай 59139 км². Ховд гол-Баяннуур харуулын ус хурах талбай 40993 км², УЦС-ын чиглэлээр 45500 км² буюу эдгээрийн зөрөө 10% байна. Ховд-Баяннуур харуулын жилийн дундаж урсацын норм 64.7 м³/с буюу 2041.5 сая м³ усны нөөцтэй. Жилийн дундаж урсац 20 жилд 1 удаа тохиох магадлалтай 5%-ийн хангамшилтай элбэг услагтай жилд 93.2 м³/с байна.

2.4 Газрын доорх ус

Төсөл хэрэгжих талбайн хэмжээнд гидрогеологийн давхрага зүйн ангилалын хувьд голоцены настай голын гарал үүсэлтэй сэвсгэр хурдасны зузаалаг дахь уст давхарга-(Q2), плейстоцен-голоцен настай бэл-хормойн, голын гарал үүсэлтэй сэвсгэр хурдасны зузаалаг

дахь уст давхарга-(Q1-2), ордовик-силурын настай гүний гарал үүсэлтэй чулуулгийн на цавын усжсан бүсийн газрын доорх ус-(O-S) тархана. Энэхүү усжсан ан цавын бүсийн зузаан нарийвчилан тогтоогдоогүй бөгөөд газрын доорх ус ихэнхдээ чөлөөт гадаргуутай, ардын болон бага гүнтэй инженерийн худгийн мэдээллээр уст үеийн илрэх гүн 0.8-5.0 м, ундарга 0.1-1.0 л/с болно. Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын усан сангийн нийт талбайн хэмжээ нь 9758.7 га буюу $9.8 \cdot 10^{10}$ м² болно. Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын усан сан байгуулах талбайн хэмжээнд 16282.5 м³/хоног буюу 190.4 л/сек хэмжээтэй газрын доорх ус нөөцлөгдөн үлдэнэ.

Усан санд ус хуримтлуулах явцад 14 000 000 м³ хэмжээтэй ус усан сангийн ёроолоор доош шүүрүүлж алдах магадлалтай болно. Усан сангийн нийт идэвхтэй эзлэхүүн 1 140 000 000 м³ ба усаар ханаагүй сэвсгэр хурдасны нүх сүв болон үндсэн чулуулгийн ан цавын орон зайг дүүргэхэд нөхөн тэжээгдлийн хэмжээ 14 000 000 м³ байгаа тул усан сангийн нийт идэвхтэй эзлэхүүний 1.2% нь тодорхой хугацаанд доошоо нэвчин алдсаны дараа хөрс нь усаар бүрэн ханах буюу усан сан д.т.д 1325 м-ийн түвшинд усаар дүүрэх хугацаа 1.2%-иар нэмэгдэх болно.

2.5 Хөрсөн бүрхэвч

Монгол Алтайн нурууны хөрс бүрэлдэн тогтох үйл явцад газрын хотгор, гүдгэр, ар өвөр хажуугийн тогтоц, уур амьсгалын эрс тэс байдал тодорхой нөлөөлж, хөрсний босоо бүслүүр үүссэн байдаг онцлогтой ба талбайн хэмжээнд тогтворжсон хөрсийг ерөнхийд нь уул-хөндийн чулуурхаг хүрэн болон голын эрэг татмын чийгт гарлын аллювийн гэж ангилж авч үзнэ.

Талбайн хэмжээнд уулын орой хяр, энгэр хажуугаар хүрэн хөрсний төрлүүд болох уулын нимгэн давхаргатай чулуурхаг цайвар хүрэн, чулуун хучаастай чулуурхаг цайвар хүрэн, сайргархаг цайвар хүрэн, харин уулын хормой бэл, хөндийдээ сайргархаг цайвар хүрэн хөрс тогтворжих ба эндээс чулуун хучаастай сул хөгжилтэй элсэн хөрс харьцангуй их тархалттай. Уулын хөрс нь өнгөн гадаргадаа ямагт чулуутай, ялзмагт давхаргын зузаан 6-15 см, нимгэн бөгөөд том жижиг чулуу их агуулсан, чулуу нь хурц өнцөгтэй, ихэнхдээ элсэнцэр механик бүрэлдэхүүнтэй, ялзмагийн агууламж 0.20-1.41% буюу бага, орчин pH 7.17-8.98 буюу шүлтлэгээс их шүлтлэг шинжтэй, дээд давхаргад карбонат бага хэмжээгээр агуулсан онцлогтой.

Голын дагуу түүний эрэг татмаар аллювийн, аллювийн нугын, аллювийн нугат-намгийн, аллювийн намгийн хөрс тогтворжих бөгөөд механик бүрэлдэхүүний хувьд элсэн, элсэнцэр болон хайрга зонхилсон хөнгөн бүтэцтэй. Энд дунд болон бүдүүн ширхэгтэй элсэн фракц 85-90%-ийг бүрдүүлж байгаа бол шавар фракц (0.01 мм) бага ба 5.4-6.6-10.1% хүрнэ. Хөрсний ялзмагт үеийн зузаан 25-35 см ба хэлбэлзэлтэй, орчин багаас (pH 7.74-8.82) их шүлтлэг, ялзмагийн агууламж (0.32-1.45%) бага. Голын татмын ус чийг байнгын ихтэй булан тохой, хотгор хэсгүүдээр аллювийн намгархаг хөрстэй. Солилцоот сууриудын нийлбэр багатай, сууриудаас магни Mg⁺⁺ болон кальц Ca⁺⁺-ийн ион ээлжлэн зонхилно. Хөрсөнд ургамалд хялбар ашиглагдах P₂O₃, K₂O-ийн хангамжаар бага.

2.6 Ургамалжилт

Бүс, бүслүүрийн хувьд Шижигтийн хавцал, хавцлаас хойш голын хөндий орчмын нутагт цөлжүү хээр зонхилж байна. Голын татамд чийгсэг бүслүүрийн бус ургамалжилт зонхилж байна. Ургамалжилтын ангилалын хувьд энд хээр, цөл, татмын нуга, татмын чийгсэг ой ба чийгсэг сөөг гэсэн ургамалжилтын үндсэн хэвшинж зонхилно.

Шижигтийн хавцал, Ховд голын сав дагуу нийт 19 овогт хамаарах 48 төрөл, 61 зүйл ургамал байна. Үүнээс хамгийн өргөн тархалттай овгуудад Asteraceae, Fabaceae, Amarantacea, Poaceae, Juncaceae зэрэг овгийн төлөөлөгчид байгаа ба төрлийн хувьд

Artemisia, Caragana, Carex, Oxytropis, Stipa, Agropyron зэрэг төрлүүд зонхилно. 3 зүйл ховор ургамал байгаа ч тохиолдоц хэлбэрээр тааралдана.

2.7 Ойн сан

Шижигтийн хавцлын өмнөд ба хойд хэсгийн Ховд голын дагуух бургас зонхилсон шугуйн одоогийн төлөв байдлыг тооцож үзэхэд нийтдээ 884 га талбайтай, 23868 м³ нөөцтэй бургас (80%), улиасан (20%) ой байна. Хавцалын өмнөд хэсгийн Ховд гол дагуух баруун зүүн эрэгт бургас, улиасан ойн улиас нь 5-7 м дундаж өндөртэй, 20-45 см дундаж диаметртэй байна.

2.8 Амьтны аймаг

Төслийн талбайд тархсан болон тархах боломжтой 31 зүйлийн хөхтөн амьтад, 157 зүйлийн шувууд, 5 зүйлийн мөлхөгчид болон олон тооны шавжийн биологийн төрөл зүйлүүд тархан байна. Ховд гол дагуу ойр хавь, Тагийн улаан, Улиастайн шил зэрэг газруудаар цоохор ирвэс, янгир ямаа, халиун буга, чоно, үнэг, хярс, мануул, заарт харх зэрэг хөхтөн амьтадтай.

Хавцлын баруун зүүн талын уулсад янгир, аргал, шилүүс, хадны суусар, саарал чоно зэрэг ховор амьтад байхаас гадна уулын тагийн бүсэд өндөр уулын шарга хайруулдай, галсүүлт, уулын цэгцгий, шийхнүүхэй, хадны жижир зэрэг шувууд байна. Мөн өндөр уулын хадан хясаа бүхий газруудад нөмрөг тас, ёл, цармын бүргэд, шилийн сар элбэг. Энд цоохор хонин гүрвэл, могой гүрвэл, бамбай хоншоорт могой, рашааны могой зэрэг нь элбэг, түгээмэл тархалттай юм.

Монгол улсын Амьтны тухай хуулийн (2012) Нэн ховор амьтны жагсаалтад төсөлд хамрагдах нутагт тархсан амьтдаас цоохор ирвэс (*Panthera uncia*), азийн минж (*Castor fiber*), борцгор хотон (*Pelicanus crispus*), цагаан толгойт ямаан сүүл (*Oxyura leucoserphala*), усны нөмрөг бүргэд (*Aquila clanga*) зэрэг хөхтөн амьтад, шувуудтай.

Талбай түүний ойр хавьд байгаа амьтдаас “Зэрлэг амьтан, ургамлын аймгийн Ховордсон зүйлийг Олон улсын хэмжээнд Худалдаалах тухай Конвенци (CITES)”-ийн I хавсралтад цоохор ирвэс, II хавсралтад аргаль хонь, шилүүс мий, мануул мий зэрэг амьтад бүртгэгдсэн байдаг. Түүнчлэн хөхтөн амьтдаас аргаль хонь (*Ovis ammon*), янгир ямаа (*Capra sibirica*), цоохор ирвэс (*Uncia uncia*), эрээн хүрнэ (*Vormela peregusna*) зэрэг зүйлүүд Монгол улсын Улаан ном (1997)-нд бүртгэгджээ.

Загас, усны амьтан. Ховд голын урсгал хүчилтөрөгчийн хангамж сайтай, цэнгэг зөөлөн ус, ёроолын хурдасны олон хэв шинжээрээ хадран ба алтайн сугасны төрлийн загаснууд, сахалт эрээлжийн байршил, үржил-идээшлэлтийн зам газар болж байдаг. Ховд голд 6 зүйл загас амьдарна. Үүнд: Монгол хадран, шивэр хадран ба Алтайн сугасны төрлийн нохой ба шар сугас, давжаа сугас загас тус ай савын унаган загас төдийгүй агнуурын үндсэн загаснууд юм. Сахалт эрээлж нь усны ёроол орчмын амьдралтай, жараахайн загас юм.

Харин ёроолын амьтнаас хавцлын дээд хэсгийн чулуу хайрган хурдастай ёроолын хурдсанд соно (*Odonato*), өдөрч (*Ephemeroptera*), хаварч (*Plecoptera*), манцуйт (*Trichoptera*) шавжийн авгалдайнууд, голоос салаалсан татуурга салаануудад шаалий хавч (*Gammaridae*), усны бясаа (*Hemiptera*) зонхилно.

Шижигтийн хавцлын хэсэгт голчлон хадран загас үржлийн цугларалт үүсгэж байгаад үрждэг. Хар, Хар-ус нуурын хадран загасны үржлийн сүрэг Ховд голын урсгал сөрж нүүдэллэн 5-р сарын сүүлчийн хагасаас 6-р сарын дунд үе хүртэлх хугацаанд усны урсгал багатай хэсгийн бүдүүн ширхэгт элс хайрга, чулуун хурдас дээр түрсээ шахна. Түрсний хөгжлийн хугацаа байгалийн нөхцөлд 23-30 хоног бойжиж жармагай гардаг.

2.9 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц байгуулахаар тусгай хэрэгцээнд авсан 28000 га талбай нь улсын тусгай хамгаалалттай газар болох Алтан Хөхий уул БНГ-аас 0.86 км зайд оршдог, Цамбагарав уул БЦГ-тай 19.9 км-ээр хил залгасан, Сартугтайн Ховд аймгийн Мянгад сумын Орон нутгийн ТХГН-тай талбайн давхцалтай байна. Давхацсан талбайн хэмжээ 4813.64 га.

2.10 Ус хэрэглээ

Барилгын ажлын үеийн усны хэрэглээг Ховд голоос, ашиглалтын үеийн ус хэрэглээг усан сангаас УЦС-д ирж буй уснаас тус тус хангана.

Барилгын ажлын үеийн гол ус хэрэглээ нь бетон зуурмаг бэлтгэхэд зарцуулагдах ба энэ үе шатанд 95400.0 м³/жил ус, зам талбайн усалгаанд жилд 32800.0 м³ ус хэрэглэнэ.

Ашиглалтын үед усны хангамжийн нэг системтэй байх ба энэ нь техникийн болон унд ахуйн усны системүүдээс бүрдэнэ. Ус хадгалах савны багтаамж 250 м³, үүний 191 м³ гал унтраах системийн ус, 59 м³ нь техникийн болон унд ахуйн хангамжийн системд ашиглана.

УЦС-ыг барьж дуусах 5 жилийн хугацаанд унд-ахуйд 9600.0 м³/жил ус хэрэглэх ба харин УЦС-ын ашиглалтын үеийн унд-ахуйн ус хэрэглээ нь 3240 м³/хон байна.

2.11 Цахилгаан болон дулаан хангамж, агаар сэлгэлт

Цахилгаан хангамж: УЦС-ын барилгын ажлын ЦЭХ-ний хэрэглээг Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын төвөөс 35 кВ-ын ЦДАШ-аар татаж хангана. Энэ үе шатанд шаардагдах ЦЭХ-ий хамгийн их хэрэглээ нь урьдчилан тооцоолсноор 5000 кВт.

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ыг Баруун бүсийн ЦЭХС-д 230 кВ-ын хоёр хэлхээ ЦДАШ-аар Мянгат дэд станцтай, 35 кВ-ын нэг хэлхээ ЦДАШ-аар Эрдэнэбүрэнгийн 35 кВ-ын дэд станцтай холбоно. УЦС-ын үндсэн барилга доторх цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний ачаалал нэг дор төвлөрсөн байх бөгөөд 0.4 кВ-ын хүчдэлтэй байна. Үндсэн боомтын байгууламж станцын барилгаас 6.0 км хол учраас 0.4 кВ-ын шугам сүлжээний хамрах хүрээнээс гарсан байх тул 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам татаж 10/0.4 кВ-ын дэд станц барьж боомтын орчимд байх хэрэглэгчдийг хангана.

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт: Барилгын ажлын үе шатанд барилгын гүйцэтгэгч компаниуд нь ажилчдын тосгоны дулаан хангамжийг ЦЭХ ашиглан өөрсдийн сонгосон хувилбаруудаар шийдвэрлэх боломжтой.

УЦС-ын ашиглалтын үед бага оврын 30 ш, дунд оврын 8 ш, өндөр температурын 40 ш халаагуур, 4 ш агаар үлээгч, 15 ш агааржуулах салхилууртай, харин засварын цех нь ердийн ба механик агааржуулагчтай байна.

2.12 Хог хаягдал

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төслийг хэрэгжүүлэх үед гарах хог хаягдал нь төсөл хэрэгжих үе шатуудад харилцан адилгүй байна. Үүнд:

Бэлтгэл ажлын үе шат, барилгын ажлын үе шатанд гарах ахуйн болон хатуу хог хаягдлыг аймаг сумын ЗДТГ-тай гэрээ байгуулан хог хаягдлыг зайлуулна.

3 ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллүүдийн үнэлгээг оноот үнэлгээний аргаар тооцон доорх хүснэгтэд үзүүлээ (БОННУ тайланд тусгасанаар).

Хүснэгт 1. Төслийн байгаль орчны болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээ

Нөлөөллийн төрөл	Эрчим	Үргэлжлэх хугацаа	Хамрах хүрээ	Магадлал	Нийт оноо	Онооны эзлэх хувь %	Нөлөөллийн зэрэг
Байгалийн төрөл зүйлийн өөрчлөлт							
Гадаргын усны чанарын өөрчлөлт	2	2	1	2	7	28	Бага
Ургамлын бүтцийн өөрчлөлт	2	2	2	4	10	40	Дунд
Хөрсний элэгдэл, эвдрэл	6	3	3	4	16	64	Дунд
Геологийн тогтоцын өөрчлөлт	2	2	1	2	7	28	Бага
Зэрлэг ан амьтадын орон зайн өөрчлөлт	2	2	2	3	9	36	Дунд
Агаарын орчин /бохирдол/	4	2	2	3	11	44	Дунд
Газар доорх усны нөөц	2	2	1	2	7	28	Бага
Дундаж						38.3	Дунд
Байгалийн нөөцийн ашиглалт							
Газрын гадаргын нөөц	3	2	2	2	9	36	Дунд
Бэлчээр, хадлангийн байдал	4	2	2	3	11	44	Дунд
Эрдэс түүхий эдийн нөөц	2	2	1	2	7	28	Бага
Дундаж						34.7	Дунд
Байгаль орчны өөрчлөлт							
Ундны усны чанар, хэмжээ	2	2	1	2	7	28	Бага
Хөрсний бохирдол	3	2	2	3	10	40	Дунд
Дуу чимээ, шуугианы нөлөөлөл	4	2	2	3	11	44	Дунд
Байгалийн үзэсгэлэнт өнгө төрх өөрчлөгдөх	2	2	1	2	7	28	Бага
Ландшафтын хэлбэр өнгө төрх өөрчлөгдөх	2	2	1	2	7	28	Бага
Дэд бүтцийн хөгжилд нөлөөлөх	+						+
Үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх	+						+
Дундаж						33.6	Дунд
Байгалийн цогцолборт газар, түүх соёлын дурсгалт зүйл, соёлт давхаргад үзүүлэх нөлөөлөл							
Тусгай хамгаалалттай ба байгалийн цогцолборт газарт нөлөөлөх	2	2	1	2	7	28	Бага
Түүх соёлын дурсгалт зүйлд нөлөөлөх	4	2	2	4	12	48	Дунд
Археологи,палентлогийн олдворт нөлөөлөх	4	2	2	4	12	48	Дунд
Дундаж						41.3	Дунд
Бусад нөлөөлөл							
Авто тээвэрлэлтээс шалтгаалан хөрс эвдрэх	4	2	2	4	12	48	Дунд
Ахуйн хог хаягдлын цэгийн ариутгал муугаас эвгүй үнэр гарах, хортон шавьж үржих	2	2	1	2	7	28	Бага
Хүчтэй салхи, түймэр, газар хөдлөл, аянга зэрэг гамшиг гарах	2	2	1	3	8	32	Дунд
Дундаж						36.0	Дунд
Ерөнхий дундаж						36.78	Дунд

Тайлбар: нөлөөлөл байхгүй бол (0) тэмдэглэгээг хийсэн болно.
--

Байгалийн төрөл зүйлийн өөрчлөлт. Хүснэгт 1-ээс үзэхэд байгалийн төрөл зүйлүүдээс ЦДАШ-ын болон УЦС-ын барилга байгууламжуудын буурийн ухлага малталт, өрөмдлөг-тэсэлгээ, материал олборлох, чулуу бутлах, барилгын материалыг ачих болон буулгах, барилга барих явцад гарах хөрсний элэгдэл, эвдрэл, агаар орчны бохирдол, ургамлын бүтцийн өөрчлөлт, амьтны амьдрах орчны өөрчлөлтөд зэрэгт үзүүлэх нөлөөллийн зэрэг “дунд”, харин бусад төрөл зүйлд үзүүлэх нөлөөллийн зэрэг “бага” байна.

Байгалийн нөөцийн ашиглалт. УЦС-ын барилга байгууламжийн бэлтгэл ажлыг хангах болон барилгын ажлыг гүйцэтгэх, усан санг дүүргэх явцад газар, түүний дотор бэлчээрийн болон байгалийн хадлангийн нилээд талбай хамрах тул тэдгээрт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл “дунд” зэрэг, харин эрдэс түүхий эдийн нөөцөд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл “бага” байхаар гарч байна.

Байгаль орчны өөрчлөлт. Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын бэлтгэл болон барилга байгууламжуудыг барих үндсэн үйл ажиллагааны явцад материал, тоног төхөөрөмжийн тээвэрлэх болон барилгын бүтээн байгуулалтын үед гарах тоос, тоосонцроос бохирдох хөрсний бохирдол, агаар орчны физик бохирдол “дунд” зэрэг, харин усны чанар, хэмжээ, байгалийн үзэсгэлэнт төрх болон ландшафтын хэлбэр, өнгө төрхөд үзүүлэх нөлөөлөл “бага” байна.

Байгалийн цогцолборт газар, түүх соёлын дурсгалт зүйл, соёлт давхаргад үзүүлэх нөлөөлөл. Байгалийн цогцолборт газрын хилийн цэсийн гадна УЦС-ын барилга байгууламж, усан сан байгуулагдах учир түүнд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл “бага”, харин төсөл хэрэгжих талбарт олон тооны түүх соёлын дурсгалт зүйл, археологийн олдворууд илэрсэн тул тэдгээрт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл “дунд” зэрэг байхаар байна.

Бусад нөлөөлөл. Бэлтгэл болон барилгын ажлын үеийн авто тээвэрлэлтээс шалтгаалан хөрс эвдрэх болон байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл /хүчтэй салхи, түймэр газар хөдлөл, аянга/-ийн нөлөөллийн зэрэг “дунд”, ахуйн хог хаягдлын ариутгал муугаас эвгүй үнэр гарах, шавьж үржих нөлөөллийн зэрэг “бага” байхаар байна.

Төслийн болзошгүй нөлөөллийг Магадлан жагсаах буюу хяналтын хуудасны арга (Checklist)-аар тооцсон үнэлгээ

“Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц барих” төслийн байгаль орчны төлөв байдалд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийн хэлбэр, түүний үргэлжлэх хугацаа, давтагдалт болон эрчмийг тодруулах үнэлгээг дараах хүснэгтэд үзүүлэв. Нөлөөлөлд өртөх байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 6 үндсэн бүлэгт хуваан авч үзэв. Нөлөөллийн байдлыг үнэлэхдээ сөрөг (-), эерэг (+), нөлөөлөлгүй (0) гэсэн 3 үзүүлэлтээр шинжээчдийн саналыг харгалзан хүснэгтэд харуулсан болно.

4 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ

“Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц барих” төслийн хүрээнд байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээгээр гаргасан байгаль хамгаалах, гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, цаашлаад арилгахаар санал болгож буй арга хэмжээний талаархи зөвлөмжийг Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгөөр дамжуулан хэрэгжүүлж ажиллахаар тусгасан байна. Тухайн жилийн БОМТ-г хэрэгжүүлснээр дараах зорилтууд хангагдана. Үүнд:

- ✓ Байгаль орчны менежментийн арга хэмжээ, үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан ажиллагсдын үүрэг хариуцлагыг тогтоосон удирдлагын шатлалын дараалал бий болгох;
- ✓ Төсөл хэрэгжүүлэгч буюу гэрээт гүйцэтгэгч бүр байгаль орчныг хамгаалахтай холбоотой үүрэг хариуцлагаа мэдсэн байх ба үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай ур чадвар, бэлтгэл сургалт, мэргэжилтэй байх;
- ✓ Байгаль орчинд гарч болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, эрсдлийг аль болохоор бууруулж, байгаль орчныг хамгаалж, байгаль орчны тухайн төлөв байдлыг хэвийн хадгалах, сайжруулах зорилтыг хангах үүднээс тэнд хамаарах тодорхой тогтолцоо, дэг журам, ажлын зааварчилгааг тодорхойлох;
- ✓ Төслийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны шат дамжлага нэг бүрт мөрдөх технологийн журам зааврыг байгаль хамгаалах хууль тогтоомжийн холбогдох зүйл заалт, стандарт шаардлагад нийцүүлэх;
- ✓ Улс, аймаг, сумын холбогдох хяналтын байгууллага, улсын хяналтын байцаагч, баг хэсгийн иргэд, айл өрх, аж ахуйн нэгжүүд болон сонирхогч хүмүүстэй төслийн үйл ажиллагаа ба түүний онцлог, байгаль хамгааллын талаар зохих ёсоор зөвлөлдөж саналыг нь авч, хамтран ажиллах;
- ✓ Болзошгүй аваар ослын үед авах шуурхай арга хэмжээний төлөвлөгөөг цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу байнга шинэчлэх шаардлагатай бөгөөд энэ нь аливаа нэгэн ослын үед (зөрчлийн тухай мэдэгдэж тайлагнах, шалгах дэг журам, урьдчилан сэргийлэх ба залруулах арга хэмжээ) мөрдөгдөхөөр байх;
- ✓ УЦС-ын ашиглалт, түүний хэт ирээдүйн явц байдлаас байгаль орчинд учирч болох сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг нарийвчлан тусгасан байх;
- ✓ УЦС-ын хамгаалалтын бүсийн дэг журам, түүнд учирч болох газар ашиглалттай холбоотой бэрхшээлүүд, байгалийн нөхцөл, ойр орчмын суурьшил, бэлчээр ашиглалтаас төслийн үйл ажиллагаанд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, түүний хэтийн төлөв;
- ✓ Байгаль орчныг хамгаалах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний талаар төслийн холбогдох ажилтнуудад зориулсан зааварчилгаа өгөх;
- ✓ Байгаль орчны менежментийн талаар БОННУ-ээр дэвшүүлсэн зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг биелүүлэх;

Төслийн хэрэгжилтийн явцыг байгаль хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний зорилтуудтай нийцүүлэн явуулахын тулд түүнийг хариуцсан байгаль орчны хэлтэс ажиллуулах, жил бүр Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, холбогдох зөвлөмж аргачлал авч ажиллах, зарим цаг уурын харуулыг өргөтгөж өртөө болгох, шинээр цаг уурын, усны, чичирхийллийн харуулууд

байгуулах, мөн хөрс-ургамал, гүний усны хяналтын цэгүүд тогтоож тохижуулах, суурин болон хөдөлгөөнт багаж төхөөрөмжүүдээр тогтмол хэмжилт явуулж байх талаар төлөвлөгөөнд тусгасан болно. Иймд менежментийн төлөвлөгөө нь энэ төслийн салшгүй нэг хэсэг төдийгүй түүний хэвийн жигд ажиллагааг хангахад байгаль орчны талаар баримтлах бодлогын үндсэн чиглэл нь болж өгнө.

Тухайн жилийн БОМТ-г хэрэгжүүлэх зардлын төсөв: УЦС барих төслийн 2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд Түүх соёлын авран хамгаалах арга хэмжээний зардалд 5,416,320,000.0 төгрөг тусгагдсан байна.

БНХАУ-ын ЭКСИМ банктai байгуулах “Тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр” 2024 оны 11 сард хийгдсэн тул төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зүгээс тухайн жилийн БОМТ-ний дагуу барилгын ажлын талбайд хийгдэх төлөвлөгөөт арга хэмжээнүүдэд тогтмол хяналт тавин, аймаг орон нутагт тайлагнаж ажиллахаар төлөвлөж байна.

5 СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

5.1 Барилгын бүтээн байгуулалтын ажлын үе шатанд

Төслийн бүтээн байгуулалтын ажлын үе шатанд хэрэгжүүлэх шаардлагатай сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг дараах байдлаар төлөвлөв.

Хүснэгт 2. Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө (Барилгын бүтээн байгуулалтын ажлын үед)

ДД	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв ₮	Хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
Уур амьсгал							
1.	Цаг уур, уур амьсгалын	Цаг уурын автомат станцыг барьж байгуулах	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-III улирал	ОУСтандартад нийцсэн байх	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
2.	нөхцөл өөрчлөгдөх	Цаг агаарын үзүүлэлтүүдийг тогтмол хянах, дата бааз үүсгэх					
Агаарын чанар							
3.	Барилгын газар шорооны ажил, тээвэрлэлт, тэсэлгээний ажлын үед тоос ихээр дэгдэх	Цаг уурын хуурайшилттай үед тээврийн замын гадаргууг чийгшүүлж услах, шороон замаар явах хурдны хязгаар тогтоох;	Барилгажих талбайд ✓ Барилга үйлдвэрлэлийн ажлын талбай, дотоод замын сүлжээ, хөрс, хурдас чулуулгийн овоолгын ажлын талбай, барилгын материалын үйлдвэр, бетон завод ✓ Материалын үйлдвэрүүд ✓ Барилгын ажлын	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III-IV улирал	✓ БОНХАЖ-ын сайдын 2015.07.30-ны А/301 тоот тушаал, 13-р хавсралт	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
4.		Салхи ихтэй, дулааны улиралд тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээ авч байх;			III-IV улирал	✓ MNS 4585:2016 Агаар орчны чанарын үзүүлэлт.	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
5.		Тоос бууруулах дастлок болон бусад мананжуулагч тоног төхөөрөмжийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III-IV улирал	Ерөнхий шаардлага ✓ MNS 12.055-91.	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
6.		Хайрга чулуу бутлах, дамжуулах, буулгах зэрэг ажиллагааг битүүмж бүхий орчинд хийж гүйцэтгэх;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III-IV улирал	Ажлын байрны агаар дахь тоосны хэмжээг тодорхойлох	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
7.		Дуу шуугианыг эх үүсвэр дээр нь тусгаарлах, багасгах амьтны аймаг дайжихаас сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байх;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III-IV улирал	✓ MNS 4585:2016 Агаар орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах

ДД	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв ₮	Хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
8.		Материал тээвэрлэлтийн машинуудыг тэвшний бүтээлгээр хангаж, ашиглалтад нь хяналт тавих, хурдны хязгаар тогтоох;	талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал	✓ Агаарын тухай ✓ Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай ✓ MNS 4585:2016	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
9.		Зөөврийн ШТС-ын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
10.		Тэсэлгээг хийхдээ тоосны тархалтыг хязгаарлах, бууруулах технологийн (усан дэр ашиглах гэх мэт) арга хэмжээ авах;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III-IV улирал	✓ “Бензин хөдөлгүүртэй авто-машин-утааны найрлага дахь хорт бодисын ЗДХ ба хэмжих арга” MNS 5013:2009	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
11.	Тээврийн хэрэгсэл, машин механизмаа с хамаарч агаар орчин бохирдох	Шаардлагагүй тохиолдолд удаан хугацаагаар асаалттай орхихгүй байх;	Барилгажих талбайд Авто тээврийн хэрэгслүүд болон зам барилгын хүнд машин механизмууд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III-IV улирал	✓ “Дизель хөдөлгүүртэй автомашин-утааны тортогжилтын ЗДХ ба хэмжих арга” MNS 5014:2009	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
12.		Тээврийн хэрэгслийг жил бүр үзлэгт хамруулж, тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийлгэж байх;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III-IV улирал		
13.				Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III-IV улирал		
Нийт зардал				0.0 төгрөг			
Усан орчин							
14.	Усны горим, чанарыг хамгаалах	Барилгын ажил үргэлжлэх хугацаанд голын (онцгой ба энгийн) хамгаалалтын бүсийг тогтоож, хайсалж хамгаалах арга хэмжээ авах;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III улирал	✓ Усны тухай хууль, 22 дугаар зүйл: 22.1, 22.2, 22.3, 22.8, 22.9 28 дугаар зүйл: 28.1, 28.4, 28.6	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
15.		Унд ахуйн хэрэглээнд зориулж гүний худаг 2-ыг байгуулж, түвшин хэмжигчээр тоноглож, тоолууржуулах арга хэмжээ авах;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III улирал	Усны тухай хууль, 23 дүгээр зүйл: 23.1, 24 дүгээр зүйл: 24.2, 24.4	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
16.		Боомт баригдах хэсэг дээр лаг шаврын хуримтлал үүсэх, барилгын материалын хог хаягдлаар бохирдож	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III-IV улирал	✓ Монгол Улсын стандарт (MNS 4943:2015),	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах

ДД	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв ₮	Хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
		болзошгүй тул хамгаалах хашлага /silt fencing/ хийж хаягдлыг ус руу орохоос хамгаалах /2 хэсэг/;				✓ Дэлхийн банкны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх, ✓ Усны тухай хууль, ✓ Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль, ✓ MNS 5918:2008 Усан орчны чанарын үзүүлэлт	
17.		Ховд голын цутгал Хонгио, Улиастай, Шураг зэрэг голын усны горим, нөөцийн судалгааг даруй хийж төслийн бүтээн байгуулалтын ажлын үед Ховд голоос түр шороон суваг шуудуу, туннелиэр ус хуваарилах, дөхүүлэх байгууламжаар дамжуулан голын экосистемийг (голын урсац, загасны нүүдэл хөдөлгөөнийг хэвийн байлгах) тэтгэх урсацыг байнга тасрахгүйгээр хангах;	Барилгажих талбайд Усан санд ус хуримтлуулах үед	ТЭЗҮ-д тусгаснаар	III-IV улирал		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
18.		Түр урсацаар зөөвөрлөгдөн ирж хуримтлагдах хагшаас болоод хогийг цэвэрлэн зөөж зайлуулах ажлыг тогтмол хийж байх;	Барилгажих талбайд Ойролцоох хуурай сайр, жалга судгуудад	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III улирал		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
19.		Дээд боомтоос дээш Ховд голд цутгах гол, хуурай сайрууд зэрэг усны урсгал саатаж тогтоол ус үүсэж намагших, давсжиж болох бүх газруудад хөндлөн дренажийн байгууламжууд хийгдсэн байх;	Барилгажих талбайд	ТЭЗҮ-д тусгаснаар	III-IV улирал	✓ Усны тухай хууль: 30 дугаар зүйл: 30.4	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
20.	Шатахуун, түлшний бохирдол гадаргын усанд нөлөөлөх	Шатахуун түгээх станцыг зохих стандартын дагуу барьж байгуулах	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	I-II улиралд	✓ Усны тухай хууль ✓ "Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах

дд	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв ₮	Хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
						журам"	
21.	Болзошгүй үерээс хамгаалах	Барилгын материалын үйлдвэр, завод, үйлдвэрлэлийн ажлын талбай нь уулын бэл хормойд голын хөндийд байрлаж буй нөхцөлд үерийн хамгаалалтын түр байгууламж барих ажлыг урьдчилж авч хэрэгжүүлсэн байх;	Барилгажих талбайд Голын баруун талд 1, зүүн талд 2 газарт	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III улирал	Гамшгаас хамгаалах тухай хууль	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
22.	Бетон зуурмаг тээвэрлэгч машины холигчийн усаар ус бохирдох	Миксерийн наалдац бетон зуурмагийг угаах, хаягдлыг дахин боловсруулах байгууламжийг байгуулж ашиглах;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III-IV улирал тухай бүр		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
23.	Ахуйн гаралтай хатуу, шингэн хаягдлаар ус бохирдох	Ахуйн хатуу хаягдлыг ангилан хадгалах, ил задгай хаяхгүй байх, богино хугацаанд нутаг дэвсгэрээс Эрдэнэбүрэн сумын хогийн цэг рүү гэрээний дагуу зайлуулах;	Барилгажих талбайд	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгав.		✓ Хог хаягдлын тухай хууль ✓ Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5344 : 2011 ✓ Хог хаягдлын ангилан ялгалтын зааварчилгаа	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
24.		Хатуу хог хаягдлын цэгийн доорх газрыг бетондох, салхинд хийсэхгүй хайс хашаатай байх, хашааны гадуур үер уснаас хамгаалсан шуудуу татсан байх;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III улирал		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
25.		Ажиллагсдын тосгон бүрийн оврын цэвэрлэх байгууламж байгуулж ашиглах;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III улирал	✓ Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус.	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
26.		Цэвэрлэх байгууламжийн хэвийн ажиллагаанд байнга хяналт тавьж ажиллах;	Барилгажих талбайд	-	Тогтмол	Ерөнхий шаардлага. MNS 4943:2015	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
Нийт дүн				0.0 төгрөг			

ДД	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв ₮	Хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
Газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвч							
27.	Хөрсөн бүрхэвч элэгдэл, эвдрэлд орох	Суурь фундамент, суваг шуудуу, нүх ухмал ухах, барилгын материалын орд нээх, ашиглалт явуулах зэрэг газар шорооны их, бага бүх ажлын үед үржил шимт хөрсийг нимгэн зузаанаас хамааруулан 20-30 см-ийн зузаантай хуулж, нөхөн сэргээлтэд буцаан ашиглах зориулалтаар түр овоолж хадгалан шимт хөрсний нөөц үүсгэх;	Барилгажих талбайд 74.2 га, 37 га, түр зам, ажлын талбайд 10-15%	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III улирал	✓ Газрын тухай хууль. 50 дугаар зүйл: 50.1.1	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
28.		Салхи шуургатай үед ялзмаг хийсэхээс хамгаалж, түүний чиглэлийг харгалзан плёнкоор хучих арга хэмжээ авах;	Барилгажих талбайд Шимт хөрсний овоолго	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III улирал тухай бүр	✓ MNS 5916 : 2008. Байгаль орчин. Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт, хадгалалт;	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
29.		Боомтын суурь фундамент, суваг шуудуу, нүх цооног, тунель ухах зэрэг газар шорооны ажлын үед шимт хөрснөөс дооших ухаж гаргасан хурдас чулуулгийг тусад нь нөхөн сэргээлтийн дүүргэлт, тэгшлэлтэд ашиглахад зориулж түр овоолох;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III улирал тухай бүр	✓ MNS 5914 : 2008 Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томьёо, тодорхойлолт;	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
30.		Хөрсний нуралт гулсалтаас хамгаалах, хөрс бэхжүүлэх арга хэмжээ авсан байх;	Барилгажих талбайд Төслийн талбайн ойр орчмын суларсан, нуранги их, эмзэг, хэвгий налуу ихтэй юмуу үер усны угаагдлаар эвдэрсэн	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III улирал	✓ “Газрын тухай” хууль: Зүйл 50-1.1, 1.2; 55-2, 3,4, 5 ✓ “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хууль: Зүйл 25-2; ✓ Газрын хэвлийн тухай хууль. 41 дүгээр зүйл. 41.1. 41.2, 41.3, 41.4;	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах

ДД	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв ₮	Хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
			жалга судгуудад				
31.		Боомтын барилга байгууламжийн ажил явагдаж буй талбайн хэмжээнд үерийн хамгаалалтын далан болоод голын урсацыг зайлуулан урсгах түр шороон суваг шуудуу, туннель, үржил шимт хөрс ба хурдсын овоолго, бусад зориулалтаар түр ухагдсан газрууд зэргийг оролцуулан талбайн хэмжээнд хөрсний элэгдлийн хяналт судалгааг идэвхтэй явуулж, тухай бүр нь засаж бэхжүүлэх, хамгаалалтын арга хэмжээнүүд авч байх;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	III-IV улирал тухай бүр		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
32.		Техник тоног төхөөрөмж суурилуулж угсрах, тулгуур бэхэлгээ гүйцэтгэх зэрэг хөрс эвдрэх, бохирдох өндөр эрсдэл бүхий ажлыг хийж гүйцэтгэхэд зориулж урьдчилж бэлтгэсэн хүрэлцэхүйц хэмжээний хамгаалалтын болоод тусгаарлагч материалын нөөцтэй байх;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал тухай бүр	Барилгын зураг төсөл зохиох, барилга угсралтын ажилд мөрдөх барилгын норм ба дүрэм	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
33.		Үйлдвэр, завод, авто зогсоол, засварын газрууд, бодис материал, хуучин сэлбэгүүдийн ил агуулахууд гэх зэрэг хөрс бохирдуулах эрсдэлтэй түр ашиглалттай ажлын талбайнуудад хатууруулах уусмал цацаж тодорхой үе үүсгэх, хайрга, битуман хучилт хийх юмуу полимер материалан дэвсгэр дэвсэж хамгаалах, цаашид үргэлжлүүлэн суурин ашиглах нөхцөлд хатуу хучилт хийж сайжруулах арга хэмжээ авсан байх;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал	✓ Газрын тухай хуул,: 50 дугаар зүйл: 50.1.1 ✓ 51 дүгээр зүйл: 51.2, 51.3	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах

ДД	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв ₮	Хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
34.		Үйлдвэрлэлийн ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж, талбайг цууралт, эвдрэл гэмтэлгүй байлгах засвар арчлалт, сайжруулалт, гарсан бохирдлыг цэвэрлэх ажлыг тухай бүр нь хийж байх;	Барилгажих талбайд Барилгын ба бетон завод, чулууны үйлдвэр	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал тухай бүр		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
35.	Машин механизмын тос тосолгооны материалаа	Хөрс бохирдсон тохиолдолд хөрсийг биобэлдмэл ашиглах буюу ашигтай бичил биетээр үйлчлүүлэх аргад суурилсан технологиор саармагжуулах цэвэршүүлэх арга хэмжээ авах;	Барилгажих талбайд Бохирдсон талбайн хэмжээгээр	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал тухай бүр	✓ MNS 5850 : 2008. Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн ЗДХ	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
36.	р хөрсөн бүрхэвч бохирдох	Нефтийн бүтээгдэхүүнээр бохирдсон хөрсийг цэвэрлэх бодис материалын нөөцтэй байх;	Барилгажих талбайд Цэвэрлэх бодис	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал тухай бүр	✓ Хөрсийг органик химийн бохирдлоос хамгаалах	
Нийт дүн				0.0 төгрөг			
Ургамалан нөмрөг							
37.	Бургас зонхилсон шугуй нөлөөлөлд өртөх	Мод үржүүлэг болон нөхөн сэргээлтэд зориулан бэлдцийг хангалттай хэмжээгээр нөөцлөх;	Нуур үүсэх талбайд 884 га талбайд	-	IV улирал	Мод тарих гарын авлага, UN-REDD, 2017	✓Аймаг болон орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй “Мод үржүүлгийн газар”-т үрсэлгээний нөөц бэлтгэх ажлыг хамтран зохион байгуулах; ✓Ахуйн хэрэгцээнд /түлш/ ашиглах боломжтой хэсгийг орон нутагт тэнцүү хуваарилах;

ДД	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв ₮	Хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
							Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах;
38.	Хөрсөн бүрхэвч элэгдэл, эвдрэлд орох	Бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны нэгж бүр дээр тавих байгаль орчны хяналтыг тогтмолжуулж, гарч буй зөрчлийг тухай бүр нь арилгаж, зам талбайг эвдрэл гэмтэлгүй, хоггүй хэвийн ашиглалттай байлгахад анхаарч ажиллах;	Төсөл хэрэгжих нийт талбайд	-	I-IV улирал тухай бүр	Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль	Газрын тухай хууль: Зүйл 50-1.1,1.2; 55-2, 3,4,5
39.	Ургамалан нөмрөгийг талхагдлаас хамгаалах	Барилгажих талбайн орчимд мод үржүүлгийн газрыг бий болгох;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-III улирал	✓ Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 2 ба 3 дугаар зүйл	✓Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
40.		Түр ашиглагдах гадаад, ажлын бүсийн дотоод замын сүлжээний өргөсөж, эвдэрч болзошгүй тойруу, нугачаа их, гуу жалга сайр дайрч өнгөрөх өргөсөж болзошгүй хэсгүүдэд жолооч операторуудад зориулж (заах, мэдээллэх, хурд хязгаарлах, анхааруулах, хориглох, дараалал тогтоох) замын тэмдгүүдийг стандартын дагуу хийж байрлуулах, бүрэн бүтэн байлгах арга хэмжээ авч байх;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-III улирал тухай бүр	✓ "Авто замын тэмдэг" MNS 4597:2013	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
41.		Барилга байгууламжийн ажил, материалын үйлдвэрийн талбай, замын сүлжээний ашиглалтад тавих хяналтыг тогтмолжуулж, талхлагдлаас хамгаалах, хөрс бэхжүүлэх арга хэмжээ авч байх /зам талбайн өргөссөн, салаалсан		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал тухай бүр		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах

ДД	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв ₮	Хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
		хэсгүүдэд хязгаарлалтууд хийж хаах, тэмдэгжүүлэх, ургамалжуулах/;					
42.		Барилга байгууламжийн ажлыг эрчмээс хамааран үйлдвэрлэлийн ажлын талбайг өргөсгөх, замын шинэ сүлжээ байгуулах ажилтай зэрэгцүүлэн талбайн хэсгийг хязгаарлах, ургамалд нөлөөлөлтэй гэж үзсэн газруудад хаалт хашлага хийж хамгаалах арга хэмжээ авах/;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал тухай бүр		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
43.		Тээврийн зам, талбайн хязгаарлалтын бүсийн гадна түүний ойр хавиар ургамлан нөмрөг байгалийн аясаар ургах хэвийн нөхцөл бүрдүүлэх арга хэмжээ авах /шаардлагатай газруудад хайс хийх, хөдөлгөөн хааж тэмдэгжүүлэх/	Барилгажих талбайд 2.25 га	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал тухай бүр		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
44.		Гол дагуу Шижигтийн хавцлын боргионоос дээш тохойролт хүртэл тойруугаар 1.3км орчим уртад голын эрэг дагуу баруун тийш 70м орчимд намгархаг газарт ургасан зэгст бүлгэмдлийг хашаалж хамгаалах /Энэ нь загасны үржил хөгжил, түрсээ шахах үндсэн орчин, голын энэ хэсгийн чийг усыг тогтоон барих, хадгалах ач холбогдолтой/;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II улирал	✓ Амьтны тухай хууль 6 дугаар зүйл, 6.1.3, 6.1.7, 6.1.9	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
Нийт үнэ				0.0 төгрөг			
Амьтны аймаг							
45.	Загасны үржил хөгжил, нүүдэл шилжих	Шижигтийн хавцал дахь чийг ус арвин намгархаг газар, түүнээс доошх боргиот хэсэгт усны хамгаалалтын бүс байгуулах;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II улирал		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах

ДД	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөө	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв ₮	Хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
	хөдөлгөөн хумигдах						
46.	Амьтан унах, орох, гарах боломжгүй болох	Газар шорооны ажлаар түр ухагдсан ухмал, суваг шуудуу зэрэг газруудад тухайн ажлыг дуустал зөөврийн түр хамгаалалт хийх;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал тухай бүр	✓ Амьтны тухай хууль 6 дугаар зүйл, 6.1.3, 6.1.7, 6.1.9	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
47.	Хөхтөн амьтад болон загас, мөлхөгчид, усны хөвөгч ба ёроолын амьтдын хувьд нүүдэллэн шилжих талбай нь хуваагдаж буурах	Голын усанд цемент, шохой, үнс, шатах тослох материал зэрэг усан орчин, ойр орчмын хөрс, ургамалд хортой нөлөө үзүүлэхүйц бодис, материалаар бохирдуулахгүй байх, ажил гүйцэтгэж буй хэсэгт тусгаарлах хамгаалалтын болоод технологийн арга хэмжээг урьдчилж төлөвлөсний дагуу авч хэрэгжүүлэх;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	II-IV улирал тухай бүр	✓ 6 дугаар зүйл: 6.1.3, 6.1.9 Усны биологийн орчныг хамгаалах,	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
48.		Амьтдын талаар бүртгэл мониторинг хөтөлж, улмаар амьтад тааралдаж болзошгүй автозам дагуу болон гол ус, шугуй, уул хад, агуй, нүх оромж гэх зэрэг газруудад анхааруулсан тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулах;	Барилгажих талбай болон усан сангийн талбайн хэмжээгээр	-	II-IV улирал тухай бүр	✓ Амьтны тухай хууль, 37 ба 39 дүгээр зүйл. Хохирол нөхөн төлүүлэх тухай, торгууль	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
Барилгажилтын үеийн нийт арга хэмжээний мөнгөн зардал				0.0 төгрөг			

6 ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төслийн үйл ажиллагааны хувьд 2024 онд БНХАУ-ын ЭКСИМ банктай байгуулах “Тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр”-тэй холбогдуулан төслийн барилгын ажил эхлээгүй, хөрс хуулалт хийгдээгүй тул тус онд төлөвлөсөн УЦС-ын үндсэн барилга байгууламжид өртөх 37 га, түр байгууламжид өртөх 74.2 га, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолтын явцад нөхөн сэргээлт хийх арга хэмжээг 2025 онд дахин төлөвлөлөө.

Хүснэгт 3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө

Нөхөн сэргээлтийн зорилт	Нөхөн сэргээх арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хүрээ	Нэгжийн өртөг, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах стандарт аргачлал	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
Барилгажих талбайн шимт хөрсийг хамгаалах	Бутлаг ургамал, нэг наст, буурцагт ургамлыг тариалах. Санал болгож буй нэг наст ургамал. Арвай, хошуу будаа, вандуй, хошоон, бог будаа, хөх тариа, судаан өвс, наран цэцэг, эрдэнэ шиш, согоовор, зүлэг	Шимт хөрсний овоолгоос ялзмагийн алдралыг багасгахын тулд ургамалжуулалтын ажлыг гүйцэтгэх. 1кг Арвайн үнэ-30,000төг 1кг Хошоон үнэ-20,000төг 1кг Судаан үнэ- 15,000төг	1га талбайн үрийн норм. Арвай 20кг Хошоон 20кг Судаан 30кг	II-IV улирал тухай бүр	Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс хуулалт, хадгалалт MNS 5916:2008 Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах, Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5918:2008	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
	Шимт хөрсний овоолгыг бордох	Био ялзмаг 1 га-д 500 кг 0,2 га-д 100 кг 1 кг үнэ: 5000 төг Гумины бордоо 1 га-д 3 л 1 л үнэ: 10000 мян.төг	Био ялзмаг 100 кг Гумины бордоо Өдөрт 600 мл шингэн бордоо. Сард 15 удаа бордох.	II-IV улирал тухай бүр		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
	Хяналтын мониторинг	Байгаль орчны хяналт	-	II-IV улирал тухай бүр		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
Нийт арга хэмжээний зардал				0.0 төгрөг		

7 НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төслийн нөлөөлөлд өртөж буй Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур, Увс аймгийн Өмнөговь сумын айл өрхийн эд хөрөнгийн нөхөн олговор, нэг удаагийн нөхөн төлбөрийг бүрэн 2024 онд бүрэн олгож дууссан. 2025 онд айл өрх, иргэдийг нуур үүсэх талбайгаас нүүлгэх ажлыг орон нутагтай хамтран зохион байгуулж ажиллана.

8 ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Түүх соёлын өвийг хамгаалах ажлын хүрээнд 2025 онд нуур үүсэх талбай дахь Археологийн биет олдворыг авран хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахаар төлөвлөлөө.

Хүснэгт 4. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө

№	Нөлөөлөлд өртөх	Хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хүрээ	Тоо хэмжээ	Нийт зардал	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
Илэрсэн түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг малтах авран хамгаалах арга хэмжээ							
1.	Соёлын биет өв	Нүүлгэн шилжүүлэх, малтлага судалгаа	Төслийн хүрээнд 9871.1 га талбайд малтлага судалгааны ажлыг хийх	-	5,416,320,000.0	II-III улирал	1.ШУА-ийн харьяа Түүх, угсаатан зүйн хүрээлэнгээр гүйцэтгүүлэх 2.Хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Нийт арга хэмжээний зардал					5,416,320,000.0 төгрөг		

9 ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 5. Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө

дд	Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Зардлын төсөв	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
1.	Барилгын ажлын үед гарч болзошгүй ХХАА-ны зөрчил	Ажиллагсдыг ХХАА-ны хувцас хэрэгсэл, хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангах, хэрэглүүлж хэвшүүлэх; Төслийн бүх ажилчдад өдөр бүр ажил эхлэхээс өмнө ХХАА-ны зааварчилгаа өгч гарын үсэг зуруулах, ХХАА-ны зааварчилгаанд хамрагдаагүй ажилчдыг тухайн өдөрт ажиллахыг хориглох;	Барилгажих талбайд Бүх ажилчид	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	✓ Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, 1999 он ✓ Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, ✓ Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль ✓ Ажлын байрны зааварчилгаа өгөх аргачилсан зөвлөмж БД 12-	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
2.				Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах

ДД	Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Зардлын төсөв	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
3.		ХХАА-ны зааварчилгаа, ажиллагсдад аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам, аливаа болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах, ослын үед өөртөө болон бусдад эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх талаар танхимын ба үзүүлэх сургалтуудыг төрөлжүүлэн зохион байгуулах;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	106-14 ✓ Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Цахилгааны аюулгүй байдал. Хамгаалах газардуулга, тэлэлт MNS 5146:2002 ✓ Засгийн газрын 2006 оны 149-р тогтоолын 2-р хавсралт, Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
4.		Бүх техник тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавих, газардуулга хийх;	Барилгажих талбайд Техник тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслүүд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
5.		Ажилчдад анхны тусламж үзүүлэх арга зааврыг эзэмшүүлэх, анхан шатны тусламжийн эм, тариа, багажийг ажлын талбаруудын аль тохиромжтой газар байрлуулах;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
6.		Том хэмжээний болзошгүй аваар ослын үед хэрэглэгдэх хөөс, абсорбент, хамгаалах маск, шүүлтүүр, хүчилтөрөгчтэй баллон зэргийг хүрэлцэхүйц хэмжээгээр нөөцлөх;	Барилгажих талбайд Зохион байгуулах	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
7.		Болзошгүй ослын улмаас гадаргын усанд нефтийн бүтээгдэхүүн алдагдвал усанд алдагдсан нефтийн хэмжээ, үүсэх хальсны хэмжээг тогтоож, түүнд шаардагдах деэмульгаторыг цацан, хамж авах		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
8.		Өдөр бүр ажил эхлэхийн өмнө тээврийн хэрэгсэл, машин механизмын бүрэн бүтэн байдалд үзлэг хяналт явуулж, тээвэрлэлт хийх, зам талбайд ажиллах зөвшөөрөл өгч байх;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
9.	Галын аюул	Ажилчдын тосгоны барилга байгууламжийг гал унтраах багаж хэрэгслээр холбогдох норм, дүрэм журмыг баримтлан хангах,	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	✓ Хөдөлмөр хамгаалал стандартын систем. Галын	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах

дд	Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Зардлын төсөв	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
	10. 11.	шаардлагатай газруудад байрлуулах (гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл, галын хор, элс, ус нөөцлөх сав гэх мэт);	80 м2 ихгүй талбайд тус бүр 1 ш галын хор байршуулах		аюулгүй байдал ерөнхий шаардлага MNS 4244:94 ✓ Гал гарах үед анхааруулгын самбар, объектоос гарах схем зураглал, галын хорын нэгж талбайд ноогдох стандарт MNS 5566:2005	
		Галын болон тэсрэлтийн аюултай орчинд галын аюулгүйн дүрэм хангасан цахилгаан төхөөрөмжүүдийг суурилуулж ашиглах;	-	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	Эрсдэлээс хамгаалах дүрэм	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
		Ажилчдыг галын хор болон бусад хэрэгслийг ашиглаж сургах, дадлага эзэмшүүлэх зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах;	Барилгажих талбайд Зохион байгуулах	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
12.	Байгалийн гамшигт үзэгдэл	Цаг агаарын аюултай үзэгдлийн сэрэмжлүүлэг мэдээллийг үндэслэн урьдчилсан арга хэмжээ авах;	Барилгажих талбайд Зохион байгуулах, төлөвлөх	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
13.		Аянга зайлуулагчийг 1340-1350 м-ийн өндөрлөгт байрлуулах;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	Аянга зайлуулагчийг суурилуулах стандарт, норм дүрэм	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
14.		Хөрсний гулсалт, нуралт гарч болзошгүй газруудад түүнээс хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
15.		Түр барилга байгууламжуудыг үерт автахас хамгаалах зорилгоор далан болон шуудуугаар хамгаалалтын түр байгууламжийг байгуулах;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
Нийт арга хэмжээний зардал				0.0 төгрөг		

10 ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 6. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

ДД	Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
Бэлтгэл үе шатанд						
1.	Ахуйн ХХ	Сум орон нутагтай гэрээ байгуулах	Барилгажих талбайд Усанд автах талбайг бэлтгэх, чөлөөлөх үед	Бэлтгэл ажлын үеийн зардалд тусгасан	✓ Хог хаягдлын тухай хууль ✓ Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5344 : 2011	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
2.		Орон нутгийн зөвшөөрөл бүхий хогийн цэгт тээвэрлэж зайлуулах;				
3.		Хог хаягдлыг цэвэрлэсний дараа ариутгаж халдваргүйжүүлэх;				
4.	Барилгын ХХ	Дарж булан тэгшилж нягтруулах;				
Барилгын ажлын үе шатанд						
5.	Ахуйн хатуу ХХ	Бүх төрлийн ахуйн хатуу хог хаягдлыг үүсэх шатанд нь ангилан ялгах, ангилан ялгах хаягдлын савнуудыг төрөлжүүлэн байршуулах, тусгаарлах хайстай байх;	Барилгажих талбайд Бохир ус цэвэрлэх байгууламжид цэвэрлэн байгальд хаях	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	✓ Хог хаягдлын тухай хууль ✓ Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5344 : 2011 ✓ Хог хаягдлын ангилан ялгалтын зааварчилгаа	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
6.		Хогийг тухайн савны багтаамжийн 2/3-оос ихгүй дүүрэх үед орон нутгаас зөвшөөрөл бүхий нэгдсэн хогийн цэгт тээвэрлэн нийлүүлэх /сард 4 удаа/;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
7.		Ахуйн бохирдлыг шийдвэрлэх ажиллах хүчний хэрэглээг хангахуйц цэвэрлэх байгууламжыг үйл ажиллагаанд ашиглах, цэвэрлэх байгууламжийн тогтмол хянаж байх;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага. MNS 4943:2015	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
8.	Ахуйн шингэн ХХ	Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний чанарт тогтоосон хугацаанд мэргэжлийн байгууллагатай хамтран (ЦБ-ийн оролт дээр цэвэрлэх гэж буй бохир ус, түүний гаралтаас байгалийн санд нийлүүлж буй цэвэрлэгдсэн ахуйн бохир усны дээж авч чанарыг хянах) цэвэрлэгдсэн бохир усны стандартад заасан үзүүлэлтээр хяналт явуулж байх;	Нуур үүсэх талбайд Бохир ус цэвэрлэх байгууламж	ОХШХ-т тусгав.	Хог хаягдлын тухай хууль	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
9.		ЦБ-ийн технологийн дамжлагуудад хийх үзлэг үйлчилгээ, засварыг тогтмолжуулж, хэвийн ажиллаж байх нөхцөлийг ханган ажиллах;	Барилгажих талбайд Бохир ус цэвэрлэх байгууламж	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах

дд	Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Зардлын төсөв	Баримтлах эрхзүйн баримт бичиг	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
10.		ЦБ, шингэн хаягдлын цооног, хогийн цэг, түүний орчимд мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх ариутгал цэвэрлэгээг тогтмолжуулж, ялаа шавьж үржихээс хамгаалах;		Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	✓ Хог хаягдлын тухай хууль ✓ Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5344 : 2011 ✓ Хог хаягдлын ангилан ялгалтын зааварчилгаа	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
11.	Барилгын ХХ	Барилгын ажлын талбай, ажлын ба туслах зам, чулууны үйлдвэр, бетон завод, ган ба модны үйлдвэр, материалын ил агуулахууд, түр суурин, тэдгээрийн нөлөөллийн бүсэд хог хаягдал цэвэрлэж зайлуулах ажлыг тогтмол явуулах;	Барилгын талбайд /сард 4 удаа нэг ээлжинд 2 машин/;	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд	✓ Хог хаягдлын тухай хууль ✓ БХБСайдын 2020 оны 48 дугаар тушаал, “Барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”	Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
12.		Асгарсан шатах тослох материал ба барилга үйлдвэрлэлийн хатуу шингэн бодис материалыг цэвэрлэх материал, шингээгчийн нөөцтэй байх;	Барилгажих талбайд	Гүйцэтгэгчийн төлөвлөлтийн зардалд		Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
Нийт арга хэмжээний зардал				0.0 төгрөг		

11 ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж, гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтран орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт заагдсан хуваарийн дагуу тайланг боловсруулж, хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллана.

Хүснэгт 7. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хугацаа ба давтамж	Хяналт шинжилгээний ажлын хэмжээ	Нийт зардал	Баримтлах стандарт, арга, аргачлал	Төслийн нэгжийн гүйцэтгэх ажил
Агаарын чанар, мониторинг						

Агаарын чанарын шинжилгээ (SO2, NO2, PM10, PM2.5); Дуу чимээ хэмжих;	Дээд ба доод боомтын хажууд, станцын барилгын дэргэд, ашиглалт явуулж буй карьерт; Барилгажилтын талбайд	III улиралд	ОХШХ-ийн агаарын чанарын тайланг бэлтгэх /7 цэгээс/	-	Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2016 Шуугианы норм. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага. MNS 5002:2000	1.Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж тайланг хүлээн авах 2.Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
Хөрсний үржил шимийн үзүүлэлтийн мониторинг						
Хөрсний үржил шимийг тодорхойлох;	- Хөрсний фон цэг (эрүүл газрын хөрснөөс); - Карьеруудын талбайн хөрснөөс (хөндөхөөс өмнө);	III улиралд	ОХШХ-ийн хөрсний мониторингийн тайланг бэлтгэх /10 цэгээс/	-	✓Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, MNS 5850:2008 ✓Хөрс. Шинжилгээний дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлага. MNS 3998:1990 ✓Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, MNS 5850:2008.	1.Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж тайланг хүлээн авах 2.Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
Бичил биетний тоо (1гр-д) Колититр Cl.perferringens титр;	Малчдын өвөлжөө хаваржааны талбайгаас Багийн төв байршиж байсан талбайгаас	III улиралд				
Ургамлын мониторинг						
Ургамлын төрөл зүйлийг тодорхойлох, хяналтын судалгаа;	Төслийн талбайд	III улиралд	Ургамлын мониторингийн тайланг бэлтгэх	-		1.Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж тайланг хүлээн авах 2.Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
Гадаргын усны бохирдлын хэмжилт						
Гадаргын усны бохирдолтын үзүүлэлтүүд;	Ховд голын уснаас (Дээд боомтын дээрээс, Доод боомтын доороос);	Жилд 1 удаа	ОХШХ-ийн усны чанарын мониторингийн тайланг бэлтгэх /10 цэгээс 14 дээж/	-	✓MNS ISO 5667-4:2001 ✓MNS 4586:1998	1.Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж тайланг хүлээн авах 2.Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
Бохир усны шинжилгээ (pH, жинлэгдэх бодис, XXX, БХХ5, фенол, нийт азот, нийт фосфор сульфид, нийт цианид);	Бохир ус цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэгдээд гарч буй уснаас;	Улиралд 1 удаа			✓MNS ISO 5667- 10:2001 ✓MNS 4943:2015	
Усны ерөнхий шинжилгээ	Унд ахуйн зориулалттай 2 худаг	Улиралд 1 удаа			✓MNS 0900:2018	
Амьтны аймаг						

Амьтдын шилжилт хөдөлгөөний ажиглалт, судалгаа явуулах;	Нийт талбайн хэмжээгээр	Жилд 1 удаа	ОХШХ-ийн амьтны аймгийн мониторингийн тайланг бэлтгэх	-	-	1.Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж тайланг хүлээн авах 2.Хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах
Нийт ОХШХ-т тусгагдсан зардал				0.0 төгрөг		

12 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Үйл ажиллагааны алба зохион байгуулна.

Хүснэгт 8. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

ДД	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Зардал, төгрөг	Баримтлах стандарт, арга, аргачлал, норм дүрэм, тушаал шийдвэр	Хариуцах албан тушаалтан
1.	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох зөвшөөрлийн орон нутгаас авах;	Барилгын ажил эхлэхээс өмнө, тухай бүр	0.0	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль, 13, 18 дугаар зүйл	ТХН, Үйл ажиллагааны алба
2.	Тухайн жилийн барилга угсралтын ажлын төлөвлөгөөнд үндэслэн зарцуулсан тэсрэх бодисын ашиглалтын дүн мэдээг гарган БОАЖЯ-нд хүргүүлж байх;	Барилгын ажлын шатанд жил бүр		Химийн бодисын ашиглалт, зарцуулалтын бүртгэл хөтлөх аргачилсан заавар	Гүйцэтгэгч
3.	ТЖБОМТ-г өмнөх оны 12-р сард багтаан БОАЖЯ-аар батлуулж, уг ТЖБОМТ-нд тусгасан төлөвлөгөөт ажлуудаа тухайн ондоо хийж гүйцэтгэсний дараа биелэлтийн тайланг боловсруулан 10-р сард багтаан орон нутгаас томилогдсон ажлын хэсгээр холбогдох байгууллагад тогтоосон хугацаанд нь 3 аймгаар дүгнүүлэх ажлыг зохион байгуулах хүрээнд бэлтгэл ажлыг хангах;	III улирал		Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам	ТХН, Үйл ажиллагааны алба
Нийт зардал			0.0 төгрөг		

13 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ХУВААРЬ

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Үйл ажиллагааны алба БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч талуудад тайлагнаж, хуваарийн дагуу хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, олон нийтийн оролцоог хангаж ажиллана.

Хүснэгт 9. БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч талуудад тайлагнах хэлэлцүүлэх хуваарь

дд	БОМТ-ний хэрэгжилтийг тайлагнахад оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Зардлын төсөв ₮	Зохион байгуулах хугацааны тов	Хариуцах нэгж	Зохион байгуулах газар
1.	Ховд, Увс, Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчны газар	ТЖБОМТ-ний хэрэгжилтийн тайланг ИНХ-д танилцуулах, Байгаль орчны мэдээллийн санд байршуулж дүгнүүлэх;	Төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлуудын мэдээлэл	-	Жил бүрийн 11-р сарын 01-ний дотор	ТХН	Аймаг, орон нутаг
2.		Ажлын хэсгийн дүгнэлт бүхий ТЖБОМТ-ний хэрэгжилтийн тайланг цахимаар илгээх;		-	Жил бүрийн 12-р сард		УБ хот, БОАЖЯ-ны байр
3.	БОУАӨЯ	Тэсрэх бодисын нийлүүлэлт, зарцуулалтын тайлан хүргүүлэх;	Нийлүүлсэн тэсрэх бодисын хэмжээ, зарцуулалт, үлдэгдлийн хэмжээ		Барилгын үе шатанд жил бүрийн 1-р сарын 25-ны дотор		БОАЖЯ-ны байр
Нийт				0.0 төгрөг			

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нийт зардал

Төслийн барилгын ажил 2024 онд эхлээгүй тул төлөвлөгдсөн арга хэмжээг 2025 оны тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд нэгдсэн байдлаар боловсруулсан болно.

Дд	Төлөвлөгөө	Нийт зардал, төгрөг
1	Бэлтгэл үе шатанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал (Барилгажилт эхлэхийн өмнө, нуур үүсгэхээс өмнө);	0.0
2	Барилгажилтын үе шатанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал (УЦС-ын барилга барих үед);	0.0
3	Орчны тохижилт, нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээний зардал;	0.0
4	Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө;	0.0
5	Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө;	3,416,320,000.0
6	Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө (Барилгажилтын талбайд);	0.0
7	Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө (Төслийн талбайд);	0.0
8	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр (Төслийн талбайд хяналт шинжилгээ явуулах дүгнэх, Аймгийн БОГаараар дүгнүүлэх);	0.0
9	БОМТ-г хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээний төлөвлөгөө;	0.0
10	БОМТ, түүний хэрэгжилтийг оролцогч талуудад тайлагнах хэлэлцүүлэх хуваарь;	0.0
Нийт дүн		3,416,320,000.0



БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ
БАЯННУУР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
83030 Цул-Улаан, Баяннуур сум, Баян-Өлгий аймаг,
Утас: 5042-7150

2025.07.28 № 1/208
таныг _____ -ны № _____ -т

БАЙГАЛЬ ОРЧИН УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЯАМАНД

Эрчим хүчний яам "Эрдэнэбүрэн усан цахилгаан станц" төслийн 2025 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/94 дүгээр албан бичгийн дагуу Эрдэнэбүрэн усан цахилгаан станц барих төслийн хүрээнд тухайн жилийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлуулахад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг тухайн сумын Засаг даргын дэргэдэх байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн тусгай дансанд төвлөрүүлэх шаардлагагүй гэж үзэж байна.

Хувийг Эрчим хүчний яам Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц төслийн нэгжид.

ДАРГА (Н.МЭНДИГҮЛЬ)



УВС АЙМАГ
ӨМНӨГОВЬ СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА

Намир, Өмнөговь сум, Увс аймаг, 85210
Цахим шуудан: admin@umngovi.uv.gov.mn
Цахим хуудас: uv.gov.mn/umngovisum

2025. 08.11 № 104

танай _____ -ны № _____ -т

БАЙГАЛЬ ОРЧИН УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЯАМАНД

“Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц барих” төслийн хүрээнд тухайн жилийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлуулахад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг тухайн сумын Засаг даргын дэргэдэх байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн тусгай дансанд төвлөрүүлэх шаардлагагүй.

Хувийг: Эрчим хүчний яам Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц төслийн нэгжид.

ДАРГА  Ш.ЛХАГВАСҮРЭН
