

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН
"ШИРЭЭ-УУЛ-2" ГӨЛТГӨНИЙН ОРД ТӨСЛИЙН 2024 ОНЫ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

/АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР: 5547938/
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: МУ-022689

ХЯНАСАН:

БОАЖЯ-НЫ ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН,
БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН
ГАЗРЫН АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ

Ц. ЖАРГАЛНЭМЭХ

БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАСАН:

“ТҮМЭН ТАЛ” ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ

Ч. АЛТАНХУЯГ

“ТҮМЭН ТАЛ” ХХК-ИЙН БХ-ИЙН АЖИЛТАН

А. ЭНХЖИН

2024 он

АГУУЛГА:

1. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА.....
 - 1.1 Үйл ажиллагаа явагдаж буй газрын засаг, захиргааны харьяалал
 - 1.2 Ордын геологийн тогтоц
 - 1.3 2024 оны уулын ажлын гүйцэтгэлийн товч танилцуулга
2. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.....
 - 2.1 Уур амьсгал
 - 2.2 Физик, газар-зүй
 - 2.3 Ус зүй ба гидрогеологийн нөхцөл
 - 2.4 Хөрс
 - 2.5 Ургамлан бүрхэвч
 - 2.6 Нийгэм, эдийн засаг
3. 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАНГИЙН ГОЛ ЗОРИЛТ.....
4. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....
 - 5.1 Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөний биелэлт
 - 5.2 Гадаргын ба газрын доорхи усны нөөцөд нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөний биелэлт
 - 5.3 Хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
6. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....
 - 6.1 Техникийн нөхөн сэргээлт
 - 6.2 “Тербум мод” үндэсний хөдөлгөөн
- 7.НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ.....
8. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....
9. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....
- 10.ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ.....
 - 11.1 Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ
 - 11.2 Усны хяналт шинжилгээ
 - 11.3 Хөрсний хяналт шинжилгээ

11. 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ.....

12. 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ
НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТ.....

13. ХАВСРАЛТ

1 БОХ-3 маягт: Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн
сэргээлтийн 2024 оны мэдээ

2 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн хээрийн хэмжилт,
авсан дээжнүүдийн лабораторийн шинжилгээний үр дүн

3 Аюултай хог хаягдлыг устгах, хадгалах арга хэмжээг гүйцэтгэсэн гэрэл зураг

4 Хуваарьт байгаль орчны аудитын дүгнэлт

5 Хайгуулын ажил, ТЭЗҮ-г хүлээн авсан тушаал, тэмдэглэл

6 Байгаль орчны барьцаа хөрөнгө байршуулсан баримт 2024 он

7 Усны төлбөр төлсөн баримт 2024 он

1. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Төслийн нэр: “Ширээ-Уул-2” гөлтгөний ордыг ашиглах төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгч: “Түмэн Тал” ХХК /РД: 5547938/

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, 5-р хороолол Роял Тауэр 907 тоот

Утас: 99099048, 99899052

1.2 Үйл ажиллагаа явуулж буй газрын засаг захиргааны харьяалал

MV-022689 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай нь Монгол улсын засаг захиргааны нэгжийн хувьд Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын нутаг дэвсгэрт Ширээ уул нэртэй газарт орших Ширээ уул-2 гөлтгөнийн уурхай нь Улаанбаатар хотоос баруун урд зүгт 400 км, Дэлгэрхангай сумын төвөөс баруун урд зүгт 50 км-т оршдог.

MV-022689 дугаартай тусгай зөвшөөрөлтэй талбай дараах солбицолд оршино.

Талбайн булангийн солбилцолууд

1.	104° 20' 47.11" 44° 59' 14.5"
2.	104° 20' 20.11" 44° 59' 14.5"
3.	104° 20' 20.11" 44° 59' 35.49"
4.	104° 20' 47.11" 44° 59' 35.49"



Зураг1. Байршлын тойм зураг

1.3 “Түмэн Тал” ХХК-ний ордын геологийн тогтоц

Ширээ уул-2 ордын талбайд дээд-дунд олигоцены настай ногоон, улаан хүрэн, хүрэн бор шавар, элсэн чулуу, хөрзөн чулуу, элс, элсэнцэр, шавханцар ба гөлтгөнө тархалттай байна.

Ордын баруун, баруун хойт хэсгээр гөлтгөнө агуулсан цайвар ногоон өнгийн шавар газрын гадаргууд тааралдах ба гөлтгөнө нь конкрец буюу судал хэлбэрээр тогтсон байдаг. Мөн ордын төв болон баруун урд талаар газрын гадаргуугийн хамгийн өндөрлөг хэсэг, жижиг гүвээ толгодын энгэр оройн хэсэгт тогтсон ногоон болон улаан хүрэн шаврын гөлтгөнөөр баяжигдсан хэсэг нь “шапка” байдалтай 50х200 м, 100х300 м хэмжээтэй биетийг үүсгэн тогтсон байдаг.

1.4 2024 оны уулын ажлын төлөвлөлт

Ашиглалтын жил	Ашигт давхарга	Гөлтгөнө	Хөрс хуулалт	Хөрс хуулалтын коэффициент
он	м3	тн	м3	м3/тн
2024	97.8	90,000	90.3	1

“Ширээ Уул–2” уурхай нь В-1 гэсэн гөлтгөнө агуулсан ашигт давхаргын геологийн болокуудаас 97.8 мян м³ гөлтгөнө агуулсан давхарга олборлож 90.1 мян м³ хөрс хуулж нийт 108.1 мян м³ (90.1 мян м³ х 1.2) сийрэгжсэн хөрсийг гадаад болон дотоод овоолгод хураана.

2. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Ширээ уул-2 гөлтгөний орд нь геологийн тогтоц, ашигт малтмалын нөөцийн хэмжээгээрээ гөлтгөний ордын нөөцийн ангиллын I бүлгийн 2-р төрөл гэсэн ангилалд хамаарах ба ашигт малтмал агуулсан хурдасны зузаан болон агуулга нь харьцангуй жигд тогтвортой байдаг.

2.1 Уур амьсгал

Дундговь аймгийн хувьд газрын гадаргын хотгор гүдгэрийн ялгаа төдийлэн их биш учраас аймгийн хэмжээгээр уур амьсгалын нөхцөл онцгой ялгардаггүй, эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Намрын эхний гэнэтийн хүйтрэлт 10-р сарын дунд 10 хоногт тохиолдох ба зарим үед 9-р сарын дунд буюу эхний 10 хоногт болдог байна. Хүйтрэлгүй хоногийн тоо 125-135 хоногт үргэлжилдэг.

Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай учир хоногийн болон улирлын агаарын температурын хэлбэлзэл ихтэй агаарын дундаж бага температур нь 1-р сард -16.2 хэм, дундаж их температур нь 7-р сард +22.4 хэм байдаг ба жилд дундажаар 80 мм орчим чийг унадаг байна. Тус сум нь говийн бүс хангайн бүсийн дунд оршдог. Өвөлдөө 20-35 хэм хүйтэрч, зундаа 25-32 хэм халдаг. Хавартаа салхи их шуурдаг бөгөөд 5-25м/сек хүрдэг.

2.2 Физик, газар зүй

Тус төслийн талбай нь газар зүйн байршлын хувьд говийн бүсэд хамаарагдах бөгөөд өргөргийн дагуу 780-840 м-ийн үнэмлэхүй өндөршилтэй гүвээрхэг, дов толгодорхог гадаргуу үүсгэн тогтсон. Талбайн баруун талд орших Ширээ уулын үнэмлэхүй өндөр 1210м байна.

Тус район нь говь, хээрийн засварын бүсэд хамаарагдах ба энд тектоник-денудацийн, элэгдэл- хуримтлалын гэсэн хоёр гадаргуу ялгаж болно.

2.3 Ус зүй ба гидрогеологийн нөхцөл

Судалгааны талбайн районд тархсан газрын доорхи ус нь хөдөлгөөн болон хуримтлалын нөхцөлөөрөө давхрагын, ан цавын гэсэн хоёр төрөлд ялгагдана. Давхаргын ус нь ихэвчлэн дөрөвдөгчийн сэвсгэр хурдсанд агуулагдах ба ус агуулагч хурдас нь хайрга, хайрганцар, элс, элсэнцэр юм.

Ордоос баруун урагш 5км-т орших Цагаан усны уурхайн худаг нь давхаргын ус бөгөөд химийн найрлагаараа гидрокарбонат натрийн ангилалд багтах ба цэнгэгдүү, зөөлөвтөр ус боловч бохирдолт нь ундны усны стандартаас их байна. Ан цавын ус нь дунд рифейн настай хувирмал чулуулаг, дунд севон, доод пермийн настай гүний чулуулаг тархсан талбайд ан цав, техтоник хагарлыг дамжин үүссэн байдаг. Талбайгаас зүүн хойш 13км-т хуучин өрөмдсөн цооногоос ус даралтаас байнга урсан гарч байдаг ба энэ нь ан цавын ус бөгөөд олон жилийн турш хүн, малын ундны хэрэгцээг хангаж байна.

2.4 Хөрс

Талбайн ихэнх гадаргуу жижиг хэмхдэс агуулсан элсэрхэг хөрстэй, хотгор хоолой хэсэгт шаварлаг харс зонхилно.

2.5 Ургамлан бүрхэвч

Хотгор, хоолойнуудаар говийн тачир ургамал/хялгана/, бусад хэсэгт модлог, бутлаг харгана, шаваг ургасан байна.

2.6 Нийгэм, эдийн засаг

Төсөл хэрэгжүүлж буй талбай нь Монгол Улсын эдийн засгийн төвийн мужийн урд хэсэгт буюу Дундговь аймаг, Өмнөговь аймгийн заагт орших ба дэд бүтэц муу хөгжсөн, төв суурин газруудтай авто машины шороон замаар холбогдсон, холбоо харилцаа, цахилгаан эрчим хүчний системд холбогдоогүй зэлүүд газар байрладаг.

3. ТҮМЭН ТАЛ ХХК-ИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙД ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЖ БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ

Гөлтгөний ордыг ашиглаж дуусах үед 38,31 га талбайн үржил шимт хөрс хуулагдаж, ургамлын хөмрөгийн байдал, органик нэгдлийн хуримтлал устаж, хөрс ургамлын үе давхаргад тархан төлжиж амьдарч байсан бичил организм, шавьж хорхой, сээр нуруугүйтэн болон бусад амьтдын амьдрах орчин өөрчлөгдөж, амьдралын хэвийн тогтолцоо тодорхой хэмжээгээр алданана. Үүний нөлөөгөөр биогеоценозын тэнцвэрт байдал алдагдана.

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад нэлээд хэмжээний тоос шороо босч ил гарсан гадаргуугаас салхиар зөөгдөн ойр орны ялангуяа салхины зонхилох салхины чиглэлийн дагуу хөрс ургамлыг дарж байгалийн өнгө төрхийг түр муутгах, ойролцоо амьдарч буй иргэдийн хэвийн амьдрах нөхцөлийг алдагдуулна. Мөн ургамлын ургалт, амьтны амьдрах орчин муутгах хүчин зүйл болно.

3.1. Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл:

Ил уурхайн олборлолтын үйл ажиллагааны явцад хөрс хуулалт, тээвэрлэлтээс ил задгай хөрснөөс хийссэн тоос нь орчны агаарыг бохирдуулах эх үүсвэр болж байна. Хуурайшилт ихтэй хавар, намрын улиралд агаарт дэгдэх тоосны хэмжээ харьцангуй их байгаа үед тоосжилт үүсгэж байгаа зам талбайд тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.

3.2 Хөрсний эвдрэл, элэгдэл:

Ил уурхайн олборлолтын үед хөрс хуулснаар үржил шимт давхрага хөндөгдөх, газрын хэвлийгээс ухагдаж гарсан хөрсний овоолго нь газрын ландшафтад өөрчлөлт оруулж байгаа тул хөрсний элэгдэл эвдрэлийг бага байлгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн, эвдэгдсэн талбайд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийж байна.

3.3. Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл:

Уурхайн унд, ахуй, хэрэгцээний усыг уурхайн талбайн ойролцоо орших худгаас хангана. Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын 2015-12-04-ний 259 тоот албан бичгээр Таргатын худгаас ус ашиглахыг зөвшөөрсөн. Уурхайд нэг ээлжийнд 10-15 хүн байрлаж ажилласан, барилгын ажил эрчимтэй биш байгаа тул хаягдал ус маш бага хэмжээтэй зөвхөн хоолны газраас гардаг. Уурхайн технологийн хэрэгцээнд ус ашиглаагүй.

3.4. Болзошгүй нөлөөлөл, үргэлжлэх хугацаа, эрчим

Ашигт малтмал олборлох, уул уурхайн үйлдвэрлэл явуулах үед байгаль орчны төлөв байдал, орон нутгийн нийгэм эдийн засагт нөлөөлж болох нөлөөллүүдийн хэлбэр, тэр нь эргэж нөлөөлөх эсэхийг болон нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа, түүний эрчимшил зэргийг тодруулдаг.

3.5. Шууд нөлөөлөл:

Болзошгүй нөлөөллийн ихэнх нь шууд нөлөөлөлд хамрагдаж байна. Ил аргаар ашигт малтмал олборлохын тулд хөрс, хучаас хөрсийг хуулах, газрын хурдасыг эвдэж өөрчлөх, геологийн тогтоцыг нь шууд эвдэж өөрчлөх, газрын гадаргын нөөц баялагт хомсдол үүсэх зэргээс шалтгаалж экологийн тухайн орчны системд нөлөөлөх, байгалийн тэнцвэр, унаган төрх өөрчлөгдөх зэрэг сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэн техникийн нөхөн сэргээлтийг байгалийн унаган төрхийг хэвээр хадгалах зарчмыг баримтлана.

3.6. Шууд бус нөлөөлөл:

Нэг дор олон хүнд механизм нэгэн зэрэг ажиллахад гарах дуу чимээ ихсэх зэрэг нөлөөлөл хамаарч байна. Дуу чимээнээс ажилчдын эрүүл мэндийг сэргийлэх зорилгоор дуу чимээний эрчмийг сулруулах чихэвч зүүлгэж хэвшүүлэх, амьтны үржлийн үед аль болох бага дуу гаргах шаардлагыг хэрэгжүүлж ажиллана.

3.7. Богино хугацааны нөлөөлөлд:

Сөрөг нөлөөлөл

- Хүнд механизмуудаас агаарт бохир утаа хаягдах
- Агаарт тоос шороо дэгдэх
- Дуу шуугианы нөлөөгөөр ая тух алдагдах
- Гадаргын өөрчлөлт бичил орчны уур амьсгалд нөлөөлөх зэрэг нөлөөлөл хамаарч байна.

Иймд утаа тоос шорооны бохирдлыг багасгах зорилгоор дизель хөдөлгүүрийн утааны янданд шүүлтүүр тавих, ухагдсан хөрс шороо, машин механизмд талхлагдсан орчны газрыг ялангуяа авто замыг хуурайшилт ихтэй үед усалж, чийглэж байх, ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдлын цэгийг хлораминаар тогтмол 7 хоногт 1 удаа ариутгаж, хуурай хог хаягдлыг Дэлгэрхангай сумын хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажилласан.

4. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ

2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд дараах зорилтуудыг тавьсан болно.

Үүнд:

- ✓ Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээгээр тодорхойлсон сөрөг нөлөөллийг бууруулахад анхаарал хандуулах
- ✓ Хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах, дахин боловсруулах үйлдвэрүүдэд нийлүүлэх
- ✓ Уурхайн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд гадаад болон дотоод овоолгыг хийж гүйцэтгэх
- ✓ Уурхайн ашиглалтын үед гал гарч болзошгүй хэсгүүдэд гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр тоноглох
- ✓ Тэрбум мод тарих хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэхэд компаний оролцоог хангаж ажиллах

5. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

5.1 Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах

№	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Хэрэгжүүлэгч	Тайлбар	Биелэлт %
1	“Ажлын байрны агаарын бохирдол”- Орчны агаарын чанарын хэмжилтийг хийлгэж, дүгнэлт гаргуулах	БО-ны ажилтан	Уурхайн орчмын 2 цэгт Дундговь аймгийн “Ус цаг уур орчны шинжилгээний газар”-аар агаарын чанарын үзүүлэлтүүдийн шинжилгээ хийлгэв.	100%
2	“Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрээс ялгарах хорт хий- гадаад орчны агаарын чанарт сөрөгөөр нөлөөлөх”- Байгууллагын эзэмшил, болон уурхайд түрээсээр ажиллаж буй тээврийн хэрэгслийг үзлэг оношилгоонд хамруулах	Жолооч нар	Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрээс ялгарах хорт хийг бууруулах ажлын хүрээнд байгууллагын эзэмшлийн техник болон тээврийн хэрэгслүүдийн эд ангид анхаарч, үзлэг оношлогоонд хамруулав.	100%

5.2 Гадаргын ба газрын доорхи усны нөөцийн чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах

№	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Хэрэгжүүлэгч	Хэрэгжилт	Биелэлт %
1	“Ус ашиглах”- Ус ашиглалтын гэрээ хийх	БО-ны ажилтан	2024 оны уурхайн ундны усны гэрээг Дэлгэрхангай сумын 3Д-тай хийж, төлбөрийг бүрэн төлөв.	100%
2	“Ус ашиглах”- Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах	БО-ны ажилтан	2024 оны Ус ашиглуулах дүгнэлтийг Дундговь аймгийн БОАЖГ-с авсан.	100%
3	Ундны усны чанарын хэмжилтийг хийлгэж, дүгнэлт гаргуулах	БО-ны ажилтан	Ундны усны шинжилгээг Дундговь аймгийн УЦУОШТ-өөр	100%

			хийлгэв.	
4	“Тоолуур тавих”- Ахуйн болон тоосжилт дарах усны хэрэглээний хэмжээг тооцох	БО-ны ажилтан	2025 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.	10%

5.3 Хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах


№	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Хэрэгжүүлэгч	Хэрэгжилт	Биелэлт %
1	“Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, булах, устгах, иргэн АННБ-с сумын засаг даргатай байгуулах гэрээ” байгуулж, хог хаягдлыг Дэлгэрхангайн хогын цэгт буулгах	БО-ны ажилтан Уурхайн ахлах	2024 онд Дэлгэрхангай сумын Засаг даргатай “Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, булах, устгах” гэрээ хийнэ хамтарч ажилласан. Хог хаягдлын төлбөрөө хугацаандаа төлсөн.	100%
2	Энгийн хог хаягдлыг сард 1 удаа тээвэрлэлт хийлгэх хувиар гаргах	Уурхайн ахлах	Байгууллагын эзэмшлийн тээврийн хэрэгслээр сардаа 1 удаа энгийн хог хаягдал ачиж, хогын цэгт буулгах ажлыг зохион байгуулсан:	100%
3	Эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагатай аюултай хог хаягдлын гэрээ байгуулах	БО-ны ажилтан	2022 оны 09-р сард “Алтан Оршихуй Групп”ХХК-тай “Техникийн хаягдал тос, тосолгооны шингэн хаягдлын гэрээ” 2 жилээр байгуулан ажилласан. Тус гэрээний дагуу техникийн хаягдал тосыг хүлээлгэн өгсөн.	100%

6. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

6.1 Техникийн нөхөн сэргээлт

Тайлант онд 2 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн ба үүнээс 1,8га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна.

№	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Хэрэгжүүлэгч	Хэрэгжилт	Биелэлт %
1	Техникийн нөхөн сэргээлт	Уурхайн ахлах БО-ны ажилтан	1,8 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийж хүлээлгэн өгсөн	90%

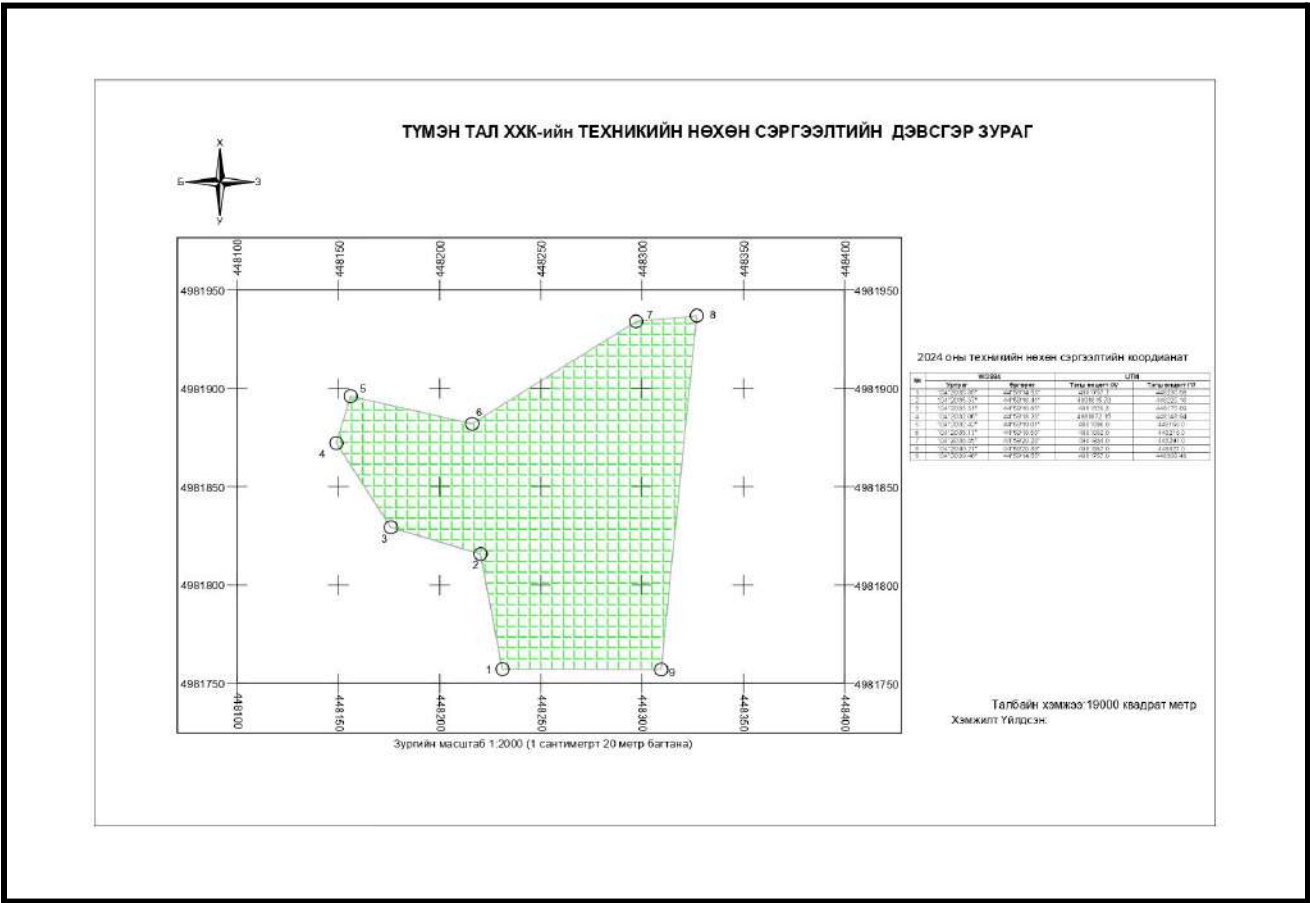

Зураг 2. Техникийн нөхөн сэргээлтийн дэвсгэр зураг

Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны А/134 дүгээр тушаалаар зөвшөөрснөөр, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 09 сарын 19-ны өдрийн А/527 дугаар тушаалаар батлав.

3-BOX-1.3

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН МЭДЭЭ

1. АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХАЯГИЙН ХЭСЭГ

Регистрийн дугаар	5	5	4	7	9	3	8
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр	Түмэн тал ХХК						
Байршил	Нэр			Код			
Аймаг, нийслэл	Дундговь			4 8			
Сум, дүүрэг	Дэлгэрхангай			1 6			

2. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар	М	Ү	0	2	2	6	8	9
Тусгай зөвшөөрлийн талбай, га	38.31							
Ашиглалт эхэлсэн он, сар, өдөр	2	0	2	2	0	7	0	1
Ашигт малтмалын төрөл	Барилгын материал							
Ашиглалтын төрөл	Ил уурхай							

3. УУЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТ

Үзүүлэлт	МД	Хэмжээ нэгж	Нийт	Тайланд онд (ашиглалт)
А	Б	В	1	2
Олборлолтод өртсөн нийт талбай	1	-	х	х
Ашигласан талбай	2	га	4.3	3.1
Хаягдал чулуулгийн овоолго	3	мян.м3		100.8
Хаягдал чулуулгийн овоолго	4	га	1	
Хаягдал чулуулгийн овоолго	5	мян.м3		
Хөрсний овоолго	6	га	2.9	1.9
Хөрсний овоолго	7	мян.м3		38
Уул уурхайн дагалдах дэд бүтцийн нөлөөнд эвдэрсэн газар	8	га	1.5	1
Бусад	9	га	0.5	0.5

4. УУЛ УУРХАЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Үзүүлэлт	МД	Хэмжээ нэгж	Нийт	Техникийн	Биологийн
А	Б	В	1	2	3
Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд зассан нөхөн сэргээлт хийх нийт талбайн хэмжээ	10	га	18		
Тайланд онд нөхөн сэргээлт хийхээр товлосон талбай	11	мян.м3	128		х
Тайланд онд нөхөн сэргээлт хийхээр товлосон талбай	12	га	2	2	
Нөхөн сэргээлт нийт хийсэн талбай, мөр14-мөр16, мөр15-мөр17	13	мян.м3	55	55	х
Тайланд онд нөхөн сэргээлт хийсэн талбай	14	га	2.8		
Тайланд онд нөхөн сэргээлт хийсэн талбай	15	мян.м3			х
Тайланд онд нөхөн сэргээлт хийсэн талбай	16	га	1.8	1.8	
Нөхөн сэргээлт хийхэд зарцуулсан нийт зардал, мөр18-мөр19	17	мян.м3			х
Тайланд онд нөхөн сэргээлт хийхэд зарцуулсан зардал	18	мян.төг	14,000	14,000	
Тайланд онд нөхөн сэргээлт хийхэд зарцуулсан зардал	19	мян.төг	5,000	5,000	
Байршуулсан нөхөн сэргээлтийн баталгааны нийт мөнгөн хөрөнгө, мөр20-мөр21	20	мян.төг	12,350	х	х
Тайланд онд байршуулсан нөхөн сэргээлтийн баталгааны мөнгөн хөрөнгө	21	мян.төг	7,000	7,000	х
Байгаль хамгаалахад зарцуулсан нийт зардал, мөр22-мөр23	22	мян.төг	29,552	х	х
Тайланд онд байгаль хамгаалахад зарцуулсан зардал	23	мян.төг	10,000	10,000	х



Захирагч: Ч. Алтанхуяг

Нягтлан бичигч: А. Энхтүвшин

2025 оны 01-р сарын 30-ны өдөр

Зураг 3. BOX 1-3 маягт

6.2 Тербум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хийгдсэн ажил

Дундговь аймаг, Дэлгэрхангай сумын төв-д “Ногоон толгой төгөл” байгуулан, 2022 оноос жил бүр 100-250 ширхэг мод, бут тарьж, арчилж ургуулж байна.



Зураг 4. Дэлгэрхангай сумын төвийн “Ногоон толгой төгөл”

7. НҮҮЛГЭН ШИЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа талбай болон эрчимтэй сөрөг нөлөө үзүүлэх бүст айл өрх, өвөлжөө хаваржаа байхгүй учраас 2024 оны БОМТ-нд нүүлгэн шилжүүлэх болон нөхөн олговор олгох ямар нэгэн ажил тусгагдаагүй.

8. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Арга хэмжээ	Хэрэгжилт	Биелэлт %
1	Уурхайн орчинд энгийн хог хаягдал ангилан ялгах, зориулалтын хогын савтай болох	Уурхайн орчинд ажилчдын шинэ кемп байгуулах ажлын хүрээнд хог хаягдлын цэг шинээр бий болгох ажлын гүйцэтгэл 60%-тай явж байна.	60%
2	Аюултай хог хаягдлын цэг бий болгох	Уурхайн орчинд ажилчдын шинэ кемп байгуулах ажлын хүрээнд аюултай хог хаягдлын цэг шинээр бий болгох ажлын гүйцэтгэл 60%-тай явж байна.	60%



Зураг 5. Уурхайн ажилчдын кемпийн барилгын ажлын явц



Зураг 6. Захиалсан энгийн хог хаягдал болон аюултай хог хаягдлын сав

11. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

Орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд “Түмэн Тал” ХХК-ийн Ширээ-Уул-2 гэлтгөний ордыг ил аргаар ашиглах төслийн нөлөөллийн болон нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүс нутагт гарах өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг зохион байгуулах зорилготой уурхайн орчинд ус, агаар, хөрс, тоосны шинжилгээг Дундговь аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвөөр хийлгэсэн.

УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ			
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 7-р баг бага төгрөг 2-200 Утас/Факс: 70522350, 88810335 E-mail хаяг: baatarul@dundgov.gov.mn			
Сорьцын дугаар: А/60, А/61 Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас: Дэлгэрхангай Түмэн тал ХХК Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал: БОШЛ-ийн техникч М.Балрмаа Сорьцын тоо, хэмжээ: 2 Сорьцын төрөл: Агаарын шинжилгээ Сорьц авсан огноо: 2024.10.18 Лабораторид хүлээж авсан: 2024.10.18 Шинжилгээ эхэлсэн огноо: 2024.10.21 Хяналсан огноо: 2024.11.06 Хуудасны тоо: 1/1 Шинжилгээ гүйцэтгэсэн шинжээчийн код: 01			
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН			
№	Сорьц авсан цаг	SO ₂ мг/м ³	NO ₂ мг/м ³
А/60	Ажилчдын байр орчим	0.014	0.018
А/61	Уурхай орчим	0.015	0.023
Шинжилгээний аргын стандарт		MNS 0017-2-5-12:2021	MNS 0017-2-5-11:2021
MNS 4585-2016 Хүлцэх хэм хэмжээ		0.450мг/м ³	0.20 мг/м ³
ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН: БОШ ЛАБОРАТОРИЙН ЗРХЛЭГЧ /Б.ЯНЖМАА/			
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно. Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамарна.			

УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ			
Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 7-р баг бага төгрөг 2-200 Утас/Факс: 70522350, 88810335 E-mail хаяг: baatarul@dundgov.gov.mn			
Сорьцын дугаар: Т/60, Т/61 Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас: Дэлгэрхангай сум Түмэн тал ХХК Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал: БОШЛ-ийн техникч М.Балрмаа Сорьцын тоо, хэмжээ: 2 Сорьцын төрөл: Нийт тоос /20 минут/ Сорьц авсан огноо: 2024.10.18 Лабораторид хүлээж авсан: 2024.10.18 Шинжилгээ эхэлсэн огноо: 2024.10.21 Хяналсан огноо: 2024.11.06 Хуудасны тоо: 1/1 Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: 1			
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН			
№	Сорьц авсан цаг	Нийт тоос /20 минут/ мг/м ³	
Т/60	Ажилчдын байр орчим	0.033	
Т/61	Уурхай орчим	0.044	
MNS 4585-2016 Хүлцэх хэм хэмжээ		0.500мг/м ³	
ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН: БОШ ЛАБОРАТОРИЙН ЗРХЛЭГЧ /Б.ЯНЖМАА/			
Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно. Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамарна.			

Зураг 7. УЦУУШТ-ийн шинжилгээний үр дүн

УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИДунговь аймэг Сайнцагаан сум 7-р баг бага тойруу 2-200
Утас/факс: 7092250, 68819335
E-mail хаяг: baarjav@buid.gov.mn

Сорьцын дугаар: S/69, S/70
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас: Дэлгэрхангай сум Түмэн тал ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал: БОШЛ-ийн эрхлэгч Б.Янжмаа
Сорьцын тоо, хэмжээ: 2
Сорьцын төрөл: Хөрсний агрохимийн шинжилгээ
Сорьц авсан огноо: 2024.10.18
Лабораторид хүлээж авсан: 2024.10.18
Шинжилгээ эхэлсэн огноо: 2024.10.21
Хэвлэсэн огноо: 2024.11.04
Хуудасны тоо: 1/1
Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: 1

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Сорьцын дугаар	Сорьц авсан цэг	
	S/69	S/70
Хөрсний чанарын үзүүлэлтүүд	Харьс	Ажилтдын байр
pH	7.85	7.97
Ялзмаг %	0.8	0.74
NO ₃ mg/kg	40.66	81.7
NH ₄ mg/kg	112.05	48.33
SO ₄ mg/kg	1238.7	526.6
P mg/kg	6.58	8.93

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН
БОШ ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ /Б.ЯНЖМАА /Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна.УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИДунговь аймэг Сайнцагаан сум 7-р баг бага тойруу 2-200
Утас/факс: 7092250, 68819335
E-mail хаяг: baarjav@buid.gov.mn

Сорьцын дугаар: w/33
Сорьц авсан газрын нэр, хаяг, утас: Түмэн тал ХХК
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал: М.Баярмаа БОШЛ-ийн техникч
Сорьцын тоо, хэмжээ: 2 литр
Сорьцын төрөл: Ундны ус
Сорьц авсан огноо: 2024.10.18
Лабораторид хүлээж авсан: 2024.10.18
Шинжилгээ эхэлсэн огноо: 2024.10.30
Хэвлэсэн огноо: 2024.11.06
Шинжилгээ хийсэн шинжээчийн код: 1/1
Хуудасны тоо: 1/1

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

Тодорхойлсон үзүүлэлт Шинжилгээний арга стандарт	Сорьц авсан нэр		MNS 900:2018 Хүлээж агууламж mg/l
	Матчны хурд	mg/l	
Жинлэгдэх бодис /MNS 6838:2020/	XCB mg/l	н/р	
Перманганатын исэлдэх чанар /MNS 6833:2020/	Perm mg/l	5.3	
Кальцийн ион /MNS ISO 1097:1979/	Ca ²⁺ mg/l	69.2	100
Магний ион /MNS ISO 1097:1979/	Mg ²⁺ mg/l	32.2	30
Аммоний ион /CA3 1:2020/	NH ₄ ⁺ mg/l	0.05	1.5
Нийт төмөр /MNS 4430:2005/	Fe mg/l	0.11	0.3
Хлоридын ион /MNS 4424:2005/	Cl ⁻ mg/l	95.0	350
Сульфатын ион /MNS 6271:2011/	SO ₄ ²⁻ mg/l	168.0	300
Нитратын ион /MNS 6778:2018/	NO ₃ ⁻ mg/l	0.022	1.0
Нитратын ион /MNS 6834:2020/	NO ₃ ⁻ mg/l	7.10	50
Фосфатын ион /MNS ISO 6878:2001/	PO ₄ ³⁻ mg/l	0.104	3.5
Фтор /MNS 6272:2011/	F ⁻ mg/l	1.64	
Хатуулаг /MNS ISO 1097:1979/	Хатуулаг мг-эсэлт	6.72	7
Натри Кали	Na+K mg/l	51.0	
Цахилгаан дамжуулах чанар /MNS ISO 7888:1999/	EC µS/cm ²⁵	952	
Гидрокарбонат MNS 6832:2020	HCO ₃ ⁻ mg/l	180.8	
Эрдсжилт MNS ISO 1097:1979	mg/l	616.0	
Орчим MNS ISO 10523:2001	pH	7.794	

Тайлбар: илр-илрээгүй

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН
БОШ ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ /Б.ЯНЖМАА /Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна.

12. 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

“Ширээ-Уул-2” гөлтгөнийн ордын төслийн хүрээнд орон нутгийн төрийн байгууллагуудаас зохион байгуулсан хурал, уулзалтад тогтмол оролцож идэвхитэй хамтран ажилласан.

№	БОМТ хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө	Хэрэгжилт	Биелэлт %
1	Жил бүрийн БОМТ-ыг боловсруулж, хэрэгжүүлж, хянаж ажиллах	2024 оны БОМТ-ыг боловсруулж, батлуулсан. 2024 оны 11-р сард БОМТ-ыг биелэлтийг Дундговь аймгийн БОАЖГ-р дүгнүүлсэн.	100%
2	Байгаль орчны төлөвлөгөөт аудит хийлгэж, аудитын тайланг зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх	2024 онд “Ширээ-Уул-2” гөлтгөний орд төслийн ээлжит төлөвлөгөөт БО-ны аудит “Эковишн” ХХК-аар хийлгэсэн. Тус аудитын зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхээр 2025 оны БОМТ-д тусгасан.	80%

БАТЛАВ:
ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ
БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

О. АМАРСАНАА

ЗӨВШӨӨРЧ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН:
"ТҮМЭН ТАЛ" ХХК ЗАХИРАЛ

Ч.АЛТАНХУЯГ

"ТҮМЭН ТАЛ" ХХК НИЙ ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН
НУТАГТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА. "ГӨЛТГӨНИЙН ОРД" ТӨСӨЛ ТӨСЛИЙН 2024
ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: МУ-005356
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР: 5547938



ХЯНАСАН:
ХБОБЗГ-ЫН АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ

Ц. ЖАРГАЛНЭМЭХ

БОЛОВСРУУЛСАН:
"ТҮМЭН ТАЛ" ХХК БАЙГАЛЬ
ОРЧНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Б.МӨНХГЭРЭЛ

2024 ОН

Зураг 8. 2024 оны БОМТ батлагдсан нүүр

**“ШИРЭЭ УУЛ-2” ГӨЛТГӨНИЙН ОРД ТӨСЛИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН**

Байгаль орчны аудит захиалагч: “Түмэн тал” ХХК

Байгаль орчны аудит гүйцэтгэгч: “Эко вишня” ХХК

Улаанбаатар хот, 2024 он

Зураг 9. 2024 оны хуваарьт байгаль орчны аудитын тайлангийн нүүр

Шилжүүлгийн баримт

Сайн уу ?

ТҮМЭНТАЛ таны Дижитал банкаар хийсэн шилжүүлгийн мэдээллийг илгээж байна.

Илгээгчийн / Sender's

Илгээгчийн банк
Sender bank

Дансны дугаар
Sender's Account No

Дансны нэр
Sender's Account Name

M БАНК

9005547938

ТҮМЭНТАЛ

Хүлээн авагчийн мэдээлэл / Reciever's

Хүлээн авагч банк
Receiving bank

Дансны дугаар
Sender's Account No

Дансны нэр
Sender's Account Name

ТӨРИЙН САН

100900013406

БО НӨХӨН СЭРГЭЭХ
БАТАЛГАА

Шилжүүлгийн мэдээлэл / Transaction details

Гүйлгээний дугаар
Transaction ID

Шилжүүлэг хийсэн огноо
Transaction date

Утга
Transaction details

2024-05-16
SMB554559

2024-05-16 12:59:44

MV-022689 ТҮМЭН
ТАЛ ХХК ДУ.
ДЭЛГЭРХАНГАЙ БО
НӨХӨН
СЭРГЭЭЛТИЙН
БАРЬЦАА

Илгээсэн дүн
Sending amount

Хүлээн авсан дүн
Receiving amount

Ханш
Rate

Шимтгэл
Fee

7,000,000.00MNT

7,000,000.00MNT

1

500₮

Баримтыг баталгаажуулах бол доорх хэсэгт тэмдэглэнэ.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

М банкны найзуудаас нь.

Энэ нь М банкнаас илгээсэн автомат мэйл учир хариу бичих шаардлагагүй.


М түслэх: 1800-2828

Вэб: www.m-bank.mn

И-мэйл: info@m-bank.mn

Хаяг: М Бизнес төв, 603 тоот, Шангри-ла Оффис 6 давхар,

Зураг 10. 2024 оны Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө байршуулсан

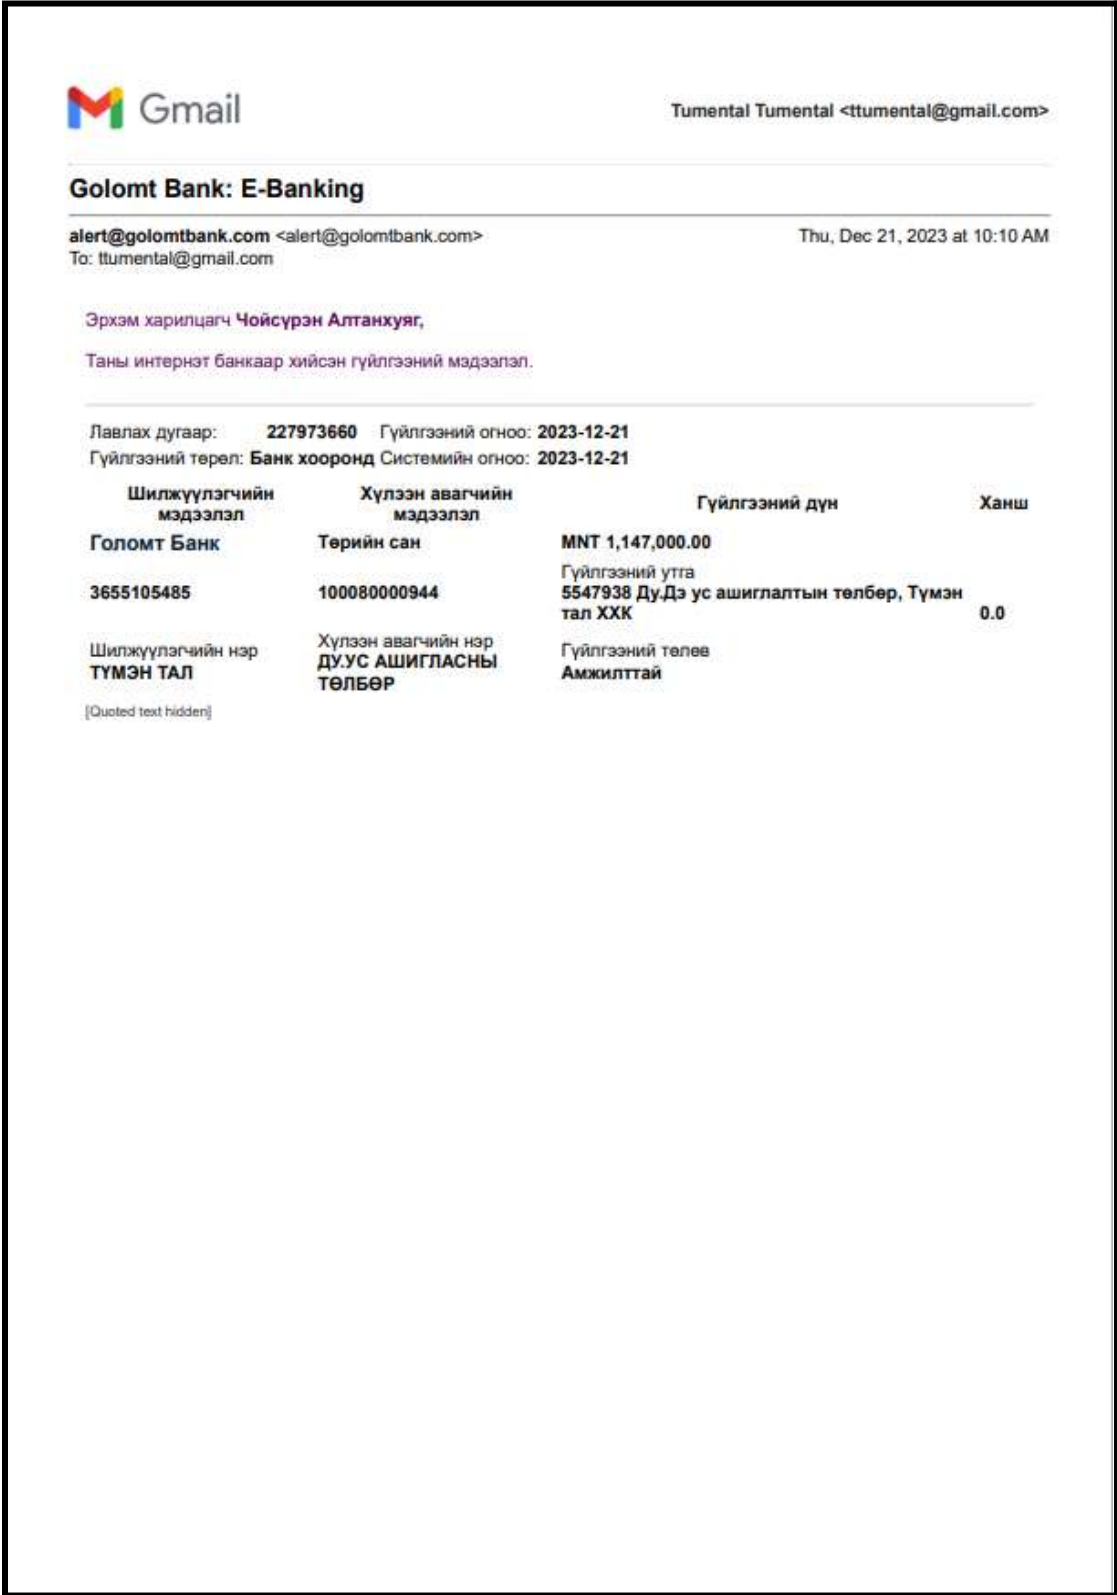

Зураг 11. 2024 оны усны төлбөр төлсөн баримт

13. 2024 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

“Түмэн Тал” ХХК-ийн Дундговь аймаг, Дэлгэрхангай сумын Ширээ-Уул-2 гөлтгөний төслийн хүрээнд уурхайн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын талаарх мэдээллийг орон нутгийн засаг захиргаа, ард иргэдэд танилцуулж хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгах тал дээр анхаарч, төрийн байгууллага, нутгийн иргэдийн санал хүсэлтийг дэмжиж хамтран ажилладаг.

2024 оны 12-р сард 2024 оны БОМТ биелэлтийг шалгуулж “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн нэгдсэн дүгнэлт” хүлээн авч, 90%-с дээш үнэлэгдсэн.
