ГАРЧИГ

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 3
1.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл 3
1.2 Төслийн байршил....................4
1.3 Уурхайн технологийн мэдээлэл 7
1.3.1 Ордын нөөц :....................7
1.3.2 Үйл ажиллагааны технологи:....................8
1.3.3 Хүчин чадал: 8
1.3.4 Овоолгын төлөвлөлт 9
1.4 Дэд бүтэц 9
1.4.1 Уурхайн барилга байгууламж....................9
1.4.2 Усан хангамж....................10
1.4.3 Шатахуун түгээх станц....................11
2025 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 12
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ 14
СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ....................15
НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 18
БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 20
НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ....................20
ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 20
ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ....................20
ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 21
ОРЧНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР....................25
ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ....................27
ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ....................29
БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВ....................**Error! Bookmark not defined.**

ТАЙЛАНД ОРСОН ХҮСНЭГТЭН МЭДЭЭЛЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий мэдээлэл......3
Хүснэгт 2. Төслийн талбайн булангийн цэгүүдийн солбицол......4
Хүснэгт 3. Ордын нөөцийн тооцооны хүснэгт (Ордын нөөц 2024-01-01-ий өдрийн байдлаар)......7
Хүснэгт 4.Уурхайн барилга байгууламж......9
Хүснэгт 5.Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө......15

ТАЙЛАНД ОРСОН ЗУРГАН МЭДЭЭЛЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1.Төслийн талбайн байрзүйн зураг......4
Зураг 2. Төслийн талбайн районы агаар, сансрын зураг......5
Зураг 3. Засаг захиргааны зураг......6
Зураг 4.Нөөцийн тооцооны дэвсгэр зураг......8
Зураг 5.Одоогийн уурхайн кемп №1......10
Зураг 6.Одоогийн уурхайн кемп №2......10
Зураг 7.Хогийн савны төрөл......23

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Хүснэгт 1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий мэдээлэл

Төслийн нэр:	▪ *Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутагт орших MV-016975 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй Төхөмийн хүрэн нүүрсний ордыг ил аргаар ашиглах төсөл*
Төсөл хэрэгжүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:	▪ *“Премиумкөүл корпораци” ХХК* ▪ *Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011359044* ▪ *Регистрийн дугаар: 5615631*
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг:	▪ *Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Жаргалант, 60-63 тоот* ▪ *Утас: 976-99091802*
Төслийн товч тодорхойлолт:	*ЭБМЗ-ийн 2011 оны 4-р сарын 6-ий өдрийн XX-06-04 тоот дүгнэлт, АМГ-ын даргын 2011 оны 5-р сарын 2-ы өдрийн 162 тоот тушаалаар ордын нөөцийг баталсан.* ➢ *Төхөмийн хүрэн нүүрсний ордын талбайд баттай (А) нөөцийг 2800332.4 тн-оор, бодитой (В) нөөцийг 3831947.5 тн-оор, боломжтой (С) нөөцийг 1642173.1 тн-оор, нийт баттай бодитой болон боломжтой (А+В+С) нөөцийг 8274453.0 тн-оор, цэвэр нүүрсний баттай (А) нөөцийг 65848345.4 тн-оор, бодитой (В) нөөцийг 72265591.2 тн-оор, боломжтой (С) нөөцийг 52299428.5 тн-оор, нийт баттай бодитой боломжтой (А+В+С) нөөцийг 190413365.4 тн-оор, уулын цултай нүүрсний баттай (А) нөөцийг 69010130.5 тн-оор, бодитой (В) нөөцийг 75930632.0 тн-оор, боломжтой (С) нөөцийг 54983742.8 тн-оор, нийт баттай, бодитой болон боломжтой (А+В+С) нөөцийг 199924505.3 тн-оор хүлээн авсан.* ➢ *2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар Төхөмийн ордод баттай болон бодиттой (А+В) зэргээр 264,877.93 мян.тн, боломжтой (С) зэргээр 54,983,60 мян.тн, нийт 199,002.64 мян.тн цэвэр нүүрсний үлдэгдэл нөөцтэй байна* *АМГТГ-ийн даргын 2024 оны 6-р сарын 24-ны өдрийн т/87 тоот тушаал, ЭБМЗ-ийн 2024 оны 5-р сарын 8-ны өдрийн т/24-14-06 тоот дүгнэлт батлагдсан.* ➢ *Төслийн нийт хугацаанд 37,802.8 мян.м3 хөрс хуулж, нийт 141,958.0 мян.м3 уулын цулын ажил гүйцэтгэж, 3.0 сая.тн/жилийн хүчин чадалтайгаар 46 жилийн хугацаанд ашиглахаар төлөвлөсөн байна.*

1.2 Төслийн байршил

Ашиглалт явуулах тусгай зөвшөөрлийн талбай нь газарзүйн байршлаар Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутагт орших ба Улаанбаатар хотоос 640 км, Сүхбаатар сумын төвөөс зүүн урагш 36 км, Баруун Урт хотоос зүүн урагш 80-км-т, Сүхбаатар-Дорнод аймгуудыг холбосон өндөр хүчдэлийн шугамаас 20 км зайд оршино .

Төхөмийн талбай нь тал хээрийн бүс дахь бөмбөгөр оройтой намхан уул, тэгшивтэр тал бүхий бүсэд хамаарна. Талбайн үнэлэхүй өндөр 850-950 м-ийн хооронд хэлбэлзэх ба хамгийн өндөр уул нь талбайн урд хэсэгт орших Цагаан өндөр (1047.0 м), хамгийн намхан цэг нь талбайн зүүн хэсэг дэх Холбоогийн говь (840 м) бөгөөд талбайн ихэнх хэсгийг (70%) тал, хөндий эзэлнэ.

Талбайн хэмжээ: 537.95 гектар

Талбайн байр зүйн зургийн нэрэлбэр: L-50–49

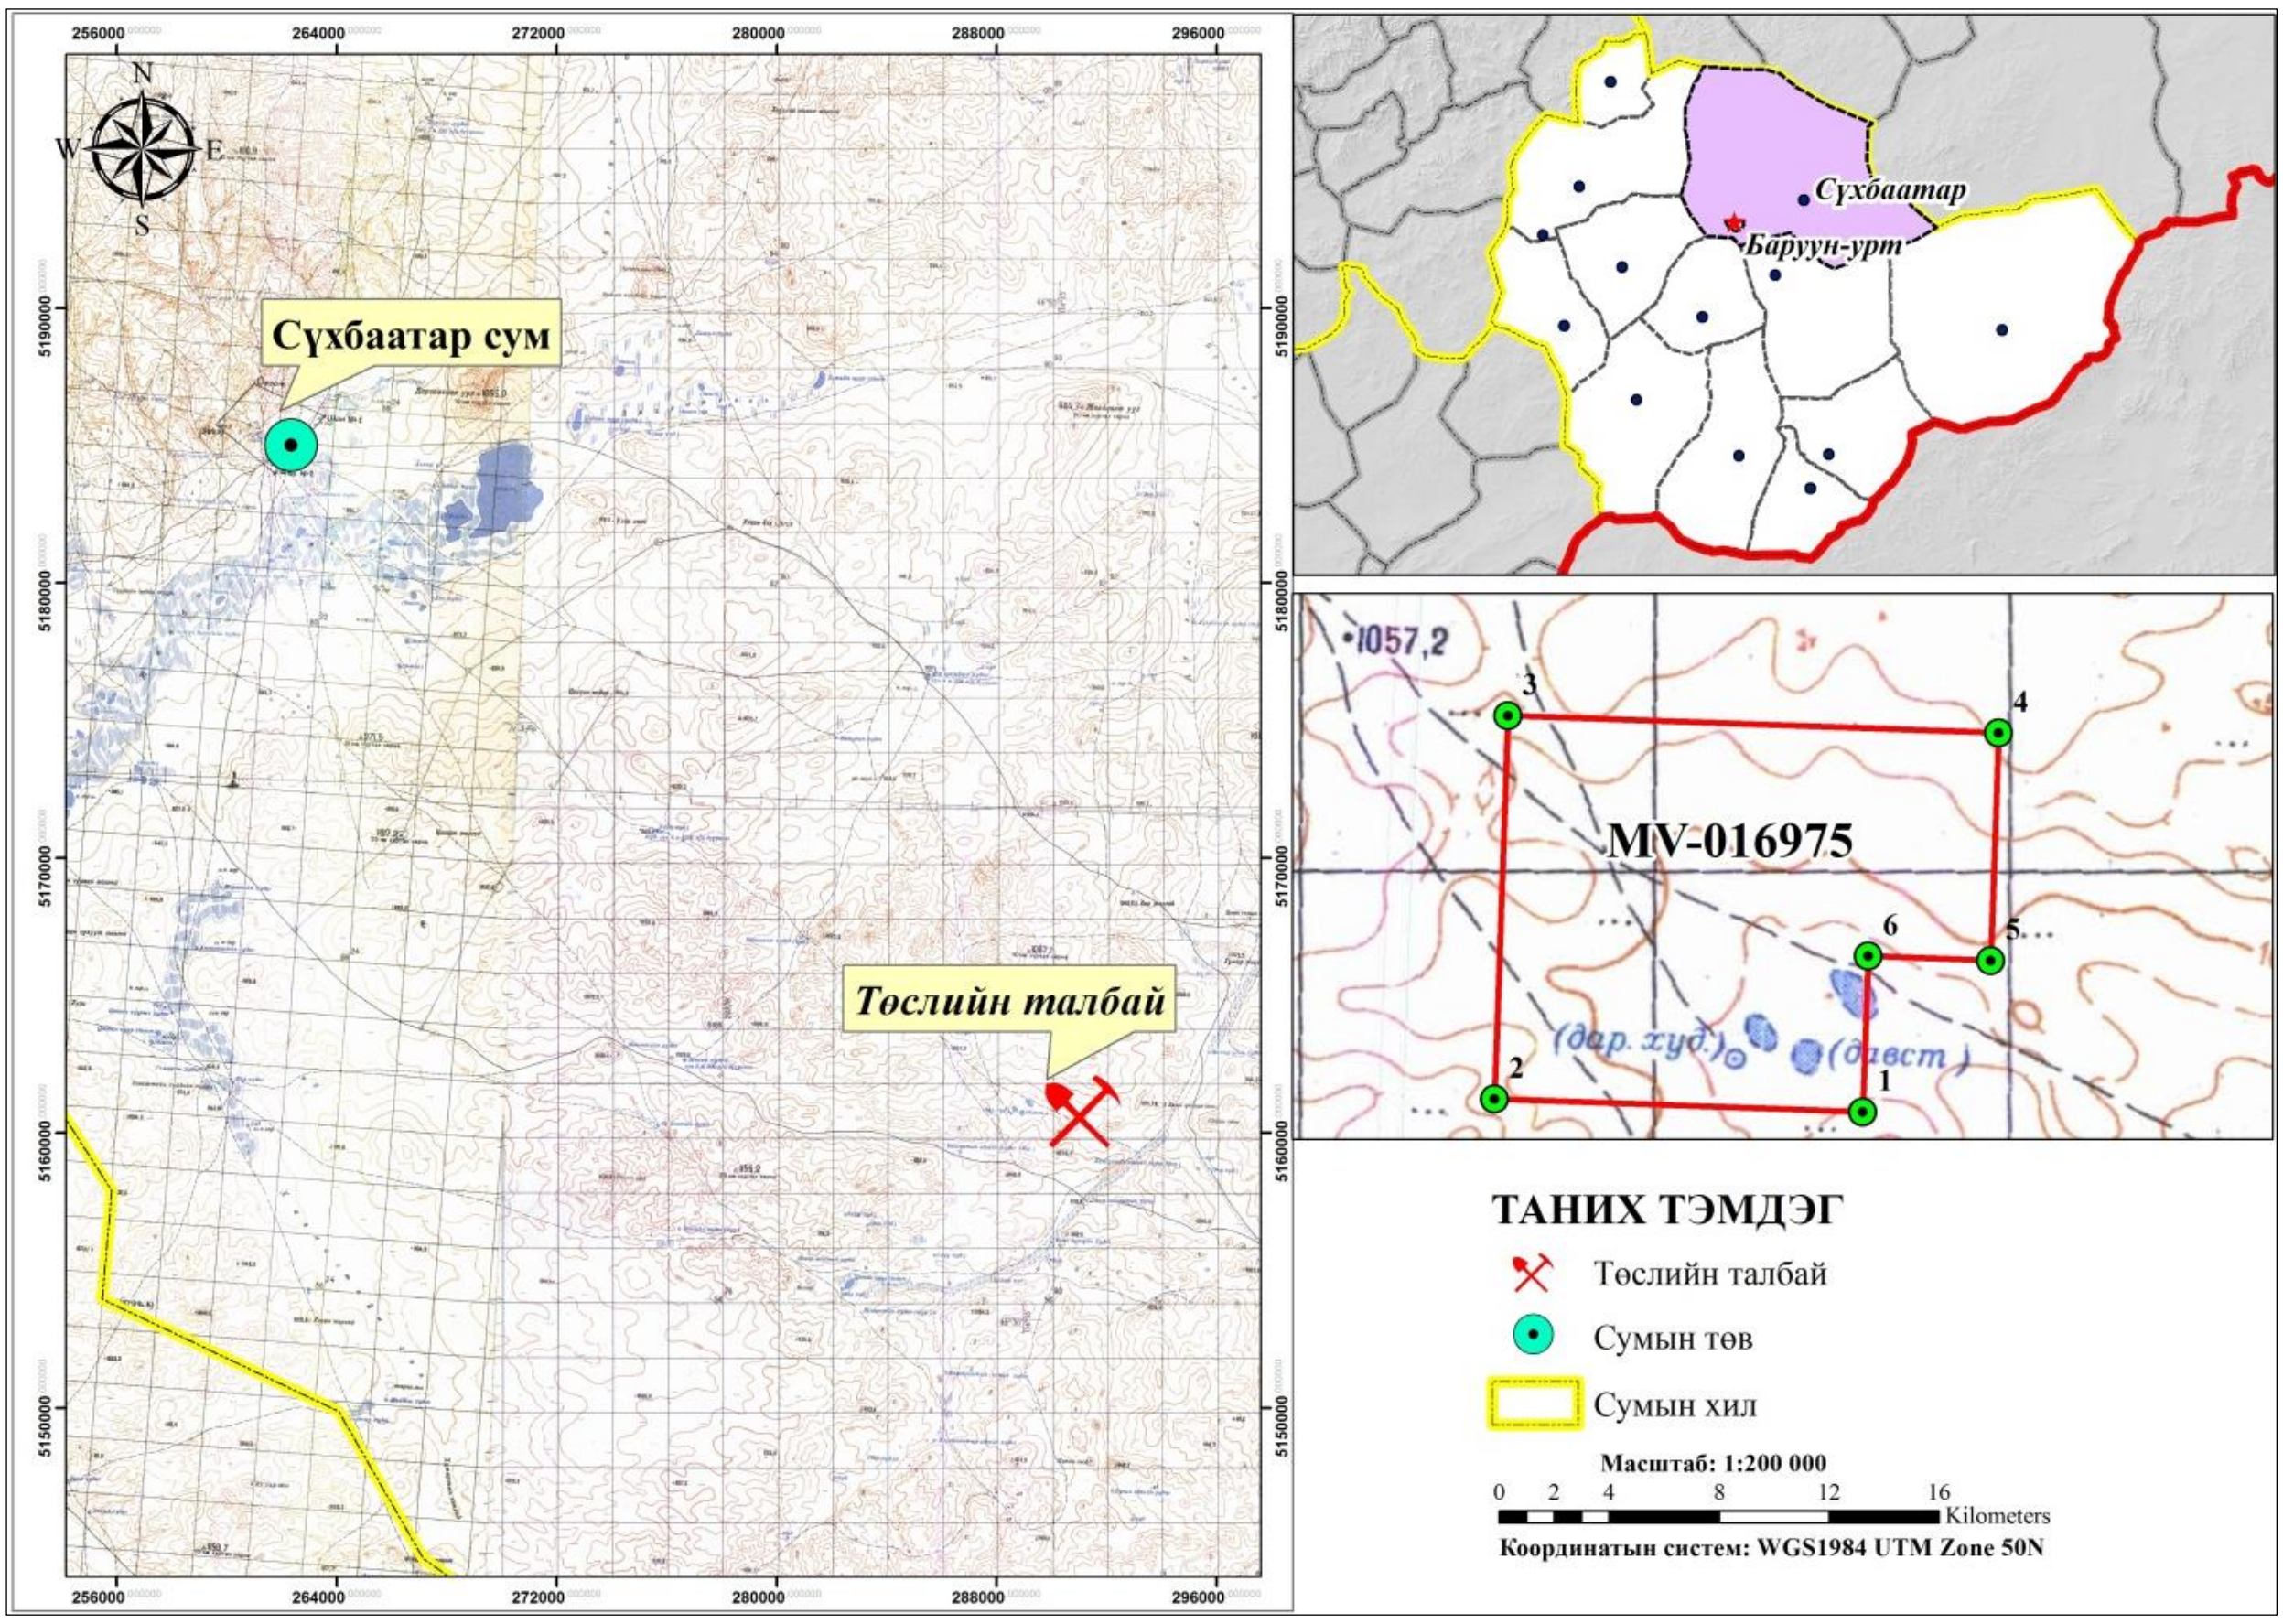

Зураг 1.Төслийн талбайн байрзүйн зураг

Хүснэгт 2. Төслийн талбайн булангийн цэгүүдийн солбилцол

Цэгийн №	Градус	Минут	Секунд	Градус	Минут	Секунд
1	114	15	0.02	46	33	51.76
2	114	13	22.39	46	33	51.76
3	114	13	22.39	46	35	1.76
4	114	15	32.4	46	35	1.76
5	114	15	32.4	46	34	20.22
6	114	15	0.02	46	34	20.22

Зураг 2. Төслийн талбайн районы агаар, сансрын зураг

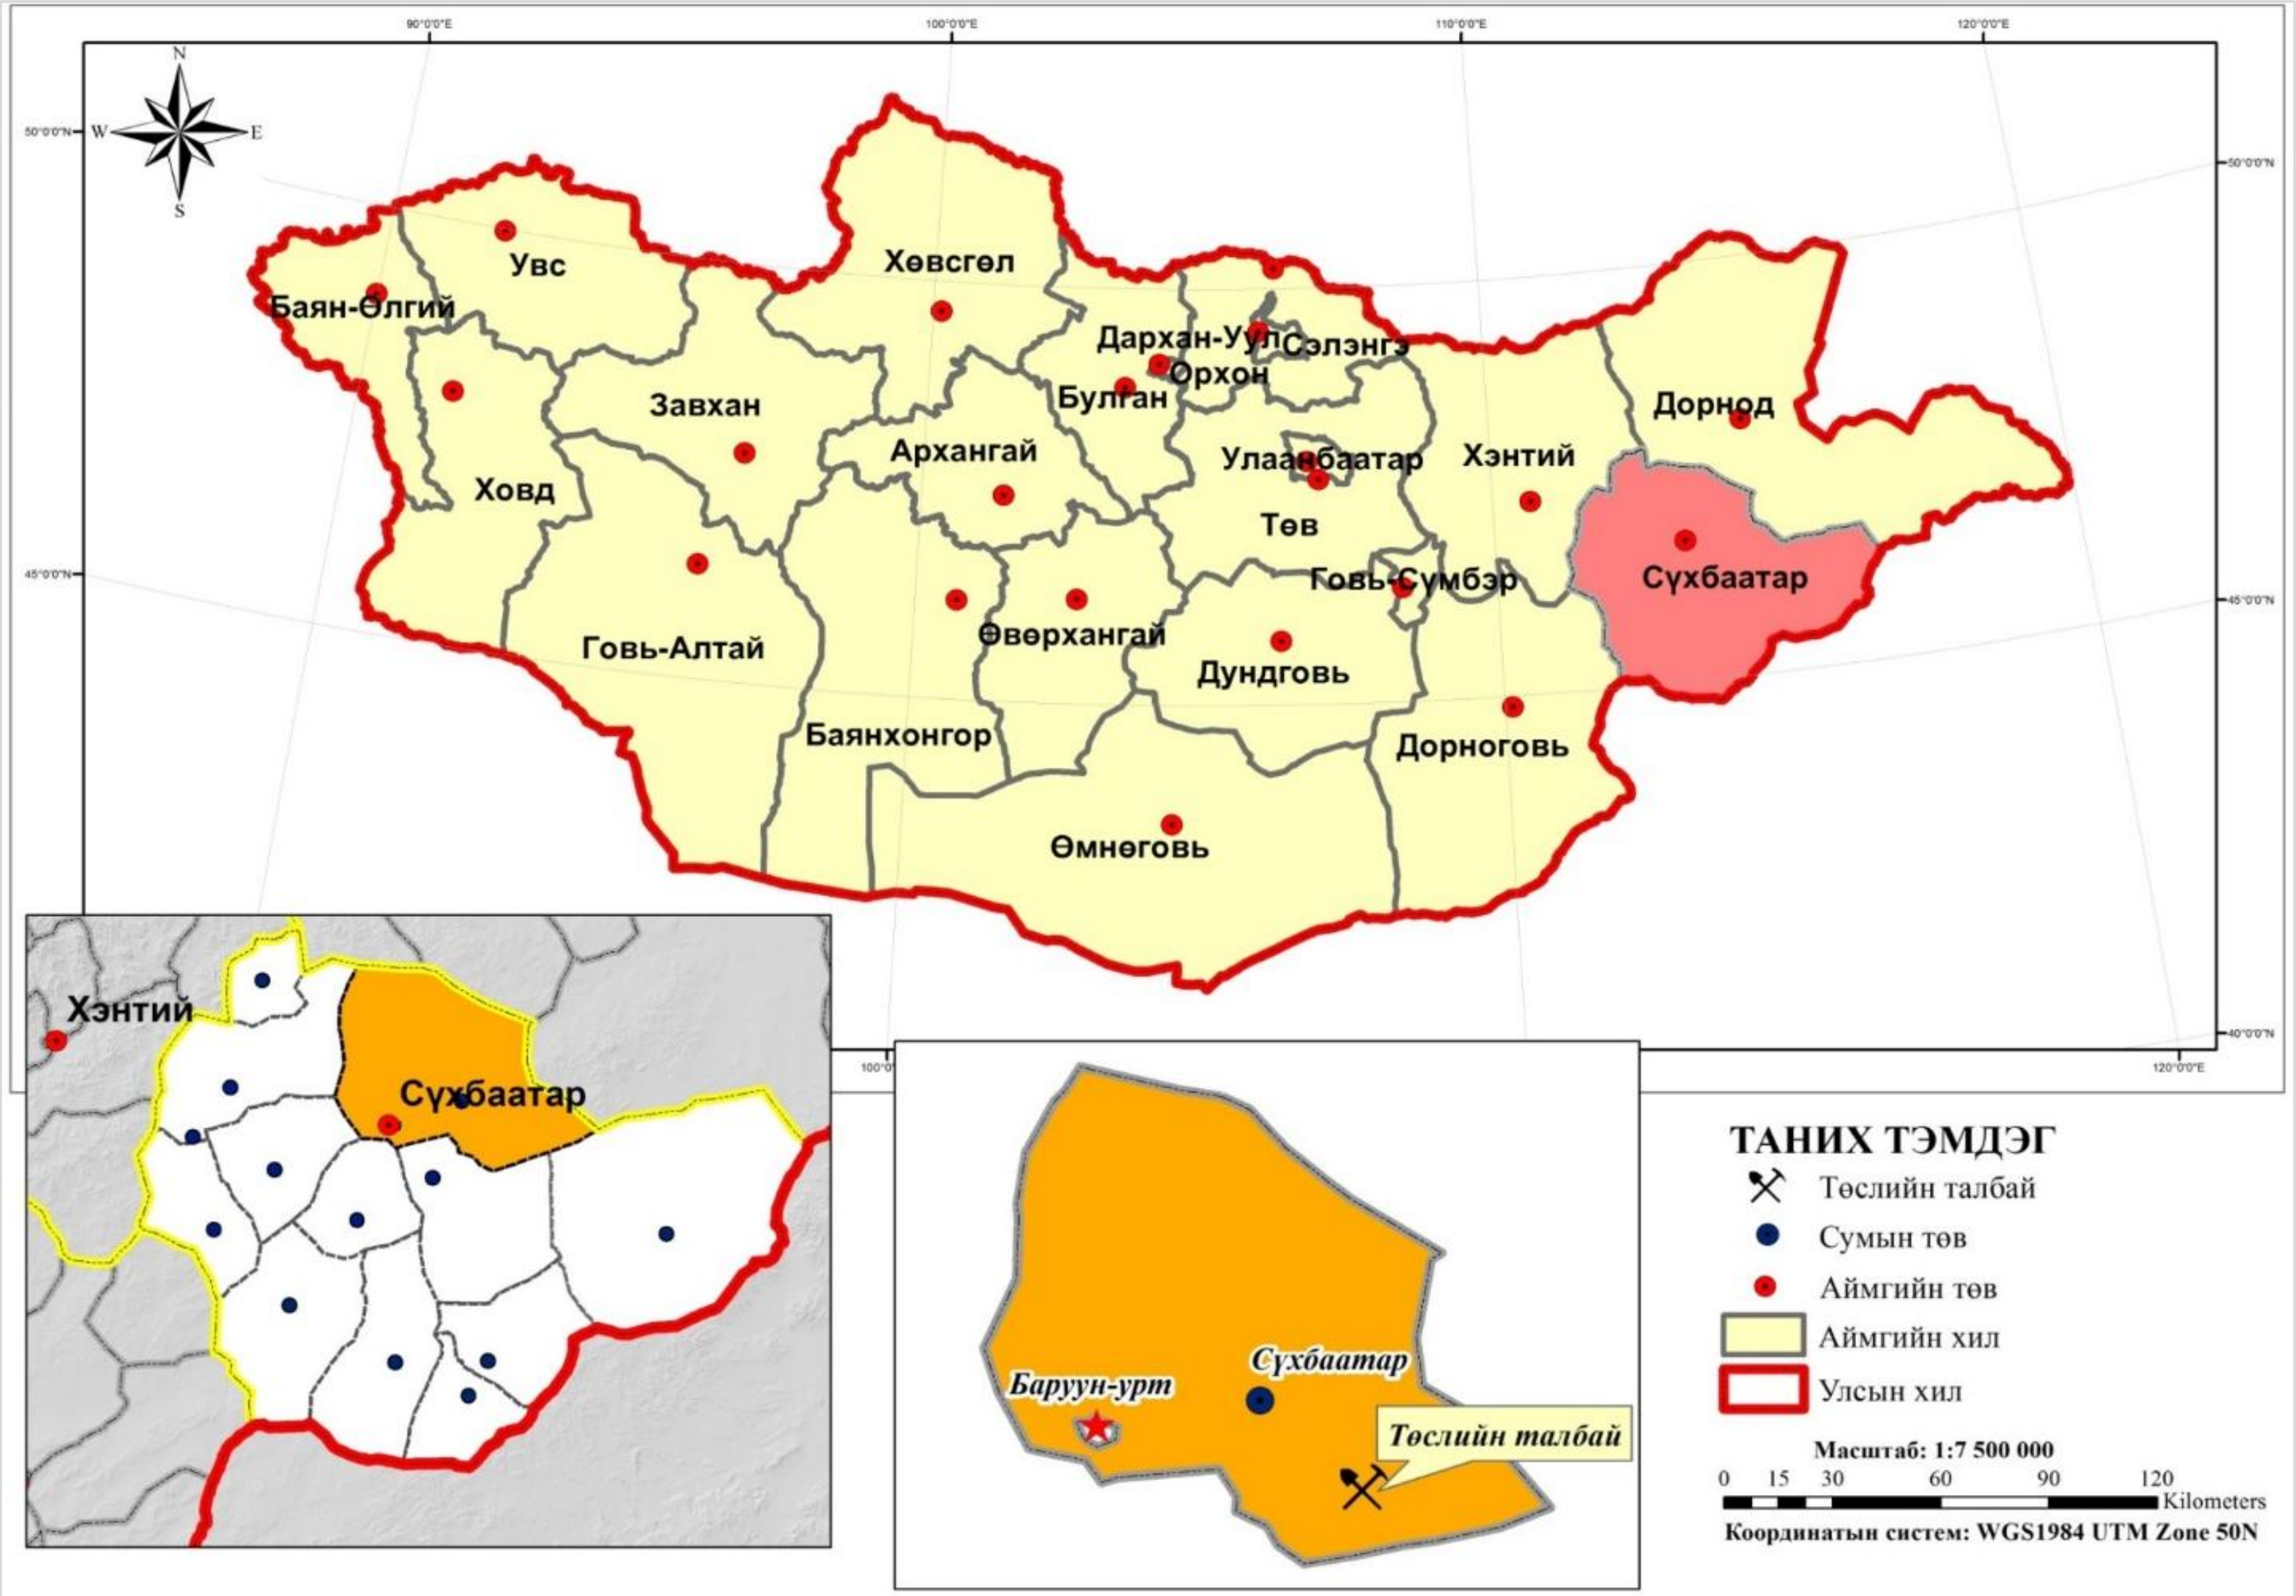

Зураг 3. Засаг захиргааны зураг

1.3 Уурхайн технологийн мэдээлэл

1.3.1 Ордын нөөц :

ЭБМЗ-ийн 2011 оны 4-р сарын 6-ий өдрийн XX-06-04 тоот дүгнэлт, АМГ-ын даргын 2011 оны 5-р сарын 2-ы өдрийн 162 тоот тушаалаар "Төхөм"-ийн хүрэн нүүрсний ордын талбайд баттай (A) нөөцийг 2,800,332.4 тн-оор, бодитой (B) нөөцийг 3,831,947.5 тн-оор, боломжтой (C) нөөцийг 1,642,173.1 тн-оор, нийт баттай бодитой болон боломжтой (A+B+C) нөөцийг 8,274,453.0 тн-оор, цэвэр нүүрсний баттай (A) нөөцийг 65,848,345.4 тн-оор, бодитой (B) нөөцийг 72,265,591.2 тн-оор, боломжтой (C) нөөцийг 52,299,428.5 тн-оор, нийт баттай бодитой боломжтой (A+B+C) нөөцийг 190,413,365.4 тн-оор, уулын цултай нүүрсний баттай (A) нөөцийг 69,010,130.5 тн-оор, бодитой (B) нөөцийг 75,930,632.0 тн-оор, боломжтой (C) нөөцийг 54,983,742.8 тн-оор, нийт баттай, бодитой болон боломжтой (A+B+C) нөөцийг 199,924,505.3 тн-оор хүлээн авсан.

Хүснэгт 3. Ордын нөөцийн тооцооны хүснэгт (Ордын нөөц 2024-01-01-ий өдрийн байдлаар)

Блокийн дугаар	Блокийн талбайн хэмжээ	Өнцгийн секанс	Зузаан, метр			Эзлэхүүн жин, гр/см^3		Нөөц, мян.тонн		
			Өгөршилд орсон	Цэвэр нүүрс	Уулын цултай нүүрс	Өгөршилд орсон	Цэвэр нүүрс	Өгөршилд орсон	Цэвэр нүүрс	Уулын цултай нүүрс
1A	289,533.4		2.5	66.3	68.3	1.39	1.36	1,006.13	26,106.65	26,894.18
2A	187,137.4		2.4	66.7	67.7	1.39	1.36	624.29	16,975.61	17,230.11
3B	240,605.3		2.9	55.8	57.7	1.39	1.36	969.88	18,259.06	18,880.78
4C	195,712.6	1.015	3.2	37.3	38.6	1.39	1.36	883.59	10,077.03	10,428.24
5B	402,269.8		2.9	51.7	53.3	1.39	1.36	1,621.55	28,284.39	29,159.73
6A	311,727.6		2.7	53.7	58.7	1.39	1.36	1,169.91	22,766.09	24,885.84
7B	140,731.9			49.8	55.7	1.39	1.36	-	9,531.49	10,660.72
	130,698.6		2.1			1.39	1.36	381.35	-	-
8B	209,331.6			39.6	42.6	1.39	1.36	-	11,273.76	12,127.84
	104,665.5		2.5			1.39	1.36	363.71	-	-
9C	236,569.9			13.5	13.9	1.39	1.36	-	4,343.42	4,472.12
10C	257,250.9			34.8	38.0	1.39	1.36	-	12,175.17	13,294.73
11B	169,735.2		2.1	21.3	22.1	1.39	1.36	495.46	4,916.89	5,101.56
12C	105,926.8		2.4	37.0	41.3	1.39	1.36	353.37	5,330.24	5,949.696
13C	124,085.7	1.015		26.5	27.7	1.39	1.36	-	4,539.13	4,659.03
	73,644.3		3.9			1.39	1.36	405.21	-	-
14C	163,934.4	1.035		27.9	28.4	1.39	1.36	-	6,438.04	6,553.42
15C	134,930.6	1.045		49.0	50.2	1.39	1.36	-	9,396.405	9,626.52
Баттай (A) нөөц								**2,800.33**	**65,848.35**	**69,010.13**
Бодитой (B) нөөц								**3,831.95**	**72,265.59**	**75,930.63**
Боломжтой (C) нөөц								**1,642.17**	**52,299.43**	**54,983.74**
НИЙТ ДҮН								**8,274.45**	**190,413.37**	**199,924.5**

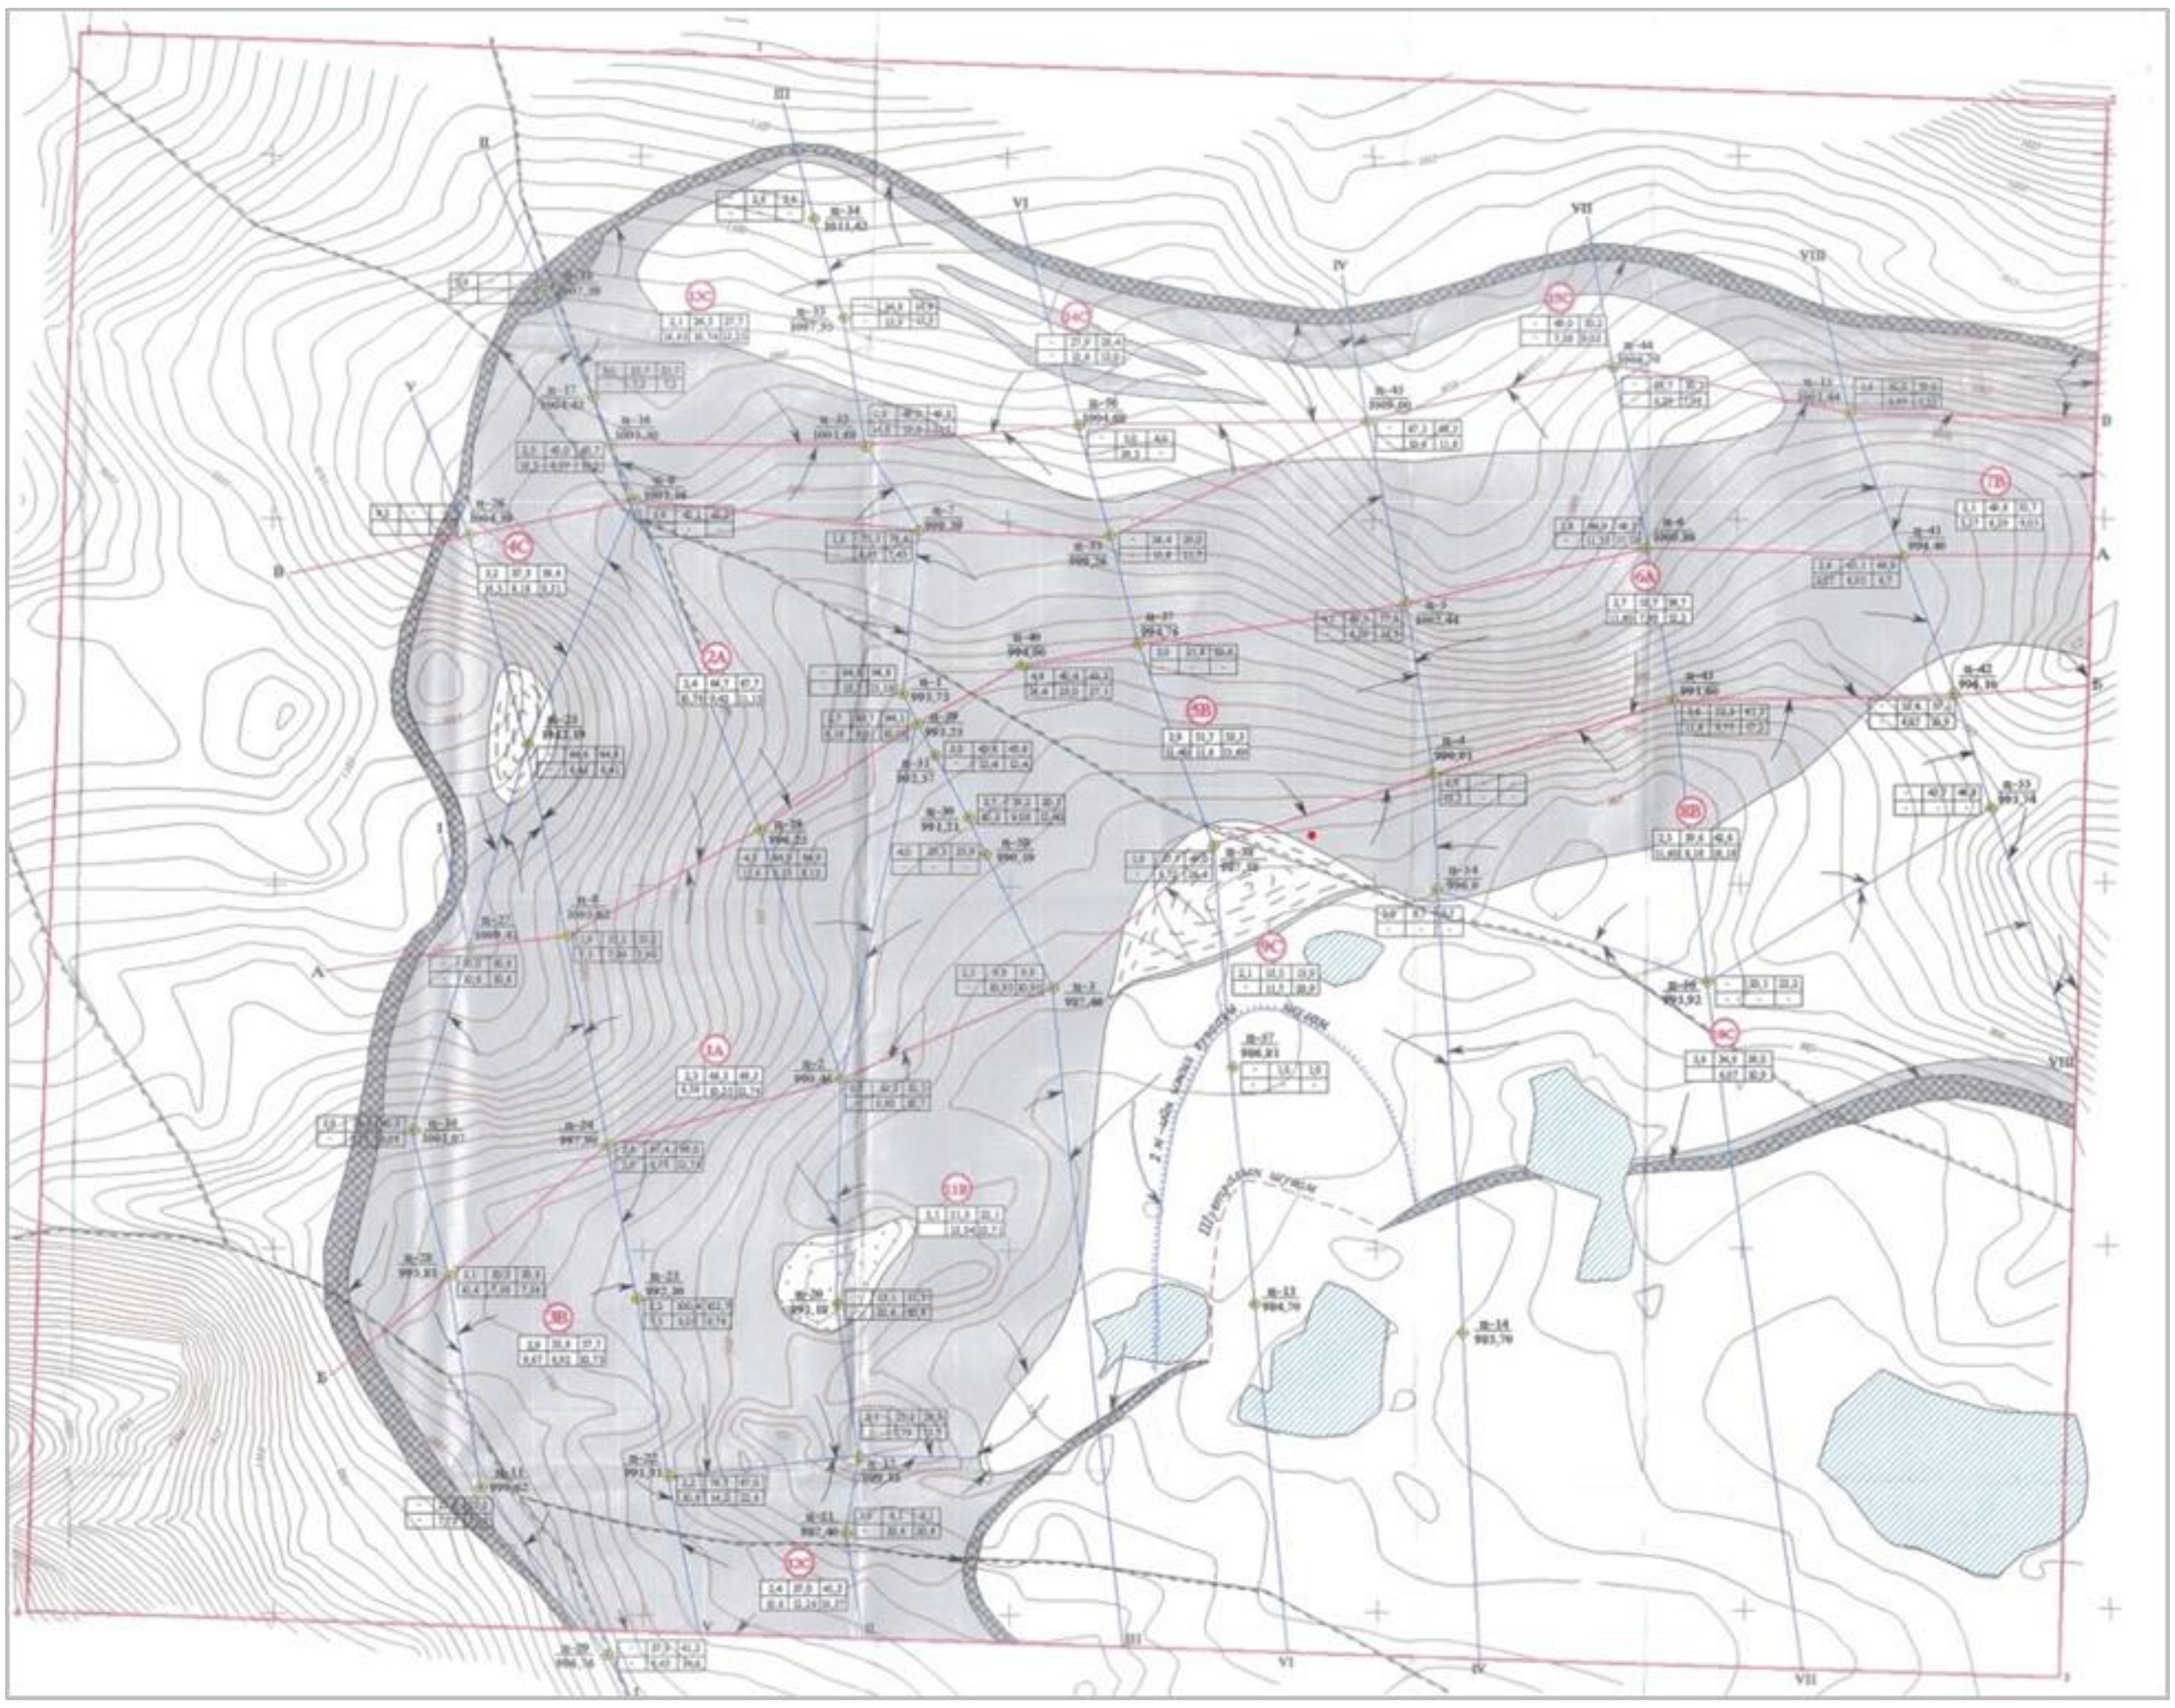

Зураг 4.Нөөцийн тооцооны дэвсгэр зураг

Техник эдийн засгийн үндэслэл: АМГТГ-ийн даргын 2024 оны 6-р сарын 24-ны өдрийн т/87 тоот тушаал, ЭБМЗ-ийн 2024 оны 5-р сарын 8-ны өдрийн т/24-14-06 тоот дүгнэлт батлагдсан. Төслийн нийт хугацаанд 37,802.8 мян. $м^3$ хөрс хуулж, нийт 141,958.0 мян.$м^3$ уулын цулын ажил гүйцэтгэж, 3.0 сая.тн/жилийн хүчин чадалтайгаар 46 жилийн хугацаанд ашиглахаар төлөвлөсөн байна.

1.3.2 Үйл ажиллагааны технологи:

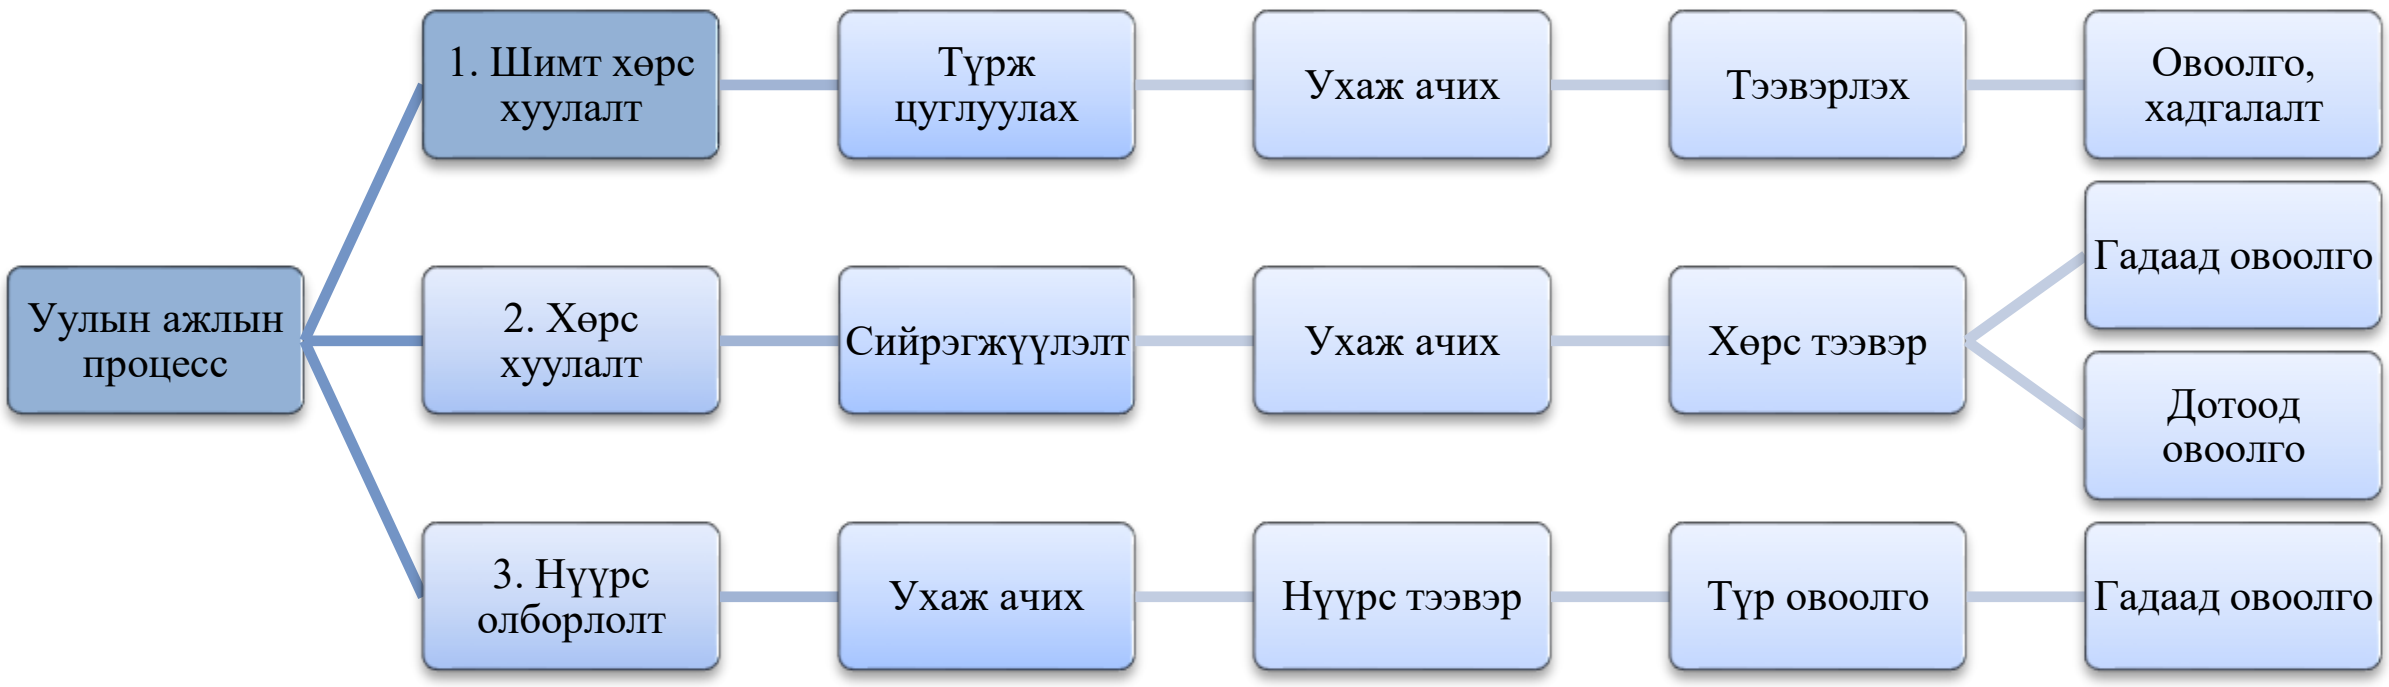

1.3.3 Хүчин чадал:

Уурхайн жилийн хүчин чадал 3.0 сая тн/жил нүүрс олборлохоор байна.

Ажиллах хүчин: Уурхайд нийт 112 ажилтан ажиллах бөгөөд жилд 330 хоног ажиллана.

1.3.4 Овоолгын төлөвлөлт

Хөрсний гадаад овоолгын төлөвлөлтийг одоогийн ашиглагдаж буй овоолгуудын байршил, нөөцийн блокуудын хил, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээ, тээвэрлэлтийн зай, чулуулгийн шинж чанар, уурхайн барилга байгууламжийн байршил зэргийг харгалзан үзэж уурхайн баруун болон хойд хэсэгт 2 гадаад овоолго үүсгэхээр төлөвлөсөн.

Ашиглалтын 19 дэхь жилээс ордын баруун урд хэсгээс эхлэн дотоод овоолго тус тус үүсгэнэ.

1.4 Дэд бүтэц

1.4.1 Уурхайн барилга байгууламж

Уурхайн талбайд ажилчдын ажиллаж, амьдрах бүрэн боломжтой ажилчдын байр, оффис, гал тогоо, ногоон байгууламж, цэвэрлэх байгууламж гэх мэт байгууламжуудыг контейнер, сэндвичин материалаар барьж байгуулсан байна. Харин уурхайн үйл ажиллагаанд шаардлагатай барилга байгууламжид засварын цех, хамгаалалтын албаны байр, сэлбэг материалын агуулах, зоорь, ШТС, гүний худаг, сайжруулсан шороон зам зэргийг багтаасан.

2028 оноос хүчин чадал нэмэгдэхтэй холбоотой барилга байгууламжийг нүүлгэн уурхайн баруун хойно шинээр барихаар төлөвлөв..

Хүснэгт 4.Уурхайн барилга байгууламж

№	Хөрөнгийн нэр	Төрөл
1	Ажилчдын байр	Контейнер
2	Оффис	Сендвич
3	Цайны газар	Контейнер
4	Шатахуун түгээх станц	Сендвич
5	Сэлбэгийн агуулах, засварын газар	Сендвич
6	Харуулын байр	Сендвич

Уурхайн оффис

Уурхайн оффис нь ажилчдын байртай зэрэгцээ байрлах бөгөөд ажилчдад нарьяд өгөх болон сургалт зохион байгуулах заал, инженер техникийн ажилчдын ажлын өрөө, хурлын өрөө, зэргээс бүрдэнэ

Зураг 5.Одоогийн уурхайн кемп №1

Зураг 6.Одоогийн уурхайн кемп №2

1.4.2 Усан хангамж

<u>Ордын гадаргын болон газар доорх усны судалгаа;</u> Ажлын явцад хайгуулын цооногуудаас 3.8-30.8 м-ийн гүнд усны ундаргын дээд түвшин тогтоогдсон ба нүүрсний давхраасны ул хүртэл ус алдалт явагдаж байсан. Энэ ус нь зөвхөн доод цэрдийн уст давхаргатай холбоо бүхий хөрсний ус юм. Доод цэрдийн ус агуулагч чулуулаг нь сул барьцалдсан хөрзөн чулуу, гравелит, элсэн чулуу, нүүрс бөгөөд уст давхаргаас ашиглагдаж буй худгуудын ундарга 0.5 л/с хүрнэ.

Орд орчимд байнгын урсдаг гол, горхи талбайн хэмжээнд байхгүй, харин өвөл, зуны аль ч улиралд байнга устай багахан зайд урсаж хөрсөнд шургаж шингэдэг жижиг булгуудтай. Энэ булгуудаас Баянхошуу худаг 20.0 л/цаг, Мөсөн худаг 20.0 л/цаг ундаргатай байдаг. Гидрогеологийн судалгаагаар ордын хэмжээнд 2-3 уст үеүд агуулагдах ба эдгээрийг шаварлаг хурдаснууд тусгаарлана.

Уст үеүд хоорондоо гидравлик холбоотой учир нэг уст цогцолбор үүсгэнэ. Газар доорх ус нь гидравлик шинжээрээ чөлөөт гадаргатай бөгөөд агаарын хур тунадас, тэжээгдлийн мужаас тэжээгддэг. Судалгааны районд ижил настай доод цэрдийн нүүрс агуулсан хурдасны шавхалт-туршилтын ажлын үр дүнгээс үзэхэд цооногийн ундарга 2.3-4.0 л/сек, түвшний бууралт 1.1-2.94 м, хувийн ундарга 0.8-3.6 л/сек. Уст давхаргын зузаан дунджаар 6.0 м/хоног, ус дамжуулалтын итгэлцүүр 237-687 $м^2$/хоног, усны түвшин дамжуулалтын итгэлцүүр 2.7x103-4.0x103 $м^2$/хоног байна. /ТЭЗҮ-56-р хуудас/

Ашиглалтын 1 дүгээр жилд хоногт 472.8 $м^3$, цагт 19.7 $м^3$ ус шавхах, 2-5 дугаар жилд хоногт 703.2 $м^3$, цагт 29.3 $м^3$ ус шавхах, 6-10 дугаар жилд хоногт 467.5 $м^3$, цагт 19.5 $м^3$ ус шавхах тооцоолол гарч байна.

1.4.3 Шатахуун түгээх станц

Уурхайн үндсэн болон туслах тоног төхөөрөмж, мөн дизель түлшээр ажилладаг бүх тоног төхөөрөмжүүдийн тасралтгүй ажиллагааг хангах, уурхайн үйл ажиллагааг зогсолтгүй найдвартай байлгахын тулд ШТС-ийг байгуулан ашиглаж байна. ШТС-ийн шатахууны нөөцийг хамгийн багадаа 30 хоногийн нөөцтэй байлгана.

2025 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний цар хүрээ

Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго, зорилт

БОМТ-ний гол зорилго нь үйлдвэрийн үйл ажиллагааны хүрээнд 2025 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны хяналт, хамгааллын ажлыг багцалж эрх бүхий байгууллагаар батлуулах, гүйцэтгэлийг хангуулж хуульд заасан хугацаанд хэрэгжилтийг тайлангахад оршино. БОМТ үндсэн зорилгынхоо хүрээнд 2025 онд дараах үндсэн ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах
- Үйлдвэрийн орчинд ногоон бүс тохижуулах
- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж осол эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээ авах
- Хог хаягдлын оновчтой менежмент хэрэгжүүлэх
- Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
- Байгаль орчны хамгаалахад удирдлагын оновчтой бодлого төлөвлөж хэрэгжүүлэх
- БОМТ-ний биелэлт, дүүргийн захиргаатай байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлтийг орон нутагт тайлагнах зэрэг ажил болно.

БОМТ-ний хамрах хүрээ

Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх 2025 оны БОМТ-г боловсруулахад БОАЖСайдын 2019 оны А/618 тоот тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, биелэлтийг тайлагнах” журмыг мөрдсөн ба төсөл нь “Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэл”-ийн төслийн ангилалд хамаарна.

БОМТ-ний нийт зардал, түүний бүтэц

2025 оны БОМТ-г хэрэгжүүлэхэд нийт 28.96 сая төгрөг төсөвлөгдөж байгаа ба түүний 60.0 хувийг орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд, 10.0 хувийг дүйцүүлэн хамгаалалын менежментийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зориулна.

Хүснэгт 5. 2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нийт зардал

д/д	Мэдээллийн төрөл	Мэдээлэл оруулах багана
1	1. Тухайн жилийн байгаль хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний нийт төсөв	**28 960 000 төг**
	2. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төсөв	1 100 000 төг
	3. Нөхөн сэргээх арга хэмжээний төсөв /техникийн, биологийн/	3 750 000 төг
	4. Дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээний төсөв	2 986 000 төг
	5. Түүх соёлын өв хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	-
	6. Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө	2 800 000 төг
	7. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө	900 000 төг
	8. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах төсөв	Дотоод төсөв
	9. Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөв	Дотоод төсөв
	10. Тухайн жилийн орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийн нийт төсөв	17 424 000 төг

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГОЛ ЗОРИЛТ

“Премиум көүл корпораци” ХХК нь хүрэн нүүрсний ордын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд байлгах улмаар үүссэн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, болзошгүй аюул эрсдэлийг гаргахгүй байх тал дээр зорилт тавин ажиллаж байна.

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Урьдчилан тооцсон төсөв	Хэрэгжүүлэх хуваарь			Хариуцсан албан тушаалтан	Тайлбар
			2025 он				
			Сар 08	Сар 09	Сар 10		
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах	Дотоод төсөв	захиалга	хүлээлцэх		Байгаль орчны мэргэжилтэн	
	Нийт	-					

СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“Премиум көүл корпораци” ХХК нь хүрэн нүүрсний ордын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд байлгах улмаар үүссэн сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг төлөвлөлөө.

Хүснэгт 6.Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Сөрөг нөлөө үүсгэх хүчин зүйл	Байгалийн бүрдэл хэсэг	Гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээ	Хэрэгжүүлэх цар хүрээ	Зардал сая.төг (Эхний жил)	Зардал сая.төг (1 жил)	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах стандарт, аргачлал
Үйл ажиллагааны үе шатанд	Агаарын чанар	• Ордыг ил аргаар олборлох үйл ажиллагааны үед тоосжилт бий болох	• Зам талбай, овоолго, тоос босох гадаргууг усалгаа хийж тоосжилт бууруулах арга хэмжээ авах Зам талбай, овоолго гэх мэт тоос босох гадаргууг хөрс барьцалдуулагч шингэнээр нягтаршуулах, ургамалжуулах зэрэг тоосжилт бууруулах арга хэмжээ авах Тээврийн хэрэгслийн хурдны хяналтыг мөрдөж ажиллах, хурд хязгаарлах тэмдэг тэмдэглэгээг тавьж өгөх, засаж	Уурхайн талбайд	500.0		Төслийн хугацаанд	-

			сайжруулж байх				
	Гүний ус	• Шатах тослох материал алдагдах үед авах яаралтай арга хэмжээг урьдчилан тодорхойлж урьдчилан сэргийлэх	• Spill kit асгаралтын иж бүрдэл байрлуулах https://hsct.mn/ • Унд ахуйн хэрэглээнд ашиглах усыг арвилан хэмнэх, ус хэмнэлтийн менежментийг хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулах • Төслийн хэрэгцээг хангах усны гүний худагт тавьсан тоолуурын бүрэн байдлыг тогтмол шалгах • Гүний худгийн усны түвшинг тогтмол хэмжиж байх • Гүний усны чанарын үзүүлэлтийг шинжлүүлж, хяналт тавих • Шүүрлийн усыг шавхах цооногуудад хяналт тавих • Унд ахуйн эх үүсвэрт	Төслийн хүрээнд	500.0	Нэг удаа	Усны тухай хууль MNS 2662-2002 БОННҮ, 2025он Байгаль орчны аудит, 2024 он, 52-р хуудас

			хамгаалалтын бүс тогтоох • Бохир жорлонгуудыг стандартад нийцүүлэх				Байгаль орчны аудит, 2024 он, 52-р хуудас
	Хөрсөн бүрхэвч	• Техникийн нөхөн сэргээлтийг арга зүйн дагуу хийгээгүй тохиолдолд хөрсөн бүрхэвч доройтох, нөхөн сэргээх чадвараа алдах	• Техникийн нөхөн сэргээлтийг хийх • Машин техникийн хөдөлгөөний хурдыг бага байхаар барьж ажиллах • Шатах, тослох материал, ажилласан тосны хаягдал гэх мэт аюултай хог хаягдлын бүртгэл гаргах • Засварын газар болон ШТС-ын газруудыг хатуу хучилттай болгох • Барилгын том овортой хог хаягдал болон хүнд даацын сэлбэгийг хөрсөн дээр байршуулахгүй тодорхой хэсэг бүхий цэмэнтэлсэн газар төвлөрүүлж байх	Уурхайн талбайд	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд тусгасан		MNS “5917:2008” БОННҮ, 2025 он БОННҮ, 2025 он Байгаль орчны аудит, 2024 он, 53-р хуудас Байгаль орчны аудит, 2024 он, 53-р хуудас

	Ургамалан нөмрөг	• Уурхайн үйл ажиллагаанаас ургамалан бүрхэвч доройтох	• Шимт хөрсний овоолгыг стандартын дагуу байгуулах, хамгаалах	Уурхайн талбайд	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд тусгасан			MNS 5918:2008
	Амьтны аймаг	• Уурхайн ухаш болон уурхайн талбайд зэрлэг амьтад нэвтрэх, улмаар нүх рүү унаж гэмтэх, хог хаягдлаас хордох	• Ажилчдад амьтны тухай хууль, байгаль хамгаалах талаар сургалт хийж байх	Бүх ажилчид	Урсгал зардлаар		Төслийн хугацаанд	• Амьтны тухай хууль
		• Амьтан хамгаалах	Шувууны шувууны суулт 2 ширхэг /үүр/ суурилуулах, эвдэрсэн тохиолдолд засварлах	Уурхайн гадна бүсэд	100.0	100.0	2 удаа	Амьтны тухай хууль
Нийт						**1100.0 (Нэг сая нэг зуун мянган төгрөг)**		

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Нөхөн сэргээлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх зорилгоор өөрийн талбайн 10%-иас доошгүй талбайд мод тарьж зүлэгжүүлэх, Тарьж ургуулсан модоо хамгаалж хашаа барих,	- 100ш мод - 10000мкв зүлэгжүүлэлт	ш	100 10000мкв	2500 (нэг суулгацын үнээр)	2500*100=250,000 10000мкв зүлэгжүүлэлт 1,0000,000	-	MNS 5918:2008. Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага
2.	Төсөл хэрэгжүүлэгч нь Тэрбум мод тарих аяны хүрээнд Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутагт ашиглалтын жилүүдэд жил бүр 1000 мод тарихаар сум орон нутагтай зөвшилцсөн.	- 1000ш мод тарих	ш	1000	2500 (нэг суулгацын үнээр)	2500*1000=2,500,000	-	MNS 5918:2008. Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага
3.	Шимт хөрсийг стандартын дагуу хадгалах хамгаалах					Дотоод төсөв		MNS 5916 : 2008 Байгаль орчин, Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт, хадгалалт
Нийт						**3750.0**		

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт	Хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Эвдэрч орхигдсон газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийх	Түвшинширээ сумын Бумбат нэртэй х.ө 46^{0} 23’ 53.14” з.у 111^{0} 36’ 39.40”	Орон нутагт	1га	-	2986.0	2025 онд	МУ-ын Шадар сайд, БОАЖС, УУХҮС, ХЗДХС нарын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн нөхөн сэргээлтийн нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах 167, А/698, А/336, А/242 хамтарсан тушаал
	Нийт					2986.0		

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төслийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд зайлшгүй нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай асуудал байхгүй байна.

ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төслийн хэрэгжилтийн явцад ямарваа нэгэн түүх соёлын дурсгалт зүйл олдох үед холбогдох хууль тогтоомжинд заасны дагуу засаг захиргааны байгууллага болон холбогдох байгууллага болох ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнд даруй мэдэгдэж төслийн үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсооно.

ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Болзошгүй аюул осол, сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж
Хээрийн түймэр уурхайн талбай, кемп рүү орж ирэх, уурхайн хээрийн түймэрт өртөх	Хээрийн түймрээс сэргийлж уурхайн талбайг тойруулан зурвас, далан байгуулах	Үйл ажиллагааны зардалд	Жил бүр
Түлшний агуулах, засварын газар, ажилчдын байр, цахилгаан үүсгүүр бүхий газруудад гал түймэр гарах магадлалтай. Мөн хаврын хуурайшилт ихтэй өдрүүдэд тамхины цог зэргээс хээрийн түймэр гарч болзошгүй	Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаах дүрэм, журам боловсруулж мөрдлөг болгон ажиллах	Дотоод журам	2025 он-2029 он
	Галын дохиолол, гал унтраах багаж хэрэгслийг шаардлагатай газруудад байрлуулах	Үйл ажиллагааны зардалд	Жил бүр
	Гал түймрээс сэргийлэх талаар анхааруулга, санамжийн хуудас хийж, шаардлагатай газруудад нүдэнд харагдахуйц газруудад байрлуулах	Үйл ажиллагааны зардалд	Жил бүр уурхай эхлэх үед

Болзошгүй аюул осол, сөрөг нөлөө	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж
Жолооч нарын санамсар болгоомжгүй үйлдлээс машин техникүүд мөргөлдөх, хүн амьтан дайрах, мөргөх зэргээр гэмтээж бэртээх гэх мэт осол аваар гарах	- Жолооч нарыг аюулгүй ажиллагааны сургалтанд хамруулах - Анхааруулга, замын тэмдэг тэмдэглэгээг шаардлагатай газруудад байрлуулах - Уурхайн талбай дотод таних тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах зардалд тусгасан	Жил бүр, жилд 1 удаа
Ажилчид болон үйлчлүүлэгчий бие өвдөх, халдварт өвчин гарах	-Ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэг	2800.0	Жилд нэг удаа
Нийт зардал		**2800.0**	

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

№	Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэмжих нэгж	Нэгжийн зардал, төг	Тоо хэмжээ	Нийт зардал, мян. төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ахуйн	Хог хаягдал хадгалах зориулалтын түр хадгалах цэгт хогийн савыг 3-аас доошгүй төрлөөр ялгаж хаях, сумын ТҮК-тэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр ачуулж хаяулах шаардлагатай Хуванцар, УЗОБ материалыг (дугуй, хуванцар сав, лааз, шил, сав баглаа) ангилан ялгаж дахин боловсруулах нэг цэгт хүргэж өгөх Хог хаягдлын бүртгэлийн дэвтэр үүсгэх	Түр хадгалах хог хаягдлын цэг	-	300.0	2удаа ачуулах	600.0	2025 оны 7, 10 сарууддад	Хог хаягдлын тухай шинэчилсэн хууль 2017.05.12 Байгаль орчны аудит, 2024 он, 54-р хуудас
					300.0	1удаа хүргэх	300.0	2025 оны 10 сард хүргэх	

2.	Аюултай	Аюултай хог хаягдал аккумлятор, ашигласан тос маслыг цуглуулах түр хадгалах зориулалтын агуулах бүхий хаягдлын цэг бий болгох, болзошгүй тохиолдолд асгарсан бодис орчинд тархахааргүй хязгаарлагч, хуримтлуулагчтай болох Аюултай хог хаягдал зайлуулах, устгуулах мэргэжлийн тусгай зөвшөөрөл бүхий компанитай гэрээ байгуулах	Түр хадгалах хог хаягдлын цэг	-	-	-	Дотоод төсөв	2025 оны 9 сард	Аймгийн 2024 оны хяналтын хуудас дээр заасан чиглэл, Байгаль орчны аудит, 2024 он, 54-р хуудас
3	Шингэн	Төслийн шингэн хог хаягдал бүхий бохир усыг бага оврын цэвэрлэх байгууламж байгуулах	Бага оврын цэвэрлэх байгууламж				Дотоод төсөв	2025 оны 9 сард	Байгаль орчны аудит, 2024 он, 52р хуудас
	Нийт						900.0		

Төслийн үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдлыг эх үүсвэрээр нь барилгын болон ажилчдын буюу ахуйн гэж хоёр ангилна. Шинж чанараар нь хатуу, шингэн, хий гэж хувааж болно.

Төслийг хэрэгжүүлэх явцад барилгын ажилчдын түр суурин байгуулах ба үүсэн гарах ахуйн хог хаягдлыг дараах журмаар зохицуулна. Ялгаатай гурван өнгийн хог ангилан цуглуулах савыг барилгын ажилчдын түр сууринд байрлуулна. Доорх хүснэгт үзүүлсэн хаяг болон зааврыг сав бүрд байрлуулна. Эдгээр саванд хогийг зааврын дагуу ангилан хийж байгаа эсэхэд тухайн төслийн байгаль орчин эсвэл эрүүл ахуйн мэргэжилтэн хяналт тавьж ажиллана.

	Өнгийн шил, гэрлийн шил, толь, цонхны болон бусад шил хийхийг хориглоно!!!!
	Цаас болон бусад сонин сэтгүүл, цаасан хайрцаг, уут гэх мэт цаасан бүтээгдэхүүн, ус үл нэвтрүүлэх хайрцгууд. Эдгээрийг хогийн саванд хийхийн өмнө хавтгайлж нугалж хийнэ!!!
	Төмөр, хуванцар сав, баглаа боодол болон хуванцар сав хийнэ. Резин болон гялгар эдийг хийхгүй!!!

Зураг 7.Хогийн савны төрөл

Хогийн саванд тавигдах шаардлага: (Хог хаягдлын тухай хууль)

15.1.1.хог хаягдлыг ангилах, ачих, цуглуулах технологид нийцсэн;

15.1.2.галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн;

15.1.3.хог хаягдал салхиар тархах, хур тунадасны ус хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас сэргийлсэн.

Хог хаягдал түүнийг цэвэрлэх, зайлуулах болон зохицуулах хэлбэр:

- Хог хаягдлыг орон нутгийн нэгдсэн хогийн цэгт нийлүүлэх талаар гэрээ байгуулж, холбогдох татвар хураамжийг цаг хугацаанд төлөх
- Ангилсан хог хаягдлаас боломжтой хэсгийг хоёрдогч түүхий эдийн цэгүүдтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр тогтмол тушаана.
- Барилгын ажлыг гүйцэтгэх явцад гарах хатуу хог хаягдлыг мөн түр цуглуулах цэгийг байгуулж хамгаалалтын хашаа, бункерт хийнэ. Ингэхдээ хууль, журмын дагуу энгийн, хяналттай, аюултай шинж чанараар нь ангилж хадгална. **Үүнийг хог хаягдал тээвэрлэх, устгах тусгай зөвшөөрөл**

бүхий аж ахуй нэгжүүдтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр тушааж байна. Төслийн хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн хог хаягдлыг тушаасан талаарх тэмдэглэлийг тогтмол бүртгэнэ.

- Шатах тослох материалын сав, ахуйн цэвэрлэгээ, ариутгалын бодисын сав, баглаа боодлыг мөн тусад нь цуглуулна.
- Шингэн хаягдал болон бохирын асуудлыг Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын дагуу бохирыг соруулж зөөвөрлөх боломжтой байхаар зохион байгуулах
- Бохирыг соруулах, зөөвөрлөх эрх бүхий байгууллагатай гэрээ байгуулж хамтран ажиллах.

ОРЧНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Сөрөг нөлөөллийн тархалт, эрчмийг хянаж байх зорилготой орчны хяналт- шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд

Уул уурхайн экологийн хяналт, удирдлагын арга хэмжээ

- Уул уурхайн олборлолтоос үүсэх тоосжилтоос хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулахад тавих шаардлага
- Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэх хаягдал ахуйн хаягдал болон хаягдал шатах тослох материал нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад тавигдах шаардлагыг хангахад орчны хяналт шинжилгээг чиглүүлнэ.

№	Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хугацаа ба давтамж	Давтамжийн тоо	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг	Тайлбар	Баримтлах стандарт, арга, аргачлал
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ажлын байрны орчин								
1	Уурхайн ухашаас үүсэх агаарын бохирдол	Ухаш, тээврийн зам	Жилд 1 удаа 8сард	2 байршилд	500,000.0	2,000,000.0	Мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.	• MNS 6783:2019 • MNS 5105:2001
2	Уурхайн агаарын тоосжилт	Ухаш, тээврийн зам	Жилд 1 удаа 8сард	2 байршилд				
Усны хяналт шинжилгээ								
3	Унд, ахуйн усны чанарын хими	Гүний худаг	Жилд 1 удаа 9 сард	Гүний худгаас	420,000.0	420,000.0	магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилүүлнэ.	• MNS 6783:2019 • MNS 5105:2001
4	Унд, ахуйн усны чанарын микробиологи	Гүний худаг	Жилд 1 удаа 9 сард	Гүний худгаас			магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилүүлнэ.	• MNS 6783:2019 MNS 5105:2001
Хүрээлэн буй орчны хяналт шинжилгээ								

6	Хөрсний нянгийн бохирдол буюу микробиологи	Уурхайн талбайд	Жилд 1 удаа 9 сард	2 байршилд	77,000.0	1,000,000.0	магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторид мэргэжлийн байгууллагаар дээж авхуулж шинжлүүлнэ	-
7	Хөрсний хүнд металлын бохирдол	Засварын газар, хогийн цэг, түлшний цэг	Жилд 1 удаа 9 сард	3 байршилд	66,000.0	1,600,000.0		
8	Хөрсний ерөнхий шинжилгээ	Уурхайн талбай	Жилд 1 удаа 9 сард	2 байршилд	44,000.0	524,000.0		
	Хяналт мониторингийн судалгаа, ажиглалт, дээжлэлтийн хугацааг дээрх хүснэгт үзүүлсэн ба уул уурхайн байгаль орчны хяналт мониторинг хийх 12 сая төгрөг төсөвлөв.							
Нийт		**17,424,000.0**						

ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Урьдчилан тооцсон төсөв	Хэрэгжүүлэх хуваарь			Хариуцсан албан тушаалтан	Тайлбар
			2025 он				
			Сар 08	Сар 09	Сар 10		
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх	Дотоод төсөв	захиалга	Явцтай танилцах	хүлээлцэх	Гүйцэтгэх захирал	Аймгийн БОГ, БОУАӨЯ
2.	Тухайн жилийн байгаль орчны мониторинг хийлгэх	Гэрээний үнийн дүнгээр	захиалга	Явцтай танилцах	хүлээлцэх	Гүйцэтгэх захирал	Мэргэжлийн байгууллагаар
3.	Байгаль орчны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.7-т заасны дагуу байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн томилох	Дотоод төсөв	захиалга	Явцтай танилцах	хүлээлцэх	Гүйцэтгэх захирал	Захирлын тушаалаар
4.	Тээвэрлэлтийн маршрутыг батлуулж ажиллах, зам ашигласны төлбөр хураамж төлөх	Дотоод төсөв	захиалга	Явцтай танилцах	хүлээлцэх	Гүйцэтгэх захирал	

5.	Гадаад тээврийн авто замын Засгийн газрын 2018 оны 379 дүгээр тогтоолын дагуу тусгай зориулалтын авто зам барьж байгуулж ашиглах	Дотоод төсөв	захиалга	Явцтай танилцах	хүлээлцэх	Гүйцэтгэх захирал	
6.	Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг 5 жил тутамд мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх	Дотоод төсөв	захиалга	Явцтай танилцах	хүлээлцэх	Гүйцэтгэх захирал	БОННҮ 169-р хуудас
7.	Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авах	Дотоод төсөв	захиалга	Явцтай танилцах	хүлээлцэх	Гүйцэтгэх захирал	БОННҮ 169-р хуудас
8.	Буйр мэнэнгийн сав газрын тушаал гаргуулах, гэрээ хийх	Дотоод төсөв	захиалга	Явцтай танилцах	хүлээлцэх	Гүйцэтгэх захирал	Байгаль орчны аудит, 2024 он, 52р хуудас
9.	Ус ашиглалтын тайлан, мэдээг холбогдох төрийн захиргааны байгууллагад гаргах	Дотоод төсөв	захиалга	Явцтай танилцах	хүлээлцэх	Гүйцэтгэх захирал	Байгаль орчны аудит, 2024 он, 52р хуудас
	Нийт	Дотоод төсөв					

ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	БОМТ, БОМТ-ний хэрэгжилтийг тайлагнахад оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Зохион байгуулах хугацааны тов	Тайлагнах зардал, төг	Хариуцан зохион байгуулах албан тушаалтан/ажилтан	Зохион байгуулах газар
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Явуулж буй үйл ажиллагааныхаа талаар сумын төвийн болон тухайн нутгийн малчдад багийн иргэдийн хурлаар танилцуулах	Цаасан	Тухайн онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө	2025.09	-	Гүйцэтгэх захирал	Орон нутаг
2.	Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх ажлын гэрээнд байгаль орчныг хамгаалах, уурхайн бүтээн байгуулалттай холбоотой дэд бүтэцийг сайжруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх ажлуудыг нэмж тусгах	Цаасан	Нийгмийн хариуцлагын гэрээ	2025.09	-	Гүйцэтгэх захирал	Орон нутаг
	Нийт				Дотоод төсөв		
