ГАРЧИГ

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА.....2

1.1. Төслийн ерөнхий мэдээлэл 2

1.2. Төсөл хэрэгжүүлэх талбайн байршил: 3

ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ.4

ГУРАВ. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЭЛЭЛТ 8

ДӨРӨВ. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....9

ТАВ. “ТЭРБУМ МОД” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН.....11

ЗУРГАА.НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....17

ДОЛОО.ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....17

НАЙМ. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....18

ЕС. ОСОЛ, ЭРСДЭЛ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 23

АРАВ. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР.....31

АРВАН НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....34

ДҮГНЭЛТ.....34

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1.Төслийн ерөнхий мэдээлэл

№	Үзүүлэлтүүд	Утга
1	Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага	“СУУРЬ” ХХК
2	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, 2-р хороолол, Өөрийн байр-00
3	Төслийн нэр	Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутагт орших “Дархан толгой” нэртэй барилгын чулууны орд
4	Хүчинтэй хууль эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт	а. ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ: Улсын бүртгэлийн дугаар: 9911010080 Улсын регистрийн дугаар: 2041588 Улсад бүртгүүлсэн: 2006.05.18 б. Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл: Дугаар: MV-005806 Олгосон огноо: 2007.01.29
5	Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбилцол	Талбай: 46 га Газар зүйн солбилцол: (L-48-11) 1. 105° 58’ 11.12” 49° 31’ 0.97” 2. 105° 58’ 45.12” 49° 31’ 0.97” 3. 105° 58’ 45.12” 49° 30’ 38.97” 4. 105° 58’ 11.12” 49° 30’ 38.97”
6	Ордын тоосгоны шаврын анх батлагдсан геологийн бодитой (В) нөөц	3571.8 мян.м^3
7	Үйлдвэрлэлийн нөөц	357.0 мян.м^3
8	Жилийн хүчин чадал	Олборлолт: 18.0 мян.м^3
9	Ордын ашиглалтын хугацаа	36.3 жил
10	Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт	1724.94 сая.төг

1.2.Төсөл хэрэгжүүлэх талбайн байршил:

“Дархан толгой” барилгын чулууууны орд нь Улаанбаатар хотоос хойд зүгт 240 км, Дархан-Уул аймгийн төвөөс зүүн хойш 4.0 км, Улаанбаатар, Дархан, Сүхбаатарын цардмал авто замаас 1.5 км MV-005806 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 46 га талбайд оршино.



Зураг 1. Төсөл хэрэгжих талбайн байршил

1.3.Уурхайн хүчин чадал

Уурхай нь жилд 125.0 мян.м^3/жил барилгын чулуу олборлох ба 30.57 мян.м^3 хөрс хуулалтын ажил хийх ба жилд 155.57 мян м^3 уулын цулыг тэслэж ачих хүчин чадалтай.

Тус ордын +819-ээс түвшнээс дээш тооцсон уурхайн үйлдвэрлэлийн нөөц 4537.5 мян.м^3, төсөлд тооцсоноор 125.0 мян.м^3/жил чулуу олборлоно гэж үзвэл, энэ нөөцийг 36.3 жил ашиглана.

Үйлдвэрлэлийн ажиллах горим, ашиглалтын хугацааг уурхайн жилийн хүчин чадлаас хамааруулан тооцоолов. Ил уурхай нь улирлын чанартай дулааны улиралд (4-р сарын 1-

наас 11-р сарын 1 хүртэл) 7 сарын хугацаанд жилд 153 хоног, хоногт 1 ээлж, ээлжинд 7 цагаар ажиллана.

ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд 8 ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн байна.

Манай компаниас дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:

1. **Уурхайн карьер болон тээврийн гол замыг чийгшүүлэх, услах, дагтаршуулж байсан.**

Уурхайн гол замын зургийг доор үзүүлэв.



Зураг 2. Технилогын зам зассан байдал



Зураг 3. Техникийн нөхөн сэргээлт хийхээс өмнөх байдал

2. ОХШХ-ийн хүрээнд агаар, ус, хөрсний шинжилгээ хийлгэсэн. Шинжилгээний хариуг орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт үзүүлэв.

Уурхайн 4 цэгт хөрсний бохирдлын шинжилгээ хийлгэхэд бохирдолгүй гарсан. Харин хөрсний ялзмагийн хэмжээ нь баяжуулах үйлдвэр орчимд эрс багассан ба гол зам, уурхайн орчимд ялзмагийн агууламж нь дунд зэрэг багассан нь ажиглагдаж байна.

Уурхайн агаар орчин, худгийн усны шинжилгээ нь Монгол улсын стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс ер даваагүй бохирдолгүй гарсан байна. Шинжилгээг Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр хэсэгт үзүүлэв.

3. Баяжуулахын бутлуурыг тогтмол засч сайжруулан тоосжилтыг бууруулсан.

Тоос баригч тор байрлуулсан. Баяжуулах үйлдвэрт хийгдсэн сэлбэг материалын жагсаалтыг доор хүснэгтэд үзүүлэв.

Бутлуурт хийгдсэн сэлбэг материал

		2025 он
4.02	Бутлуур -1 м24 боолт 2ш	20,000
4.06	Холигч 1 ш	45,000
4.09	2-р бутлуурт ахилгааны ажлын хөлс	100,000
4.11	2-р бутлуурт цахилгааны материал	1,020,800
4.11	2-р бутлуурт цахилгааны материал	155,300
4.12	2-р бутлуурт кабель утас 6м	42,000
4.12	Бутлуурт сэлбэг	59,040
4.12	2-р бутлуур төгсгөвч кабель	30,600.00
4.14	1.2 -р бутлуурт сэлбэг татан авалт	3,550,000.00
4.15	Цахилгааны сэлбэг авсан /эрээн хотоос авсан/	1,900,000.00
4.15	2-р бутлуурт амперметр	17,500.00
4.16	Гагнуурын бээлий сэлбэг багаж /Автирка ком-25.0 /	133,100
4.16	Бутлуурт -1 Электрод 60/13	275,000
4.19	2-р бутлуурт кондакт 2ш	15,350
4.20	1-р бутлуур дээр хий 1ш	33,000
4.29	Цэнхэр товуд	77,000
4.30	Сэлбэг таталт нансаа	1,548,100
5.01	1-р бутлуурт резва 3ш	97,000
5.01	1-р бутлуурт гайх 60 ш	60,000
5.02	Хий 1 ши	33,000
5.03	Удирдлага-40.0 кабель	68,500
5.08	1-р бутлуурт 32 боолт гайх	68,750

5.09	Хуягны үлдэгдэл төлбөр	1,710,940
5.10	1-р бутлуурт электрод	70,000
5.10	1-р бутлуурт боолт цолмон	80,000
5.11	1-р бутлуурт Төмрийн шрүп	60,000
5.13	1-р бутлуурт 32- боолт м-24 боолт гайх шаав	56,700
5.16	Гагнуурын бээлий	47,850.00
5.16	Гагнуурын электрод	10,000.00
5.17	Ханын хадаас том жижиг	8,000
5.17	Бутлуур-1 Маск -32к Тасдагчийн ир -95к /05.17-ны 8к хамт шивэгдсэн/	127,000
5.17	Бутлуур-1 Электрод 60-13	220,000
5.20	1-р бутлуурт Электрод	70,000
5.22	Удирдлагын батерай	61,000
5.24	Бут-1 Дулааны реле	32,000
5.25	Бут-1 Дулааны реле	28,000
5.30	Электрод 5ш	135,000
6.05	Сальник 2ш	12,000
6.08	5 м кабель	37,500
6.09	Бутлуурт жижиг тасдагчийн зөөлөн ир	45,000
6.11	Бут-1 резва сэлбэг	212,300
6.19	Бутлуур-1 засварын ажилд товуд	77,000
6.19	Бутлуурт-1 засварын ажилд ремен	99,000
6.20	Бутлуур -1 22мм торны үнэ	1,675,000
6.26	Бутлуур -2 цахилгаан засварт автомат	49,500
6.26	Бутлуурт сэлбэг хуяг болон хуягны боолт	1,280,000
6.28	Бут -2 ремен	138,600
6.28	Бутлуурт сэлбэг	1,446,300
7.01	Бутлуур -1 Төмөр шрүп	60,000
7.03	Бутлуур -1 сэлбэг	11,000
7.03	Бутлуурт сэлбэгний материал	232,000
7.04	Бутлуурт-1 ширэмний электрод	110,000
7.09	Бутлуурт 5ш хуяг 20ш боолт	1,370,000
7.09	Бутлуурт Гайх 27 32 той /цолмонгоос авсан	130,000
7.09	Бутлуур -1 ремен	180,000
7.09	Бутлуурт-1 товуд	77,000
7.25	Цавуу А Б	5,500.00
7.27	Бутлуур 1 2 сэлбэг боолт	871,000
7.28	Бутлуурт сэлбэгний материал	226,500
8.03	Бутлуур -1 бутлуурын тор	3,894,500
8.04	Бутлуур-1 11 квт мотор	1,704,000
8.09	Бутлуур -1 засварт	65,000
8.11	Бутлуур-1 Шигшүүр сэлбэг	430,000

8.12	Бутлуур-1 засварт хуяг авсан	896,000
8.13	Бутлуур-1 засварт шайв	50,000
8.14	Бутлуурын сэлбэг төлөлт	606,000
8.29	Бутлуурт электрод	572,000
8.30	Бутлуурт-1 моторын шингэн	313,500
9.01	Шаариг 2ш	484,000
9.05	Бутлуурт-1 хуяг 4ш	752,000
9.09	Бутлуур -1 автомат	38,000
9.10	Бутлуурт цахилагаан пускатель толгой	205,000
9.10	Бутлуур-1 засварт товуд 2ш	154,000
9.12	Бутлуурын засварт товудын шприз	110,000
9.17	Бутлуурын засварт	154,000

4. Төсөлд хэрэглэгдэж буй тээврийн хэрэгслүүдэд оношлогоог тогтмол хийлгэж, тэдгээрт засвар үйлчилгээ хийж, түлшний зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэв.

Манай уурхай дээр Экскаватор, Автосамосвал, Утгуурт ачигч ажилладаг. Эдгээр тоног төхөөрөмжид үзлэг хийлгээгүй байна. Учир нь манай уурхай нь 2025 онд 125.0 мян.м3 барилгын чулуу олборлох байсанд 34.86 мян.м^3 хүдэр олборлосон бөгөөд 27.8 хувь гүйцэтгэлтэй ажилласан. Бид ихэнхи засвар үйлчилгээг баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг засч сэлбэхэд зарцуулсан бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор 2025 онд санхүүгийн бэрхшээлд тулгараад байсан. 2026 онд энэхүү ажлыг нөхөн гүйцэтгэх боломжтой байна.

5. Хүнд машин механизм явах замыг засаж сайжруулан, байгалийн хөрс бүхий замаар тээвэрлэлт аль болох бага хийх

Хүнд машин механизмын явах замыг тогтмол цэвэрлэж, засаж сайжруулж байв.

6. Хог хаягдлыг, тогтсон нэг цэгт төвлөрүүлж, ариутгах, зайлуулах арга хэмжээг төлөвлөсөн хугацаанд хийсэн.

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хэсэгт Хог хаягдлыг тогтмол хугацаанд зайлуулж байсан гэрээг хавсаргав. Ахуйн шингэн бохир дүүрэх бүр тухай бүр зайлуулж байсан ба Марз Зүрх Хайрхан ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлсэн.

7. Тоосжилтоос үүсэх дам нөлөөг багасгах үүднээс шаардлагагүй замуудыг хаах, усалгаа хийх, байнгын хяналт тавьж байх

2025 он хаах шаардлагатай зам гараагүй байна.

8. Мониторинг хийх газруудыг барьж байгуулах, үйл ажиллагаа эхлэх үед оновчтой сонгон нөлөөллийг хэрхэн бууруулах арга замыг боловсруулан шууд хэрэгжүүлж байх

Баяжуулах үйлдвэр орчим, Уурхайн олборлолтын цэг, тээврийн замын орчим, кемп орчим 4 цэгийг мониторингийн цэгээр сонгон авч хөрсний бохирдлын, зарим ерөнхий шинжилгээг хийж байна. хөрсний шинжилгээн дээр тулгуурлан явган хүний замыг нарийн тодорхойлж, ажилчдад тээврийн хэрэгслийг төлөвлөсөн хөдөлгөөний дагуу хөдөлгөхийг зааварлав.

Стандартын шаардлага хангасан 3 сая төгрөгийн өртөг бүхий эко бие засах цэгийг шинээр тусгай зөвшөөрөл бүхий “ЭКО нойл” ХХК-аар хийж гүйцэтгүүлэв.



Зураг 4. Төслийн талбай дээр байгуулсан эко бие засах газар

ГУРАВ. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЭЛЭЛТ

Харин 2025 онд уурхайн нь уурхайн гүн лүү олборлолт хийсэн ба шимт хөрс хуулаагүй, шимт хөрсний овоолго үүсгээгүй байна. Мөн 2025 онд тус уурхайд биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлт хийх талбай байхгүй. 2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвөгөөнд төлөвлөөгүй байна.

ДӨРӨВ. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй БОАЖЯ, УУХҮЯ, МХЕГ, ЦЕГ-уудын хамтарч буй “Нөхөн сэргээлт-2024-2026” арга хэмжээний хүрээнд Дархан-Уул аймгийн БОГ-аас хуваарилсан Дархан сумын 6-р багийн “Дархан толгой” уулын баруун урд байрлах эвдэрсэн нийт 4.43 га газрыг техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр харилцан тохиролцсон болно.

Уг нөхөн сэргээх талбай нь “Суурь” ХХК-ны А/5806 тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн ойролцоо буюу ертөнцийн зүгээр баруун хэсэг, уурхайн технологын замын дагуу урд өмнө ухагдаж эвдэрсэн талбайд 2024 онд 0,85 га талбайд шимт хөрс буулгуулан тарааж техникийн нөхөн сэргээлт хийлээ. Ирэх хавар зүлэг тарихаар төлөвлөгөөнд тусгагдсан.

2025 онд нөхөн сэргээлт хийх үлдэгдэл 3,58 га газрын 1,25 га талбайд 10-р сарын 18-наас 10-р сарын 23-ны хооронд техникийн нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэллээ.

Техникийн нөхөн сэргээлтийг өөрсдийн техник төхөөрөмжөөрөө хийж зардалыг дотоод үйл ажиллагааны зардлаас гаргав. 1,25 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтэнд 1,5 сая төгрөг зарцууллаа.

Жич:Нөхөн сэргээж буй ухагдсан талбайд дүүргэх хөрс, шороог зуучлан өгч, харилцаа холбоотой ажилдаг Аймгийн Захирагчын алба, БОГ-ын хамт олонд талархсанаа илэрхийлье.





Хүснэгт 1. 2024-2026 он хүртэл техникийн нөхөн сэргээлт хийх солбилцлын цэгүүд

№	И	Е
1	49°30’33.19	105°57’51.3
2	49°30’34.26	105°57’52.56
3	49°30’32.88	105°57’52.25
4	49°30’34.05	105°57’50.99
5	49°30’33.66	105°57’52.81
	Нийт талбай /м^2/	4,43

Хүснэгт 2. 2025 онд хийгдсэн техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн солбилцлын цэгүүд

№	И	Е
1	49°30’31.1	105°57’42.69
2	49°30’34.4	105°57’43.27
3	49°30’34.85	105°57’46.63
4	49°30’32.07	105°57’48.58
	Нийт талбай /м^2/	1,25 га

Хүснэгт 3. Ажилласан техник, хугацаа, нөхөн сэргээсэн талбайн хэмжээний үзүүлэлт

Нөхөн сэргээлтийн төрөл		**Ажилласан техник**	**Ажилласан хугацаа**	**Нийт төсөв**
Техникийн нөхөн сэргээлт	1,25 га	Lingong SDLG953N утгуурт ачигч	16 цаг	1,5 сая төг



Зураг 5. Техникийн нөхөн сэргээлтийн үед талбайг тэгшлэх, хэлбэржүүлэлт хийж буй байдал



Зураг 6. Шимт хөрсөөрталбайг хучиж буй байдал



Зураг 7. Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байдал

2025 оны 11 сарын 12-ны өдөр тус газрыг Дархан-Уул аймгийн Байгаль орчны газраас ажлын хэсэг гарган нөхөн сэргээлт хийсэн газрыг хүлээн авч эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийсэн газрыг хүлээж авах акт үйлдсэн байна.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
2023 оны 09 дүгээр сарын 06–ны өдрийн
А/439 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

ЭВДЭРСЭН ГАЗАРТ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙСЭН ГАЗРЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ АКТ

2025 оны 11 дүгээр сарын 12-ний өдөр

1. Байршлын мэдээлэл		
1.1.	Аймаг, нийслэлийн нэр	Дархан-Уул аймаг
1.2.	Сум, дүүргийн нэр	Дархан сум 6-р баг
1.3.	Газрын нэр	“Дархан толгой” уул
2. Нөхөн сэргээлт хийсэн байгууллагын мэдээлэл		
2.1	Нөхөн сэргээлт хийсэн аж ахуй нэгжийн нэр, регистр	**“Суурь” ХХК** Регистр: 2041588
2.2	Хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр	Техникийн нөхөн сэргээлтийг өөрсдийн техник төхөөрөмжөөрөө хийж зардалыг дотоод үйл ажиллагааны зардлаас гаргав. 1,31 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтэнд 1,5 сая төгрөг зарцууллаа. Жич: Ирэх хавар зүлэгжүүлэхээр 2026 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан болно.
2.3	Тус газрын эвдрэлд өртсөн шалтгаан	Зах зээлийн үеэр хууль бусаар түгээмэл тархцтай ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагаанаас шалтгаалж эвдрэлд орсон.
2.4	Тус талбайд нийт эвдрэлд өртсөн талбайн хэмжээ (га)	Аймгийн эвдэрсэн газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн Дархан сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Дархан толгой” уулын баруун урд хэсэгт эвдэрч орхигдсон 4.43га газраас - 2024 онд 0,85га, - 2025 онд 1,31га газруудыг нөхөн сэргээв.
2.5	Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй эсэх, зөвшөөрлийн дугаар	Нөхөн сэргээлт хийх эрх, зөвшөөрлийн дугаар байхгүй
3. 2025 онд хүлээлгэн өгч буй нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл		
Техникийн нөхөн сэргээлт - Талбайн хэмжээ (га) -2024 онд 0,85га - 2025 онд 1,31 га - Зардлын хэмжээ (төгрөгөөр) - 2024 онд 1 сая төгрөг - 2025 онд 1,5 сая төгрөг		Биологийн нөхөн сэргээлт - Талбайн хэмжээ (га) - Биологийн нөхөн сэргээлтэд ашигласан мод, сөөг, ургамлын зүйлийн нэр, ургамалжуулсан байдал - Зардлын хэмжээ (төгрөгөөр)

4. Орон зайн мэдээлэл

4.1 Нөхөн сэргээлт хийгдсэн газрын фото зураг

- Нөхөн сэргээлтийн явцын зургыг тайланд хавсаргав

4.2. Хэмжилт, зураглал

- Кадастрын зураглал хийсэн мэргэжлийн байгууллага болон хэмжилт хийсэн хүний нэр:

- Хэмжилтэд ашигласан программ, тоног төхөөрөмж,
Garmin etxex20 gps ашиглан хэмжилт хийсэн.
Мөн Google map ашигласан
- Холбогдох утас: 8812-0925, 9005-0395
Гарын үсэг:

4.3 Нөхөн сэргээлт хийсэн газрын солбицол

Жич: 4-өөс доошгүй эргэлтийн цэгийн солбицол байна.

№	E	И
	Техникийн нөхөн сэргээлт	
1	105° 57' 42.450" E	49° 30' 30.980" N
2	105° 57' 49.170" E	49° 30' 32.910" N
3	105° 57' 49.060" E	49° 30' 35.600" N
4	105° 57' 42.870" E	49° 30' 34.910" N
5		

Нөхөн сэргээлт хийсэн газарт хэмжилт хийж талбайн хэмжээг тогтоон полигон хэлбэрээр shape.file үүсгэн флаш болон CD-нд хуулж акттай хавсаргана.

5. Мэдээллийн сангийн бүртгэл

Нөхөн сэргээлтийг хүлээн авсан ажлын хэсэг нь Байгаль орчны мэдээлллийн сангийн www.eic.mn цахим системийн Нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн дэд санд заавал бүртгүүлнэ.

Жич: Мэдээллийн санд бүртгээгүй тохиолдолд нөхөн сэргээлтийг хүлээн авсан актыг хүчинтэйд тооцохгүй.

Мэдээлэл оруулсан хүний нэр, албан тушаал: А.Энхжин /БОГ-ын мэргэжилтэн/

Гарын үсэг:

Огноо: 2025.12.30

Нэмэлт мэдээлэл:

Нөхөн сэргээлтийн ажил нь холбогдох хууль, журам, стандартад нийцсэн талаарх ажлын хэсгийн дүгнэлт:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

АКТ ГАРГАСАН:

Комиссын дарга: ..... (гарын үсэг) — Г.Батбаяр (*Дархан Уул аймгийн Байгаль орчны газрын дарга*)

Нарийн бичгийн дарга: ..... (гарын үсэг) — А.Энхжин (*Дархан Уул аймгийн Байгаль орчны газрын газар, газрын хэвлий,нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн*)

Гишүүд:

..... (гарын үсэг) — Я. Батбилэг (*Дархан Уул аймгийн Байгаль орчны газрын Усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн*)

..... (гарын үсэг) — Б.Зам (*Дархан Уул* аймгийн цагдаагийн газрын экологийн асуудал хариуцсан эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ~~хошуучаа~~ газар хариуцсан)

..... (гарын үсэг) — Б.Гантуяа (Дархан Уул аймгийн Дархан сумын газрын даамал)

..... (гарын үсэг) — Г.Гантогтох (*Дархан Уул* аймгийн Дархан сумын байгаль орчны мэрэгжилтэн)

..... (гарын үсэг) — Д.Банзрагч (Дархан Уул аймгийн Дархан сумын байгаль хамгаалагч)

..... (гарын үсэг) — Н.Монхбаатар (Дархан сумын нутгийн иргэн)

ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН:


..... (гарын үсэг) — Х.Чинболд (“Суурь”ХХК-ийн захирал)

ТАВ. “ТЭРБУМ МОД” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд “Дархан-Карьер” ХХК нь Зулзагын голын нарсан ойг тэлэх, эвдэрсэн газрын ургамалжуулах, ойжуулалтын ажлыг хийхээр шалгарсан мэргэжлийн байгууллага болох "Батбадрах Дэлгэр" ХХК-д 300 ширхэг шилмүүст төрлийн мод, бут тариулахаар 5 сая төгрөгийг тус компаний дансанд шилжүүлж, мод тариулж байна.

Хүснэгт 4. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хийгдсэн ажил

Тарих модны тоо ширхэг	Арга хэмжээний цар хүрээ	Нийт зардал	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж
300 ш	0,25 га	5000,0 сая. төг	2025

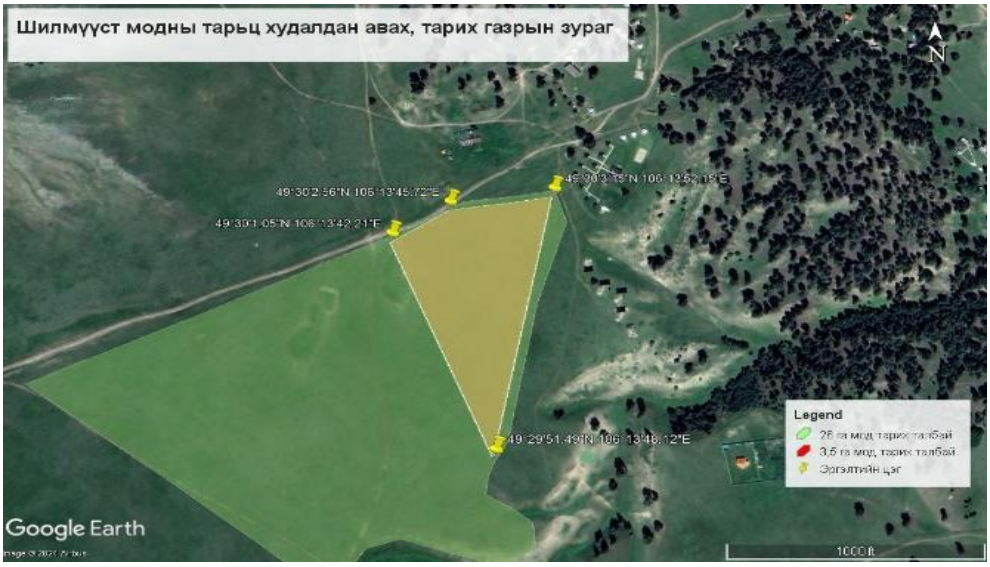

Зураг 8. Тарих газрын байршил



Зураг 9. Тарилт хийсэн талбай







Зураг 10. Мод тарьж буй байдал



Зураг 11. Мод тарьж буй байдал

ЗУРГАА.НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Тухайн төслийн үйлдвэрийн бүсэд иргэд, оршин суугчид, айл өрх, байгууллага байхгүй байна. Иймд нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө тусгагдаагүй болно.

ДОЛОО.ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Уурхайн ашиглалтын үйл явцад уурхайн үйл ажиллагааг түр зогсоон зохих байгууллагад мэдэгдэж, түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах ажлыг зохион байгуулах болно.

Тус уурхайн ашиглалтын үйл явцад түүх соёлын дурсгалт зүйлс олдвол олоогүй болно.

НАЙМ. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хог хаягдлын гэрээг байгуулж, хуваарийн дагуу тогтмол тээвэрлүүлсэн. /Хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх гэрээ болон санхүүгийн баримтыг хавсаргав./ Дархан-Карьер ХХК нь Суурь ХХК-тай туслан гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

БАТЛАВ:
“ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР ОНӨААТҮ ГАЗАР-ЫН”
ДАРГА_____Л.ОТГОНБАЯР

БАТЛАВ:
“Дархан-Карьер ХХК” ТӨХК-ийн ЗАХИРАЛ /ДАРГА/
_____Р.Отгонбаяр

ХОГ ХАЯГДАЛ АЧИЖ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

2025 оны 5 сар 7 өдөр №..... Дархан-Уул аймаг

Иргэн, ААН байгууллагын нэр	Дархан-Карьер ХХК	
Регистерийн дугаар	4250125	
Үйл ажиллагааны чиглэл	Уул уурхай, чулуу бүтээгдэхүүний үйлдвэр	
Иргэн, ААНБ-ын хаяг	Дархан сум 6р баг Баянцагаан А-446	
ААНБ-ын холбогдох утас	99060958, 99047005	
Данс	Хаан банк 5108479620	
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төрөл	Сард .M^3-15.000төгрөг	Рейсийн тоогоор 1 рейс ..... Төгрөг
Гэрээний хугацаа	2025 оны 5-р сарын 7-ны өдрөөс 2025 оны 12-р сарын 31-ны өдөр хүртэл	
Гэрээний сунгалт	20..... оны .....-р сарын .....ны өдрөөс 20..... оны .....-р сарын .....ны өдөр хүртэл	

Гүйцэтгэгч талаас “Дархан Хотын Хог Тээвэр” ОНӨААТҮ Газар-ыг төлөөлж Ахлах байцаагч Ганзориг овогтой Баярмаа Нөгөө талаас Рабнаа овогтой Отгонбаяр /цаашид захиалагч тал гэх/ нар нь "Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хууль", "Зөрчлийн тухай хууль" эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудыг үндэслэн харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээний зорилго нь гүйцэтгэгч тал нь ААНБ-аас гарч байгаа ахуйн болон аюултай, эрсдэлтэй хог хаягдлыг гэрээнд заасан хугацаанд ачиж тээвэрлэх түрж булж устгах, захиалагч тал нь гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрийг төлөх болон байгууллага хоорондын ажлын уялдааг сайжруулж хариуцлагыг дээшлүүлэхэд оршино.

Хоёр. Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

2.1 Захиалагч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй

2.2 Хог хаягдал тээвэрлэсний хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулахыг шаардах эрхтэй

2.3 Хог тээврийн машин орж ачих боломжгүй байршилд байгаа, тогтоосон цэгт төвлөрүүлээгүй, хог тээврийн хураамжаа тайлант хугацаанд төлөөгүй, хуримтлагдсан өртэй ААНБ-ын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.

2.4 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжуудыг үндэслэн хог хаягдлаа ачиж тээвэрлүүлэх, зориулалтын зөвшөөрөгдсөн цэгт хаяхыг шаардах эрхтэй

2.5 Хог хаягдлыг дуудлагаар буюу графикт хугацаанд гэрээний дагуу ачих үүрэг хүлээнэ.

2.6 Ажлын ачаалал, цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч графикт хугацаанд хогийг ачиж тээвэрлэж чадахгүй бол урьдчилан мэдэгдэнэ.

Гурав. Захиалагч талын эрх үүрэг

3.1 Гүйцэтгэгч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй.

3.2 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийн талаар төрийн болон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээллэх, тайлбар мэдээ авах эрхтэй.

3.3 Хог хаягдлын төлбөрийг сар бүрийн 25ны дотор багтаан барагдуулах үүрэг хүлээнэ.

3.4 Хог хаягдлаа ачиж тээвэрлэх захиалга өгсөн үед тээврийн хэрэгсэл очиход хариуцсан ажилтнаа байгууллага дээрээ байлгаж, хог ачилтанд хяналт тавих үүрэг хүлээнэ.

3.5 ААНБ-ууд нь хог хаягдлыг саадгүй ачих нөхцлийг бүрдүүлсэн байх, тохиромжтой, стандартын хогийн савтай байх, хог хаягдлын талаархи хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг ханган ажиллах

3.6 Захиалагч тал нь хог хаягдлыг өөрсдийн машинаар тээвэрлэхээр болвол Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын “Бараат” хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хаяна.

Дөрөв. Талуудын хүлээх хариуцлага

4.1 Энэхүү гэрээний 3.3-т заасан хугацаанд захиалагч тал үйлчилгээний төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутам үнийн дүнгийн 0.2 хувиар алданги тооцож төлнө.

4.2 Нийтийн эдэлбэр газар болон ногоон бүсэд хог хаягдал хаясан иргэн, ААН-ийн зөрчил үйлдэхэд ашигласан тээврийн хэрэгсэл хураах, унаа хөсөг, техник тоног төхөөрөмжийг хурааж, "Зөрчлийн тухай хууль"-ийн 6 дугаар зүйлийн 1,2,3,4,5,6т зааснаар зөрчил гаргасан хүнийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

4.3 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх болон хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гарч болох бүх маргаан зөрчил зэргийг харилцан тохиролцож шийдвэрлэх ба үл тохиролцсон тохиолдолд Монгол улсын хуулийн дагуу тухайн бүс нутагийн харъяалах шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

4.4 Гэрээг 2 хувь үйлдэж гэрээнд эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.

4.5 Үйл ажиллагаа зогссон, татан буугдсан тохиолдолд гэрээг өөрийн биеэр ирж цуцлах бөгөөд түүнээс үүссэн төлбөр тооцоог аж ахуй нэгж өөрөө хариуцна.

Тав. Нэмэлт заалт

.....

.....

“ДАРХАН ХОТЫН ХОГ ТЭЭВЭР” ОНӨААТҮГ-ЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН:

_____/...../

АХЛАХ БАЙЦААГЧ:

_____/...../

ХАРИУЦСАН БАЙЦААГЧ: 99394390.

_____/...../

УТАС:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Албан тушаал: ХАБЭА ахлах мэргэжилтэн

Нэр : Д.Отгонбаяр

Утас: 99060258.

Хяг: Үндэсний уснаа сав 9984-4048.

Цаас (картон.) 8911-3480.

Зураг 12. Хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх гэрээ

Батлав: Захиалагч
Дархан Карьер ХХК
ЗАХИРАЛ
/Ч.ҮНЭНБАТ/

Батлав:
МАРЗ ЗҮРХ ХАЙРХАН ХХК
ЗАХИРАЛ
С.БАТЦЭНГЭЛ

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

2024 оны 10-р сарын 15 Дугаар 06 Дархан-Уул аймаг

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1. Нэг талаас : Дархан Карьер ХХК, РД:4250125 /цаашид захиалагч гэх/ Нөгөө талаас Дархан-Уул аймгийн "Марз зүрх хайрхан" ХХК 4270045 регистрийн дугаартай компаний захирал Сандуйжавын Батцэнгэл /цаашид гүйцэтгэгч гэх/ нар харилцан тохиролцон энэхүү гэрээг байгуулав.
2. Монгол улсын иргэний хуулийн 346 -р зүйлийг үндэслэл болгон талууд гэрээний нөхцлийг тодорхойлсон болно.

Хоёр. Захиалагчийн хүлээх үүрэг

Захиалагч нь бохир усны резервуарын дүүргэлтийг тогтмол шалгаж ариутгах татуургын горимыг жигд хангах зорилгоор бохир ус зайлуулах график гаргаж батална.

1. Захиалагч нь бохир ус татах ажиллагааг хянаж машины дүүргэлт, явалтын тоог тусгайлан бүртгэнэ. Энэхүү бүртгэлд тохиролцон гарын үсэг зурна.
2. Бохир ус зайлуулах бүрт ажил гүйцэтгэх актыг үндэслэн төлбөр тооцоог хийнэ.
3. Захиалагчийн саналыг харгалзан гүйцэтгэх графикийн бус өдөр ажиллах ба аваарын байдалтай нөхцөлд график харгалзахгүй гүйцэтгэгч ажиллах эрх эдэлнэ.
4. Бохир усны цооногийг ариутгах халдваргүйжүүлэх ажлыг мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн зааврын дагуу тогтмол хийнэ.
5. Өвлийн улиралд захиалагч тал зам хашааны цас, мөс цэвэрлэж ажил гүйцэтгэхэд бэлэн болгож байна.

Гурав. Гүйцэтгэгчийн хүлээх үүрэг

Гэрээний хугацаа, үнэ төлбөр төлөх журам.

1. Гэрээт ажлын хөлсний 1 ресийг соруулах үнэ 88.000 мянган төгрөг байна.
2. Шугамын бөглөөс гаргахдаа 1 удаа 150.000 мянган төгрөг байна. Өндөр даралттай усаар буудаж цэвэрлэж гаргана.
3. Шугамын угаалга бодистой цэвэрлэгээ 1 удаа 60.000 мянган төгрөг байна.
4. НӨАТ төлөгч учир НӨАТ-г үнийн дүнг оруулж тооцсон болно.
5. Ажил гүйцэтгэгчийн ажлын хөлсийг сар бүрийн 25-ны дотор олгож байх.
6. Төлбөрийг бэлнээр буюу дансаар "Марз зүрх хайрхан" ХХК -ний Худалдаа Хөгжлийн банк 476003226 тоот дансаар хийнэ.

7. Гүйцэтгэгч нь тусгай зориулалтын авто машины техникийн бэлэн байдлыг бүрэн хариуцна.
8. Шатах, тослох материал, сэлбэг хэрэгсэл, засвар үйлчилгээний зардлыг бүрэн хариуцна.
9. Гүйцэтгэгч байгууллагын жолооч үйлчилгээний ажилчин бүр бохир ус соруулах ажлын үеэр танкны тагийг тогтмол хааж, нүхэнд хүүхэд унах эрсдлээс байнга сэргийлж ажиллана.
10. Захиргчийн баталсан хүсэлт шаардлагын дагуу бохир ус зайлуулах ажлыг тогмол жигд гүйцэтгэх буюу торхны дүүргэлтийг хэвийн хэмжээнд хийнэ. Машин ажилд гарсан тохиолдолд сантехник харуулын хяналтын хамт ажил гүйцэтгэж, гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээг /рейс/ актаар хөлс төлөлтийг нэхэмжилнэ.

Дөрөв. Гэрээний хариуцлага

1. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу технологийн шаардлага хангаагүй, байгаль орчин бохирдуулсан тохиолдолд гарсан нөхцлийг тооцон бууртай этгээдийг тодорхойлно.
2. Бохир ус зайлуулах ажлын горимыг зөрчсөн резераурын халиулсан, байгаль орчин болон иргэдийн эрүүл мэндэд нөлөөлсөн зэргээс гарах хохиролыг гүйцэтгэгч шууд хариуцна.
3. Машин болон сорох төхөөрөмж нь эвдрэл зайлшгүй гарсан тохиолдолд уг машиныг хэвийн ажиллагаанд орох хүртэлх бохир ус татах асуудлыг 2 тал харилцан ашигтай хохиролгүй байхаар шийдвэрлэнэ.

Тав. Гэрээний хугацаа

1. Гэрээ нь 2024 оны 10 сарын 15-ны өдрөөс 2025 оны 10 сарын 15-н хүртэл 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.
2. Энэхүү гэрээнд хоёр тал гарын үсэг зурсан өдрөөс хуулийн хүчин төгөлдөр баримт болно.
3. Гэрээг 2% үйлдэж баталгаажуулах ба хувь тус бүр нь хүчин төгөлдөр баримт болно.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:	**ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ**:
“Дархан Карьер” ХХК	МАРЗ ЗҮРХ ХАЙРХАН ХХК-ИЙН
Нягтлан бодогч ...../Д.Эрдэнэцэцэг /	ЗАХИРАЛ .....
Утас: 9904-7005	С.БАТЦЭНГЭЛ
Хаяг: 6-р баг Баяндаваа 4-466	РД: 4270045
Чулуу бутлах ангилах үйлдвэр	Утас: 9962-6982, 8837-6417
РД: 4250125	

Зураг 13. Ахуйн бохир соруулах гэрээ



Зураг 14. Төслийн талбай дээрх эко нойл

Байгууллагын албан конторын 2 давхарт иж бүрэн бие засах газар, усанд орох өрөөг байгуулж, ажилчдын ажлын хувцасаа угаах 2 ширхэг угаалгын машин, угаалтуур,зэргийг байршуулж ажилчдын тав тухыг хангаж ажиллав.



Байгууллагын албан конторт 1 давхарт иж бүрэн бие засах газар, усанд орох өрөөг байгуулж, , угаалтууртай.



ЕС. ОСОЛ, ЭРСДЭЛ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 5. Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Гүйцэтгэл
Энэхүү тайлангийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах зөвлөмжүүдийг үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлэх	+
Ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт семинарыг тогтмол зохион байгуулж, хамруулсан	+
Ажиллагсадыг улиралд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах.	-
Ажиллагсадыг тоосноос хамгаалах хошуувч, хувцас хэрэгслээр хангах	+

“Суурь” ХХК нь Уурхайн орчимд ажилчид болон иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор шаардлагатай хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын дүрэм, заавар, мэдээллийн самбаруудыг байрлуулж ажиллаж байна. Холбогдох зургийг доор үзүүлэв.



Зураг 15. Уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг танилцуулсан самбар



Зураг 16. Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй байдлын самбар байршуулсан байдал

Уурхайн кемп, зоогийн газар, ажилчдын байр орчимд гал унтраагуур болон хэрэглэх заавар, аврах гарцны самбаруудыг байршуулж Дархан-Уул аймгийн онцгой байдлын газраас галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийг авч ажилласан. Холбогдох зургийг доор үзүүлэв.



Зураг 17. Гал унтраагуур байрлуулсан байдал



Зураг 18. Утаа мэдрэгч байршуулсан байдал



Зураг 19. Галын сараалж



ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮГНЭЛТ

Дугаар 0010105

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: Дархан карьер ХХК

Хаяг: Дархан сум 6-р баг

Ажлын байрны зориулалт, үйл ажиллагааны чиглэл: Чулуу бутлах, ангилах үйлдвэр

худалдаа, үйлдвэрлэл

Барилга байгууламжид гал унтраах тоног төхөөрөмж, / гал унтраах автомат болон дохиололын систем, утаа зайлуулах систем, усан хангамж /ахуун шаны багаж хэрэгсэл, бодис материал зэргийг байрлуулан ашиглахад зөвшөөрөх дүгнэлтийг олгоно. /Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3/

Олгосон: 2023 он 06 сар 20 өдөр

Хүчинтэй хугацаа: 2025 он 06 сар 19 өдөр хүртэл

Дүгнэлт олгосон:

Дархан-Уул аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын газар /хэлтсийн/

дарга Хурандаа цолтой С.Пүрэвсамдан

Дүгнэлт гаргасан:

Дархан-Уул аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын газар /хэлтсийн/

Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч: Хошуучцолтой Ц.Идэш

/тамга дарна/

САНАМЖ

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийг үйлчилгээний танхимд хүний нүдэнд харагдахуйц газар байрлуулсан байна.

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт нь үнэт цаас учраас гэмтээлгүй хадгалахаас гадна хувилж, үрэгдүүлж, олшруулж, хуурамчаар үйлдвэрлэсэн болон бусдад түрээслэх, худалдсан тохиолдолд холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт нь банкны зээлийн баталгаа, барьцаа болохгүй.

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан норм, дүрэм, стандартыг зөрчсөн тохиолдолд Онцгой байдлын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан хураан авах, цуцлах эрхтэй.

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийн хугацаа дуусснаас хойш 1 сарын хугацаанд дахин сунгуулах.

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, норм, дүрэм стандарт зөрчигдсөнөөс үүдэн гарсан зөрчлийн болон эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

Зураг 20. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт



Зураг 21. Баяжуулах үйлдвэр дээрх аюулгүй байдлын тэмдэг, тэмдэглэгээг байршилуулсан байдал

“Дархан-карьер” ххк-ны удирдлага, ажилчид сургалтанд хамрагдсан.

Тус компаний нийт 10-н ажилтан, удирдах албан тушаалтануудад 2025.04.04, 2025.04.23-ны өдрүүдэд ХАБЭА-н хууль, дүрэм, журам, тогтоомжууд болон аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааны тухай хичээл сургалтыг явуулж, зааварчилгаа өгсөн. Жич: Шалгалтыг 2025.04.10-нд гүйцэтгэх захирлын өрөөнд тест хэлбэрээр авсан болно.

Сургалтын сэдэв:

Удирдах албан тушаалтанд

1. Хөдөлмөрийн тухай хууль
2. ХАБЭА-н тухай хууль, дүрэм, журам, стандартын тухай
3. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл, хурц хордлогын шалтгаан, бууруулах арга зам
4. ХАБЭА-н зөвлөлийн дүрэм
5. ХАБЭА-н бодлолго
6. ХАБЭА-н тогтолцоо
7. ХАБЭА-н ажил үүргийн тухай журам
8. Эрсдлийн удирлагын тухай журам
9. ХАБЭА-н баримт бичгийн хяналтын журам
10. Дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам
11. Уурхайн замын хөдөлгөөнд оролцох үед баримтлах журам
12. Цоожлох, Пайзлах журам
13. Галын аюулгүй байдлын журам
14. Гамшгаас хамгаалах бүлгийн зохион байгуулалт
15. Онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ авах журам
16. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийтлэг дүрэм
17. ХАБЭА-н сургалт явуулах, зааварчилгаа өгөх, шалгалт авах тухай журам

Нийт ажилчидад:

1. Байгууллагын дотоод журам
2. Хөдөлмөрийн гэрээний талаар
3. Ажлын байранд галын аюулгүй байдлыг хангах
4. Аюулыг танин мэдэх, илрүүлэх, мэдээлэх, арилгах
5. Ажлын байранд үзүүлэх эмнэлэгийн анхны тусламж
6. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны ёрөнхий зааварчилгаа, сургалт
7. Тухайн ажлын байранд шаардагдах ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэлээр хангах, түүнийг тогтмол хэрэглэх /видео хичээл/
8. Тухайн ажлын байрны технилогийн горимын талаар
9. Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа
10. Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа /видео хичээл/
11. Бутлуурын аюулгүй ажиллагааны сургалт, зааварчилгаа
12. Тэжээгчийн аюулгүй ажиллагааны сургалт, зааварчилгаа
13. Бункерийн аюулгүй ажиллагааны сургалт, зааварчилгаа
14. Туузан дамжуулагчийн аюулгүй ажиллагааны сургалт, зааварчилгаа
15. Шигшүүрийн аюулгүй ажиллагааны сургалт, зааварчилгаа

16. Авто ачигчийн операторын АА-ны сургалт, зааварчилгаа
17. Огтлогч багажаар ажиллах, АА-ны сургалт, зааварчилгаа
18. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн АА-ны сургалт, зааварчилгаа
19. Засвар, үйлчилгээний АА-ны сургалт, зааварчилгаа зэрэг сэдвээр

Сургалтанд хамрагдсан талаарх зураг:







Зураг 22. Сургалтанд хамрагдсан талаарх зураг

“ДАРХАН-КАРЬЕР” ХХК

ДАРХАН КАРЬЕР ХХК

ХИЧЭЭЛ СУРГАЛТ, ЗААВАРЧИЛГААТАЙ ТАНИЛЦСАН ТАЛААРХ ТЭМДЭГЛЭЛ

1 АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА РТ

2025.04.01 --2025.11.20 хүртэл

№	Овог, нэр	Албан тушаал	Огноо	Ажилтаны гарын үсэг
		Нийт ажилчид		
1	Ч.Үнэнбат	Гүйцэтгэх захирал	2025.04.01	
2	Р.Отгонбаяр	ХАБЭА ажилтан	2025.04.01	
3	Д.Эрдэнэцэцэг	Санхүүч, Ня-бо	2025.04.01	
4	С.Алтансүх	Цахилгааны инженер	2025.04.10	
5	Ж.Өнөрсайхан	Ковшын операторчин	2025.04.08	
6	Т.Мөнхбат	Бутлуурын операторчин	2025.04.08	
7	У.Төмөрсүрэн	Туслах ажилтан	2025.04.01	
8	Г.Гэрэлцэцэг	Нярав	2025.04.1	
9	Н.Уянга	Тогооч	2025.04.09	
10	А.Нарангарвуу	Үйлчлэгч	—	
11	Д.Дэлгэрсүрэн	Бутлуурын операторчин	2025.04.23	
12	У.Оюунхүү	Туслах ажилтан	2025.06.02	
13	Ц.Мөнхцэцэг	Туслах ажилтан	2025.09.02	
14				
15				
16				
17				
18				

Хичээл сургалт, зааварчилгаа өгсөн: ХАБЭА-н ажилтан Р.Отгонбаяр



ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГААГҮЙ АЖИЛ ТИЙМ Ч ЧУХАЛ БИШ ГЭДГИЙГ ҮРГЭЛЖ САНАГТУН

2

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА, СУРГАЛТ, ЗААВАРЧИЛГАА ӨГСӨН ТАЛААРХ ТЭМДЭГЛЭЛ

Дархан ШУТИС-ийн Н.Эрдэнэбаяр багштай “Барилагын инженерчлэл-1” ангийн оюутан залуус үйлдвэртэй танилцах дадлагын удирдамжтай ирсэний дагуу “дархан-Карьер”ХХК-ниас ХАБЭА-н хичээл сургалт явуулж, үйлдвэрийн явц, үйлдвэрлэлийн дамжлага, технилогын ерөнхий горим, бүтээгдэхүүний гарц, биет байдалтай танилцуулж ажиллаа.





Зураг 23. Далдлагажигчид

АРАВ. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ус, агаар, хөрсны шинжилгээг 2025 оны 09 сарын 05-нд Дархан-уул аймгийн ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн Байгаль орчны шинжилгээний лабораторид хийж гүйцэтгэлээ.

Хөрсний дээжийг уурхайн орборлолтын орчимд, технологийн зам, үйлдвэрийн орчноос, бутлуурийн орчны хөрснөөс ялзмаг зарим хөрсний бохирдуулагч бодис, цахилгаан дамжуулах чанар, pH-ийг үзэхэд хөрс нь сул шүлтлэг орчинтэй хөрсний ялзмаг нь бутлуур, олборлолтын орчин, технологийн орчимд бага байна. Нитрат, сульфатын агууламж нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даваагүй.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ

Дархан сум. 5 дугаар баг.УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: darkhan-tsaguur@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№ : 2025/3-36
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : **“ДАРХАН КАРЬЕР” ХХК**
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Ө.Алтанзул, БОШЛ-ийн усны химийн ахлах инженер
Сорьцын тоо, төрөл : 4 цэг, Хөрсний химийн шинжилгээ
Сорьц авсан огноо : 2025.09.03
Шинжилсэн огноо : 2025.09.08-11
Хуудасны тоо : 3/3

№	Шинжилгээний аргын стандарт	Хөрсний химийн шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS 3297:2019 ЗДХ	Тодорхойлсон агууламж			
					3063250901	3063250902	3063250903	3063250904
1	MNS3310:91	Хөрсний ялзмаг	%		0.27	1.52	0.74	0.95
2		Нитрат, NO_3	мг/кг	130	4.8	9.9	5.5	5.9
3		Сульфат, SO_4	мг/кг	160	61.4	72.0	68.8	19.0
4		Аммони, NH_4	мг/кг		34.9	25.9	32.6	38.6
5		Фосфор, P_2O_5	мг/кг		3.3	1.9	2.1	1.8
6		PH			8.04	7.90	8.06	8.18
7		EC	µS/cm		132.1	85.8	98.0	112.8

Товчилсон үг: ЗДХ - Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Дээжийн код: 3063250901 – Бутлуурын орчин
3063250902 – Үйлдвэрийн орчноос 100м зайд
3063250903 – Олборлолтын орчин
3063250904 – Технологийн замын орчин

Тайлбар:
1) Хөрсний дээжийг диагоналийн арга ашиглан авч анхан шатны боловсруулт хийн шинжилгээний ажилд бэлтгэсэн.
2) Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх MNS3297:2019 стандарт дахь хөрсний эрүүл ахуйн шаардлагын химийн үзүүлэлтээр нитрат /NO_3/, сульфат /SO_4/-ын агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан бохирдолгүй.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН АГААРЫН ХИМИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР Г.АНХМАА
ХЯНАН, БАТАЛГААЖУУЛСАН:
БОШЛ-ИЙН ХИМИЙН ТЕХНОЛОГИЧ
ИНЖЕНЕР Э.САЙНЗАЯА

УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

Зураг 24. Хөрсны шинжилгээний хариу

Бутлуур орчин, үйлдвэрлэлээс 50м орчимд агаарын нийт тоосонцор, азотын давхар исэл, хүхэрлэг хийн агууламжийг тодорхойлоход өчүүхэн бага гарсан ба зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс даваагүй. Агаарын бохирдолгүй байна.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ

Дархан сум. 5 дугаар баг.УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: darkhan-tsaguur@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№ : 2025/1-39
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : **“ДАРХАН КАРЬЕР” ХХК**
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Г.Анхмаа, БОШЛ-ийн ахлах шинжээч
Ө.Алтанзул, БОШЛ-ийн агаарын шинжээч
Сорьцын тоо, төрөл : 2 цэг, агаарын бохирдлын шинжилгээ
Сорьц авсан огноо : 2025.09.05
Шинжилсэн огноо : 2025.09.06
Хуудасны тоо : 1/3

№	Шинжилгээний аргачлал	Агаарын шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS4585: 2025 1 удаагийн сорьцын ХА	Хэмжилт хийсэн цэг	
					20 минутын сорьцын дундаж агууламж /давтамж 3/	
					1063250901	1063250902
1	MNS 0017-2-5-12:2021	Хүхэрлэг хий /SO2/	мкг/м^3	**450**	3	5
2	MNS 0017-2-5-11:2021	Азотын давхар исэл /NO2/	мкг/м^3	**200**	33	35
3	MNS4048-88	Нийт тоосонцор /20 мин/	мкг/м^3	**500**	2.017	77

Товчилсон үг: ХА-Хүлцэх агууламж
Сорьцын код: 1063250901- Бутлуур орчин
1063250902- Үйлдвэрлэлээс 50 метр орчин

Тайлбар:
1) Тухайн сорьц авах, хэмжилт хийх хугацааны цаг агаарын нөхцөл: Агаарын чийгшил 37-39%, агаарын температур 15.7-17.8 градус дулаан, салхи баруун хойноос 2-4 м/с хурдтай байсан.
2) Агаар дахь хүхэрлэг хий, азотын давхар ислийн агууламж агаарын чанарын MNS4585:2025 стандартын 1 удаагийн сорьцын дундаж хүлцэх агууламжаас давсан бохирдолгүй байна.
3) Нийт тоосны агууламж агаарын чанарын MNS4585:2025 стандартын 1 удаагийн сорьцын дундаж хүлцэх агууламжаас бутлуурын орчинд 4.0 дахин давсан бохирдолтой.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН АГААРЫН ШИНЖЭЭЧ Ө.АЛТАНЗУЛ
ХЯНАСАН:
БОШЛ-ИЙН ХЯНАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ, ЧМ Э.САЙНЗАЯА
БАТАЛГААЖУУЛСАН:
УОШХ-ИЙН ДАРГА М.АЛИМАА

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

Зураг 25. Агаарын шинжилгээны хариу

Худгийн усны шинжилгээг хийлгэхэд мөн адил бохидолгүй байна.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ

Дархан сум. 5 дугаар баг.УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: darkhan-tsaguur@yahoo.com

ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№ : 2025/2-28
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : **“ДАРХАН КАРЬЕР” ХХК**
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Ө.Алтанзул, БОШЛ-ийн усны химийн ахлах инженер
Сорьцын тоо, төрөл : 1 цэг, усны химийн шинжилгээ
Сорьц авсан огноо : 2025.09.05
Шинжилсэн огноо : 2025.09.08-18
Хуудасны тоо : 2/3

№	Шинжилгээний аргачлал	Усны химийн шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS 0900:2018 ЗДХ	Агууламж 2063250901
1	MNS1097:2023	Ca^{+} /кальци/	мг/л	**100.0**	32.1
2	MNS1097:2023	Mg^{+} /магни/	мг/л	**30.0**	14.7
3	MNS1097:2023	$Na^{+}+K^{+}$ /натри кали/	мг/л	**200.0**	103.3
4	MNS6832:2020	HCO_3^{-} /гидрокарбонат/	мг/л		339.3
5	MNS 6271:2011	SO_4^{-} /сульфат/	мг/л	**500.0**	5.8
6	MNS4424:2005	Cl^{-} /хлорид/	мг/л	**350.0**	44.7
7	MNS1097:2023	Нийт эрдэсжилт	мг/л		539.9
8	MNS6836:2020	Жинлэгдэх бодис	мг/л		1.56
9	MNS6779:2019	Хатуулаг /Ca Mg/	мг-экв/л	**7.0**	2.81
10	MN ISO 7150-1:2006	NH_4 /аммони/	мгN/л	**1.5**	0.37
11	MNS6779:2019	NO_2 /нитрит/	мгN/л	**1.0**	илрээгүй
12	MNS6834:2020	NO_3 /нитрат/	мгN/л	**50.0**	0.43
13	MN ISO 6878:2001	Рэрд /ортофосфат/	мгP/л		0.005
14	MNS 6272:2011	F /фтор/	мг/л	**0.7-1.5**	1.46
15	MNS 4430:2005	Fe /төмөр/	мг/л	**0.30**	0.007
16	MNS ISO10523:2001	PH /усны орчин/		**6.5-8.5**	8.13
17	MNS ISO7888:1999	EC /ЦДЧ/	µS/cm		784.0
18	MNS ISO11083:2001	Cr-VI /6 валентат хром/	мг/л		илрээгүй
19	MNS 6833:2020	Перманганатын исэлдэх чанар	мг/л		1.6

Товчилсон үг: **ЗДХ**-зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Дээжийн код: 2063250901-Худгийн ус

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН АГААРЫН ХИМИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР Г.ӨНХМАА
ХЯНАЖ, БАТАЛГААЖУУЛСАН:
БОШЛ-ИЙН ХИМИЙН ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР Э.САЙНЗАЯА

УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

Зураг 26. Усны химийн шинжилгээ

АРВАН НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

1. **Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайланг боловсруулж жил бүр батлуулж ажиллах**


2025 оын байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хууль, журамд заасны дагуу бичиг баримтыг бүрдүүлэн батлуулав.

2. **Байгаль орчны аудитыг 2 жилд тутамд хийлгэх /мэргэжлийн байгууллагаар/**

Байгаль орчны аудитыг 2024 оны 10 аудит хийлгэх гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлсэн. Байгаль орчны аудитын заавар зөвөлгөөний дагуу 2025 онд халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг гүйцэтгүүлсэн.

Халдваргүйжүүлэлтийн эрх бүхий байгууллага болох “Алтан жолоо” ХХК-ны мэргэжилтэнгүүдээр хуучин ашиглаж байсан нүхэн жорлонг Франц улсад үйлдвэрлэгдсэн 44,91%-ийн клорсентийн 0,015%-ийн уусмалаар, мөн гипохлорид кальцийн хуурай нунтагаар тус тус ариутгаж, уг нүхэн жорлонг нурааж, шороогоор дүүргэж булав



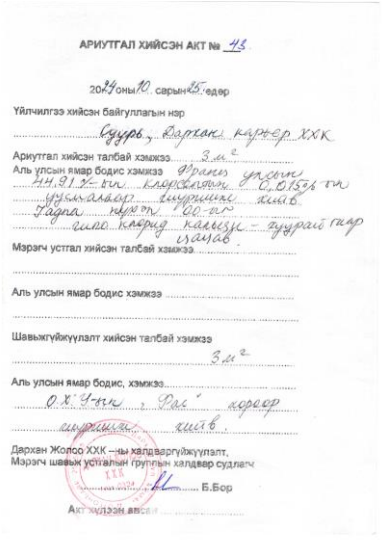

АРИУТГАЛ ХИЙСЭН АКТ № 43

2024 оны 10 сарын 25-ны өдөр

Үйлчилгээ хийсэн байгууллагын нэр: Сүүрь, Дархан курер ХХК

Ариутгал хийсэн талбай хэмжээ: 3 м²

Аль улсын ямар бодис хэмжээ: Франц улсын 44.91 % бүх клорсентийн 0.015% бүх уусмалаар шингэлэх хийв. Гадна нүхэн 100-ыг гэмэ. Кафид калцыг - суурьтай гар ашиглав.

Мэрэгч устгал хийсэн талбай хэмжээ:

Аль улсын ямар бодис хэмжээ:

Шавьжгүйжүүлэлт хийсэн талбай хэмжээ: 3 м²

Аль улсын ямар бодис, хэмжээ: О.Х.Үнэн, Фос курер шингэлэх хийв.

Дархан Жолоо ХХК –ны халдваргүйжүүлэлт, Мэрэгч шавьж устгалын группын халдвар судлаач: Б.Бор

Акт хүлээн авсан:

Зураг 27. Бие засах газруудад ариутгал хийсэн байдал



Зураг 28. Ангилан ялгах хогийн сав байршуулсан байдал

3. **Орон нутгийн засаг захиргаа хорооны иргэдийн саналыг сонсож, зохих арга хэмжээ авах, харилцан мэдээлэл солилцож ажилласан.**

Орон нутгийн засаг захиргаа болон сумын байгаль хамгаалагчаас зөвөлгөө, заавар авч үйл ажиллагаандаа утсгаж ажиллаж байсан.

4. **Газар, ус, цахилгаан ашигласны болон бусад төлбөрийг төлөх**

Газар, цахилгааны төлбөрийг төлдөг.

ДҮГНЭЛТ

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг боловсруулан холбогдох байгууллагуудад танилцуулахаар хүргүүлсэн болно.

№	Бүрэлдэхүүн хэсгүүд	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нийт зардал мян.төг	Тайлбар, үндэслэл
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	ш	8	1000.0	ОХШХ-ийн дагуу хөрс, ус, агаарын чанарын шинжилгээ хийлгэх, шингэн хаягдал болон хог хаягдлын гэрээг байгуулж, тогтмол тээвэрлүүлэх зэрэг төлөвлөсөн ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Төсөлд хэрэглэгдэж буй тоног төхөөрөмж болон тээврийн хэрэгслүүдэд оношлогоог тогтмол хийлгэж, тэдгээрт засвар үйлчилгээ хийж, түлшний зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх Хүнд машин механизмын явах замыг засаж сайжруулсан.
2	“Тэрбум мод ” үндэсний хөтөлбөр	ш га	300 0,25	5 000.0	“Тэрбум мод ” үндэсний хөтөлбөрийн “Ногоон Дархан-2032” арга хэмжээний хүрээнд аймгийн ойн санг нэмэгдүүлэх бодлого чиглэлийн хүрээнд Зулзагын голын нарсан ойг тэлж ойжуулахаар мод тарьж оролцсон.
3	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	-	-	-	2025 онд нөхөн сэргээлтийн талбай гараагүй тул нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэхгүй. Шимт хөрс хуулаагүй, шимт хөрсний овоолго нэмэгдэж үүсээгүй.
4	Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	га	1,25	1 500.0	Дархан-Уул аймгийн БОАЖГ -аас санал болгосон төслийн талбайгаас 500м орчим зайд Дархан сумын 6-р багийн Дархан толгойн уулын урд дахь эвдэрсэн нийт 4.43 га газрын 1,25 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн.
5	Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	-	-	-	2025 онд энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа төлөвлөгдөөгүй болно.
6	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	-	-	-	2025 онд ашиглалтын талбайн хэмжээнд түүх, соёлын дурсгалт зүйл илрээгүй
7	Осол эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	ш	3	2000.0	Тогтмол ХААБ сургалтанд хамрагдсан, хувцас хэрэгслээр хангасан Галын аюулгүй байдлыг хангаж галын дүгнэлт гаргуулсан. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний зөвлөмжүүдийг хангаж ажилласан.

8	Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	ш	1	1000.0	Дархан хотын Хот Тохижилт Үйлчилгээний газартай Хог, хаягдлын гэрээ байгуулан хог хаягдлыг тогтмол хугацаанд тээвэрлүүлэн ажиллаж байна. Ариутгал, цэвэрлэгээний ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Ажилчдад тухтай цэвэр орчинг бүрдүүлсэн.
9	Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан	ш	2	-	“Дархан толгой” нэртэй барилгын чулууны ордыг ил уурхай дээр Суурь ХХК орон нутагтай хамтран ажиллаж үйл ажиллагаагаа тайлагнаж Байгаль орчны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж барьцаа хөрөнгө байршуулсан.
10	Олон нийтэд тайлагнах хуваарь, төлөвлөгөөний биелэлт	ш	2	-	2025 оны БОМТ-ний биелэлтийн тайланг боловсруулж, БОАЖЯ-ны цахим системд хугацаанд нь илгээсэн.
11	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	ш	3	400.0	ЦУОШГ-ын Байгаль орчны хэмжилзүйн лабораторид агаар орчинд 2 цэгт, хөрсний 4 цэгт, худгийн уснаас шинжилгээ хийлгэсэн. Орчны шинжилгээгээр бохирдол илрээгүй байна.
	Дүн		**22**	**10900.0**	

Манай компани нь 2025 онд нийт 22 ажил төлөвлөснөөс 21 ажлыг хийж гүйцэтгэв. 2026 онд нөхөж гүйцэтгэнэ. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

1. Хаягдал ус зайлуулах зөвшөөрөл, бохир соруулах үйлчилгээний гэрээг тайланд хавсаргав.
2. Хүнд машин механизмын явах замыг засаж тэмдэгжүүлэв.
3. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу 1,25 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн. Ингэхдээ дараах 2026 онд биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд бэлдсэн.
4. ОХШХ-ийн хүрээнд агаар, ус, хөрсний шинжилгээ хийлгэсэн. Шинжилгээнд орчны бохирдол илрээгүй.
5. Ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт семинарыг тогтмол зохион байгуулж, хамруулав.
6. Галын дүгнэлт гаргуулав.
7. “Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн “Ногоон Дархан-2032” арга хэмжээний хүрээнд аймгийн ойн санг нэмэгдүүлэх бодлого чиглэлийн хүрээнд Зулзагын голын нарсан ойг тэлж ойжуулахаар 5000 сая төгрөг зарцуулж, 300 ш нарс модны суулгац тарьж оролцсон.
8. Бутлуур төхөөрөмжийг тогтмол засвар үйлчилгээ хийлгүүлж тоосжилтыг бууруулсан.
