ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ, “ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХХК-ИЙН ГАНГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН 2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

/АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР: 2051303/

БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАСАН:
“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ: ______________ / Г.ДУГАРЖАВ /

“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХХК-ИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИНЖЕНЕР ______________ /Э.НАНДИНБОЛОР/

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
DMP
ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ХХК

2023 он

АГУУЛГА

ЗУРАГ 2

ХҮСНЭГТ 2

1 ТУХАЙН ЖИЛИЙН БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 3

2 СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 5

3 ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ . 11

4 ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 15

5 ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 16

6 ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 19

7 ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 33

8 ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 34

9 ТУХАЙН ЖЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ ОРШИН СУУГЧИД, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 39

10 ДҮГНЭЛТ 40

ХАВСРАЛТ 41

ЗУРАГ

Зураг 1 Хогийн цэгүүдэд ариутгал хийж буй байдал 8
Зураг 2 Хаягдал тоосго ашиглан явган хүний зам хийсэн байдал....9
Зураг 3 Хуванцар хог хаягдал ачуулж буй байдал....10
Зураг 4 Төмөр бэлтгэх цехийн ажилчидад сургалт орж буй байдал 10
Зураг 5 Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулсны дараах байдал 10
Зураг 6 Цэцгийн мандал хийсэн байдал....12
Зураг 7 Бут сөөг хэлбэржүүлсэн байдал....13
Зураг 8 Зүлэгжүүлэлт хийсэн байдал 14
Зураг 9 Үйлдвэрийг зүлгийг хадаж, услаж буй байдал 15
Зураг 10 Тэрбум модны хүрээнд Төмөр хүн орчимд суулгасан нарс....15
Зураг 11 Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж буй байдал....17
Зураг 12 НААҮГ хог хаягдал ачиж буй байдал....22
Зураг 13 Хаягдал бээлий цуглуулах сав....22
Зураг 14 3 ангилдаг хогны сав хийж буй байдал....22
Зураг 15 Оффисын орчимд болон цехүүдэд байршуулсан хогны савнууд....23
Зураг 16 Металл ялгах ажил хийгдэж буй байдал....23
Зураг 17 Эмнэлгийн хог хаягдал устгалд өгч буй байдал 24
Зураг 18 Сум галт зэвсэг түр хадгалах цэгийг тохижуулж буй байдал....29
Зураг 19 Бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийж буй байдал....30
Зураг 20 Хаврын их цэвэрлэгээг хийж буй байдал 31
Зураг 21 Хаягдал тос “ЮТО” ХХК-д нийлүүлж буй байдал 32
Зураг 22 Нийт ажилчдын сургалт орж буй байдал....35
Зураг 23 НМТ-г нэвтрүүлэхээр стандартын сургалт авч буй байдал....36
Зураг 24 БОСШТ-н мэргэжилтнүүд Үйлдвэр дээр ажилласан байдал 38

ХҮСНЭГТ

Хүснэгт 1 Гангийн үйлдвэрийн гүйцэтгэл....4

1 ТУХАЙН ЖИЛИЙН БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК нь 33 хэлтэс, алба, цехтэй ба нийт 1530 орчим ажилчинтай, орон нутгийн хамгийн том ажил олгогч компанид тооцогддог. Хэрэглэгчдийн эрх ашигт нийцсэн, аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн тулд материал, түүхий эдийн хяналт, үндсэн үйлдвэрлэл, технологийн шат дамжлагын хяналт, худалдан борлуулах, хадгалах бүхий л үе шатанд чанарын удирдлагын хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэн ажилладаг. Түүнчлэн олон улсын болон үндэсний ISO/IEC 17025:2005 (MNS ISO/IEC 17025:2007) стандартын шаардлага хангасан, уул уурхай, металлургийн төрөлжсөн өөрийн гэсэн итгэмжлэгдсэн лабораторитойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн Гангийн үйлдвэр нь 1993 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд металлыг даралтаар боловсруулах, цувимал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи дээр үндэслэгдэн байгуулагдсан Монгол улсын металлургийн салбарын анхдагч болоод хамгийн том үйлдэр юм.

Тус үйлдвэр нь жилд 121.7 мянган тонн хаягдал төмөр хайлж, 108.7 мянган тонн бэлдэц үйлдвэрлэн, 100.0 мянган тонн цувимал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай ба Япон улсын “Ниссей”, “Мицубиши” зэрэг компанийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон үйлдвэр юм.

Бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, дотоодын эрэлт хэрэгцээг хангах зорилгоор 2017 онд жилд 25,000 тн давтмал ган бөмбөлөг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, ХБНГУ, Итали улсын тоног төхөөрөмж бүхий ган бөмбөлгийн давтах аргын үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан.

2023 оны 10 сар хүртэл Гангийн үйлдвэр нь 20,024 тн хаягдал төмөр боловсруулан, 25,775 тн бэлдэц, 24,000 тн цувимал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр төлөвлөсөн ба 2023.09.17-ны байдлаар 22,294.4 тн хаягдал төмөр боловсруулан, 25,336.7 тн бэлдэц, 23,537.9 тн цувимал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж дунджаар 102.5 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна. Дэлгэрэнгүйг Хүснэгт 1-р харуулав.

Хүснэгт 1 Гангийн үйлдвэрийн гүйцэтгэл

№	Үйлдвэрлэл	Ангилал	1 сар	2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	Өссөн дүн
1	Хаягдал төмөр худалдан авалт	**Биз.Төл, тн**	3,400.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	**30,600.0**
		Гүйцэтгэл, тн	963.0	1,496.0	6,402.6	6,444.5	7,853.6	11,253.5	6,884.7	4,284.0	2,105.8	**47,687.6**
		Төмөр, тн	424.1	609.4	5,499.4	5,494.0	6,440.5	9,568.0	5,879.2	3,519.1	2,105.8	39,539.5
		Шреддер, тн	503.4	864.7	707.3	345.2	498.1	240.7	211.2	189.6		3,560.2
		Ширэм, тн	35.5	21.9	195.9	605.3	915.0	1,444.8	794.3	575.3		4,588.0
		Биелэлт, %	**28.3%**	**44.0%**	**188.3%**	**189.5%**	**231.0%**	**331.0%**	**202.5%**	**126.0%**	**61.9%**	**155.8%**
2	Хаягдал төмөр боловсруулалт	**Биз.Төл, тн**	2,132.0	1,725.0	2,325.0	2,151.0	2,413.0	2,238.0	1,877.0	2,363.0	2,800.0	**20,024.0**
		Гүйцэтгэл, тн	2,350.6	1,492.3	2,640.1	2,943.3	2,778.0	2,957.9	2,423.4	3,052.2	1,611.7	**22,249.4**
		Зүссэн төмөр, тн	1838.38	1,027.9	2,087.9	2,044.2	1,916.5	1,953.6	1,835.0	2,489.7	1,611.7	16,804.9
		Ялгасан төмөр, тн	270.98	140.6	300.1	163.2	197.8	250.8	216.8	245.0		1,785.3
		Ширэм, тн	241.24	323.7	173.6	326.7	291.4	395.1	371.6	317.6		2,440.9
		Пресс, тн	-	-	78.5	409.2	372.3	358.4	-	-		1,218.3
		Биелэлт, %	**110.3%**	**86.5%**	**113.6%**	**136.8%**	**115.1%**	**132.2%**	**129.1%**	**129.2%**	**57.6%**	**111.1%**
3	Хүчилтөрөгч үйлдвэрлэл KZO-50	**Биз.Төл, м3**	21,790	19,840	24,173	22,887	24,987	24,287	17,280	7,440		**162,684.0**
		Гүйцэтгэл, м3	15,096	17,064	22,752	21,186	16,914	18,834	13,224	11,742		**136,812.0**
		Биелэлт, %	**69.3%**	**86.0%**	**94.1%**	**92.6%**	**67.7%**	**77.5%**	**76.5%**	**157.8%**	**#DIV/0!**	**84.1%**
4	Бэлдэц үйлдвэрлэл	**Биз.Төл, тн**	3,200.0	3,225.0	3,225.0	3,225.0	3,225.0	3,225.0	3,225.0	-	3,225.0	**25,775.0**
		Гүйцэтгэл, тн	3,353.1	3,257.3	3,272.5	3,276.2	3,292.4	3,319.4	3,661.9	-	1,903.8	**25,336.7**
		SD390	-	2,901.4	3,272.5	3,276.2	2,889.8	-	-	-		12,340.0
		Ст70	3,353.125	355.9	-	-	402.6	3,319.4	3,661.9	-	1,903.8	12,996.7
		Биелэлт, %	**104.8%**	**101.0%**	**101.5%**	**101.6%**	**102.1%**	**102.9%**	**113.5%**	**#DIV/0!**	[illegible]	**98.3%**
5	Цувимал үйлдвэрлэл	**Биз.Төл, тн**	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	-	[illegible]0.0	**24,000.0**
		Гүйцэтгэл, тн	3,085.3	3,057.7	3,107.8	3,113.4	3,125.7	3,098.5	4,077.1	-	872.4	**23,537.9**
		D13	-	1,284.2	2,572.1	1,570.6	2,053.1	-	-	-		7,480.0
		D16	-	531.0	-	463.7	1,072.6	-	-	-		2,067.3
		D22	-	-	535.8	-	-	-	-	-		535.8
		D25	-	539.8		541.9	-	-	-	-		1,081.7
		Арматур	-	**2,355.0**	**3,107.8**	**3,113.4**	**3,125.7**	-	-	-	-	**11,701.9**
		R80	2,015.2	-	-	-	-	2,035.7	4,077.1	-	872.4	9,000.4
		R40	1,070.1	702.7	-	-	-	1,062.8	-	-		2,835.6
		R12	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		Круг	**3,085.3**	**702.7**	-	-	-	**3,098.5**	**4,077.1**	-	872.4	**11,836.0**
		Биелэлт, %	**102.8%**	**101.9%**	**103.6%**	**103.8%**	**104.2%**	**103.3%**	**135.9%**	**#DIV/0!**	**29.1%**	**98.1%**

2 СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн ажил	Сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн ажлын биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Агаарын чанарт хяналт тавих, агаар бохирдуулагч бодисын хяналтыг тодорхой төлөвлөгөөний дагуу тогтмол хийх	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгасан хуваарийн дагуу агаарын шинжилгээг Дархан-Уул аймгийн УЦУОШТ-р гүйцэтгүүлсэн.	-	Дэлгэрэнгүйг 7 дугаар бүлгээс харна уу.
2	Тээврийн хэрэгслийн сул ажиллагааг хязгаарлах, хяналт тавих	БО-ны инженер өдөр тутмын тойрох үзлэг хийхдээ хяналт тавин ажилласан.	-	
3	Тогтмол хяналт тавьж ил задгай хог шатаалгахгүй байх	БО-ны инженер өдөр тутмын тойрох үзлэг хийхдээ хяналт тавин ажилласан.		
4	Хог хаягдлыг тогтмол хугацаанд зайлуулж, ариутгал хийх	Дархан-Уул аймгийн НААҮГ-тай байгуулсан гэрээний дагуу ахуйн хог хаягдыг тогтмол ачуулж ажилласан ба хогны саванд дотоодын нөөц боломжоор жавелионы уусмал ашиглан ариутгал хийсэн. Ариутгалын ажилд эрүүл ахуйч зааварчилгаа өгч ажилласан.	Дотоод зардал	Дэлгэрэнгүйг 6 дугаар бүлгээс харна уу. Хог хаягдал түр хадгалах савны ариутгал хийж буй зургийг Зураг 1-д хавсаргав
5	Дуу шуугианы хэмжилт хийж, дуу шуугиан бүхий машин механизмын ашиглалтыг оновчтой төлөвлөх, үр ашиггүй ашиглалтыг багасгах	БО-ны инженер өдөр тутмын тойрох үзлэг хийхдээ хяналт тавин ажилласан. Эрүүл ахуйчийн дуу шуугийн хэмжигч багаж гэмтэлтэй байсан тул шуугианы хэмжилт хийх боломжгүй болсон	-	

6	Бохир ус дамжуулах хоолойн холбоосуудаар ус алдагдаж байгаа эсэхийг үе үе хянах, тухай бүр нэн даруй засвар хийх	ҮШСЦ-ийн сантехникчид хяналт тавин ажилладаг ба засвар үйлчилгээ хийх шаардлага гараагүй	-	
7	Шатах тослох материал алдагдах үед авах яаралтай арга хэмжээг урьдчилан тодорхойлж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах	Арчих, хөвөөлөх, шингээх материалын нөөцийг ШТС-д төвлөрүүлэн ажиллаж байна.	Дотоод зардал	
8	Явган зам, зам талбайг шинээр хийх	Ажилчдын тогтмол зорчдог замуудыг үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарсан хаягдал тоосгыг ашиглан засаж сайжруулсан.	Дотоод зардал	Холбогдох зургийг Зураг 2-д хавсаргав.
9	Шатах тослох материал алдагдах, гэнэтийн ослын үед ашиглах багаж, материал төхөөрөмж бэлэн байлгах	Арчих, хөвөөлөх, шингээх материалын нөөцийг ШТС-д төвлөрүүлэн ажиллаж байна.	Дотоод зардал	
10	Хог хаягдал түр хадгалах цэгийг бетонжуулах	Шаардлагатай материалын худалдан авалт хийгдэж байна.	-	
11	Хөрсний хяналт шинжилгээг тогтмол хуваарийн дагуу хийх	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгасан хуваарийн дагуу агаарын шинжилгээг Дархан-Уул аймгийн УЦУОШТ-р гүйцэтгүүлсэн.	-	Дэлгэрэнгүйг 7 дугаар бүлгээс харна уу.
12	Хог хаягдлыг ангилан ялгаж байх	Хуванцар хог хаягдлыг ялган “SESL” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу дахин боловсруулалтанд өгсөн. Үүссэн хэмжээг Хог хаягдлын менежментийн хэсэгт тусгасан.	-	Хуванцар хог хаядлыг “SESL” ХХК-д ачуулж буй зургийг Зураг 3-д хавсаргав.

13	Нефтийн бүтээгдэхүүнээр хөрс бохирлогдсон газарт хөрсийг саармагжуулах арга хэмжээ авах	Хөрсний шинжилгээний дүнгээр нефтийн бүтээгдэхүүнээс бохирдсон хөрс байгаагүй.	-	Хөрсний шинжилгээний дүнг “Хавсралт” хэсэгт хавсаргав.
14	Үйл ажиллагаа явагдахаас өөр газруудад машин, техник явуулахгүй байх, замын нэгдсэн сүлжээг гаргах	Үйл ажиллагаа явагдахаас өөр газруудад машин, техник явуулахгүй байхад Харуулын алба хяналт тавин ажилласан.	-	
15	Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах 100 квт станц болон агаарын шугам дээр шувуу үргээгч байрлуулах	ШУА-ын Биологийн хүрээлэнгийн Шувуу судлалын лабораторийн эрхлэгч, доктор Д.Идэрбат судалгаа хийж шувуу үргээгч байрлуулах шаардлагагүй гэж үзсэн.	-	
16	Шатах тослох материал болон химийн бодис хадгалах ашиглах зааварчилгааны талаар ажилчидад сургалт хийх	ҮШСЦ, ТБЦ болон АТА-ны ажилчидад БО-ны инженерүүд сургалт орсон.	-	Сургалт явуулж буй зургийг Зураг 4-д хавсаргав.
17	Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах	Орчны тохижуулалт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэсэгт тусгасан.	-	Тайлангийн 3 дугаар бүлгээс дэлгэрэнгүйг харна уу.
18	Нэмэлт	Оффис, БҮЦ болон ТБЦ-д бага оврын ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулан ажилчид шууд ундны ус хэрэглэх боломжоор хангаж өгсөн.	4,950,000	Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулсан зургийг Зураг 5-д хавсаргав. Усны дээж авч шинжилгээ хийлгэсэн дүнг “Хавсралт” хэсэгт хавсаргав.
НИЙТ			4,950,000	

Зураг 1 Хогийн цэгүүдэд ариутгал хийж буй байдал

Үйлдвэрийн насос станцаас Цувимал үйлдвэрлэх цех хүртэлх зам, засмал замаас Чанарын агуулах хүртэлх нийт 15 орчим м замыг хаягдал тоосго ашиглан засаж, сайжруулсан.

Зураг 2 Хаягдал тоосго ашиглан явган хүний зам хийсэн байдал

"SESL" XXK-тай байгуулсан гэрээ:

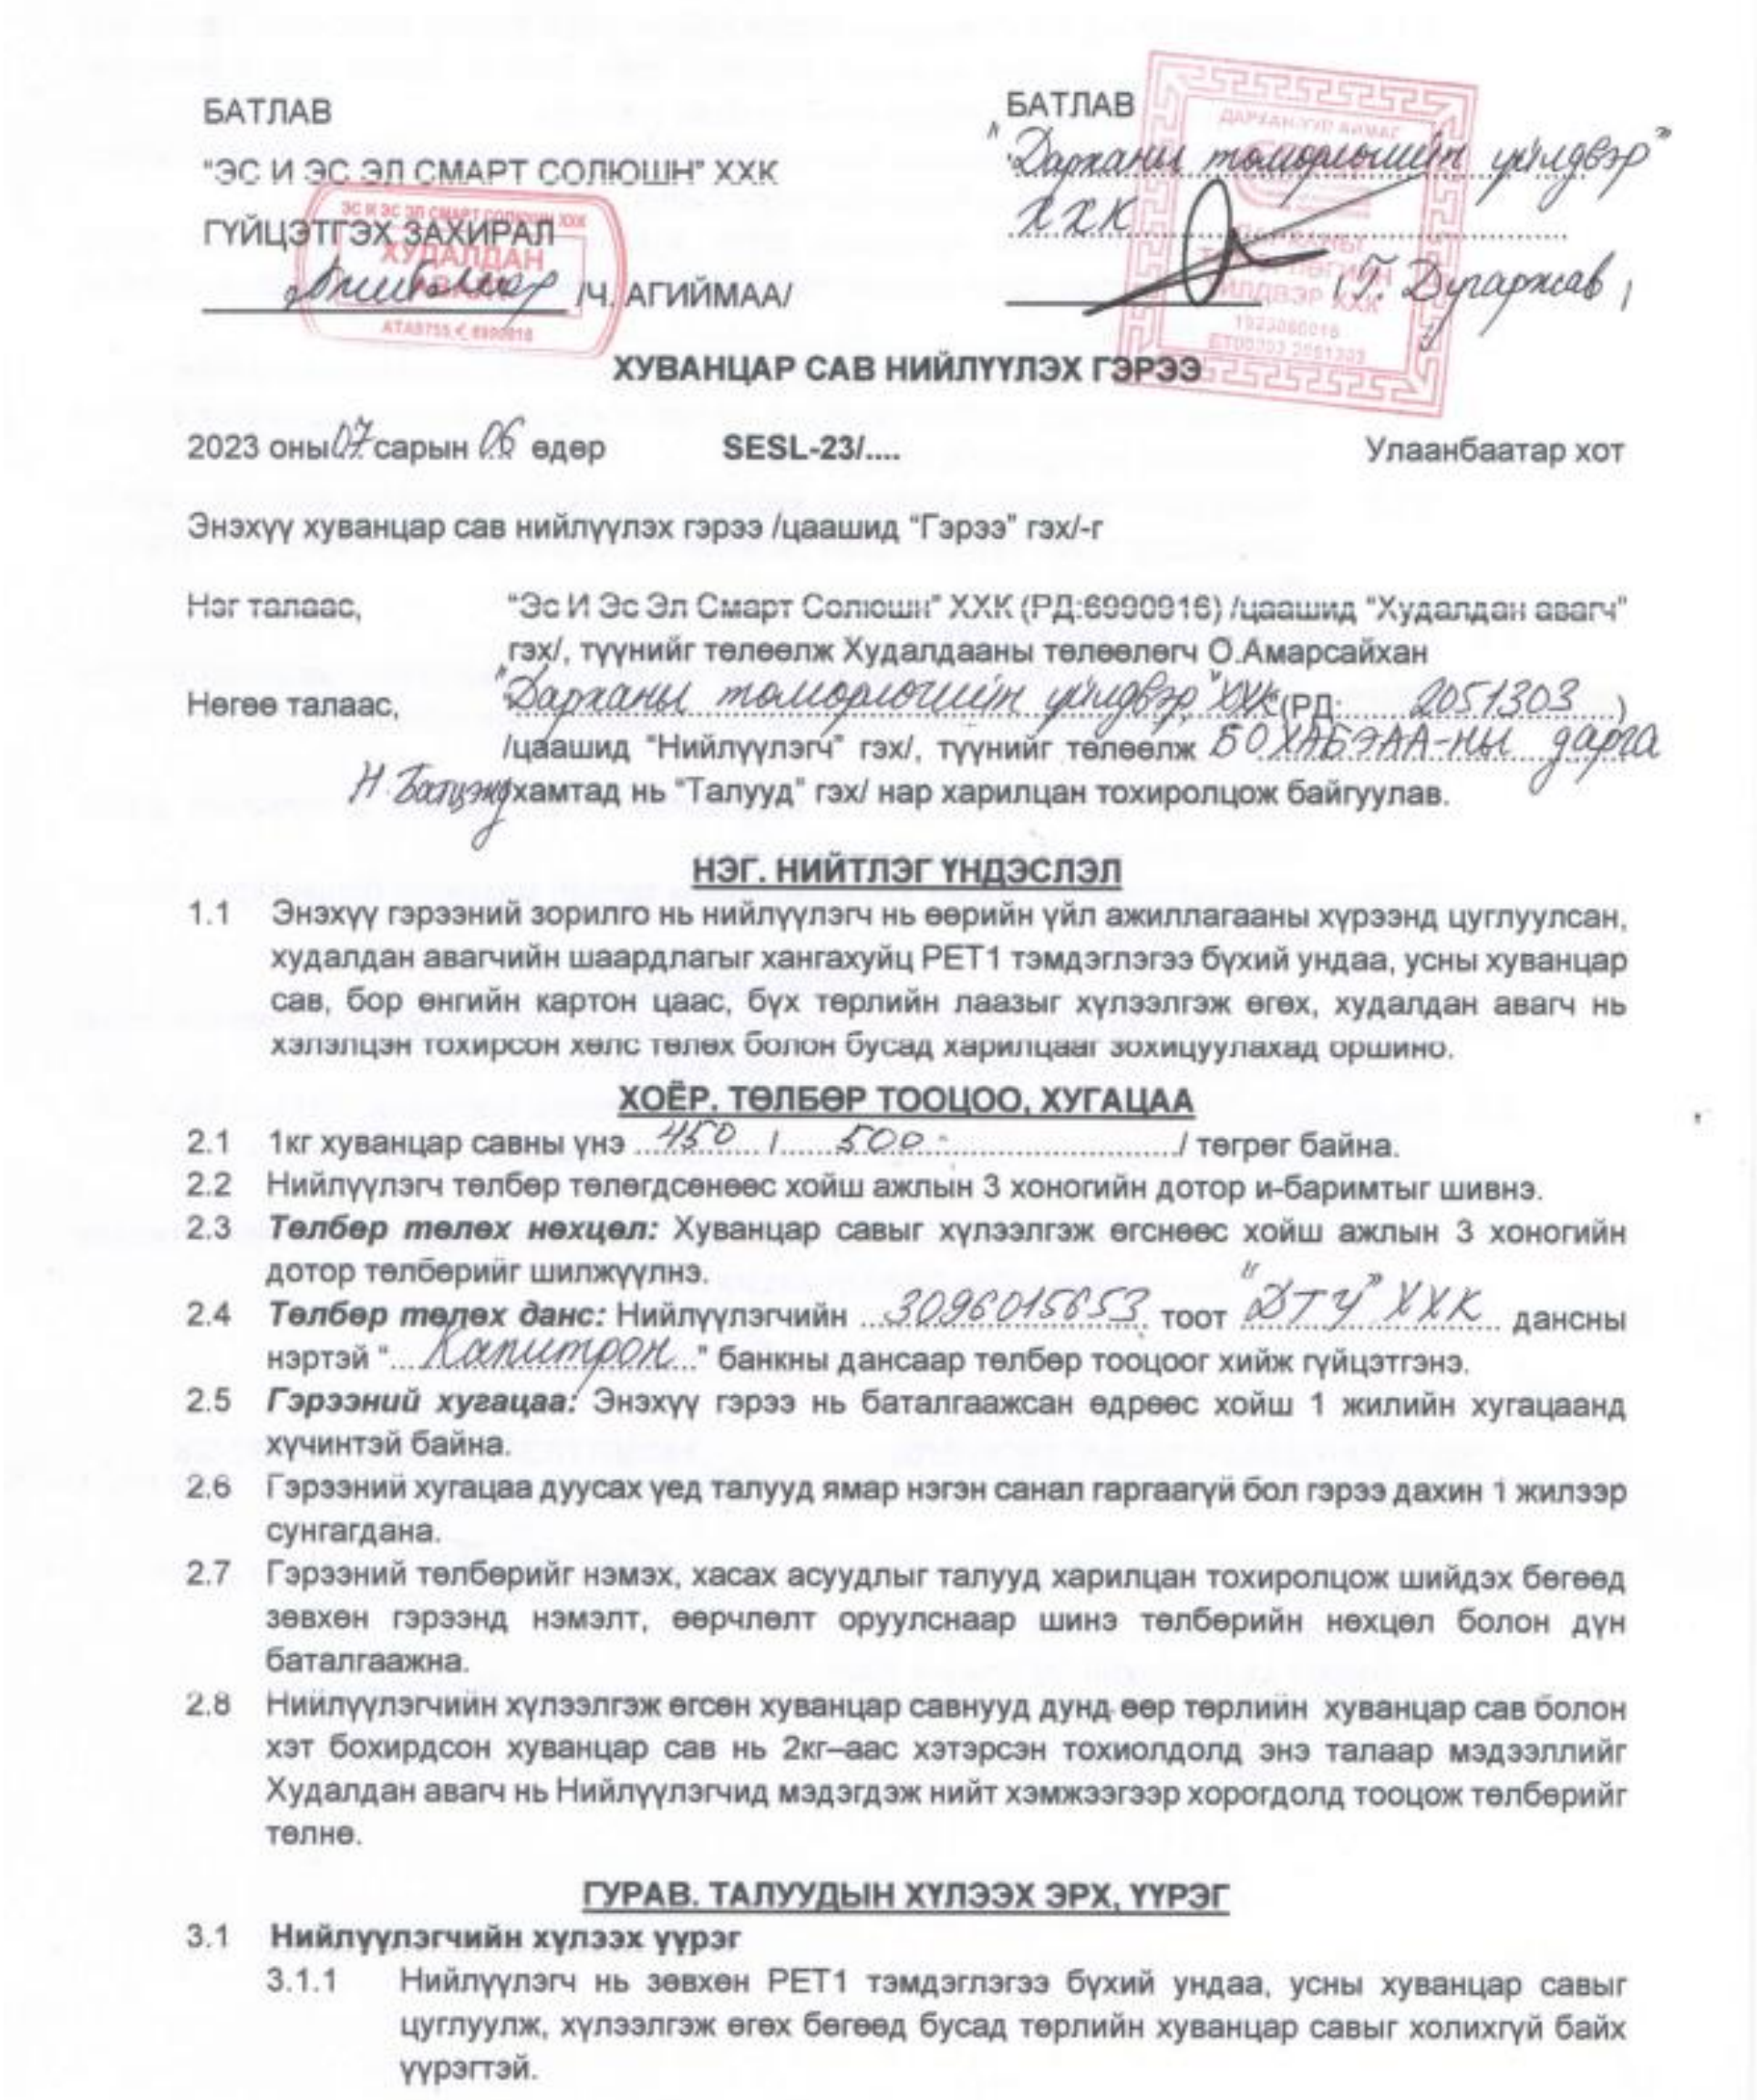

БАТЛАВ
"ЭС И ЭС ЭЛ СМАРТ СОЛЮШН" ХХК
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
__________ /Ч. АГИЙМАА/

БАТЛАВ
"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК
__________ /Т. Дуламжав/

ХУВАНЦАР САВ НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2023 оны 07 сарын 06 өдөр **SESL-23/....** Улаанбаатар хот

Энэхүү хуванцар сав нийлүүлэх гэрээ /цаашид "Гэрээ" гэх/-г

Нэг талаас, "Эс И Эс Эл Смарт Солюшн" ХХК (РД:6990916) /цаашид "Худалдан авагч" гэх/, түүнийг төлөөлж Худалдааны төлөөлөгч О.Амарсайхан

Нөгөө талаас, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК (РД: 2051303) /цаашид "Нийлүүлэгч" гэх/, түүнийг төлөөлж БОХАБЭАА-ны дарга Н.Батцэнд хамтад нь "Талууд" гэх/ нар харилцан тохиролцож байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Энэхүү гэрээний зорилго нь нийлүүлэгч нь өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд цуглуулсан, худалдан авагчийн шаардлагыг хангахуйц PET1 тэмдэглэгээ бүхий ундаа, усны хуванцар сав, бор энгийн картон цаас, бүх төрлийн лаазыг хүлээлгэж өгөх, худалдан авагч нь хэлэлцэн тохирсон хөлс төлөх болон бусад харилцааг зохицуулахад оршино.

ХОЁР. ТӨЛБӨР ТООЦОО, ХУГАЦАА

2.1 1кг хуванцар савны үнэ ...450 / 500... / төгрөг байна.
2.2 Нийлүүлэгч төлбөр төлөгдсөнөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор и-баримтыг шивнэ.
2.3 ***Төлбөр төлөх нөхцөл:*** Хуванцар савыг хүлээлгэж өгснөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор төлбөрийг шилжүүлнэ.
2.4 ***Төлбөр төлөх данс:*** Нийлүүлэгчийн ...3096015653... тоот "ДТҮ" ХХК дансны нэртэй "...Капитрон..." банкны дансаар төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэнэ.
2.5 ***Гэрээний хугацаа:*** Энэхүү гэрээ нь баталгаажсан өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
2.6 Гэрээний хугацаа дуусах үед талууд ямар нэгэн санал гаргаагүй бол гэрээ дахин 1 жилээр сунгагдана.
2.7 Гэрээний төлбөрийг нэмэх, хасах асуудлыг талууд харилцан тохиролцож шийдэх бөгөөд зөвхөн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулснаар шинэ төлбөрийн нөхцөл болон дүн баталгаажна.
2.8 Нийлүүлэгчийн хүлээлгэж өгсөн хуванцар савнууд дунд өөр төрлийн хуванцар сав болон хэт бохирдсон хуванцар сав нь 2кг–аас хэтэрсэн тохиолдолд энэ талаар мэдээллийг Худалдан авагч нь Нийлүүлэгчид мэдэгдэж нийт хэмжээгээр хорогдолд тооцож төлбөрийг төлнө.

ГУРАВ. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1 **Нийлүүлэгчийн хүлээх үүрэг**
3.1.1 Нийлүүлэгч нь зөвхөн PET1 тэмдэглэгээ бүхий ундаа, усны хуванцар савыг цуглуулж, хүлээлгэж өгөх бөгөөд бусад төрлийн хуванцар савыг холихгүй байх үүрэгтэй.

1/2

Зураг 3 Хуванцар хог хаягдал ачуулж буй байдал

Зураг 4 Төмөр бэлтгэх цехийн ажилчидад сургалт орж буй байдал

Зураг 5 Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулсны дараах байдал

3 ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ, ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн ажил	Сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн ажлын биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Шороон хэсгийг замтай болгон шороо босох байдлыг багасгах	Насос станцаас ЦҮЦ, Засмал замаас Засварын төв хүртэлх хэсгүүдэд хаягдал тоосго ашиглан явган хүний зам хийсэн.	Дотоод зардал	Тайлангийн 2-р бүлгийн 8-р хэсгээс дэлгэрэнгүйг харна уу
2	Цэцгийн мандал хийх	ҮШСЦ болон оффисын гадна талбайд 1200ш цэцгийн мандал суулган, арчилсан.	1,800,000	Цэцгийн мандал хийсэн зургийг Зураг 6-д хавсаргав.
3	Модыг тайрах насжилтыг уртасгах, ургалтыг дэмжих өнгө үзэмжийг сайжруулах	Үйлдвэрийн орчимд тарьсан моднуудад тайралт хийн ургалтыг дэмжиж, өнгө үзэмжийг сайжуулсан.	Дотоод зардал	Холбогдох зургийг Зураг 7-д хавсаргав
4	Зүлэгжүүлсэн талбайг услах	ҮШСЦ-н урд хэсэгт 0.7га орчим талбайг зүлэгжүүлсэн, мөн Үйлдвэрийн харьяа Төмөр хүний орчимд 20 гаран мод шилжүүлэн суулгаж ойр орчмыг зүлэгжүүлэн услаж, арчилж байна.	1,595,000	Холбогдох зургийг Зураг 8, 9-д хавсаргав.
5	Компанийн “Нэг сая” төлөвлөгөөний дагуу мод тарих	225ш нарс модыг Төмөртэй уурхайгаас шилжүүлэн Төмөр хүний орчимд суулган, арчилгаа тордолгооны ажил хийгдэж байна.	Дотоод зардал	Нарс суулгасан зургийг Зураг 10-д хавсаргав.
НИЙТ			**2,395,500**	

Зураг 6 Цэцгийн мандал хийсэн байдал

Зураг 7 Бут сөөг хэлбэржүүлсэн байдал

Зураг 8 Зүлэгжүүлэлт хийсэн байдал

Зураг 9 Үйлдвэрийг зүлгийг хадаж, услаж буй байдал

Зураг 10 Тэрбум модны хүрээнд Төмөр хүн орчимд суулгасан нарс

4 ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Төслийн талбай болон түүний нөлөөллийн бүсэд ямар нэгэн түүх соёлын дурсгалт зүйл ба археологийн олдвортой газар байхгүй. Төслийн хэрэгжилтийн явцад ямарваа нэгэн түүх соёлын дурсгалт зүйл олдох үед холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу засаг захиргааны байгууллага болон холбогдох байгууллага болох ШУА-ын Түүхийн хүрээлэнд даруй мэдэгдэж төслийн үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсооно.

5 ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн ажил	Сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн ажлын биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Ажиллагсадыг жилд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах.	“Эрдэнэт Медикал” эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан нийт 1444 ажилтанг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан.	Дотоод зардал	Эрүүл мэндийн үзлэгийн тайлан болон зургийг хавсаргав.
2	Ажиллагсадыг хөдөлмөр хамгааллын хошуувч, хувцас хэрэгслээр хангах, тогтмол хоргүйжүүлэх нэмэлт бүтээгдэхүүнээр хангах	Ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслээр бүрэн хангаж ажилласан ба хоргүйжүүлэх бэлдмэлийг шаардлагатай ажилчидад өгч ажилласан.	Дотоод зардал	Холбогдох гэрээнүүдийг хавсаргав.
3	Гал унтраах хэрэгслээр үйлдвэрийг бүрэн хангах арга хэмжээ авах, гал унтраах талаар тодорхой түвшинд бэлтгэлийг хангуулах арга хэмжээ зохион байгуулах	Гал аюулгүй байдал хариуцсан ХАБ-н инженер өдөр тутмын тойрох үзлэгээр хяналт тавин ажилласан. Шаардлагатай газруудад галын хор нэмж байршуулсан.	Дотоод зардал	
4	Байгалийн гамшиг, гэнэтийн ослоос сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах	Үйлдвэрийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг холбогдох төрийн байгууллагаар батлуулсан.	Дотоод зардал	Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хавсаргав
НИЙТ			**Дотоод зардал**	

“Эрдэнэт Медикал” эмнэлгийн үзлэг хийсэн тайлан:

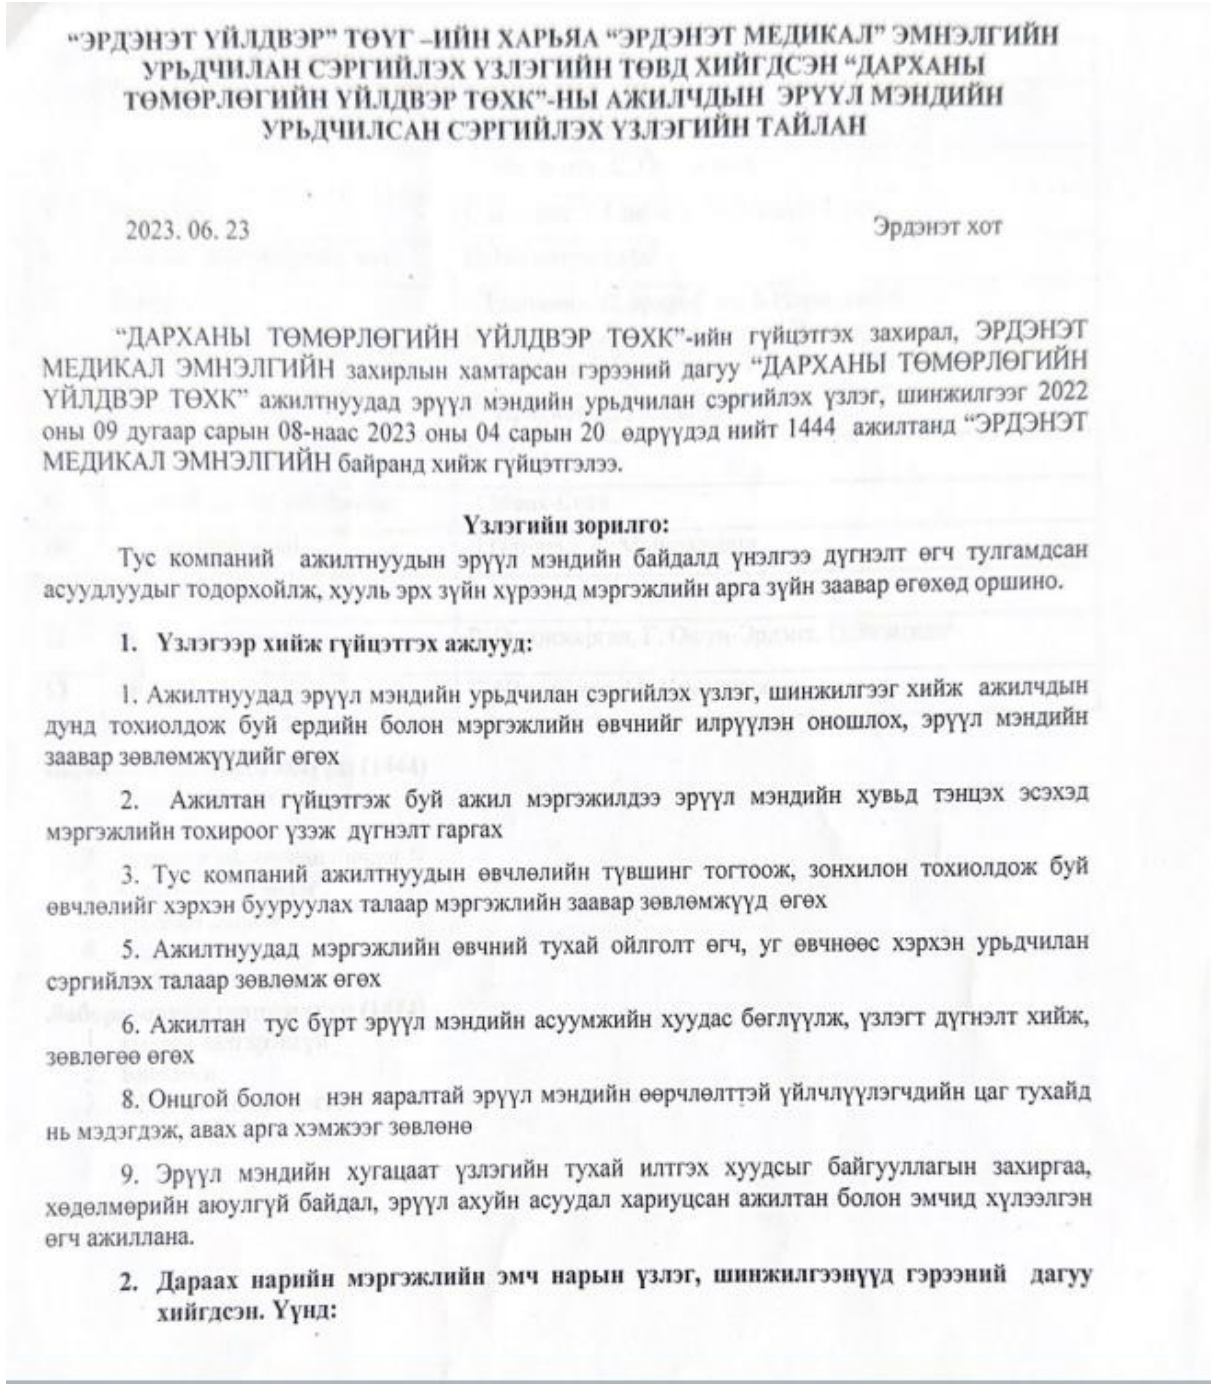

“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ –ИЙН ХАРЬЯА “ЭРДЭНЭТ МЕДИКАЛ” ЭМНЭЛГИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГИЙН ТӨВД ХИЙГДСЭН “ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ТӨХК”-НЫ АЖИЛЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛСАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГИЙН ТАЙЛАН

2023. 06. 23 Эрдэнэт хот

“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ТӨХК”-ийн гүйцэтгэх захирал, ЭРДЭНЭТ МЕДИКАЛ ЭМНЭЛГИЙН захирлын хамтарсан гэрээний дагуу “ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ТӨХК” ажилтнуудад эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээг 2022 оны 09 дугаар сарын 08-наас 2023 оны 04 сарын 20 өдрүүдэд нийт 1444 ажилтанд “ЭРДЭНЭТ МЕДИКАЛ ЭМНЭЛГИЙН байранд хийж гүйцэтгэлээ.

Үзлэгийн зорилго:

Тус компаний ажилтнуудын эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ дүгнэлт өгч тулгамдсан асуудлуудыг тодорхойлж, хууль эрх зүйн хүрээнд мэргэжлийн арга зүйн заавар өгөхөд оршино.

1. Үзлэгээр хийж гүйцэтгэх ажлууд:

1. Ажилтнуудад эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээг хийж ажилчдын дунд тохиолдож буй ердийн болон мэргэжлийн өвчнийг илрүүлэн оношлох, эрүүл мэндийн заавар зөвлөмжүүдийг өгөх

2. Ажилтан гүйцэтгэж буй ажил мэргэжилдээ эрүүл мэндийн хувьд тэнцэх эсэхэд мэргэжлийн тохироог үзэж дүгнэлт гаргах

3. Тус компаний ажилтнуудын өвчлөлийн түвшинг тогтоож, зонхилон тохиолдож буй өвчлөлийг хэрхэн бууруулах талаар мэргэжлийн заавар зөвлөмжүүд өгөх

5. Ажилтнуудад мэргэжлийн өвчний тухай ойлголт өгч, уг өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж өгөх

6. Ажилтан тус бүрт эрүүл мэндийн асуумжийн хуудас бөглүүлж, үзлэгт дүгнэлт хийж, зөвлөгөө өгөх

8. Онцгой болон нэн яаралтай эрүүл мэндийн өөрчлөлттэй үйлчлүүлэгчдийн цаг тухайд нь мэдэгдэж, авах арга хэмжээг зөвлөнө

9. Эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгийн тухай илтгэх хуудсыг байгууллагын захиргаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтан болон эмчид хүлээлгэн өгч ажиллана.

2. Дараах нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг, шинжилгээнүүд гэрээний дагуу хийгдсэн. Үүнд:

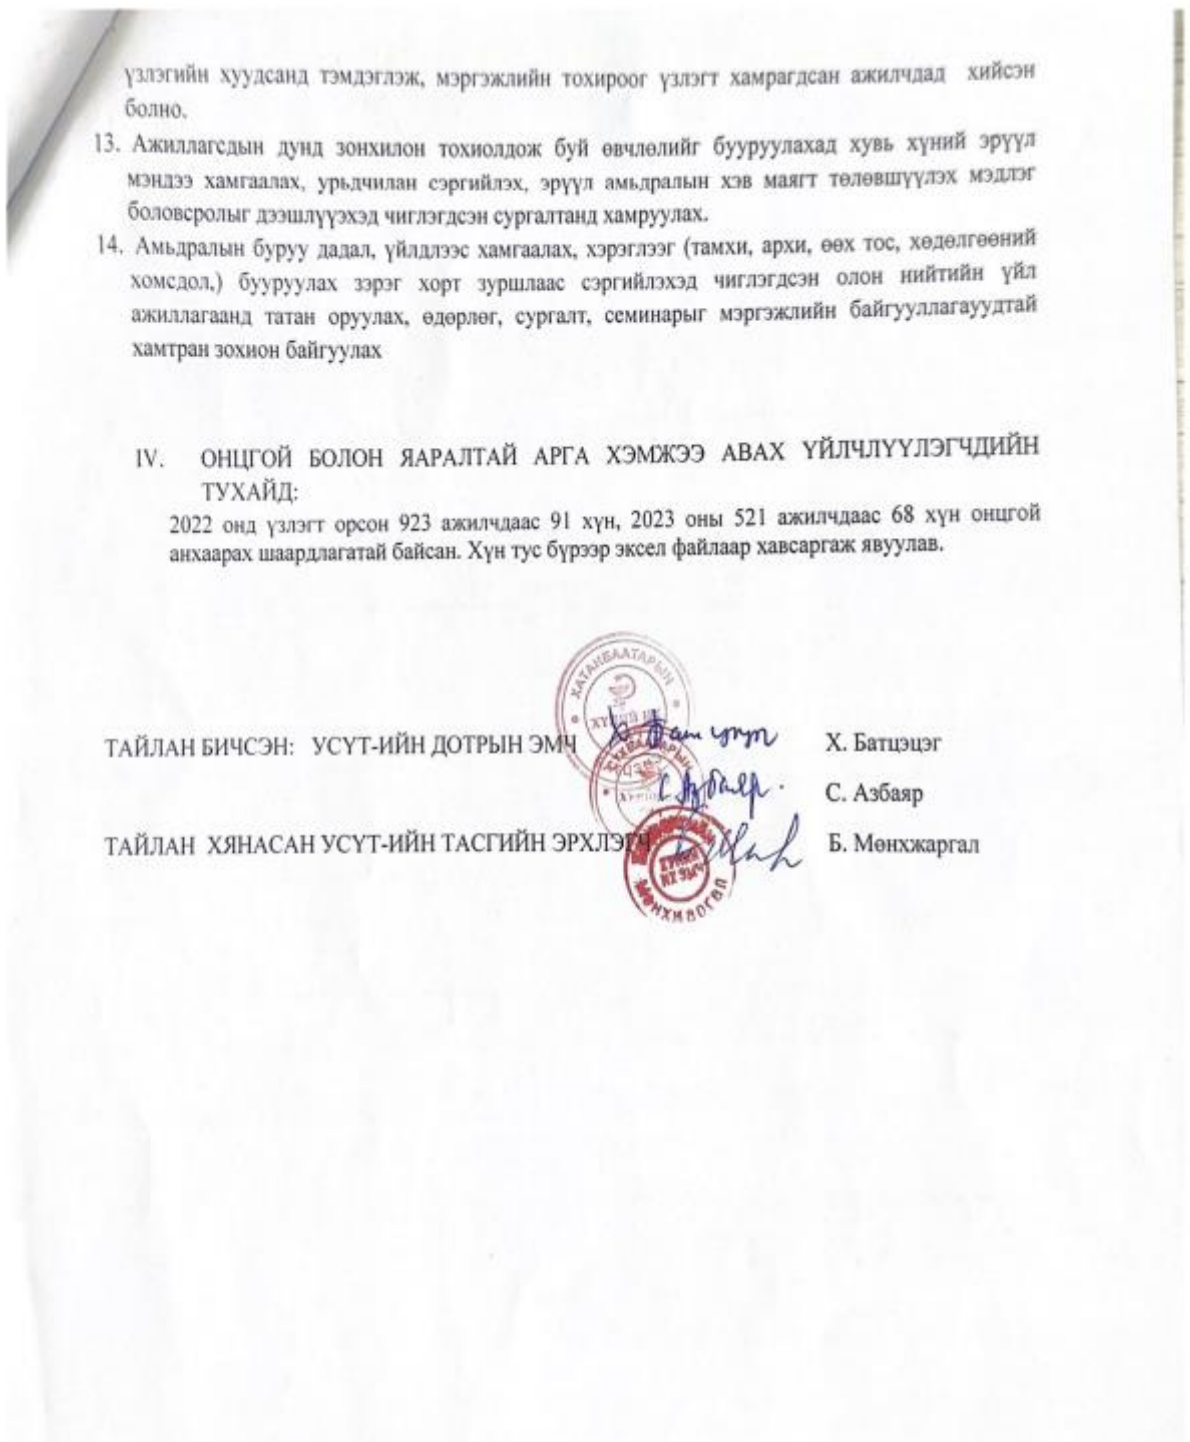

үзлэгийн хуудсанд тэмдэглэж, мэргэжлийн тохироог үзлэгт хамрагдсан ажилчдад хийсэн болно.

13. Ажиллагсдын дунд зонхилон тохиолдож буй өвчлөлийг бууруулахад хувь хүний эрүүл мэндээ хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдралын хэв маягт төлөвшүүлэх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн сургалтанд хамруулах.
14. Амьдралын буруу дадал, үйлдлээс хамгаалах, хэрэглээг (тамхи, архи, өөх тос, хөдөлгөөний хомсдол,) бууруулах зэрэг хорт зуршлаас сэргийлэхэд чиглэгдсэн олон нийтийн үйл ажиллагаанд татан оруулах, өдөрлөг, сургалт, семинарыг мэргэжлийн байгууллагауудтай хамтран зохион байгуулах

IV. ОНЦГОЙ БОЛОН ЯАРАЛТАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ТУХАЙД:

2022 онд үзлэгт орсон 923 ажилчдаас 91 хүн, 2023 оны 521 ажилчдаас 68 хүн онцгой анхаарах шаардлагатай байсан. Хүн тус бүрээр эксел файлаар хавсаргаж явуулав.

ТАЙЛАН БИЧСЭН: УСУТ-ИЙН ДОТРЫН ЭМЧ Х. Батцэцэг

С. Азбаяр

ТАЙЛАН ХЯНАСАН УСУТ-ИЙН ТАСГИЙН ЭРХЛЭГЧ Б. Мөнхжаргал

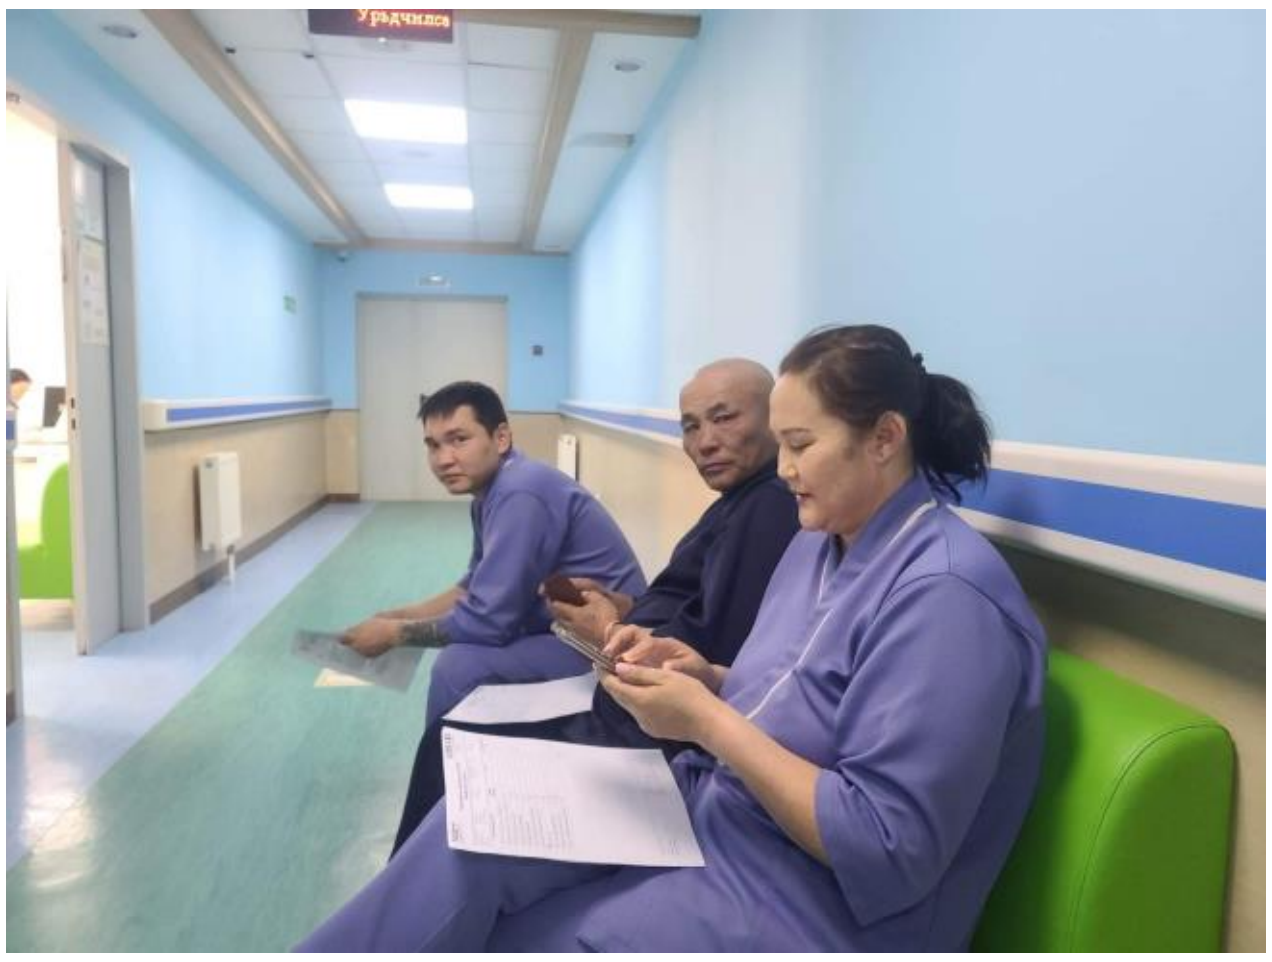

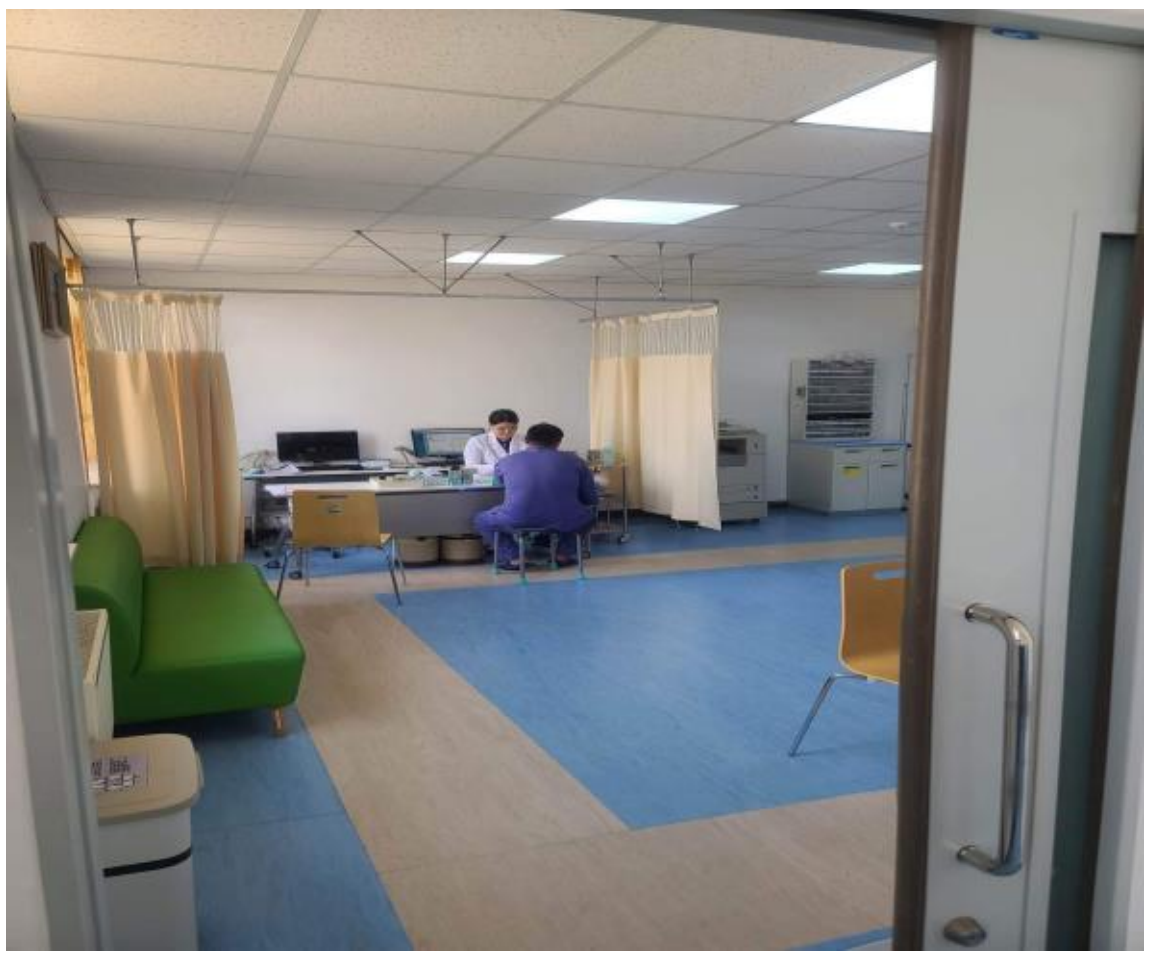

Зураг 11 Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж буй байдал

Ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгсэл болон хор саармагжуулах бүтээгдэхүүнээр хангах гэрээ:

БАТЛАВ
"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР"
ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
.... Г.ДУГАРЖАВ

БАТЛАВ
"ШҮТЭН-УУЛ" ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ
.... Н.Оюунцэцэг

"ЗУНЫ ХУВЦАС, КОМБЕНЗОН, НИМГЭН ЦАМЦ, НИМГЭН ХАНТААЗ, ХАНЦУЙВЧ, ТУСГАЙ ХУВЦАС" ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

Дугаар № ДААТҮТӨХК/2023042149

2023 оны 08-р сарын 30-ны өдөр — Дархан-Уул аймаг

Нэг талаас **"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК РД:2051303** (цаашид"Захиалагч" гэх) нь нөгөө талаас **"Шүтэн-Уул" ХХК, РД: 2545985** (цаашид "нийлүүлэгч" гэх)-ийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь "Бараа" гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх "Зуны хувцас, комбензон, нимгэн цамц, нимгэн хантааз, ханцуйвч, тусгай хувцас/"-ын үнэ нь **249,899,364.0 (хоёр зуун дөчин есөн сая найман зуун ерэн есөн мянга гурван зуун жаран дөрвөн)** төгрөг (цаашид "гэрээний үнэ" гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна. НӨАТ орсон.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **"Шүтэн-Уул" ХХК**-ийн харилцах ***[Төрийн банк]*** банкны ***[140801867108], [Капитрон банк]*** банкны ***[3006003591]*** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид "гэрээний баримт бичиг" гэх). Үүнд:
   - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл; **/2023.08.22 №01/1551**
   - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
   - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
   - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
   - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа; **/01.09.2023 дугаар 3035 23/102/**
   - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
   - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
   - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
     Эцэг/эх-ийн нэр: **Батжав**
     Нэр: **Тулгацогт**
     Албан тушаал: **Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн дарга**
     Ажлын утас:**75550011**
     Гар утас: **88111600**

БАТЛАВ
"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР"
ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Г.ДУГАРЖАВ

БАТЛАВ
"АЧИТ-АНДАГ" ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ
Д.БОЛОРМАА

"ХОР СААРМАГЖУУЛАХ РАШААН " ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

Дугаар № ДААТҮТӨХК/2023041565

2023 оны 09-р сарын 01-ний өдөр — Дархан-Уул аймаг

Нэг талаас **"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК РД:2051303** (цаашид"Захиалагч" гэх) нь нөгөө талаас **"АЧИТ-АНДАГ" ХХК, РД:4388984** (цаашид "нийлүүлэгч" гэх)-ийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь "Бараа" гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх "Хор саармагжуулах рашаан"-ы үнэ нь **136,161,000.0 (Нэг зуун гучин зургаан сая нэг зуун жаран нэгэн мянга)** төгрөг (цаашид "гэрээний үнэ" гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна. НӨАТ орсон.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **"АЧИТ-АНДАГ" ХХК**-ийн харилцах ***Төрийн банкны 131101857624*** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид "гэрээний баримт бичиг" гэх). Үүнд:
   - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл; **/2023.08.30 №01/1631/**
   - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
   - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
   - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
   - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
   - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
   - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
   - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
     Эцэг/эх-ийн нэр: **Батжав**
     Нэр: **Тулгацогт**
     Албан тушаал: **Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн дарга**
     Ажлын утас:**75550011**
     Гар утас: **88111600**
     Цахим шуудан: info@dmp.mn,
   - *4.2.* Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл

Үйлдвэрийн батлагдсан гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө:

БАТЛАВ:Гүйцэтгэх захирал.................Г.Дугаржав

ДАРХАН УУЛ АЙМГИЙН ХОНГОР СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ
"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР" ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХЯНАСАН: ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨЛТ БЭЛЭН БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН, ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УЛСЫН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ

Хянасан:Хошууч.......................................Н.Отгонбаяр

Боловсруулсан:ХАБЭА инженер ....Э.Баярсайхан

ДАРХАН-УУЛ

2023 ОН

1

6 ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн ажил	Сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн ажлын биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	НААҮГ-тай гэрээ байгуулан ачилтыг хугацаанд нь хийлгэх	Дархан-Уул аймгийн НААҮГ-тай гэрээ байгуулан, тогтмол ачуулж ажилласан.	3,430,000	Хог хаягдлын гэрээ болон хог хаягдал ачуулж буй зургийг хавсаргав. /Зураг 12/
2	Хог хаягдлыг ангилан ялгаж түр хадгалах, дахин боловсруулах боломжтой хогийг зөвшөөрөлтэй газар нийлүүлэх	Хаягдал бээлий, хуванцар хог хаягдлыг ангилан хаях дадлыг хэвшүүлэн, Хуванцар хог хаягдлыг “SESL” ХХК-тай гэрээ байгуулан дахин боловсруулалтанд өгч байна.	Дотоод зардал	-Хуванцар хог хаягдлын талаар дэлгэрэнгүйг 2 дугаар бүлгийн 12 дугаар хэсгээс харна уу. -Хаягдал бээлийг тусгай савнуудад хуримтлуулан, цуглуулж, угаалгын газарт угааж цэвэрлэн дахин ашиглахад бэлэн болгон хадгалж байна. Нийт 200 орчим кг бээлий цугларсан байна. /Зураг 13/
3	Хатуу хог хаягдал түр хадгалах цэгийг тохижуулах	Хог хаягдал түр хадгалах цэгийг тохижуулан бетонжуулахаар шаардлагатай материалын худалдан авалт хийгдэж байна.	-	
4	Хог хаягдал ангилан хадгалах зориулалтын цэгт хогийн савыг 3-аас доошгүй төрлөөр ялгаж, тэмдэгжүүлэх	Ахуйн хог хаягдал түр хадгалах савыг 3 ангилдаг байдлаар хийсэн.	7,658,000	Хогны сав хийж буй зургийг Зураг 14-д хавсаргав.
5	Нийтийн эзэмшлийн талбай, үйлчилгээний орчинд болон хариуцан хамгаалах талбайн орчинд хогийн сав байрлуулах	Оффис дотор 3 ангилдаг 1ш хогны сав, Оффисын 2 талд тамхины хогны сав, мөн цехүүдийн гадна 240л-ийн багтаамжтай 4ш түрдэг хогны савыг байршуулсан.	2,416,100	Зураг 15-д хогны савнуудын зургийг хавсаргав

6	Дахин боловсруулах	Технологийн хаягдлын талбайгаас металл хэсгийг ялган авах ажил хийгдэж 100 орчим тн металлыг хаягдал шаарнаас ялган авч үйлдвэрлэлд эргүүлэн ашигласан	Дотоод зардал	Хаягдал шаарнаас металл хэсгийг ялган авч буй зургийг Зураг 16-д хавсаргав
7	Технологийн хаягдлуудыг холилдож, хөрс бохирдуулахаас сэргийлж тусд нь хадгалах	Үйлдвэрийн технологиос гарах хаягдал шаар, зэв, тоосго, уутан фильтр зэргийг тус тусад нь хадгалж, гарсан тоо хэмжээ бүрээр бүртгэл хөтлөн ажилласан.	-	Холбогдох мэдээллийг Хуудас 25-с харна уу.
8	Хаягдал төмөртэй хамт аюултай хог хаягдал орж ирэхгүй байхад тогтмол хяналт тавьж ажиллах	“Хаягдал төмөр хүлээн авах” журмын дагуу хаягдал төмөртэй хамт аюултай хог хаягдал оруулахгүй байхад ЧХХ-с хяналт тавин ажилладаг	-	Холбогдох журмыг хавсаргав
9	Эмнэлгийн хог хаягдлыг мэргэжлийн байгууллагад өгч устгуулах	АШТҮХ-с гарах аюултай хог хаягдлыг Нэгдсэн эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт устгалд өгсөн.	120,000	Эмнэлгийн хог хаягдал устгуулахаар өгч буй зургийг Зураг 17-д хавсаргав.
10	Аюултай хог хаягдлын бүртгэл хөтлөж, хяналт тавих	Хог хаягдлын батлагдсан бүртгэлийн маягтын дагуу гарах хог хаягдлын төрөл тус бүрээр нь бүртгэл хөтлүүлэн холбогдох нэгжүүдээс сар бүр хог хаягдлын мэдээг авч ажилласан.	-	Хог хаягдлын бүртгэлийн маягтын дагуу хөтөлсөн байдлыг 2023.10 сар хүртэлх гарсан хог хаягдлын хэмжээтэй хамт хавсаргав.
11	Нэмэлт	Сум галт зэвсэг түр хадгалах цэгт хайрга дэвсэн,	Дотоод зардал	Холбогдох зургийг Зураг 18-д хавсаргав

		хашаажуулж тохижуулсан.		
12		Долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт бүх нийтийн цэвэрлэгээний өдөр болгон нэгж хэсгүүд хуваарьт талбайгаа цэвэрлэж хэвшсэн	-	Цэвэрлэгээ хийж буй зургийг Зураг 19-д хавсаргав.
13		Хаврын их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан.	Дотоод зардал	Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох зургийг хавсаргав. /Зураг 20/
14		“ЮТО” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу 16тн хаягдал тосыг устгалд өгсөн.	2,255,150	Хаягдал тос ачуулсан акт болон зургийг Зураг 21-д хавсаргав
НИЙТ			**15,879,250**	

Дархан-Уул аймгийн НААҮГ-тай байгуулсан гэрээ:

БАТЛАВ:
“ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР”-ЫН ДАРГА
З.ЭРДЭНЭБАТ

БАТЛАВ:
“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК”-н ЗАХИРАЛ /ДАРГА/
Г. Бурмаа

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

2022оны 9 сар 1 өдөр №25 Дархан-Уул аймаг

Иргэн, ААН байгууллагын нэр	“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК	
Регистерийн дугаар		
Үйл ажиллагааны чиглэл		
Иргэн, ААНБ-ын хаяг	14-р баг	
ААНБ-ын холбогдох утас	88983978, 99109775	
Данс	100190100947	
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төрөл	Сард ....төгрөг	Рейсийн тоогоор 1 рейс 1м³ 15000 Төгрөг
Төлбөрийн нөхцөл		
Гэрээний хугацаа	2022 оны 9-р сарын 1-ны өдрөөс 2023 оны 9-р сарын 1-ны өдөр хүртэл	
Гэрээний сунгалт		

Гүйцэтгэгч талаас “Дархан Хот Тохижилт Үйлчилгээний Газар” ОНӨААТҮГ-ыг төлөөлж Ахлах байцаагч Даш-ёндон овогтой Нарантуяа Нөгөө талаас ....Д............овогтой.....Мөнхсайхан...../цаашид захиалагч тал гэх/ нар нь "Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хууль", "Зөрчлийн тухай хууль" эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудыг үндэслэн харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээний зорилго нь гүйцэтгэгч тал нь ААНБ-аас гарч байгаа ахуйн болон аюултай, эрсдэлтэй хог хаягдлыг гэрээнд заасан хугацаанд ачиж тээвэрлэх түрж булж устгах, захиалагч тал нь гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрийг төлөх болон байгууллага хоорондын ажлын уялдааг сайжруулж хариуцлагыг дээшлүүлэхэд оршино.

Хоёр. Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

2.1 Захиалагч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй

2.2 Хог хаягдал тээвэрлэсний хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулахыг шаардах эрхтэй

2.3 хог тээврийн машин орж ачих боломжгүй байршилд байгаа, тогтоосон цэгт төвлөрүүлээгүй, хог тээврийн хураамжаа тайлант хугацаанд төлөөгүй, хуримтлагдсан өртэй ААНБ-ын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.

2.4 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжуудыг үндэслэн хог хаягдлаа ачиж тээвэрлүүлэх, зориулалтын зөвшөөрөгдсөн цэгт хаяхыг шаардах эрхтэй

2.5 хог хаягдлыг дуудлагаар буюу графикт хугацаанд гэрээний дагуу ачих үүрэг хүлээнэ.

2.6 Ажлын ачаалал, цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч графикт хугацаанд хогийг ачиж тээвэрлэж чадахгүй бол урьдчилан мэдэгдэнэ.

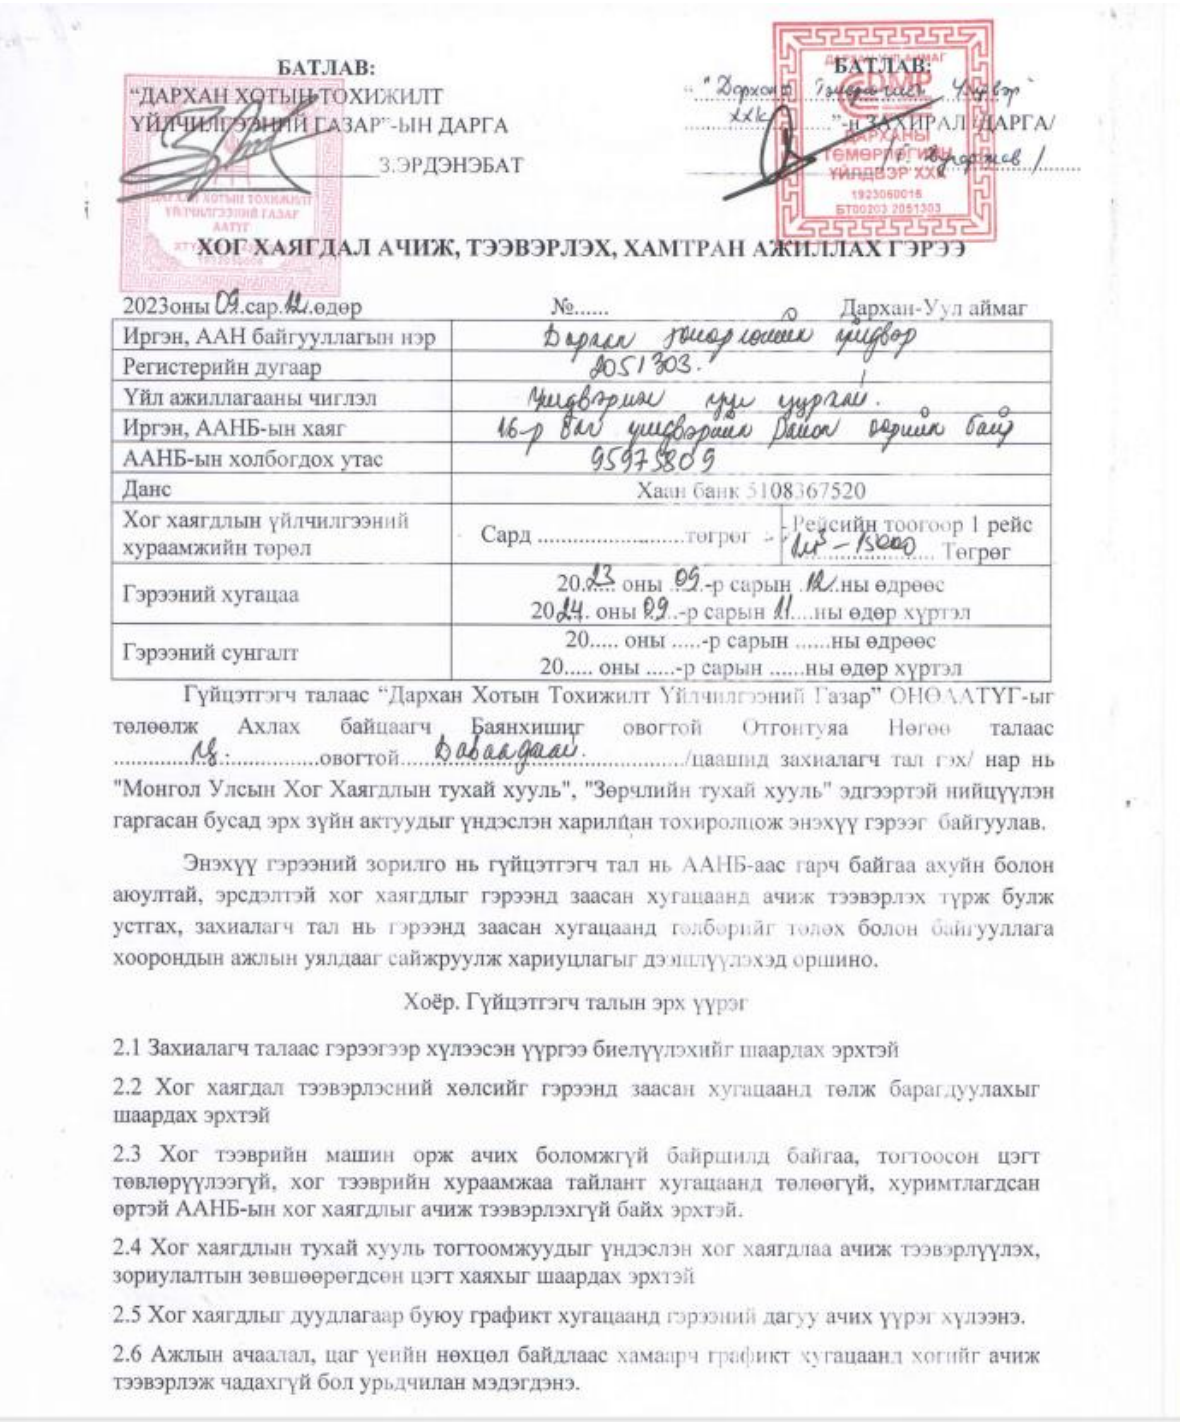

БАТЛАВ:
“ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР”-ЫН ДАРГА
З.ЭРДЭНЭБАТ

БАТЛАВ:
“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК”-н ЗАХИРАЛ /ДАРГА/

ХОГ ХАЯГДАЛ АЧИЖ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

2023оны 09 сар 12 өдөр №...... Дархан-Уул аймаг

Иргэн, ААН байгууллагын нэр	Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр	
Регистерийн дугаар	2051303	
Үйл ажиллагааны чиглэл		
Иргэн, ААНБ-ын хаяг	16-р баг	
ААНБ-ын холбогдох утас	95975809	
Данс	Хаан банк 5108367520	
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төрөл	Сард ....төгрөг	Рейсийн тоогоор 1 рейс 1м³ - 15000 Төгрөг
Гэрээний хугацаа	2023 оны 09-р сарын 12-ны өдрөөс 2024 оны 09-р сарын 11-ны өдөр хүртэл	
Гэрээний сунгалт	20..... оны .....-р сарын ......ны өдрөөс 20..... оны .....-р сарын ......ны өдөр хүртэл	

Гүйцэтгэгч талаас “Дархан Хотын Тохижилт Үйлчилгээний Газар” ОНӨААТҮГ-ыг төлөөлж Ахлах байцаагч Баянхишиг овогтой Отгонтуяа Нөгөө талаас ....овогтой.../цаашид захиалагч тал гэх/ нар нь "Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хууль", "Зөрчлийн тухай хууль" эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудыг үндэслэн харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээний зорилго нь гүйцэтгэгч тал нь ААНБ-аас гарч байгаа ахуйн болон аюултай, эрсдэлтэй хог хаягдлыг гэрээнд заасан хугацаанд ачиж тээвэрлэх түрж булж устгах, захиалагч тал нь гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрийг төлөх болон байгууллага хоорондын ажлын уялдааг сайжруулж хариуцлагыг дээшлүүлэхэд оршино.

Хоёр. Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

2.1 Захиалагч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй

2.2 Хог хаягдал тээвэрлэсний хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулахыг шаардах эрхтэй

2.3 Хог тээврийн машин орж ачих боломжгүй байршилд байгаа, тогтоосон цэгт төвлөрүүлээгүй, хог тээврийн хураамжаа тайлант хугацаанд төлөөгүй, хуримтлагдсан өртэй ААНБ-ын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.

2.4 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжуудыг үндэслэн хог хаягдлаа ачиж тээвэрлүүлэх, зориулалтын зөвшөөрөгдсөн цэгт хаяхыг шаардах эрхтэй

2.5 Хог хаягдлыг дуудлагаар буюу графикт хугацаанд гэрээний дагуу ачих үүрэг хүлээнэ.

2.6 Ажлын ачаалал, цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч графикт хугацаанд хогийг ачиж тээвэрлэж чадахгүй бол урьдчилан мэдэгдэнэ.

Зураг 12 НААҮГ хог хаягдал ачиж буй байдал

Зураг 13 Хаягдал бээлий цуглуулах сав

Зураг 14 3 ангилдаг хогны сав хийж буй байдал

Зураг 15 Оффисын орчимд болон цехүүдэд байршуулсан хогны савнууд

Зураг 16 Металл ялгах ажил хийгдэж буй байдал

Хаягдал төмөр хүлээн авах журам:

Зураг 17 Эмнэлгийн хог хаягдал устгалд өгч буй байдал

Хог хаягдлыг нэр төрөл тус бүрээр бүртгэхээр баталгаажуулсан баримт:

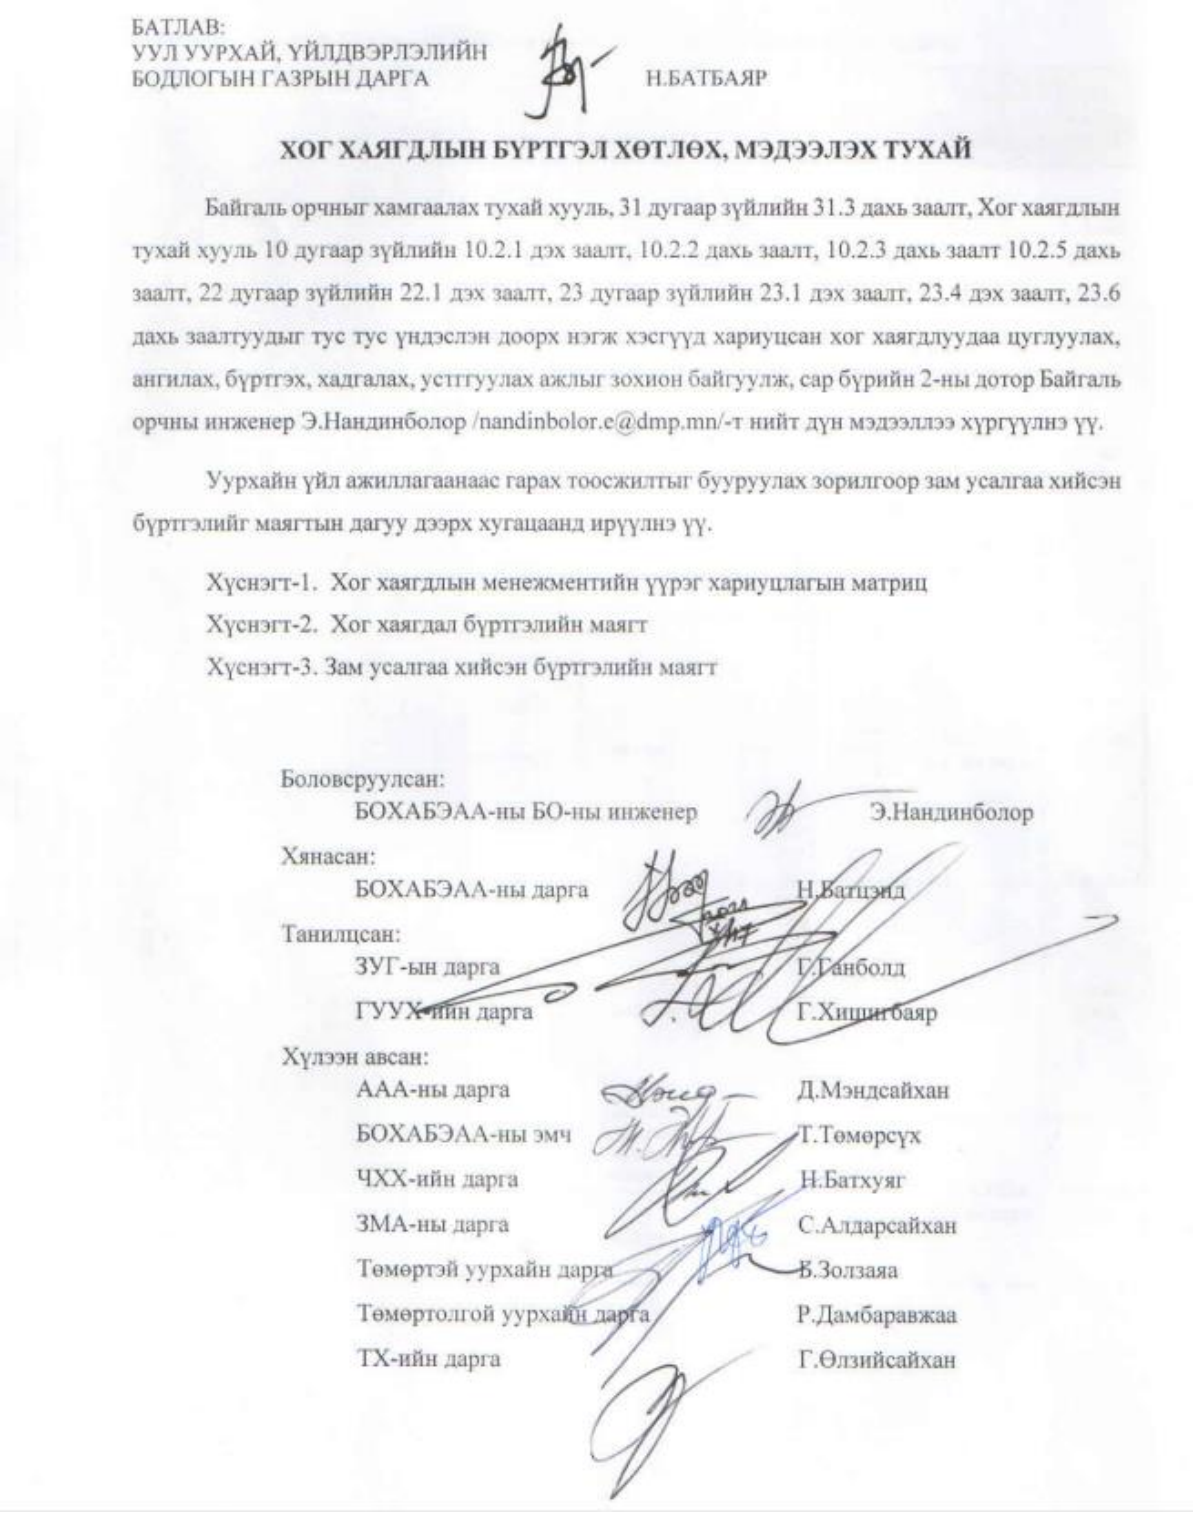

БАТЛАВ:
УУЛ УУРХАЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН
БОДЛОГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Н.БАТБАЯР

ХОГ ХАЯГДЛЫН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, МЭДЭЭЛЭХ ТУХАЙ

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, 31 дугаар зүйлийн 31.3 дахь заалт, Хог хаягдлын тухай хууль 10 дугаар зүйлийн 10.2.1 дэх заалт, 10.2.2 дахь заалт, 10.2.3 дахь заалт 10.2.5 дахь заалт, 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх заалт, 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх заалт, 23.4 дэх заалт, 23.6 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн доорх нэгж хэсгүүд хариуцсан хог хаягдлуудаа цуглуулах, ангилах, бүртгэх, хадгалах, устгуулах ажлыг зохион байгуулж, сар бүрийн 2-ны дотор Байгаль орчны инженер Э.Нандинболор /nandinbolor.e@dmp.mn/-т нийт дүн мэдээллээ хүргүүлнэ үү.

Уурхайн үйл ажиллагаанаас гарах тоосжилтыг бууруулах зорилгоор зам усалгаа хийсэн бүртгэлийг маягтын дагуу дээрх хугацаанд ирүүлнэ үү.

Хүснэгт-1. Хог хаягдлын менежментийн үүрэг хариуцлагын матриц
Хүснэгт-2. Хог хаягдал бүртгэлийн маягт
Хүснэгт-3. Зам усалгаа хийсэн бүртгэлийн маягт

Боловсруулсан:
БОХАБЭАА-ны БО-ны инженер Э.Нандинболор
Хянасан:
БОХАБЭАА-ны дарга Н.Батцэнд
Танилцсан:
ЗУГ-ын дарга Г.Ганболд
ГУУХ-ийн дарга Г.Хишигбаяр
Хүлээн авсан:
ААА-ны дарга Д.Мэндсайхан
БОХАБЭАА-ны эмч Т.Төмөрсүх
ЧХХ-ийн дарга Н.Батхуяг
ЗМА-ны дарга С.Алдарсайхан
Төмөртэй уурхайн дарга Б.Золзаяа
Төмөртолгой уурхайн дарга Р.Дамбаравжаа
ТХ-ийн дарга Г.Өлзийсайхан

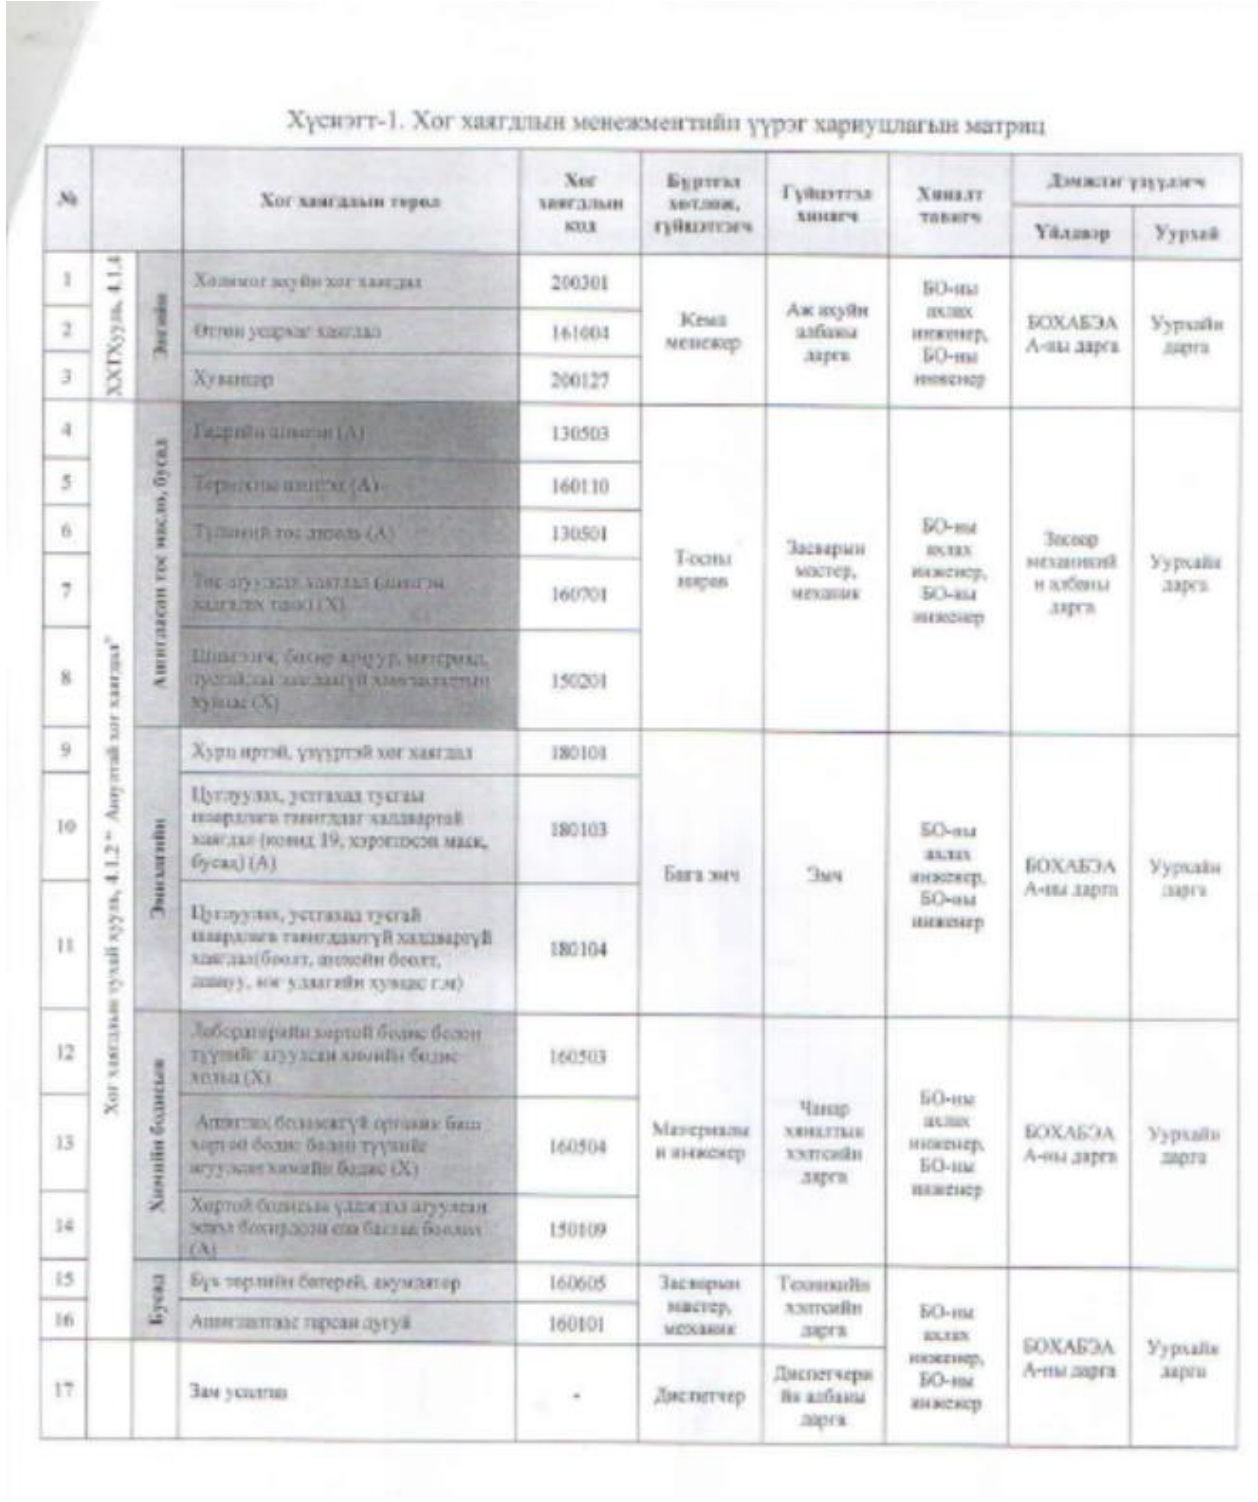

Хүснэгт-1. Хог хаягдлын менежментийн үүрэг хариуцлагын матриц

№			Хог хаягдлын төрөл	Хог хаягдлын код	Бүртгэл хөтлөх, гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэл хянагч	Хяналт тавигч	Дэмжлэг үзүүлэгч	
								Үйлдвэр	Уурхай
1	ХХТХууль, 4.1.4	Энгийн	Холимог ахуйн хог хаягдал	200301	Кемп менежер	Аж ахуйн албаны дарга	БО-ны ахлах инженер, БО-ны инженер	БОХАБЭА А-ны дарга	Уурхайн дарга
2			[illegible] хаягдал	161004					
3			[illegible]	200127					
4	Хог хаягдлын тухай хууль, 4.1.2" Аюултай хог хаягдал"	Ашиглагдсан тос масло, бусад	[illegible] шингэн (A)	130503	Тосны нярав	Засварын мастер, механик	БО-ны ахлах инженер, БО-ны инженер	Засвар механикийн албаны дарга	Уурхайн дарга
5			Тормозны шингэн (A)	160110					
6			Түлшний тос дизель (A)	130501					
7			Тос агуулсан хаягдал (шингэн хадгалах танк) (X)	160701					
8			[illegible], бохир арчуур, материал, [illegible] (X)	150201					
9		Эмнэлгийн	Хурц иртэй, үзүүртэй хог хаягдал	180101	Бага эмч	Эмч	БО-ны ахлах инженер, БО-ны инженер	БОХАБЭА А-ны дарга	Уурхайн дарга
10			Цуглуулах, устгахад тусгай шаардлага тавигддаг халдвартай хаягдал (ковид 19, хэрэглэсэн маск, бусад) (A)	180103					
11			Цуглуулах, устгахад тусгай шаардлага тавигддаггүй халдваргүй хаягдал(боолт, гипсэн боолт, даавуу, нэг удаагийн хувцас г.м)	180104					
12		Химийн бодисын	Лабораторийн хортой бодис болон түүнийг агуулсан химийн бодис [illegible] (X)	160503	Материалын инженер	Чанар хяналтын хэлтсийн дарга	БО-ны ахлах инженер, БО-ны инженер	БОХАБЭА А-ны дарга	Уурхайн дарга
13			Аюултай бодисгүй органик бус хортой бодис болон түүнийг агуулсан химийн бодис (X)	160504					
14			Хортой бодисын үлдэгдэл агуулсан эсвэл бохирдсон сав баглаа боодол (A)	150109					
15		Бусад	Бүх төрлийн батерей, аккумлятор	160605	Засварын мастер, механик	Техникийн хэлтсийн дарга	БО-ны ахлах инженер, БО-ны инженер	БОХАБЭА А-ны дарга	Уурхайн дарга
16			Ашиглалтаас гарсан дугуй	160101					
17			Зам усалгаа	-	Диспетчер	Диспетчерийн албаны дарга			

Энгийн хог хаягдал бүртгэсэн байдал:

Хүснэгт-2 Хог хаягдал бүртгэлийн маягт

"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ТӨХК		Нэгж хэсгийн нэр: Үйлдвэр-ААА															
		2023 оны 07-р сар															
ХАЯГДЛЫН ТӨРӨЛ	Хэмжих нэгж	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Нийт
ЭНГИЙН/АЮУЛТАЙ: Хатуу хог хаягдал	кг									8						2	10
Хуванцар сав	кг															100	100
																	100
Нийт																	
ҮҮНЭЭС																	
Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт нийлүүлсэн										+							
Дахин боловсруулсан																	
Дахин ашигласан																+	
Хадгалж байгаа																	
Тайлбар																	
Бүртгэл хөтөлсөн ажилтны албан тушаал		ААА-ны ажилтан						Овог нэр		Х.Нандинцэцэг			Гарын үсэг				
Хянасан ажилтны албан тушаал		ААА-ны дарга						Овог нэр		Ц.Даваадалай			Гарын үсэг				

Лабораторийн хог хаягдал бүртгэсэн байдал:

Хүснэгт-2 Хог хаягдал бүртгэлийн маягт

"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ТӨХК		Нэгж хэсгийн нэр: ЧХХ – ЧХХ- Материалын лаборатори үйлдвэрийн хэсэг															
		2023 оны 07-р сар															
ХАЯГДЛЫН ТӨРӨЛ	Хэмжих нэгж	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Нийт
ЭНГИЙН/АЮУЛТАЙ: Химийн бодисын хуванцар сав	Гр										105,4						105.4
Химийн бодисын шилэн сав	Гр											347					347
Пресслэсэн дээж/борын хүчил/	Гр	515	125	65	80	245		50	440	140	215		350			305	4950
Шилэн дээж/flux/	Гр																0
ҮШСЦ /шилэн сав/	Гр	8527,5															8527.5
Төмөртэй уурхайн /шахмал дээж/	Гр											46100					46100
Нийт																	
ҮҮНЭЭС																	
Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт нийлүүлсэн																	
Дахин боловсруулсан																	
Дахин ашигласан																	
Хадгалж байгаа	1-7р сарын байдлаар Хатуу хаягдал - 102.2кг , хуванцар сав – 1,4кг , шил – 18,23кг																
Тайлбар																	
Бүртгэл хөтөлсөн ажилтны албан тушаал		МРШ-ний инженер						Овог нэр		Б.Энхбаяр			Гарын үсэг				
Хянасан ажилтны албан тушаал		Чанарын менежер						Овог нэр		А.Чулуунцэцэг			Гарын үсэг				

Бэлдэц үйлдвэрлэх цехээс гарах хог хаягдлыг бүртгэсэн байдал:

Хүснэгт-2 Хог хаягдал бүртгэлийн маягт

"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ТӨХК			Нэгж хэсгийн нэр: БҮЦ															
			2023 оны 07-р сар															
	ХАЯГДЛЫН ТӨРӨЛ	Хэмжих нэгж	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Нийт
ЭНГИЙН/АЮУЛТАЙ	Уутан фильтер	ш	3							5			1					11
	Зэв	тн	2.55	2.55	2.55	2.55	2,55		2,55	2,55	'	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	43.35
Нийт																		
ҮҮНЭЭС																		
Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт нийлүүлсэн			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Дахин боловсруулсан																		
Дахин ашигласан																		
Хадгалж байгаа			+							+			+					
Тайлбар																		
Бүртгэл хөтөлсөн ажилтны албан тушаал			Хайлахын технологич инженер						Овог нэр		Б.Самбалхүндэв			Гарын үсэг		[signature]		
Хянасан ажилтны албан тушаал			БҮЦ-н дарга						Овог нэр		Х.Баярсайхан			Гарын үсэг				

Анхан шатны тусламж үзүүлэх хэсгээс гарах хог хаягдлыг бүртгэсэн байдал:

Хүснэгт-2 Хог хаягдал бүртгэлийн маягт

"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ТӨХК			Нэгж хэсгийн нэр: АШТҮХ															
			2023 оны ....07.-р сар															
	ХАЯГДЛЫН ТӨРӨЛ	Хэмжих нэгж	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Нийт
ЭНГИЙН/АЮУЛТАЙ	Халдвартай хог хаягдал	кг						4,6/ТХУ/	5,5									
	Хурц үзүүртэй, иртэй хог	кг						2,1/ТХУ/	3,2									
	Хугацаа дууссан эм/тос/	кг							0,8									
Нийт								6,7/ТХУ/	9,5									16,2
ҮҮНЭЭС																		
Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт нийлүүлсэн				ДНЭ														
Дахин боловсруулсан																		
Дахин ашигласан																		
Хадгалж байгаа																		
Тайлбар			Дархан нэгдсэн эмнэлэгт гэрээний дагуу очч устгуулсан болно.															
Бүртгэл хөтөлсөн ажилтны албан тушаал			Сувилагч						Овог нэр		Б.Сувдэрдэнэ			Гарын үсэг		[signature]		
Хянасан ажилтны албан тушаал			Их эмч						Овог нэр		Т.Төмөрсүх			Гарын үсэг		[signature]		

Хаягдал поошиг, дугуй, аккумуляторыг бүртгэсэн байдал:

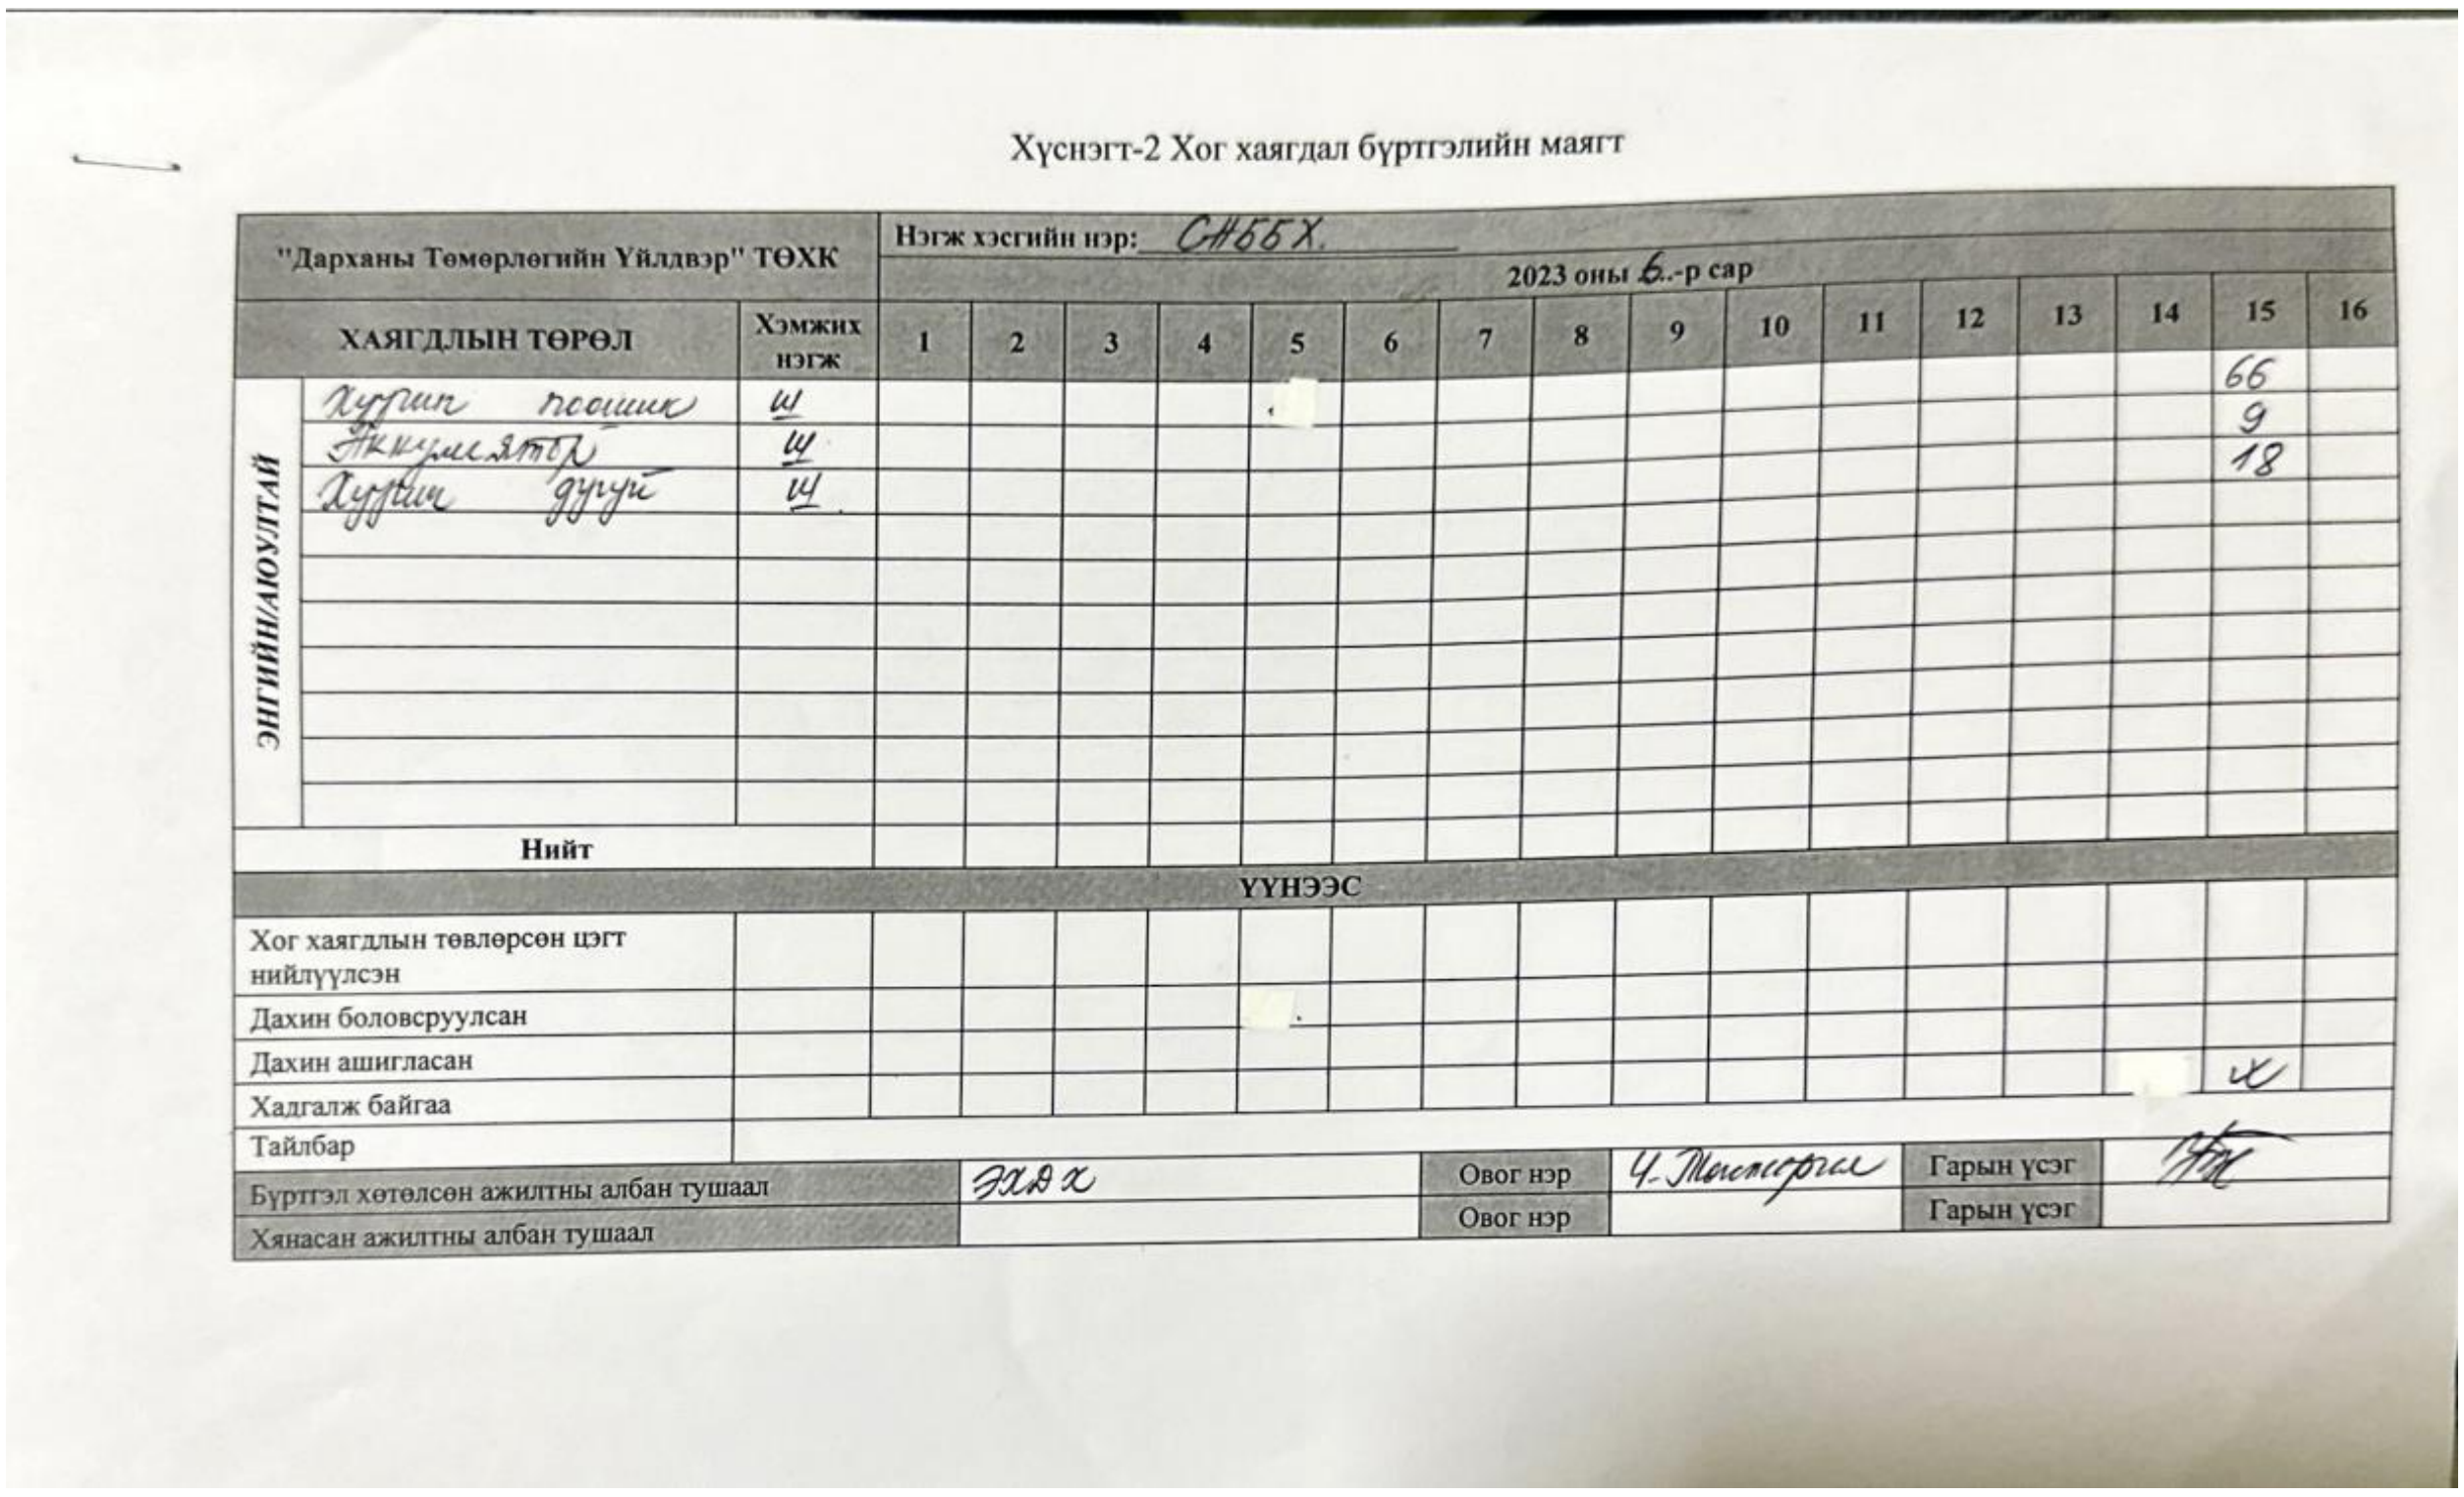

Хүснэгт-2 Хог хаягдал бүртгэлийн маягт

"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ТӨХК			Нэгж хэсгийн нэр: СНББХ. 2023 оны 6.-р сар															
ХАЯГДЛЫН ТӨРӨЛ		Хэмжих нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЭНГИЙН/АЮУЛТАЙ	Хуучин поошиг	ш															66	
	Аккумлятор	ш															9	
	Хуучин дугуй	ш															18	
Нийт																		
ҮҮНЭЭС																		
Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт нийлүүлсэн																		
Дахин боловсруулсан																		
Дахин ашигласан																	к	
Хадгалж байгаа																		
Тайлбар																		

Бүртгэл хөтөлсөн ажилтны албан тушаал	ЭХДХ	Овог нэр	Ч. Төмөрхүү	Гарын үсэг	
Хянасан ажилтны албан тушаал		Овог нэр		Гарын үсэг	

Сум галт зэвсгийг бүртгэсэн байдал:

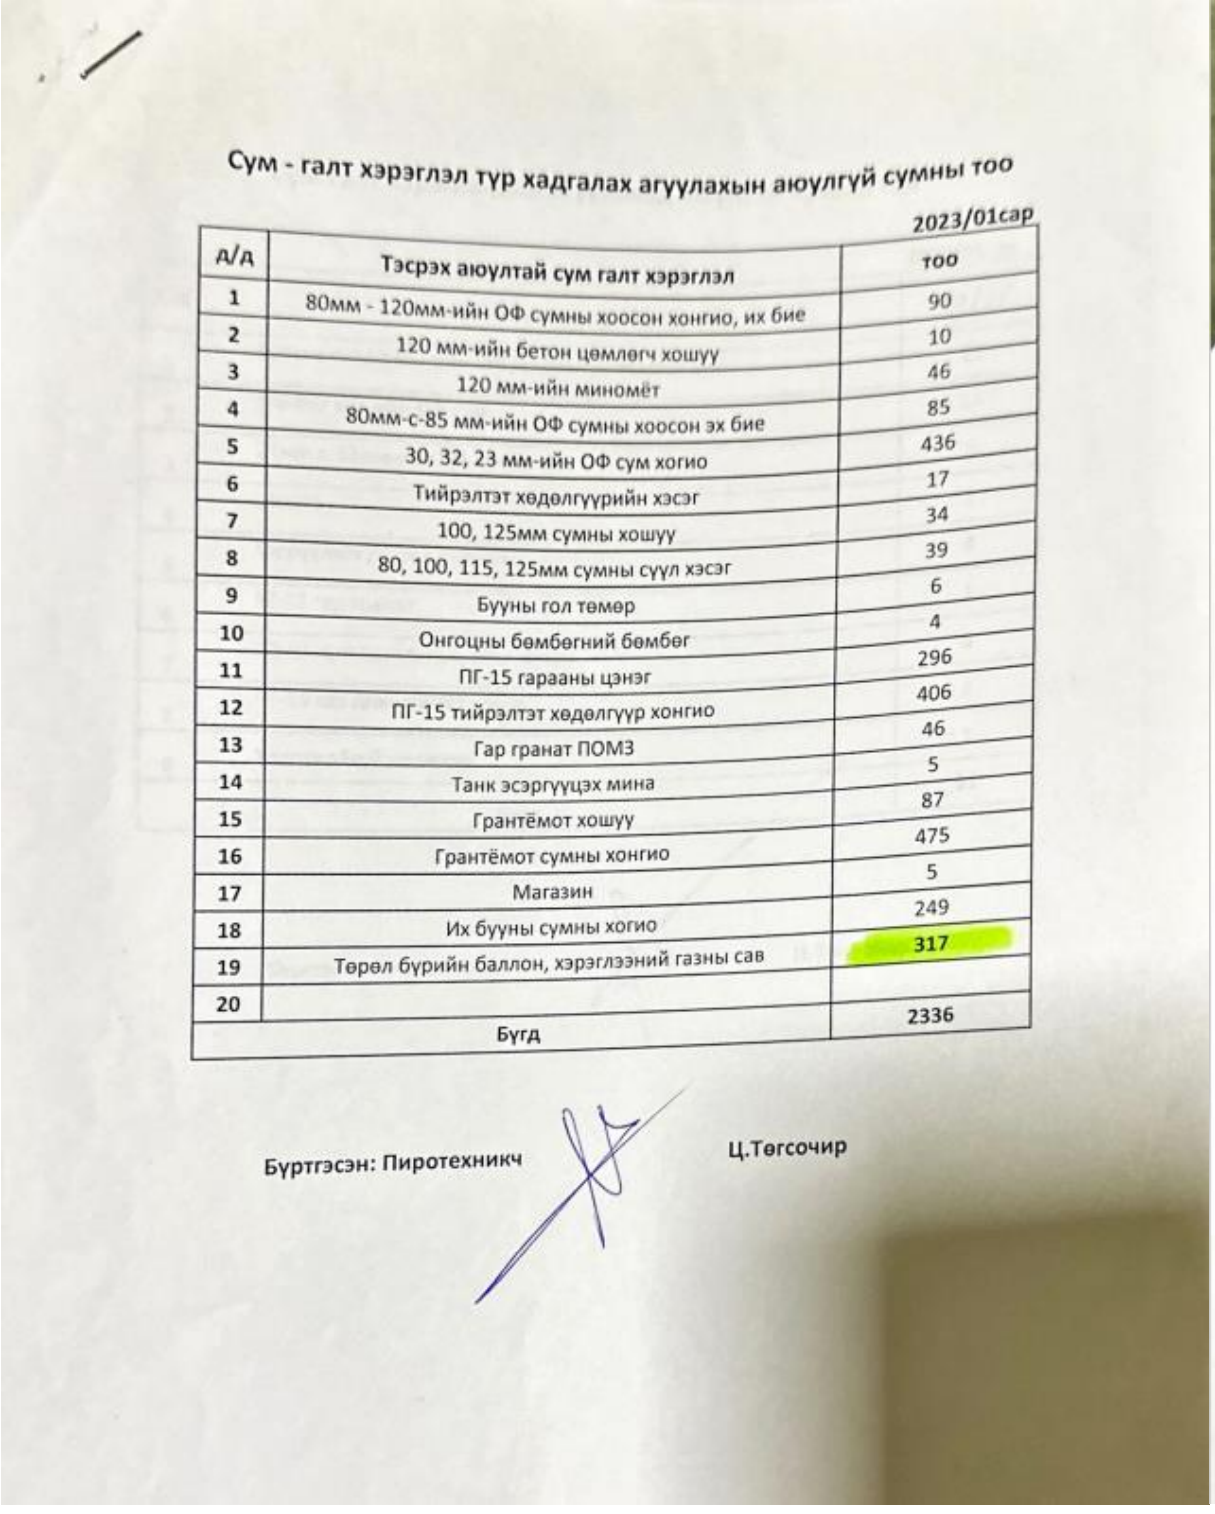

Сум - галт хэрэглэл түр хадгалах агуулахын аюулгүй сумны тоо

2023/01сар

д/д	Тэсрэх аюултай сум галт хэрэглэл	тоо
1	80мм - 120мм-ийн ОФ сумны хоосон хонгио, их бие	90
2	120 мм-ийн бетон цөмлөгч хошуу	10
3	120 мм-ийн миномёт	46
4	80мм-с-85 мм-ийн ОФ сумны хоосон эх бие	85
5	30, 32, 23 мм-ийн ОФ сум хогио	436
6	Тийрэлтэт хөдөлгүүрийн хэсэг	17
7	100, 125мм сумны хошуу	34
8	80, 100, 115, 125мм сумны сүүл хэсэг	39
9	Бууны гол төмөр	6
10	Онгоцны бөмбөгний бөмбөг	4
11	ПГ-15 гарааны цэнэг	296
12	ПГ-15 тийрэлтэт хөдөлгүүр хонгио	406
13	Гар гранат ПОМЗ	46
14	Танк эсэргүүцэх мина	5
15	Грантёмот хошуу	87
16	Грантёмот сумны хонгио	475
17	Магазин	5
18	Их бууны сумны хогио	249
19	Төрөл бүрийн баллон, хэрэглээний газны сав	317
20		
Бүгд		2336

Бүртгэсэн: Пиротехникч Ц.Төгсочир

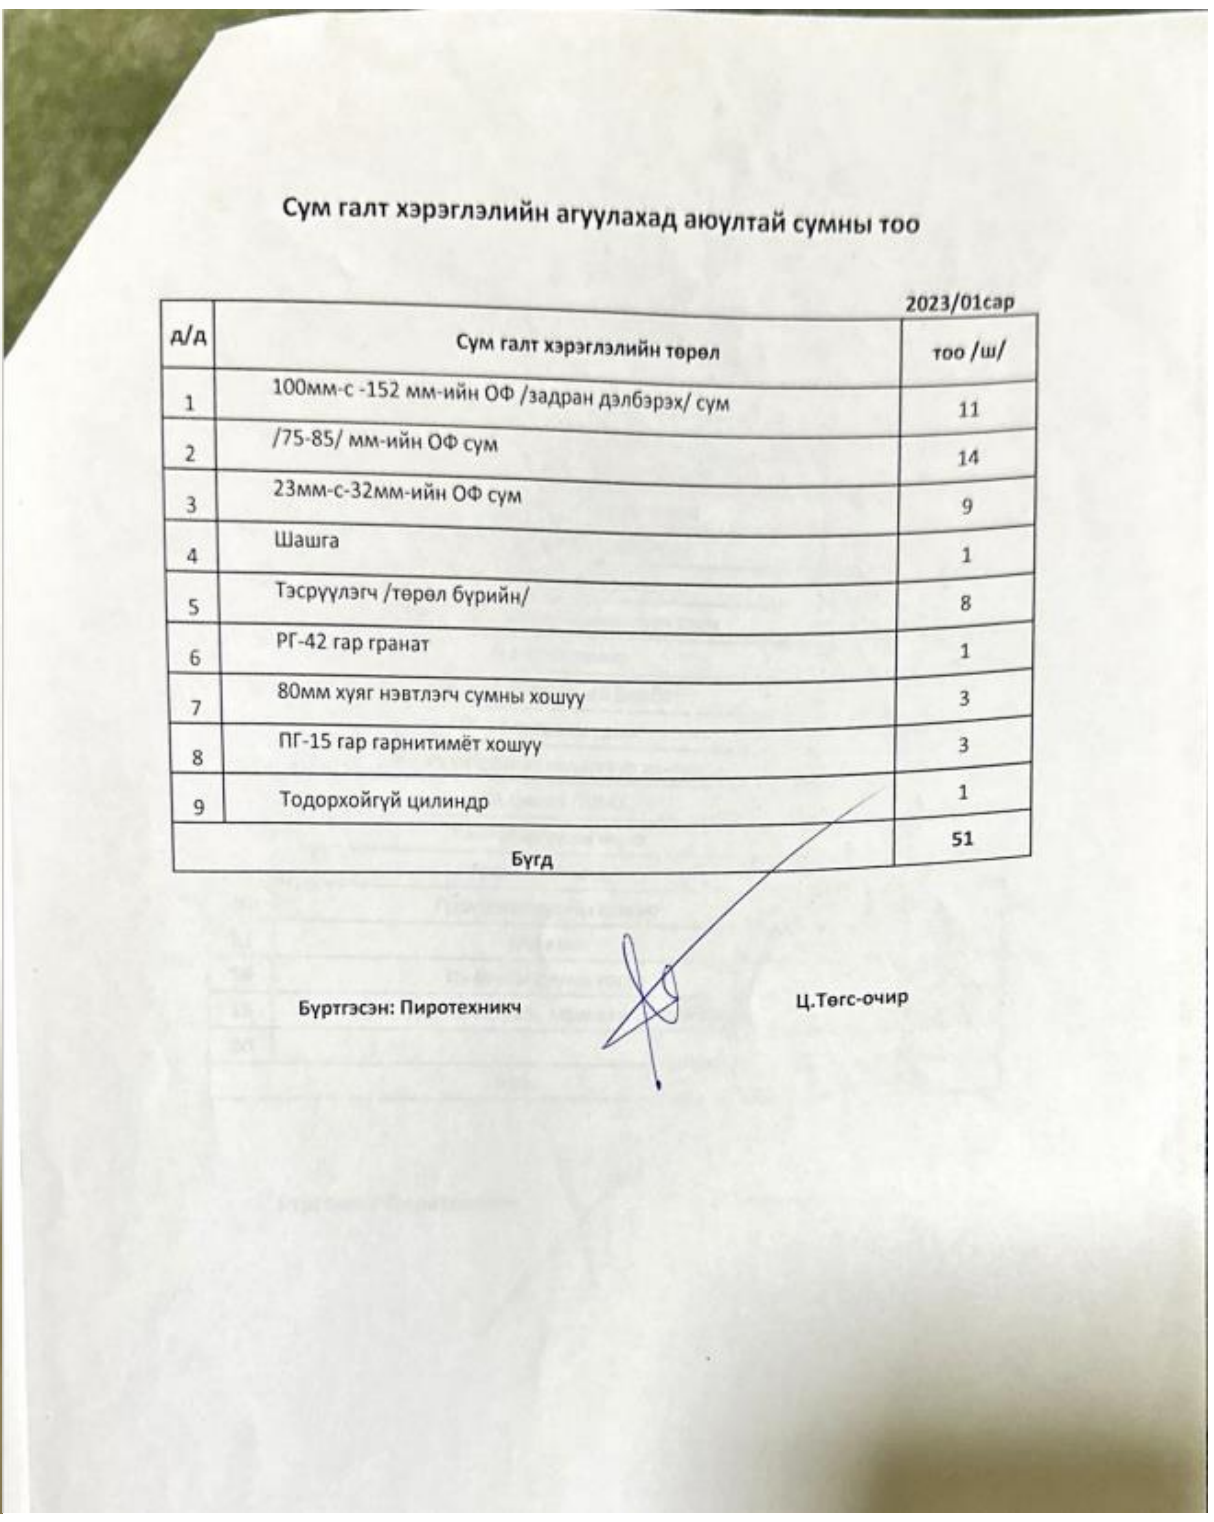

Сум галт хэрэглэлийн агуулахад аюултай сумны тоо

2023/01сар

д/д	Сум галт хэрэглэлийн төрөл	тоо /ш/
1	100мм-с -152 мм-ийн ОФ /задран дэлбэрэх/ сум	11
2	/75-85/ мм-ийн ОФ сум	14
3	23мм-с-32мм-ийн ОФ сум	9
4	Шашга	1
5	Тэсрүүлэгч /төрөл бүрийн/	8
6	РГ-42 гар гранат	1
7	80мм хуяг нэвтлэгч сумны хошуу	3
8	ПГ-15 гар гарнитимёт хошуу	3
9	Тодорхойгүй цилиндр	1
Бүгд		51

Бүртгэсэн: Пиротехникч Ц.Төгс-очир

2023 оны 10 сар хүртэл Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гарсан хог хаягдлын хэмжээ:

№	Ангилал	Хог хаягдлын төрөл	Нийт хэмжээ
1	Энгийн хог хаягдал	Ахуйн хатуу хог хаягдал , $м^3$	145
2		Барилгын хатуу хог хаягдал, $м^3$	6000
3		Хуванцар, кг	858
4	Ашигласан тос масло, бусад	Гидрийн шингэн	-
5		Ашигласан тос масло, тн	10
6		Түлшний тос дизель, тн	1350.41
7		Тос агуулсан хаягдал (шингэн хадгалах танк), ш	100
8		Шингээгч, бохир алчуур, материал, тусгайлан заагдаагүй хамгаалалтын хувцас, кг	200
9	Эмнэлгийн хог хаягдал	Хурц иртэй, үзүүртэй хог хаягдал, кг	31.9
10		Халдвартай хог хаягдал, кг	57.35
11		Хугацаа нь дууссан эм/тос/, кг	-
12	Химийн бодисын хог хаягдал	Химийн хатуу хог хаягдал, кг	111.26
13		Химийн шингэн хог хаягдал, л	5
14		Химийн бодисын хуванцар сав, гр	1.2544
15		Химийн бодисын шилэн сав, кг(ҮШСЦ-с нэмж өгсөн)	16.2745
16	Автома шин	Бүх төрлийн батерей, аккумулятор, ш	9
17		Ашиглалтаас гарсан дугуй, ш	18
18	Сум, галт зэвсэг	Аюулгүй сум, ш	2406
19		Аюултай сум, ш	112
20	Технологийн хаягдал	Шаар, тн	3910.6
21		Шаар (ССМ), тн	763.8
22		Зэв, тн (08сар)	43.55
23		Уутан фильтер, ш (06,07 сар)	23
24		Хаягдал тоосго, тн	329.65
25		Насос станцын лаг, тн (06-08сар)	25
26		Циолит,тн	30
27	Бусад	Галын хор	174

Хаягдал төмөртэй хамт холилдон ирсэн сум галт зэвсгийг ангилан ялгаж, аюултай аюулгүйгээр нь бүртгэн аюултай сум галт зэвсгийг түр хадгалах цэгт хадгалдаг. Энэхүү түр цэгийг хашаажуулан, хайрга дэвсэж тохижуулах ажил хийгдсэн.

Зураг 18 Сум галт зэвсэг түр хадгалах цэгийг тохижуулж буй байдал

Долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагийг бүх нийтийн цэвэрлэгээний өдөр болгон нэгж хэсгүүд хуваарьт талбайгаа цэвэрлэн ажилласан.

Талбайн хуваарилалтын зураг:

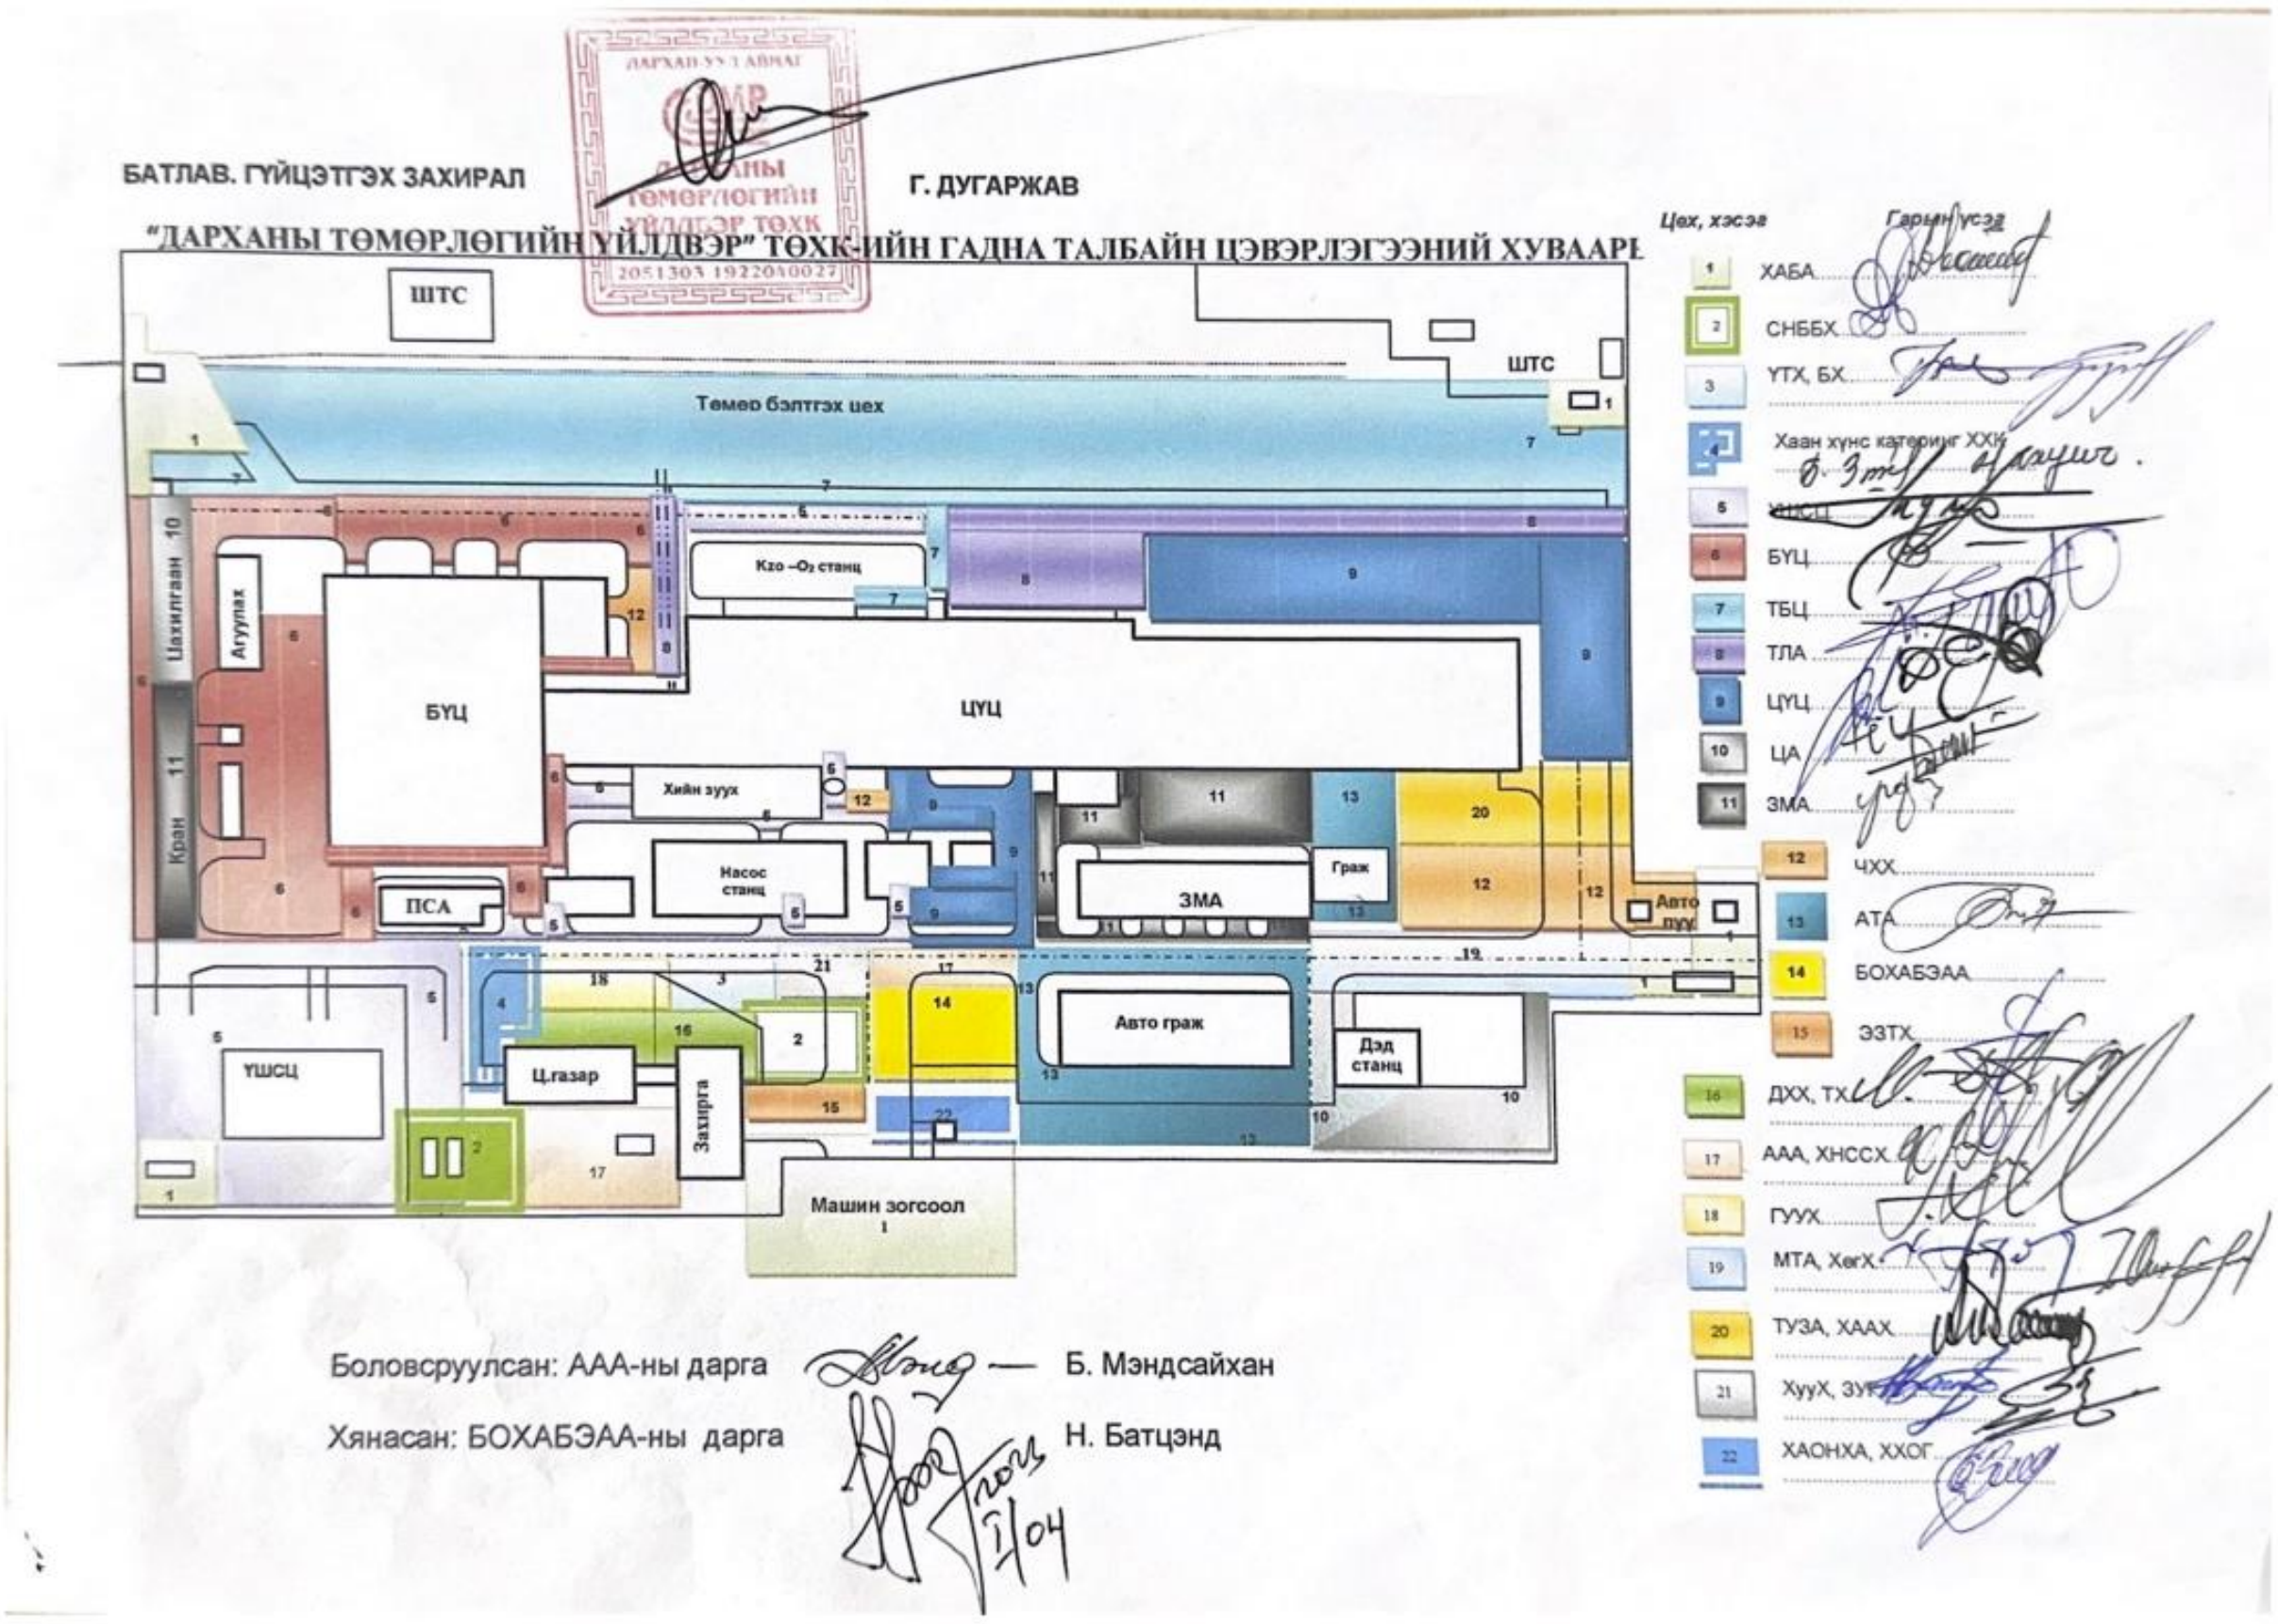

Зураг 19 Бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийж буй байдал

Жил бүр Үйлдвэрийн эзэмшлийн болон ойр орчмын талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэж, орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор Хаврын их цэвэрлэгээг зохион байгуулан ажилладаг. Тус ажлын хүрээнд 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр цэвэрлэгээг зохион байгуулан, 16 нэгж хэсгийн 250 гаруй ажилтан оролцон, 97 орчим га газрын хог хаягдлыг цэвэрлэжээ. Нийт 6000 гаруй кг хог хаягдал гарсан ба цэвэрлэгээнд 3 ковш, 1 хово ашигласан.

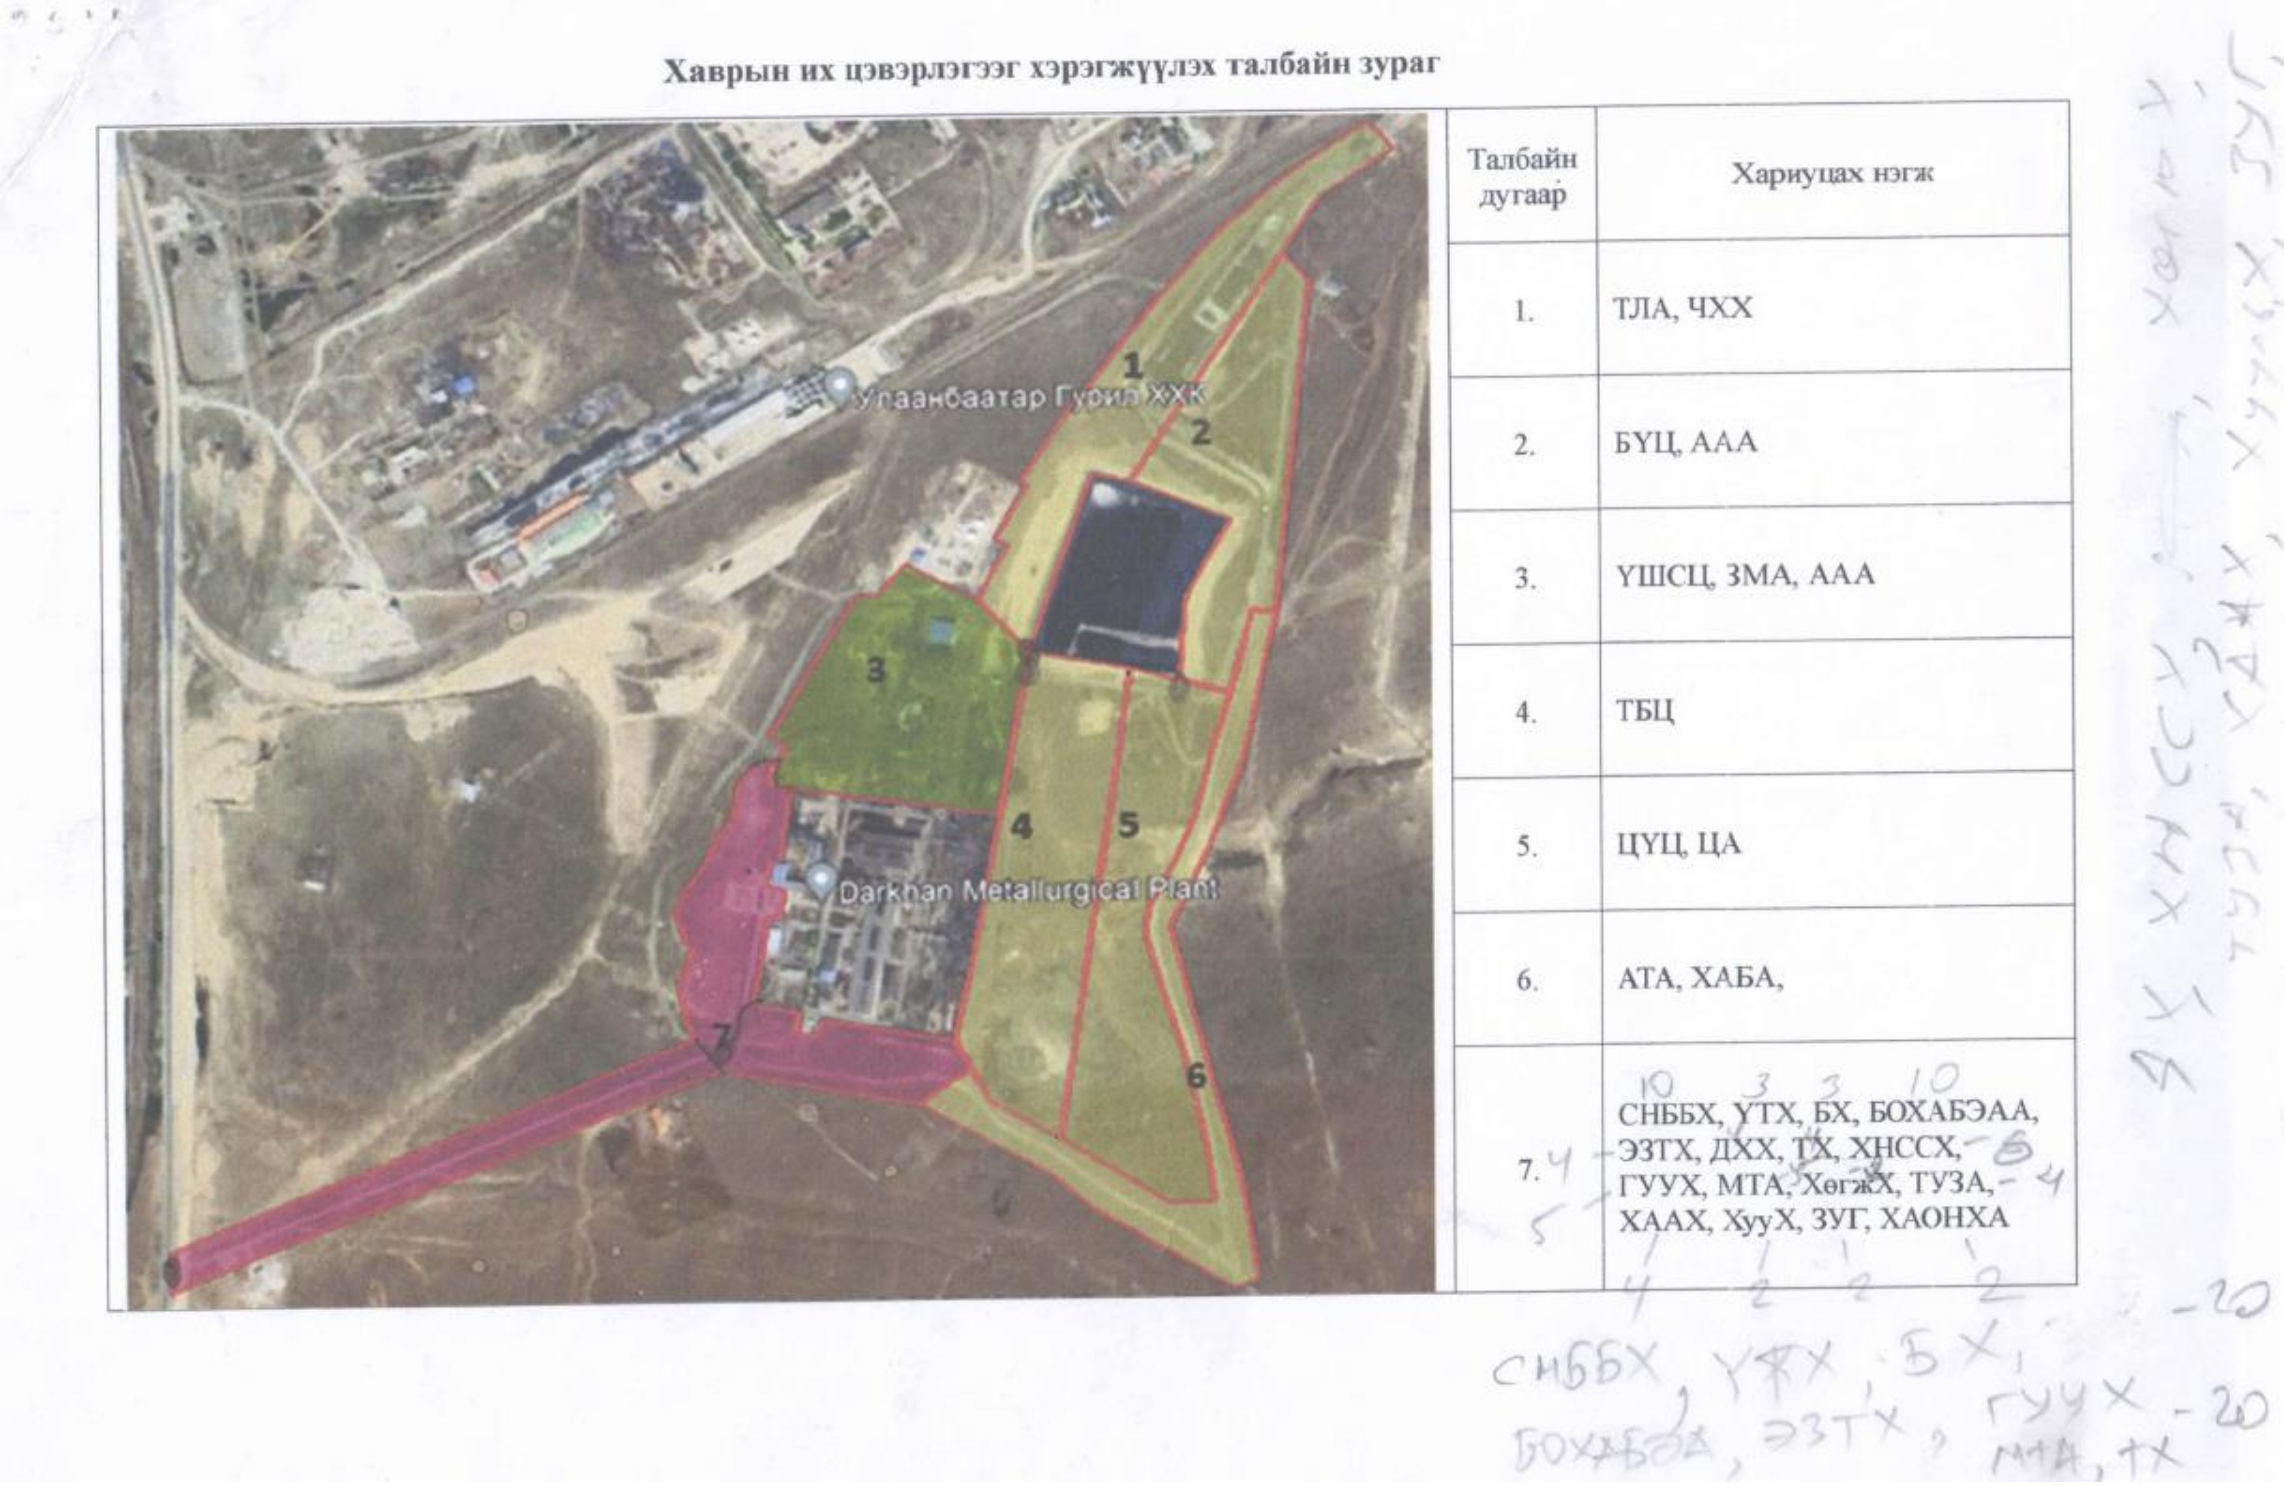

Хаврын их цэвэрлэгээг хэрэгжүүлэх талбайн зураг

Талбайн дугаар	Хариуцах нэгж
1.	ТЛА, ЧХХ
2.	БҮЦ, ААА
3.	ҮШСЦ, ЗМА, ААА
4.	ТБЦ
5.	ЦҮЦ, ЦА
6.	АТА, ХАБА,
7.	СНББХ, ҮТХ, БХ, БОХАБЭАА, ЭЗТХ, ДХХ, ТХ, ХНССХ, ГУУХ, МТА, ХөгжХ, ТУЗА, ХААХ, ХууХ, ЗУГ, ХАОНХА

Зураг 20 Хаврын их цэвэрлэгээг хийж буй байдал

Зураг 21 Хаягдал тос "ЮТО" ХХК-д нийлүүлж буй байдал

Хаягдал тос "ЮТО" ХХК-д хүлээлгэн өгсөн акт:

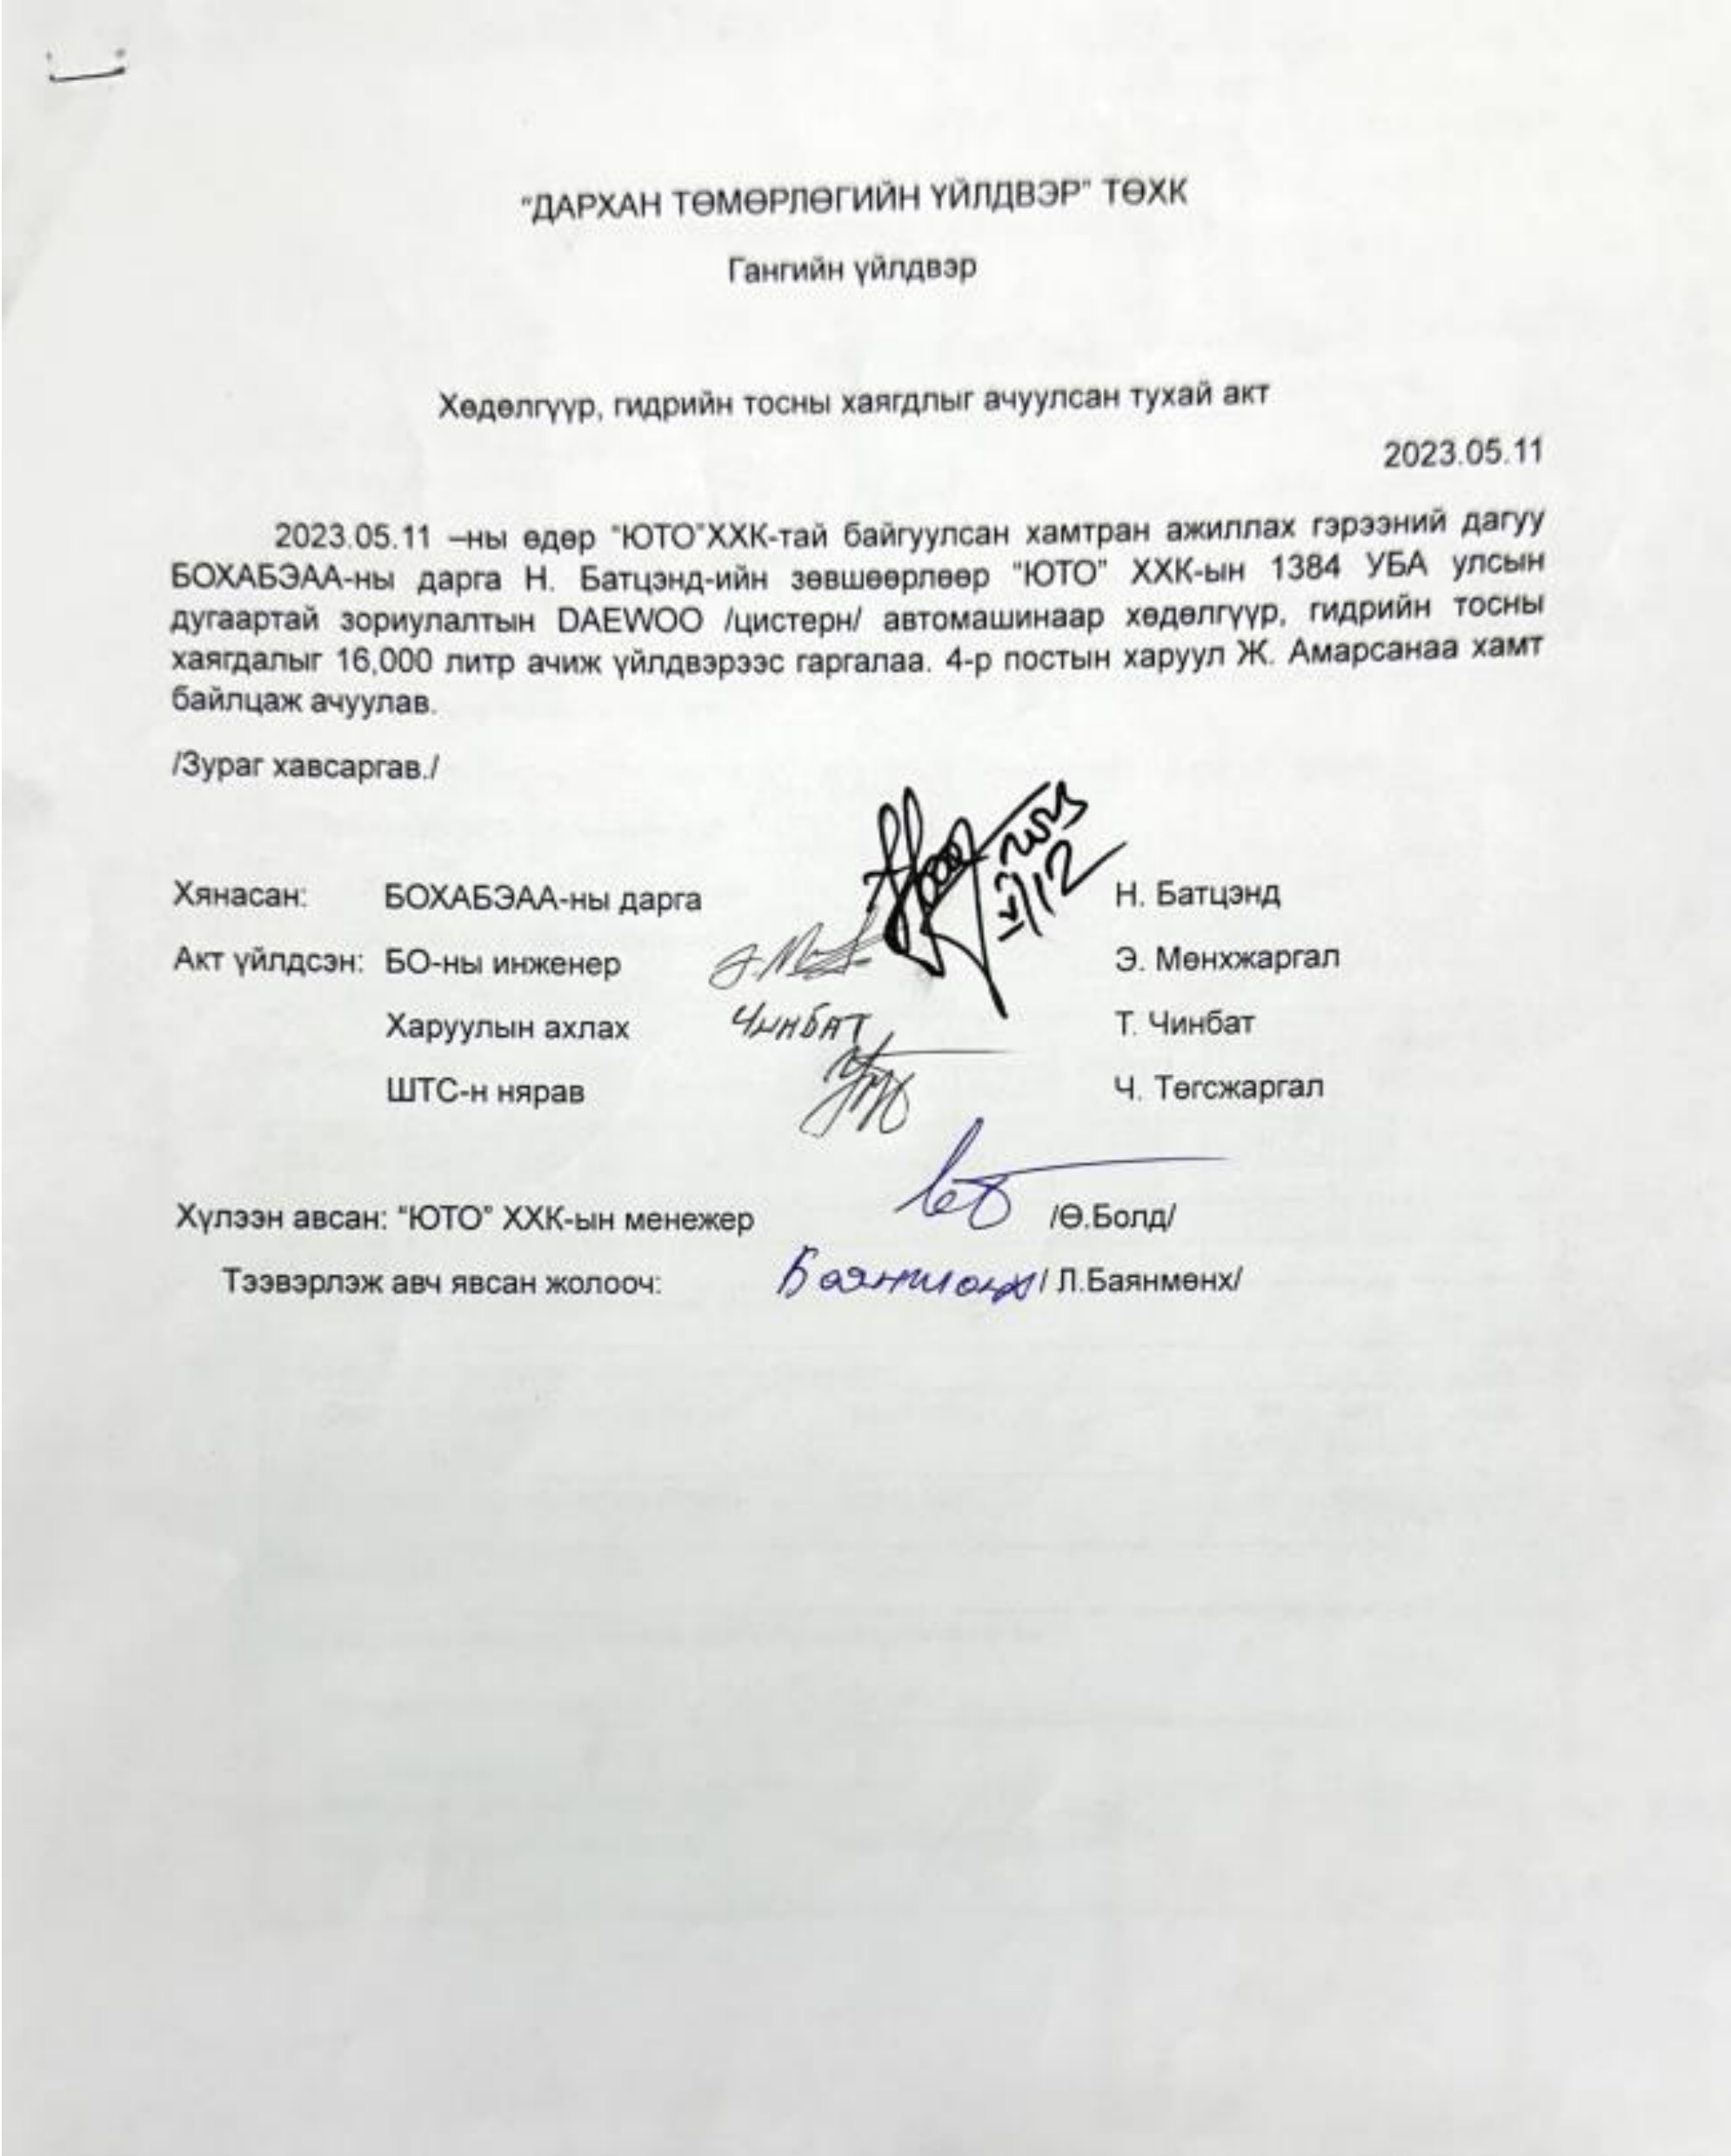

"ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР" ТӨХК

Гангийн үйлдвэр

Хөдөлгүүр, гидрийн тосны хаягдлыг ачуулсан тухай акт

2023.05.11

2023.05.11 –ны өдөр "ЮТО"ХХК-тай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу БОХАБЭАА-ны дарга Н. Батцэнд-ийн зөвшөөрлөөр "ЮТО" ХХК-ын 1384 УБА улсын дугаартай зориулалтын DAEWOO /цистерн/ автомашинаар хөдөлгүүр, гидрийн тосны хаягдалыг 16,000 литр ачиж үйлдвэрээс гаргалаа. 4-р постын харуул Ж. Амарсанаа хамт байлцаж ачуулав.

/Зураг хавсаргав./

Хянасан: БОХАБЭАА-ны дарга Н. Батцэнд

Акт үйлдсэн: БО-ны инженер Э. Мөнхжаргал

Харуулын ахлах Т. Чинбат

ШТС-н нярав Ч. Төгсжаргал

Хүлээн авсан: "ЮТО" ХХК-ын менежер /Ө.Болд/

Тээвэрлэж авч явсан жолооч: / Л.Баянмөнх/

7 ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

Д/д	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Гал тогооны уснаас усны шинжилгээг – pH, уусан давс, хатуулаг, Ca, Mg, K, Na, SO_4, NO_2, NO_3, NH_4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni ба бактериологийн үзүүлэлтүүдээр жилд 2 удаа хийлгэх	– Гал тогооны ус – Насос станцын шүүх сангийн усанд • Химийн дэлгэрэнгүй • Бактериологийн шинжилгээг 2023 оны 01, 04, 06 саруудад Дархан-Уул аймгийн УЦУОШТ болог Ус суваг ХК-р хийлгэсэн		Шинжилгээний дүнгээр стандартаас давсан үзүүлэлтгүй байна. Шинжилгээний дүнг “Хавсралт” хэсэгт хавсаргав.
2	– Технологийн хаягдлын талбай – Засварын төв – Түүхий эд хүлээн авах цэг – Төв замаас үйлдвэрийн хашааны хаалга хүрэх замд цэг сонгон хөрсний шинжилгээг • pH, ЦДЧ, давс %, ялзмаг, NO_3, хөрсний механик бүрэлдэхүүн, хүнд металл (K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Se, Sr, Pb, Hg, S, Cl,) үзүүлэлтүүдээр жилд 1 удаа хийлгэх	– Уутан фильтр – Хогийн цэгийн орчим – ШТС орчин – Төмөр бэлтгэх талбайн орчим – Оффисын орчин – Технологийн хаягдлын талбайн орчмоос хөрсний шинжилгээг • pH, ЦДЧ, ялзмаг, NH_4, NO_3, SO_4 болон хүнд металл үзүүлэлтүүдээр 2023 оны 05 сард Дархан-Уул аймгийн УЦУОШТ, БОХТЛ-р хийлгэсэн.	1,621,450	Бүх цэгүүдэд хөрсний химийн үзүүлэлт стандартаас давсан үзүүлэлтгүй, харин хогийн цэгийн орчин, технологийн хаягдлын талбай болон төмөр бэлтгэх талбайн орчимд Pb агууламж 1.01-3.12 дахин, Zn агууламж 11.3-22.2 дахин стандартаас давсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Шинжилгээний дүнг “Хавсралт” хэсэгт хавсаргав.
3	– Уутан фильтрийн орчим – Дизель агуулах – Төмөр бэлтгэх цехийн орчмоос агаарын шижнилгээг • SO_2, NO_2, CO, нийт тоос, PM2.5, PM10, дуу шуугианы үзүүлэлтүүдээр улирал тутам хийлгэх	– Уутан фильтрийн орчим – Дизель түлшний агуулах – Төмөр бэлтгэх талбай – Кезо станц орчим – ПСА станц орчим – Үйлдвэрлэлийн орчин – ШТС орчимоос агаарын шинжилгээг • SO_2, NO_2, нийт тоос, PM2.5, PM10 тооцонцорын үзүүлэлтүүдээр 2023 оны 04, 07 саруудад Дархан-Уул аймгийн УЦУОШТ-р хийлгэсэн.		Тухайн цэгүүдэд SO_2, NO_2-ийн агууламж стандарт хэмжээнд, үйлдвэрийн орчинд PM10 тоосонцор стандартаас 4.46 дахин давсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Шинжилгээний дүнг “Хавсралт” хэсэгт хавсаргав.
НИЙТ			**1,621,450**	

8 ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Төлөвлөгөөний биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Ажилчидад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт зохион байгуулах	Нийт ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалт ХАБ-н инженерүүд зохион байгуулсан.	Дотоод зардал	Сургалт орж буй зураг болон сургалтын агуулгыг хавсаргав. /Зураг 22/
2	Байгаль орчныг хамгаалах талаар сургалт зохион байгуулах, холбогдох орон нутгийн байгаль орчны алба болон байгаль хамгаалагч нартай харилцан холбоотой ажиллах	АТА, ТБТ болон ҮШСЦ-ийн ажилчдад сургалт зохион байгуулсан ба орон нутгийн БО-ны албатай харилцан холбоотой ажилласан.	Дотоод зардал	Сургалтын талаарх дэлгэрэнгүйг тайлангийн 2 дугаар бүлгийн 16 дахь хэсгээс харна уу.
3	Байгаль орчныг хамгаалах жилийн тайланг орон нутгийн засаг захиргаанд цаг тухайд нь гаргаж өгч байх	2023 оны БОМТ-ны биелэлтийн тайланг Дархан-Уул аймгийн БОАЖГ-т хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн.	Дотоод зардал	-
4	Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO14001:2015 стандартыг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх	Компанийн хэмжээнд ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 стандартуудыг нэвтрүүлэн ажиллахаар мэргэжлий байгууллагаас зөвлөх үйлчилгээ аван ажиллаж байна.	Дотоод зардал	НМТ-ны сургалт авах гэрээ болон сургалт авч буй зургийг хавсаргав. /Зураг 23/
5	Нэмэлт	“Төгрөг баян хангай” ХХК-иар Гангийн үйлдвэр БОННҮ-д тодотгол хийлгэсэн.	42,344,087.5	БОННҮ-ны батлагдсан нүүрийг хавсаргав.
6		“Мон газар консалтинг” ХХК-иар байгаль орчны төлөвлөгөөт аудит хийлгэж байна.	19,000,000	Байгаль орчны аудит хийлгэх гэрээг хавсаргав.
7		БОАЖЯ болон БОСШТ-с ирж ажилласан	Дотоод зардал	Холбогдох зургийг Зураг 24-д хавсаргав.
НИЙТ			**61,344,087.5**	

Нийт ажилчдын сургалтын агуулга:

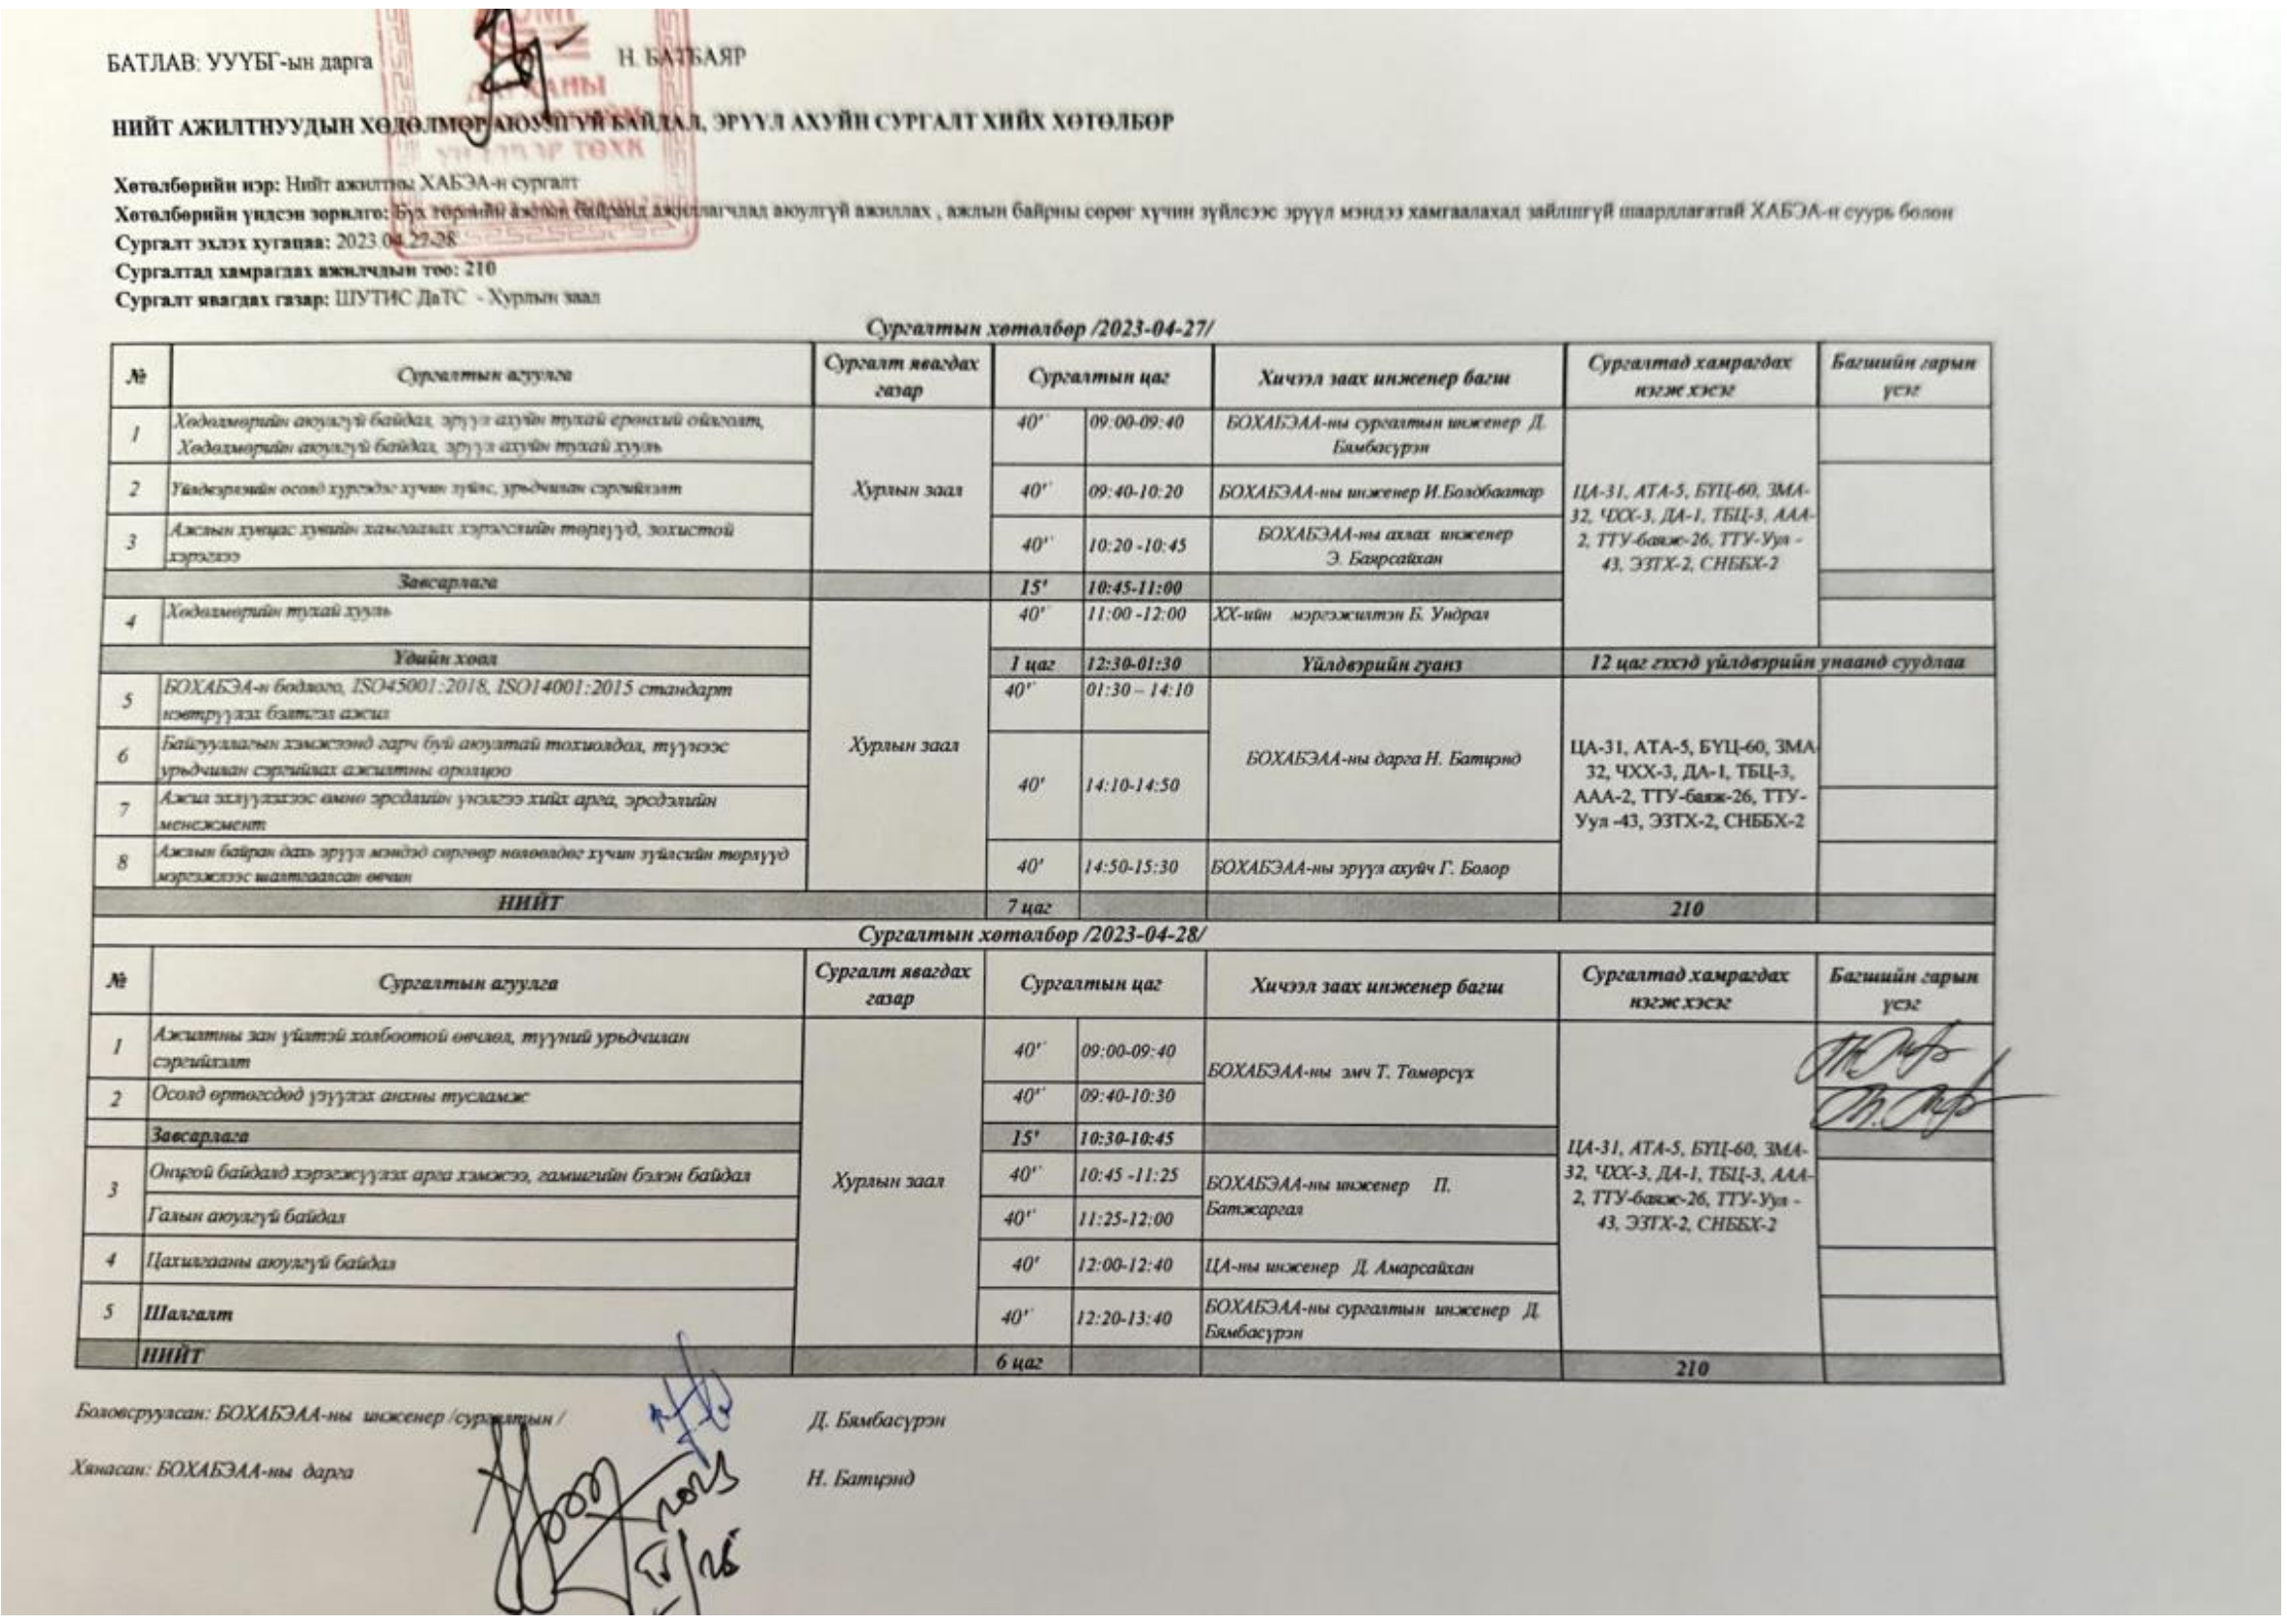

БАТЛАВ: УУҮБГ-ын дарга Н. БАТБАЯР

НИЙТ АЖИЛТНУУДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТ ХИЙХ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн нэр: Нийт ажилтны ХАБЭА-н сургалт
Хөтөлбөрийн үндсэн зорилго: Бүх төрлийн ажлын байранд ажиллагчдад аюулгүй ажиллах , ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлсээс эрүүл мэндээ хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай ХАБЭА-н суурь болон
Сургалт эхлэх хугацаа: 2023.04.27-28
Сургалтад хамрагдах ажилчдын тоо: 210
Сургалт явагдах газар: ШУТИС ДаТС - Хурлын заал

Сургалтын хөтөлбөр /2023-04-27/

№	Сургалтын агуулга	Сургалт явагдах газар	Сургалтын цаг		Хичээл заах инженер багш	Сургалтад хамрагдах нэгж хэсэг	Багшийн гарын үсэг
1	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай ерөнхий ойлголт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль	Хурлын заал	40'	09:00-09:40	БОХАБЭАА-ны сургалтын инженер Д. Бямбасүрэн	ЦА-31, АТА-5, БҮЦ-60, ЗМА-32, ЧХХ-3, ДА-1, ТБЦ-3, ААА-2, ТТУ-бааж-26, ТТУ-Уул -43, ЭЗТХ-2, СНББХ-2	
2	Үйлдвэрлэлийн осолд хүргэдэг хүчин зүйлс, урьдчилан сэргийлэлт		40'	09:40-10:20	БОХАБЭАА-ны инженер И.Болдбаатар		
3	Ажлын хувцас хувийн хамгаалах хэрэгслийн төрлүүд, зохистой хэрэглээ		40'	10:20 -10:45	БОХАБЭАА-ны ахлах инженер Э. Баярсайхан		
	Завсарлага		15'	10:45-11:00			
4	Хөдөлмөрийн тухай хууль	Хурлын заал	40'	11:00 -12:00	ХХ-ийн мэргэжилтэн Б. Ундрал		
	Үдийн хоол		1 цаг	12:30-01:30	Үйлдвэрийн гуанз	12 цаг гэхэд үйлдвэрийн унаанд суудлаа	
5	БОХАБЭА-н бодлого, ISO45001:2018, ISO14001:2015 стандарт нэвтрүүлэх бэлтгэл ажил		40'	01:30 – 14:10	БОХАБЭАА-ны дарга Н. Батцэнд	ЦА-31, АТА-5, БҮЦ-60, ЗМА-32, ЧХХ-3, ДА-1, ТБЦ-3, ААА-2, ТТУ-бааж-26, ТТУ-Уул -43, ЭЗТХ-2, СНББХ-2	
6	Байгууллагын хэмжээнд гарч буй аюултай тохиолдол, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажилтны оролцоо		40'	14:10-14:50			
7	Ажил эхлүүлэхээс өмнө эрсдлийн үнэлгээ хийх арга, эрсдлийн менежмент						
8	Ажлын байран дахь эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн төрлүүд мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин		40'	14:50-15:30	БОХАБЭАА-ны эрүүл ахуйч Г. Болор		
	НИЙТ		7 цаг			210	

Сургалтын хөтөлбөр /2023-04-28/

№	Сургалтын агуулга	Сургалт явагдах газар	Сургалтын цаг		Хичээл заах инженер багш	Сургалтад хамрагдах нэгж хэсэг	Багшийн гарын үсэг
1	Ажилтны зан үйлтэй холбоотой өвчлөл, түүний урьдчилан сэргийлэлт	Хурлын заал	40'	09:00-09:40	БОХАБЭАА-ны эмч Т. Төмөрсүх	ЦА-31, АТА-5, БҮЦ-60, ЗМА-32, ЧХХ-3, ДА-1, ТБЦ-3, ААА-2, ТТУ-бааж-26, ТТУ-Уул -43, ЭЗТХ-2, СНББХ-2	
2	Осолд өртөгсдөд үзүүлэх анхны тусламж		40'	09:40-10:30			
	Завсарлага		15'	10:30-10:45			
3	Онцгой байдалд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, гамшгийн бэлэн байдал		40'	10:45 -11:25	БОХАБЭАА-ны инженер П. Батжаргал		
	Галын аюулгүй байдал		40'	11:25-12:00			
4	Цахилгааны аюулгүй байдал		40'	12:00-12:40	ЦА-ны инженер Д. Амарсайхан		
5	Шалгалт		40'	12:20-13:40	БОХАБЭАА-ны сургалтын инженер Д. Бямбасүрэн		
	НИЙТ		6 цаг			210	

Боловсруулсан: БОХАБЭАА-ны инженер /сургалтын/ Д. Бямбасүрэн

Хянасан: БОХАБЭАА-ны дарга Н. Батцэнд

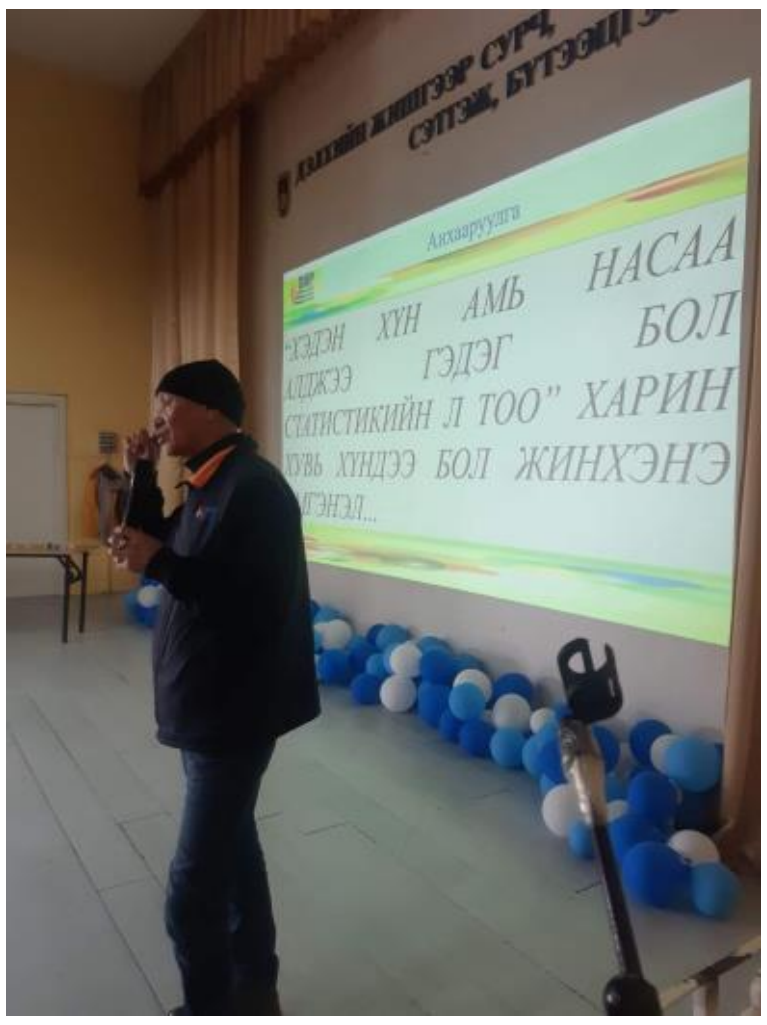

Зураг 22 Нийт ажилчдын сургалт орж буй байдал

Нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ:

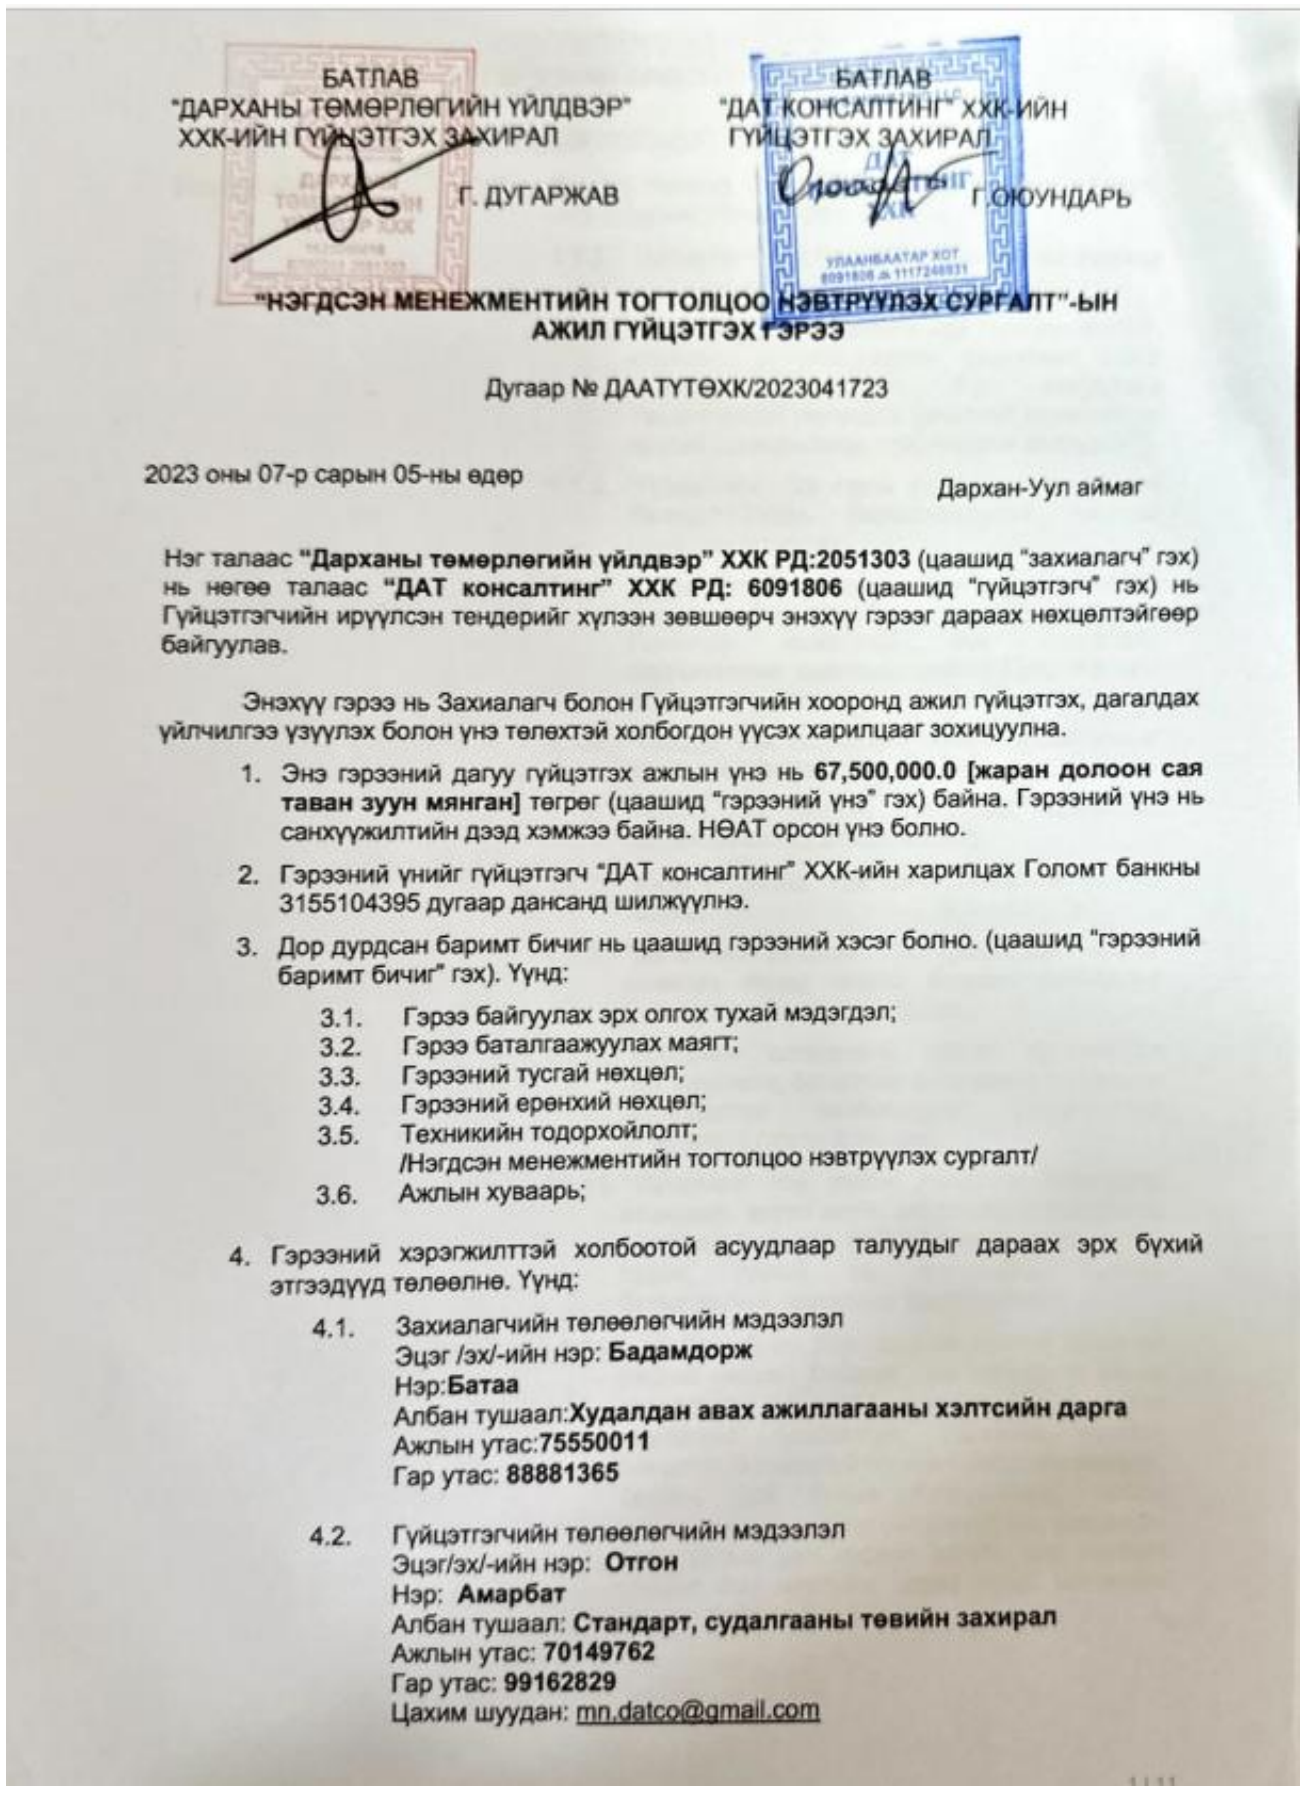

БАТЛАВ
"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР"
ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Г. ДУГАРЖАВ

БАТЛАВ
"ДАТ КОНСАЛТИНГ" ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Г. ОЮУНДАРЬ

"НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО НЭВТРҮҮЛЭХ СУРГАЛТ"-ЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

Дугаар № ДААТҮТӨХК/2023041723

2023 оны 07-р сарын 05-ны өдөр

Дархан-Уул аймаг

Нэг талаас **"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК РД:2051303** (цаашид "захиалагч" гэх) нь нөгөө талаас **"ДАТ консалтинг" ХХК РД: 6091806** (цаашид "гүйцэтгэгч" гэх) нь Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлтэйгөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийн хооронд ажил гүйцэтгэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажлын үнэ нь **67,500,000.0 [жаран долоон сая таван зуун мянган]** төгрөг (цаашид "гэрээний үнэ" гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна. НӨАТ орсон үнэ болно.
2. Гэрээний үнийг гүйцэтгэгч "ДАТ консалтинг" ХХК-ийн харилцах Голомт банкны 3155104395 дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид "гэрээний баримт бичиг" гэх). Үүнд:
   3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
   3.2. Гэрээ баталгаажуулах маягт;
   3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
   3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
   3.5. Техникийн тодорхойлолт;
   /Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлэх сургалт/
   3.6. Ажлын хуваарь;
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
   4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
   Эцэг /эх/-ийн нэр: **Бадамдорж**
   Нэр:**Батаа**
   Албан тушаал:**Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн дарга**
   Ажлын утас:**75550011**
   Гар утас: **88881365**

   4.2. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
   Эцэг/эх/-ийн нэр: **Отгон**
   Нэр: **Амарбат**
   Албан тушаал: **Стандарт, судалгааны төвийн захирал**
   Ажлын утас: **70149762**
   Гар утас: **99162829**
   Цахим шуудан: mn.datco@gmail.com

Зураг 23 НМТ-г нэвтрүүлэхээр стандартын сургалт авч буй байдал

Гангийн үйлдвэрийн БОННҮ тайлан батлагдсан нүүр:

БАТЛАВ.
БОАЖЯ-ны ЕРӨНХИЙ ШИНЖЭЭЧ: Ц.УРАНЧИМЭГ

"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР" ТӨХК -ИЙН ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ХОНГОР СУМЫН 1-Р БАГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ "ГАНГИЙН ҮЙЛДВЭР" ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 2023-2027 ОН ДУУСТАЛ МЕНЕЖМЕНТИЙН НЭМЭЛТ ТОДОТГОЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Үнэлгээ хийсэн мэргэжлийн байгууллага:
"ТӨГРӨГ БАЯН ХАНГАЙ" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ: М.ЭРДЭНЭБАЯР

Төсөл хэрэгжүүлэгч:
"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР" ТӨХК-ИЙН ЗАХИРАЛ: Г.ДУГАРЖАВ

УЛААНБААТАР ХОТ
2023 он

Үйлдвэрийн байгаль орчны төлөвлөгөөт аудит хийх гэрээ:

БАТЛАВ
"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР"
ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Г.ДУГАРЖАВ

БАТЛАВ
"МОН ГАЗАР КОНСАЛТИНГ" ХХК
-ИЙН ЗАХИРАЛ
Ю.ДЭЛГЭРМАА

"ҮЙЛДВЭРИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙЛГЭХ" АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

Дугаар № ДААТҮТӨХК/2023041765

2023 оны 08-р сарын 14-ны өдөр Дархан-Уул аймаг

Нэг талаас **"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК РД:2051303** (цаашид "захиалагч" гэх) нь нөгөө талаас **"Мон газар консалтинг" ХХК РД:5845239** (цаашид "гүйцэтгэгч" гэх) нь Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлтэйгөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийн хооронд ажил гүйцэтгэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажлын үнэ нь **19,000,000.0 [*арван есөн сая*]** төгрөг (цаашид "гэрээний үнэ" гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг гүйцэтгэгч "Мон газар консалтинг" ХХК-ийн харилцах Голомт банкны 1165109205 дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид "гэрээний баримт бичиг" гэх). Үүнд:
    - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл; **/2023.01.25 №01/157/**
    - 3.2. Гэрээ баталгаажуулах маягт;
    - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
    - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
    - 3.5. Техникийн тодорхойлолт; **/Байгаль орчны аудит хийлгэх ажлын даалгавар/**
    - 3.6. Ажлын хуваарь; /**гэрээний Хавсралт 1/**
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
    - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
      Эцэг /эх/-ийн нэр: **Нямсамбуу**
      Нэр:**Батцэнд**
      Албан тушаал: БОХАБЭАА-ны дарга
      Ажлын утас:**75550011**
      Гар утас: **88013326**
      Цахим шуудан: info@dmp.mn,
    - 4.2. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
      Эцэг/эх/-ийн нэр: Болдбаатар
      Нэр: Даваажаргал
      Албан тушаал: аудитор
      Ажлын утас:
      Гар утас: 90017706
      Цахим шуудан: davaajargal.b@gmail.com

Байгаль орчны судалгаа шинжилгээний төвөөс 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ашигт малтмал олборлох, баяжуулах, боловсруулах төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж буй бохирдлыг судлах, байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтэд газар дээр нь ажиллаж дүн шинжилгээ хийх үүрэг бүхий ажлын хэсэг 2023.07.30-ны өдөр Гангийн үйлдвэрт ажилласан.

Байгаль орчин судалгаа, шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн албан бичиг:

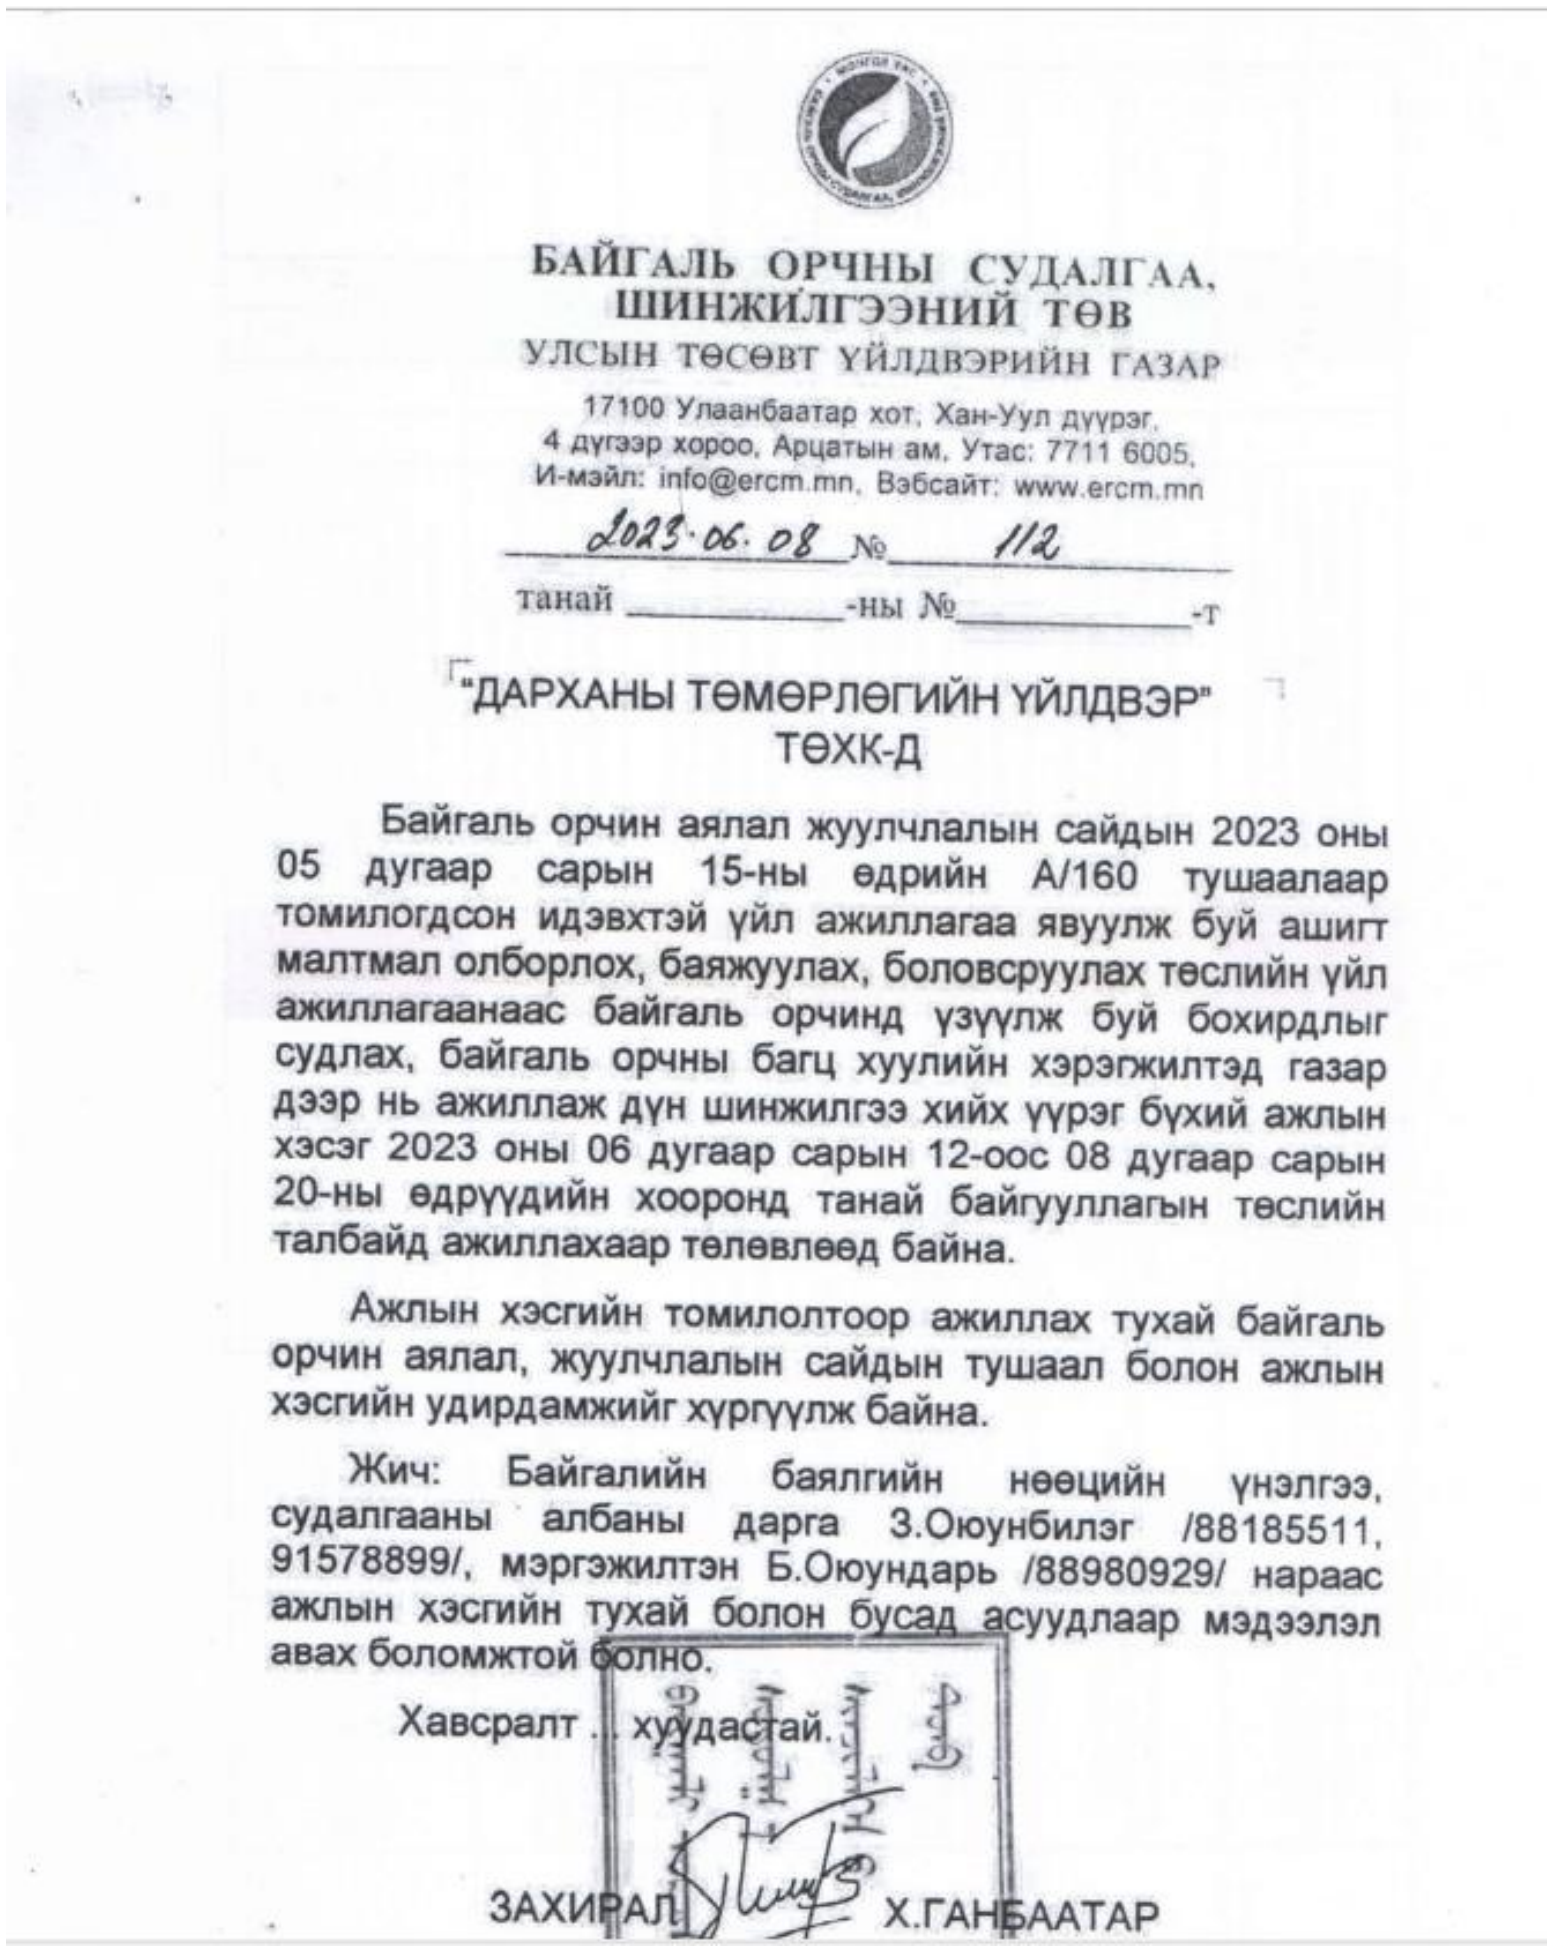

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР

17100 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,
4 дүгээр хороо, Арцатын ам, Утас: 7711 6005,
И-мэйл: info@ercm.mn, Вэбсайт: www.ercm.mn

2023.06.08 № 112
танай ____________-ны №____________-т

"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР"
ТӨХК-Д

Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/160 тушаалаар томилогдсон идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй ашигт малтмал олборлох, баяжуулах, боловсруулах төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж буй бохирдлыг судлах, байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтэд газар дээр нь ажиллаж дүн шинжилгээ хийх үүрэг бүхий ажлын хэсэг 2023 оны 06 дугаар сарын 12-оос 08 дугаар сарын 20-ны өдрүүдийн хооронд танай байгууллагын төслийн талбайд ажиллахаар төлөвлөөд байна.

Ажлын хэсгийн томилолтоор ажиллах тухай байгаль орчин аялал, жуулчлалын сайдын тушаал болон ажлын хэсгийн удирдамжийг хүргүүлж байна.

Жич: Байгалийн баялгийн нөөцийн үнэлгээ, судалгааны албаны дарга З.Оюунбилэг /88185511, 91578899/, мэргэжилтэн Б.Оюундарь /88980929/ нараас ажлын хэсгийн тухай болон бусад асуудлаар мэдээлэл авах боломжтой болно.

Хавсралт ... хуудастай.

ЗАХИРАЛ Х.ГАНБААТАР

Зураг 24 БОСШТ-н мэргэжилтнүүд Үйлдвэр дээр ажилласан байдал

9 ТУХАЙН ЖЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ ОРШИН СУУГЧИД, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Д/д	БОМТ-ний биелэлтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчидад тайлагнах төлөвлөгөө	БОМТ-ний биелэлтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчидад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	Зардал, төгрөг	Тайлбар
1	Дархан-Уул аймгийн БОАЖГазар	БОМТ биелэлтийн тайланг Дархан-Уул аймгийн БОАЖГ-т хүргүүлсэний дараа тайлан хамгаалах хугацааг товлох ба тогтоосон хугацаанд тайланг хамгаална.	-	
2	Нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид	БОННҮ-ний тодотгол тайланг боловсруулах үеэр Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1р багийн ИНХ-р хэлэлцүүлсэн	Дотоод зардал	ИНХ-р хэлэлцэн дэмжигдсэн байдлыг хавсаргав.
3	БОАЖЯ-ны ХБОБНУ-ын газарт	Дархан-Уул аймгийн БОАЖГ-т тайлангаа хамгаалсны дараа БОАЖЯ-ны eic.mn цахим системд оруулан, батлуулна.	-	
НИЙТ			Дотоод зардал	

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1-р багийн ИНХ-р хэлэлцүүлсэн байдал:

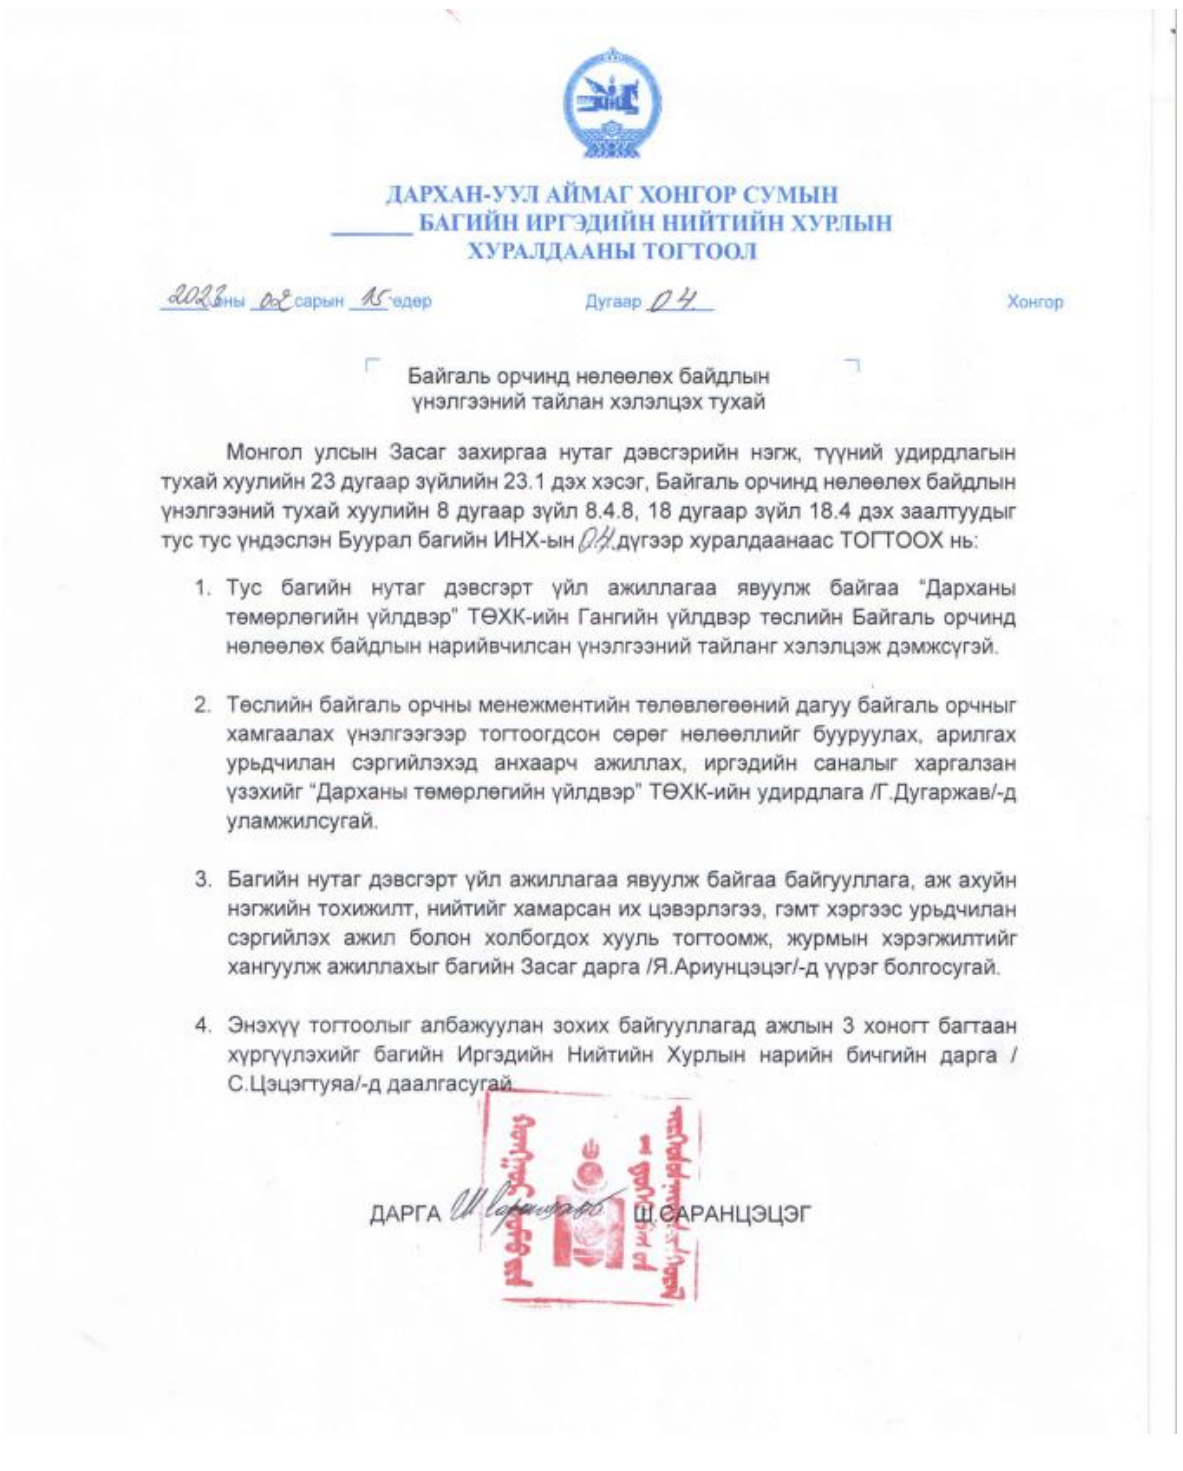

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ХОНГОР СУМЫН
______ БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН
ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2023 оны 02 сарын 15 өдөр　　Дугаар 04　　Хонгор

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан хэлэлцэх тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэг, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйл 8.4.8, 18 дугаар зүйл 18.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн Буурал багийн ИНХ-ын 04 дүгээр хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1. Тус багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ТӨХК-ийн Гангийн үйлдвэр төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хэлэлцэж дэмжсүгэй.
2. Төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу байгаль орчныг хамгаалах үнэлгээгээр тогтоогдсон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах урьдчилан сэргийлэхэд анхаарч ажиллах, иргэдийн саналыг харгалзан үзэхийг "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ТӨХК-ийн удирдлага /Г.Дугаржав/-д уламжилсугай.
3. Багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тохижилт, нийтийг хамарсан их цэвэрлэгээ, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил болон холбогдох хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг багийн Засаг дарга /Я.Ариунцэцэг/-д үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү тогтоолыг албажуулан зохих байгууллагад ажлын 3 хоногт багтаан хүргүүлэхийг багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын нарийн бичгийн дарга /С.Цэцэгтуяа/-д даалгасугай.

ДАРГА　　Ш.САРАНЦЭЦЭГ

10 ДҮГНЭЛТ

2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 54 ажлыг 86,190,287.5 төгрөгийн төсвөөр хийж гүйцэтгэсэн байна.

Д/д	Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээ	Дүн /төгрөг/
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	4,950,000
2	Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	2,395,500
3	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	-
4	Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	Дотоод зардал
5	Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	15,879,250
6	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	1,621,450
7	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	61,344,087.5
8	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	-
НИЙТ		**86,190,287.5**

ХАВСРАЛТ

1. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн лабораторийн шинжилгээний үр дүнгүүд
2. Орон нутагтай байгуулсан хог хаягдлын гэрээ, түүний биелэлтийг нотлох баримтууд, гэрэл зургууд
3. Эрх бүхий байгууллагуудаас гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээж авсан актын хуулбарууд (“ЮТО” ХХК, “Төгрөг баянхангай” ХХК, “Цэнгэг эрдэнэ” ХХК)

MNAS Accreditation system
TL 08-07 003209
MNS ISO/IEC 17025

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ

Дархан сум. 5 дугаар баг. УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: info@darkhan-uul.namem.gov.mn

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№	: 2023/1-06
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: **ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ТӨХК ҮЙЛДВЭР**
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Ц.Оюунчулуун, БОШЛ-ийн инженер Ө.Алтанзул, БОШЛ-ийн техникч
Сорьцын тоо, төрөл	: 4 цэг, агаарын бохирдлын шинжилгээ
Сорьц авсан огноо	: 2023.04.03
Шинжилсэн огноо	: 2023.04.04
Хуудасны тоо	: 1/1

№	Шинжилгээний аргачлал	Агаарын шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS4585: 2016 1 удаагийн сорьцын ХА	Хэмжилт хийсэн цэг		
					10401a	10402a	10403a
					20 минутын дундаж агууламж		
1	MNS 0017-2-5-12:2021	Хүхэрлэг хий /SO2/	мкг/$м^3$	**450**	10	6	6
2	MNS 0017-2-5-11:2021	Азотын давхар исэл /NO2/	мкг/$м^3$	**200**	31	28	27
3	MNS4048-88	Нийт тоосонцор /20 мин/	мкг/$м^3$	**500**	354	454	447
24 цагийн дундаж агууламж			Хэмжих нэгж	MNS4585:2016 24 цагийн ХА	10404a		
4	MNS4048-88	PM10 тоосонцор /24 цаг/	мкг/$м^3$	**100**	446		

Товчилсон үг: ХА-хүлцэх агууламж
Сорьцын код: 10401а - Кезо станцын орчин
10402а - Төмөр бэлтгэх талбайгаас 100метр орчин
10403а - Төмөр бэлтгэх талбайгаас 200метр орчин
10404а - Үйлдвэрлэлийн орчин

Тайлбар: Тухайн сорьц авах, хэмжилт хийх хугацааны цаг агаарын нөхцөл: Агаарын чийгшил 19%, агаарын температур 3.8 градус хүйтэн, баруунаасаа 3м/с хурдтай байсан.
Агаар дахь хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоосонцрын агууламж агаарын чанарын MNS4585:2016 стандартын 1 удаагийн сорьцын ХА-аас давсан бохирдолгүй.
PM10 тоосонцор MNS4585:2016 стандартын 24 цагийн ХА-аас 4.5 дахин давсан бохирдолтой.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН ИНЖЕНЕР Г.АНХМАА
ХЯНАСАН:
БОШЛ-ИЙН ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР Э.САЙНЗАЯА
БАТАЛГААЖУУЛСАН:
УОШХ-ИЙН ДАРГА М.АЛИМАА

Стандарт, хэмжил... Итгэмжлэгдсэн лаборатори TL № 08-07

000300006

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ

Дархан сум. 5 дугаар баг. УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: info@darkhan-uul.namem.gov.mn

MNAS Accreditation system
TL 08-07 003209
MNS ISO/IEC 17025

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№	: 2023/1-36
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: **ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ТӨХК ДАРХАН СУМ, ҮЙЛДВЭР**
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Ц.Оюунчулуун, БОШЛ-ийн инженер Ө.Алтанзул, БОШЛ-ийн техникч
Сорьцын тоо, төрөл	: 1 цэг, агаарын бохирдлын шинжилгээ
Сорьц авсан огноо	: 2023.04.03
Шинжилсэн огноо	: 2023.04.04
Хуудасны тоо	: 1/1

№	Шинжилгээний аргачлал	Агаарын шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS4585:2016 стандартын 24 цагийн ХА	Хэмжилт хийсэн цэг
					10404а
					24 цагийн дундаж агууламж
1	MNS4048-88	Нийт тоос /TSP/	мкг/м^3	**150**	145
		PM10 тоосонцор	мкг/м^3	**100**	92
		PM2.5 тоосонцор	мкг/м^3	**50**	43

Товчилсон үг: ХА-хүлцэх агууламж
Сорьцын код: 10404а - Үйлдвэрлэлийн орчин

Тайлбар:
1) Агаар дахь PM10 тоосонцор, PM2.5 тоосонцор, нийт тоосны хэмжилтийг 24 цагаар хэмжсэн.
2) Агаарын чанарын MNS4585:2016 стандартын 24 цагийн ХА-аас нийт тоос, PM10 тоосонцор, PM2.5 тоосонцор давсан бохирдолгүй.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН ИНЖЕНЕР Г.АНХМАА
ХЯНАСАН:
БОШЛ-ИЙН ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР Э.САЙНЗАЯА
БАТАЛГААЖУУЛСАН:
УОШХ-ИЙН ДАРГА М.АЛИМАА

Стандарт, хэмжил зүй Итгэмжлэгдсэн лаборатори TL № 08-07

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ

Дархан сум. 5 дугаар баг. УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: info@darkhan-uul.namem.gov.mn

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№	: 2023/1-44-1
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	: **ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ТӨХК ДАРХАН СУМ, ҮЙЛДВЭР**
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Ө.Алтанзул, Р.Отгонтуяа БОШЛ-ийн техникч
Сорьцын тоо, төрөл	: 5 цэг, агаарын бохирдлын шинжилгээ
Сорьц авсан огноо	: 2023.07.18
Шинжилсэн огноо	: 2023.07.19
Хуудасны тоо	: 1/2

№	Шинжилгээний аргачлал	Агаарын шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	MNS4585: 2016 1 удаагийн сорьцын ХА	Хэмжилт хийсэн цэг				
					10701г	10702г	10703г	10704г	10705г
					20 минутын дундаж агууламж				
1	MNS 0017-2-5-12:2021	Хүхэрлэг хий /SO2/	мкг/м^3	**450**	5	10	9	11	10
2	MNS 0017-2-5-11:2021	Азотын давхар исэл /NO2/	мкг/м^3	**200**	27	32	35	40	15
3	MNS4048-88	Нийт тоосонцор /20 мин/	мкг/м^3	**500**	39	61	29	33	40

Товчилсон үг: ХА-хүлцэх агууламж

Сорьцын код: 10701г-ПСА Хүчил төрөгч станцын орчин
10702г-Уутат фильтрийн орчин
10703г-ШТС-н орчинд
10704г-Төмөр бэлтгэх цехээс 200м орчинд
10705г-Дизель түлшний агуулах орчинд

Тайлбар:
1) Тухайн сорьц авах, хэмжилт хийх хугацааны цаг агаарын нөхцөл: Агаарын чийгшил 37%, агаарын температур 25.0 градус дулаан, салхи хойдын зүүн хойноосоо 2м/с хурдтай байсан.
2) Агаар дахь хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нийт тоосны агууламж агаарын чанарын MNS4585:2016 стандартын 1 удаагийн сорьцын дундаж ХА-аас давсан бохирдолгүй байна.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН АГААРЫН ТЕХНИКЧ Р.ОТГОНТУЯА
ХЯНАСАН:
БОШЛ-ИЙН ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР Э.САЙНЗАЯА
БАТАЛГААЖУУЛСАН:
УОШХ-ИЙН ДАРГА М.АЛИМАА

Стандарт хэмжил зүйн итгэмжлэгдсэн лаборатори № 08-07

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ДАРХАН-УС СУВАГ ХК-ИЙН
НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

*Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 8-р баг
Генерал Бавуугийн гудамж Утас: 89018836*

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН
/CERTIFICATE OF ANALYSIS/**

ДУГААР №0017

2023.04.08

№		
1	Бүтээгдэхүүний нэр	Шугамын ус
2	Дээж авсан газрын нэр	Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум " Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр" ТӨХК цайны газар /410/
3	Дээж авсан хүний нэр	Г.Болормаа
4	Протокол, сорьцын дугаар	410
5	Дээжийн хэмжээ	1,0л 0,5л
6	Шинжилгээнд хүлээн авсан /Он, сар, өдөр/	2023.04.05
7	Шинжилсэн хугацаа /Он, сар, өдөр/	2023.04.05 - 2023.04.08
8	Бүтээгдэхүүний стандарт	MNS 0900-2018

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ TL-33 УИТ0006

ЛАБОРАТОРИЙН АЛБАН ЁСНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ХУУЛБАРЛАН ХЭРЭГЛЭХИЙГ ХОРИГЛОНО.

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Химийн

№	Аргын стандарт	үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Шаард лага	Шинжилгээний дүн		
					364		
1	MNS/ISO 10523-2001	pH		6,5-8,5	7,18		
2	MNS/ISO 6059-2005	Хатуулаг	Мг-экв/л	7	2,85		
3	MNS/ISO 9963-1-2005	Шүлтлэг	Мг/л		2,9		
4	MNS 4430-2005	Нийт төмөр	Мг/л	0,3	<0,1		
5	MNS 9297:2005	Хлорид	Мг/л	350	25,2		
6	MNS 4431:2005	Нитрит	Мг/л	1,0	<0.02		
7	MNS/ISO 7890-3:2001	Нитрат	Мг/л	50	0.548		
8	MNS ISO 7150-1:2006	Аммони	Мг/л	1,5	<0.1		
9	MNS 1091:1970	Кальци	Мг/л	100	37,2		
10	MNS 1097:1970	Гидрокарбонат	Мг/л	-	173,8		
11	MNS 1091:1970	Магни	Мг/л	30	12,0		
12	MNS/ISO 6878:2001	Фосфат	Мг/л	3,5	1,388		
13	MNS 4423:1997	Хуурай үлдэгдэл	Мг/л	1000	292		
14	MNS 6271:2011	Сульфат	Мг/л	500	28,64		
15	MNS 6272:2011	Фтор	Мг/л	0,7-1,5	0.685		
16	MNS/ISO 7393-3:2008	Үлдэгдэл хлор	Мг/л	-	-		
17	MNS/ISO 7888:1999	ЦДЧ	мS/см	1	0,335		

Бактериологийн

№	Аргын стандарт	Үзүүлэлтийн нэр	Шаард лага	Шинжилгээний дүн		
				410		
1	MNS/ISO 6222:1998	1мл дахь нийт нянгийн тоо	100ш	75ш		
2	MNS/ISO 9308-2:1998	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч	0	0		
3	MNS/ISO 19250:2017	Сальмонелийн төрлийн нян илрүүлэх	0	0		
4	MNS ISO 4698:1998	E.Coli-г илрүүлэх	0	0		
5	MNS 5033-2001	Шимэгч хорхой илрүүлэх	0	0		

ТАЙЛБАР: СОРИЛТЫН ДҮН НЬ ЗӨВХӨН ШИНЖИЛСЭН ДЭЭЖИНД ХҮЧИНТЭЙ.

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН:
ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ Л.ЦЭВЭЛСҮРЭН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН: ХИМИЧ С.ДАШЧИРАВ
НЯН СУДЛААЧ Б.ЦАГААНЦЭЦЭГ

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

ДАРХАН-УС СУВАГ ХК-ИЙН
НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 8-р баг
Генерал Бавуугийн гудамж Утас: 89018836

MNAS Accreditation system TL 033 MNS ISO/IEC 17025

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН /CERTIFICATE OF ANALYSIS/

ДУГААР №0002

2023.01.13

1	Бүтээгдэхүүний нэр	Шугамын ус
2	Дээж авсан газрын нэр	Дархан-Уул аймаг Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр шүүлтүүрийн халуун ус /68/, шүүлтүүрийн ус /69/, аяга таваг угаах кра́нтны ус /70/, боловсруулах өрөөний тогоон дээрх ус /71/
3	Дээж авсан хүний нэр	Д.Болормаа
4	Протокол, сорьцын дугаар	68,69,70,71
5	Дээжийн хэмжээ	1,0л 0,5л
6	Шинжилгээнд хүлээн авсан /Он, сар, өдөр/	2023.01.10
7	Шинжилсэн хугацаа /Он, сар, өдөр/	2023.01.10 - 2023.01.13
8	Бүтээгдэхүүний стандарт	MNS 0900-2018

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ TL-33

ЛАБОРАТОРИЙН АЛБАН ЁСНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ХУУЛБАРЛАН ХЭРЭГЛЭХИЙГ ХОРИГЛОНО.

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Химийн

№	Аргын стандарт	үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Шаард лага	Шинжилгээний дүн			
					68	69	70	71
1	MNS/ISO 10523-2001	pH		6,5-8,5				7,13
2	MNS/ISO 6059-2005	Хатуулаг	Мг-экв/л	7				2,7
3	MNS/ISO 9963-1-2005	Шүлтлэг	Мг/л					3,3
4	MNS 4430-2005	Нийт төмөр	Мг/л	0,3				0,1
5	MNS 9297:2005	Хлорид	Мг/л	350				16,8
6	MNS 4431:2005	Нитрит	Мг/л	1,0				0,031
7	MNS/ISO 7890-3:2001	Нитрат	Мг/л	50				0,535
8	MNS ISO 7150-1:2006	Аммони	Мг/л	1,5				0,1
9	MNS 1091:1970	Кальци	Мг/л	100				41,2
10	MNS 1097:1970	Гидрокарбонат	Мг/л	-				161,6
11	MNS 1091:1970	Магни	Мг/л	30				7,78
12	MNS/ISO 6878:2001	Фосфат	Мг/л	3,5				0,094
13	MNS 4423:1997	Хуурай үлдэгдэл	Мг/л	1000				472
14	MNS 6271:2011	Сульфат	Мг/л	500				21,99
15	MNS 6272:2011	Фтор	Мг/л	0,7-1,5				0,654
16	MNS/ISO 7393-3:2008	Үлдэгдэл хлор	Мг/л	0,2-0,3				-
17	MNS/ISO 7888:1999	Цахилгаан дамжуулах чанар	мS/см	1				0,329

Бактериологийн

№	Аргын стандарт	Үзүүлэлтийн нэр	Шаард лага	Шинжилгээний дүн			
				68	69	70	71
1	MNS/ISO 6222:1998	1мл дахь нийт нянгийн тоо	100ш	127	84	64	72
2	MNS/ISO 9308-2:1998	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч	0	0	0	0	0
3	MNS/ISO 19250:2017	Сальмонелийн төрлийн нян илрүүлэх	0	0	0	0	0
4	MNS ISO 4698:1998	E.Coli-г илрүүлэх	0	0	0	0	0
5	MNS 5033-2001	Шимэгч хорхой илрүүлэх	0	0	0	0	0

ТАЙЛБАР: СОРИЛТЫН ДҮН НЬ ЗӨВХӨН ШИНЖИЛСЭН ДЭЭЖИНД ХҮЧИНТЭЙ.

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ... ТӨВ
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ
TL-33

ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН:
ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ Л.ЦЭВЭЛСҮРЭН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН: ХИМИЧ С.ДАШЧИРАВ
НЯН СУДЛААЧ Б.ОДОНЧИМЭГ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ

Дархан сум. 5 дугаар баг. УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: info@darkhan-uul.namem.gov.mn

MNAS Accreditation system
TL 08-07 003209
MNS ISO/IEC 17025

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№	: 2023/3-29
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	**ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ТӨХК ДАРХАН СУМ, ҮЙЛДВЭР**
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Э.Сайнзаяа БОШЛ-ийн технологич инженер,
Сорьцын тоо, төрөл	: 9 цэг, Хөрсний химийн шинжилгээ
Сорьц авсан огноо	: 2023.05.25
Сорьц хүлээн авсан огноо	: 2023.05.25
Хуудасны тоо	: 2/2

№	Сорьц код	Шинжилгээний аргын стандарт	Шинжилгээний үзүүлэлт, мг/кг					
			Ялзмаг, %	Нитрат, NO_3	Сульфат, SO_4	Аммони, NH_4	PH	EC, µS/cm
1	30501р	**MNS3310:91**	1.20	2.9	14.3	16.3	7.78	283.0
2	30502р		0.70	3.7	16.4	47.5	8.04	378.0
3	30503р		0.85	1.5	99.4	35.6	6.49	1343.0
4	30504р		1.10	1.7	36.0	30.4	7.36	875.0
5	30505р		2.60	4.9	57.7	22.6	7.58	195.5
6	30506р		0.80	5.4	28.0	18.2	8.41	333.0
7	30507р		1.43	3.9	41.8	18.2	8.17	372.0
8	30508р		1.16	3.3	22.7	21.9	7.52	103.8
9	30509р		1.10	4.1	52.4	17.4	7.62	206.0
MNS3297:2019 ЗДХ				**130**	**160**			

Товчилсон үг: ЗДХ - Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Сорьцын код: 30501р- Уутан филтерийн орчин
30502р- Хогийн цэгийн орчин
30503р- ШТС орчин
30504р- Төмөр бэлтгэх талбай орчин
30505р- Оффиссын орчин
30506р- Шаарын талбай, өнгөн хэсэг
30507р- Шаарын талбай, зүүн дунд хэсэг
30508р- Шаарын талбайгаас зүүн тийш 50м зайд
30509р- Шаарын талбайгаас зүүн тийш 100м зайд

Тайлбар:

1. Хөрсний сорьц авсан арга: Диагоналийн арга
2. Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх MNS3297:2019 стандарт дахь хөрсний эрүүл ахуйн шаардлагын химийн үзүүлэлтээр нитрат /NO_3/, сульфат /SO_4/-ын агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан бохирдолгүй.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН ИНЖЕНЕР Г.АНХМАА
ХЯНАСАН:
БОШЛ-ИЙН ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР Э.САЙНЗАЯА

Стандарт, хэмжил... итгэмжлэгдсэн лаборатори TL № 08-07

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ

Дархан сум. 5 дугаар баг. УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: info@darkhan-uul.namem.gov.mn

MNAS Accreditation system
TL 08-07 003209
MNS ISO/IEC 17025

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№	: 2023/3-32
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	**ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ТӨХК ДАРХАН СУМ, “ГАН УРСГАЛ” АМРАЛТ**
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	: Э.Сайнзаяа БОШЛ-ийн технологич инженер,
Сорьцын тоо, төрөл	: 2 цэг, Хөрсний химийн шинжилгээ
Сорьц авсан огноо	: 2023.05.25
Сорьц хүлээн авсан огноо	: 2023.05.25
Хуудасны тоо	: 2/2

№	Сорьц код	Шинжилгээний аргын стандарт	Шинжилгээний үзүүлэлт, мг/кг					
			Ялзмаг, %	Нитрат, NO_3	Сульфат, SO_4	Аммони, NH_4	PH	EC, µS/cm
1	30501т	**MNS3310:91**	1.84	2.0	31.3	6.8	6.53	113.8
2	30502т		2.60	1.7	48.0	9.9	5.55	60.1
MNS3297:2019 ЗДХ				**130**	**160**			

Товчилсон үг: ЗДХ - Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Сорьцын код: 30501т- Ил талбай
30502т- Талбай

Тайлбар:
1. Хөрсний сорьц авсан арга: Диагоналийн арга
2. Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх MNS3297:2019 стандарт дахь хөрсний эрүүл ахуйн шаардлагын химийн үзүүлэлтээр нитрат /NO_3/, сульфат /SO_4/-ын агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан бохирдолгүй.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН ИНЖЕНЕР Г.АНХМАА
ХЯНАСАН:
БОШЛ-ИЙН ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР Э.САЙНЗАЯА
БАТАЛГААЖУУЛСАН:
УОШХ-ИЙН ДАРГА М.АЛИМАА

Стандарт итгэмжлэгдсэн лаборатори TL № 08-07

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ

Дархан сум. 5 дугаар баг. УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: info@darkhan-uul.namem.gov.mn

MNAS Accreditation system TL 08-07 003209 MNS ISO/IEC 17025

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№ : 2023/3-31
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : **ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ТӨХК ДАРХАН СУМ, ҮЙЛДВЭР МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ГАЗАР**
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Э.Сайнзаяа БОШЛ-ийн технологич инженер,
Сорьцын тоо, төрөл : 3 цэг, Хөрсний химийн шинжилгээ
Сорьц авсан огноо : 2023.05.25
Сорьц хүлээн авсан огноо : 2023.05.25
Хуудасны тоо : 2/2

№	Сорьц код	Шинжилгээний аргын стандарт	Шинжилгээний үзүүлэлт, мг/кг					
			Ялзмаг, %	Нитрат, NO_3	Сульфат, SO_4	Аммони, NH_4	PH	EC, µS/cm
1	30501c	**MNS3310:91**	1.40	8.4	81.0	45.4	8.00	1112.0
2	30502c		1.48	1.3	47.5	8.0	7.65	413.0
3	30503c		3.29	7.8	81.5	42.4	7.86	1770.0
Стандарт **MNS3297:2019 ЗДХ**				**130**	**160**			

Товчилсон үг: ЗДХ - Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Сорьцын код: 30501c- Голын урд эрэг
30502c- Голын зах, дэнж талруугаа
30503c- Голын хойно

Тайлбар:
1. Хөрсний сорьц авсан арга: Диагоналийн арга
2. Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх MNS3297:2019 стандарт дахь хөрсний эрүүл ахуйн шаардлагын химийн үзүүлэлтээр нитрат /NO_3/, сульфат /SO_4/-ын агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан бохирдолгүй.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН ИНЖЕНЕР Г.АНХМАА
ХЯНАСАН:
БОШЛ-ИЙН ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР Э.САЙНЗАЯА
БАТАЛГААЖУУЛСАН:
УОШХ-ИЙН ДАРГА М.АЛИМАА

Стандарт итгэмжлэгдсэн лаборатори TL № 08-07 газрааc

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ

Дархан сум. 5 дугаар баг. УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: info@darkhan-uul.namem.gov.mn

MNAS Accreditation system TL 08-07 003209 MNS ISO/IEC 17025

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№ : 2023/03-30
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас : **ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ТӨХК ДАРХАН СУМ, ҮЙЛДВЭР**
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал : Э.Сайнзаяа БОШЛ-ийн технологич инженер,
Сорьцын тоо, төрөл : 1 цэг, Хөрсний химийн шинжилгээ
Сорьц авсан огноо : 2023.05.25
Сорьц хүлээн авсан огноо : 2023.05.25
Хуудасны тоо : 2/2

№	Шинжилгээний арга, стандарт	Хөрсний химийн шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	**MNS 5850:2018 ЗДХ**	Сорьцын код	Бохирдлын агууламж
1	**ОХУ.БО-ны НББ16.1.41-04**	Хөрсөн дэх нефтийн бүтээгдэхүүн	г/кг	**2.0**	30501с	1.25

Товчилсон үг: ЗДХ - зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Хөрсний сорьц авсан арга: Диагоналийн арга
Сорьцын код: 30501с- ШТС орчин

Тайлбар: Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ MNS5850:2018 стандарт дахь хөрсөн дэх органик бохирдуулах бодис газрын тосны бүтээгдэхүүний агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан бохирдолгүй.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН ИНЖЕНЕР Г.АНХМАА
ХЯНАСАН:
БОШЛ-ИЙН ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР Э.САЙНЗАЯА
БАТАЛГААЖУУЛСАН:
УОШХ-ИЙН ДАРГА М.АЛИМАА

Стандарт ИТГЭМЖЛЭГДСЭН лаборатори TL № 08-07

Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хамаарна

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ЛАБОРАТОРИ

Дархан сум. 5 дугаар баг. УЦУОШТ-ийн байр
Утас: 7037-3783, 70374161
E-mail: info@darkhan-uul.namem.gov.mn

MNAS Accreditation system
TL 08-07 003209
MNS ISO/IEC 17025

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

Дугаар он/№	:2023/3-36
Сорьц ирүүлсэн газрын нэр, хаяг, утас	**ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ТӨХК ДАРХАН СУМ, ҮЙЛДВЭР**
Сорьц авсан хүний нэр, албан тушаал	:Э.Сайнзаяа, БОШЛ-ийн технологич инженер
Сорьцын тоо, төрөл	: 1 цэг, Хөрсний химийн шинжилгээ
Сорьц авсан огноо	: 2023.06.14
Шинжилсэн огноо	: 2023.06.15
Хуудасны тоо	: 3/1

№	Шинжилгээний аргын стандарт	Хөрсний химийн шинжилгээний үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	**MNS 3297:2019 ЗДХ**	Үзүүлэлтүүд
					30601г
1	**MNS3310:91**	Хөрсний ялзмаг	%		2.30
2		Нитрат, NO_3	мг/кг	**130**	24.0
3		Сульфат, SO_4	мг/кг	**160**	97.3
4		Аммони, NH_4	мг/кг		40.8
5		PH			7.88
6		EC	µS/cm		276.0

Товчилсон үг: ЗДХ - зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Дээжийн код: 30601г- Лагийн талбай орчин

Тайлбар:
1. Хөрсний сорьц авсан арга: Диагоналийн арга
2. Хот, суурин газрын хөрсний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлт, бохирдлыг үнэлэх MNS3297:2019 стандарт дахь хөрсний эрүүл ахуйн шаардлагын химийн үзүүлэлтээр нитрат /NO_3/-ын агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан бохирдолгүй.

ШИНЖИЛГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭСЭН:
БОШЛ-ИЙН ИНЖЕНЕР — Г.АНХМАА
ХЯНАСАН:
БОШЛ-ИЙН ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР — Э.САЙНЗАЯА
БАТАЛГААЖУУЛСАН:
УОШХ-ИЙН ДАРГА — М.АЛИМАА

Стандарт, ... итгэмжлэгдсэн лаборатори TL № 08-07

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар хот
Утас: 11-341818 И-мэйл: bohztl@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2023/ 218-226
Сорьцыг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг,утас : Төмөрлөгийн үйлдвэр
Сорьцыг авсан хүний нэр,албан тушаал : Э.Сайнзаяа БОШЛ-ийн инженер
Сорьцын тоо,төрөл : 9, хөрсний сорьц
Сорьцыг авсан огноо : 2023.05.24
Сорьцын тодорхойлолт : Дархан-Уул аймаг
Шинжилгээний аргын стандарт : САЗ А01:2022
Шинжилсэн огноо : 2023.05.24-2023.06.09
Хуудасны тоо : 2/2
Үр дүн

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Кадьми (Cd)	Хар тугалга (Pb)	Мөнгөн ус (Hg)	Хром (Cr)	Цайр (Zn)	Зэс (Cu)	Стронци (Sr)
		мг/кг						
6	Утан фильтерийн орчим	<0.005	19.3	<0.005	12.1	175.5	20.4	370.8
7	Шаарын талбайн зүүн тийш 50м	<0.005	19.4	<0.005	0.7	1170.6	22.7	372.3
8	Хогийн цэг орчим	14.1	204.5	<0.005	<0.005	6597.6	21.6	405.7
9	ШТС орчим	<0.005	25.9	<0.005	1.7	352.1	44.6	249.9
MNS 5850:2019/ ЗДХ/		**3**	**100**	**2**	**150**	**300**	**100**	**800**

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: Инженер Б.Даваасүрэн

Хянаж баталгаажуулсан: БОШ-ний хэлтсийн дарга Б.Бархасрагчаа

ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ TL 08 ҮИТ0235

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

MNAS Accreditation system TL 08 MNS ISO/IEC

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар хот
Утас: 11-341818 И-мэйл: bohztl@gmail.com

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЭМЖИЛЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№	: 2023/ 218-226
Сорьцыг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг,утас	: Төмөрлөгийн үйлдвэр
Сорьцыг авсан хүний нэр,албан тушаал	: Э.Сайнзаяа БОШЛ-ийн инженер
Сорьцын тоо,төрөл	: 9, хөрсний сорьц
Сорьцыг авсан огноо	: 2023.05.24
Сорьцын тодорхойлолт	: Дархан-Уул аймаг
Шинжилгээний аргын стандарт	: САЗ А01:2022
Шинжилсэн огноо	: 2023.05.24-2023.06.08
Хуудасны тоо	: 2/1

Үр дүн

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Кадьми (Cd)	Хар тугалга (Pb)	Мөнгөн ус (Hg)	Хром (Cr)	Цайр (Zn)	Зэс (Cu)	Стронци (Sr)
		мг/кг						
1	Шаарын талбайн өнгөн хөрс	6.6	245.7	<0.005	209.8	3389.9	15.0	310.4
2	Оффис орчим	1.5	14.8	<0.005	<0.005	263.4	30.5	417.4
3	Шаарын талбайн зүүн тийш	<0.005	18.2	<0.005	<0.005	235.9	30.4	414.5
4	Шаарын талбайн зүүн урд хэсэг	<0.005	311.8	<0.005	89.3	6667.4	14.9	338.9
5	Төмөр бэлтгэх талбайн орчим	<0.005	101.3	<0.005	54.5	3641.7	9.8	299.9
MNS 5850:2019/ ЗДХ/		3	100	2	150	300	100	800

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: Б. Даваасүрэн Инженер Б.Даваасүрэн

Хянаж баталгаажуулсан: БОШ-ний хэлтсийн дарга Б.Бархасрагчаа

ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВӨӨС ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ TL 08 УИТ 0235

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

17043, Үйлдвэр 2-4, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Улаанбаатар хот
Утас: 11-341818 И-мэйл: bohztl@gmail.com

СОРИЛТЫН ДҮН

Дугаар он/№ : 2023/ 257
Сорьцыг ирүүлсэн газрын нэр, хаяг,утас : "Төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК
Сорьцыг авсан хүний нэр,албан тушаал : Г.Анхмаа
Сорьцын тоо,төрөл : 1, хөрсний сорьц
Сорьцыг авсан огноо : 2023.06.19
Сорьцын тодорхойлолт : Дархан-Уул аймаг
Шинжилгээний аргын стандарт : САЗ А01:2022
Шинжилсэн огноо : 2023.06.19-2023.06.28
Хуудасны тоо : 1/1
Үр дүн

№	Сорьц авсан цэгийн нэр	Кадьми (Cd)	Хар тугалга (Pb)	Мөнгөн ус (Hg)	Хром (Cr)	Цайр (Zn)	Зэс (Cu)	Стронци (Sr)
		мг/кг						
1	Лагийн талбай	<0.005	15.0	<0.005	<0.005	608.8	31.3	218.3
	MNS 5850:2019/ ЗДХ/	**3**	**100**	**2**	**150**	**300**	**100**	**800**

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн: Инженер Б.Даваасүрэн

Хянаж баталгаажуулсан: Чанарын менежер инженер Б.Алтантуяа

ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВӨӨС ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ TL 08 ҮИТ0235

Хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
Сорилтын дүн нь зөвхөн шинжилсэн сорьцонд хүчинтэй.

БАТЛАВ:
"ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР"-ЫН ДАРГА
З.ЭРДЭНЭБАТ

БАТЛАВ:
"Дарханы Технологийн Үйлдвэр ТӨХК"-н ЗАХИРАЛ /ДАРГА/
Г. Бугартаб

ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ААТҮГ

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

2022оны 9 сар 1 өдөр №.25. Дархан-Уул аймаг

Иргэн, ААН байгууллагын нэр	"Дарханы Технологийн Үйлдвэр" ТӨХК	
Регистерийн дугаар		
Үйл ажиллагааны чиглэл	Боловсруулах үйлдвэрлэл	
Иргэн, ААНБ-ын хаяг	14-р баг	
ААНБ-ын холбогдох утас	88983978 ; 99109773 ня-бо.	
Данс	100190100947 – төрийн сан	
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төрөл	Сард ....төгрөг	Рейсийн тоогоор 1 рейс 1м³ 15000........ Төгрөг
Төлбөрийн нөхцөл		
Гэрээний хугацаа	2022 оны 9-р сарын 1 ны өдрөөс 2023 оны 9-р сарын 1 ны өдөр хүртэл	
Гэрээний сунгалт		

Гүйцэтгэгч талаас "Дархан Хот Тохижилт Үйлчилгээний Газар" ОНӨААТҮГ-ыг төлөөлж Ахлах байцаагч Даш-ёндон овогтой Нарантуяа Нөгөө талаас ....Д.............овогтой.....Мөнхсайхан......./цаашид захиалагч тал гэх/ нар нь "Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хууль", "Зөрчлийн тухай хууль" эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудыг үндэслэн харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээний зорилго нь гүйцэтгэгч тал нь ААНБ-аас гарч байгаа ахуйн болон аюултай, эрсдэлтэй хог хаягдлыг гэрээнд заасан хугацаанд ачиж тээвэрлэх түрж булж устгах, захиалагч тал нь гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрийг төлөх болон байгууллага хоорондын ажлын уялдааг сайжруулж хариуцлагыг дээшлүүлэхэд оршино.

Хоёр. Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

2.1 Захиалагч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй

2.2 Хог хаягдал тээвэрлэсний хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулахыг шаардах эрхтэй

2.3 хог тээврийн машин орж ачих боломжгүй байршилд байгаа, тогтоосон цэгт төвлөрүүлээгүй, хог тээврийн хураамжаа тайлант хугацаанд төлөөгүй, хуримтлагдсан өртэй ААНБ-ын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.

2.4 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжуудыг үндэслэн хог хаягдлаа ачиж тээвэрлүүлэх, зориулалтын зөвшөөрөгдсөн цэгт хаяхыг шаардах эрхтэй

2.5 хог хаягдлыг дуудлагаар буюу графикт хугацаанд гэрээний дагуу ачих үүрэг хүлээнэ.

2.6 Ажлын ачаалал, цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч графикт хугацаанд хогийг ачиж тээвэрлэж чадахгүй бол урьдчилан мэдэгдэнэ.

БАТЛАВ:
"ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР"-ЫН ДАРГА
_______________З.ЭРДЭНЭБАТ

БАТЛАВ:
"Дархан Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХХК
..........................."-н ЗАХИРАЛ /ДАРГА/
______________/Г. Баярмаа/..........

ХОГ ХАЯГДАЛ АЧИЖ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

2023оны 09.сар.12.өдөр №...... Дархан-Уул аймаг

Иргэн, ААН байгууллагын нэр	Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр	
Регистерийн дугаар	2051303.	
Үйл ажиллагааны чиглэл	Үйлдвэрлэл эрх үүрэг.	
Иргэн, ААНБ-ын хаяг	16-р баг үйлдвэрийн Дахон өдрийн байр	
ААНБ-ын холбогдох утас	95975809	
Данс	Хаан банк 5108367520	
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төрөл	Сард ....төгрөг	Рейсийн тоогоор 1 рейс 1м³ – 15000 Төгрөг
Гэрээний хугацаа	20.23. оны 09.-р сарын 12..ны өдрөөс 2024. оны 09..-р сарын 11....ны өдөр хүртэл	
Гэрээний сунгалт	20..... оны .....-р сарын ......ны өдрөөс 20..... оны .....-р сарын ......ны өдөр хүртэл	

Гүйцэтгэгч талаас "Дархан Хотын Тохижилт Үйлчилгээний Газар" ОНӨААТҮГ-ыг төлөөлж Ахлах байцаагч Баянхишиг овогтой Отгонтуяа Нөгөө талаас ....Ц.............овогтой.............Даваадагва................./цаашид захиалагч тал гэх/ нар нь "Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хууль", "Зөрчлийн тухай хууль" эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудыг үндэслэн харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээний зорилго нь гүйцэтгэгч тал нь ААНБ-аас гарч байгаа ахуйн болон аюултай, эрсдэлтэй хог хаягдлыг гэрээнд заасан хугацаанд ачиж тээвэрлэх түрж булж устгах, захиалагч тал нь гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрийг төлөх болон байгууллага хоорондын ажлын уялдааг сайжруулж хариуцлагыг дээшлүүлэхэд оршино.

Хоёр. Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

2.1 Захиалагч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй

2.2 Хог хаягдал тээвэрлэсний хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулахыг шаардах эрхтэй

2.3 Хог тээврийн машин орж ачих боломжгүй байршилд байгаа, тогтоосон цэгт төвлөрүүлээгүй, хог тээврийн хураамжаа тайлант хугацаанд төлөөгүй, хуримтлагдсан өртэй ААНБ-ын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.

2.4 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжуудыг үндэслэн хог хаягдлаа ачиж тээвэрлүүлэх, зориулалтын зөвшөөрөгдсөн цэгт хаяхыг шаардах эрхтэй

2.5 Хог хаягдлыг дуудлагаар буюу графикт хугацаанд гэрээний дагуу ачих үүрэг хүлээнэ.

2.6 Ажлын ачаалал, цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч графикт хугацаанд хогийг ачиж тээвэрлэж чадахгүй бол урьдчилан мэдэгдэнэ.

Гурав. Захиалагч талын эрх үүрэг

3.1 Гүйцэтгэгч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй.

3.2 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийн талаар төрийн болон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээллэх, тайлбар мэдээ авах эрхтэй.

3.3 Хог хаягдлын төлбөрийг сар бүрийн 25ны дотор багтаан барагдуулах үүрэг хүлээнэ.

3.4 Хог хаягдлаа ачиж тээвэрлэх захиалга өгсөн үед тээврийн хэрэгсэл очиход хариуцсан ажилтнаа байгууллага дээрээ байлгаж, хог ачилтанд хяналт тавих үүрэг хүлээнэ.

3.5 ААНБ-ууд нь хог хаягдлыг саадгүй ачих нөхцлийг бүрдүүлсэн байх, тохиромжтой, стандартын хогийн савтай байх, хог хаягдлын талаархи хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг ханган ажиллах

3.6 Захиалагч тал нь хог хаягдлыг өөрсдийн машинаар тээвэрлэхээр болвол Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын “Бараат” хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хаяна.

Дөрөв. Талуудын хүлээх хариуцлага

4.1 Энэхүү гэрээний 3.3-т заасан хугацаанд захиалагч тал үйлчилгээний төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутам үнийн дүнгийн 0.2 хувиар алданги тооцож төлнө.

4.2 Нийтийн эдэлбэр газар болон ногоон бүсэд хог хаягдал хаясан иргэн, ААН-ийн зөрчил үйлдэхэд ашигласан тээврийн хэрэгсэл хураах, унаа хөсөг, техник тоног төхөөрөмжийг хурааж, "Зөрчлийн тухай хууль"-ийн 6 дугаар зүйлийн 1.2,3,4,5.6т зааснаар зөрчил гаргасан хүнийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

4.3 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх болон хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гарч болох бүх маргаан зөрчил зэргийг харилцан тохиролцож шийдвэрлэх ба үл тохиролцсон тохиолдолд Монгол улсын хуулийн дагуу тухайн бүс нутагийн харьяалах шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

4.4 Гэрээг 2 хувь үйлдэж гэрээнд эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.

Тав. Нэмэлт заалт

Тэнэр хүн оршин хогийг тээвэрлэх

ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ЭДИЙН ЗАСАГЧ

[signature] Т.АМГАЛАНБААТАР

АХЛАХ БАЙЦААГЧ

Б.Отга Б.ОТГОНТУЯА

Утас: 88063230

99371701 – дис.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Албан тушаал: ААА-ны дарга [signature] Ц.Даваадэлгэр

Албан тушаал: ....

Утас: ....

БАТЛАВ "ЭС И ЭС ЭЛ СМАРТ СОЛЮШН" ХХК ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ _______________ /Ч. АГИЙМАА/	БАТЛАВ "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК _______________ /Т. Дугаржав/

ХУВАНЦАР САВ НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2023 оны 07 сарын 06 өдөр SESL-23/.... Улаанбаатар хот

Энэхүү хуванцар сав нийлүүлэх гэрээ /цаашид "Гэрээ" гэх/-г

Нэг талаас, "Эс И Эс Эл Смарт Солюшн" ХХК (РД:6990916) /цаашид "Худалдан авагч" гэх/, түүнийг төлөөлж Худалдааны төлөөлөгч О.Амарсайхан

Нөгөө талаас, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК (РД: 2051303) /цаашид "Нийлүүлэгч" гэх/, түүнийг төлөөлж БОХАБЭАА-ны дарга Н.Батцэцэг /хамтад нь "Талууд" гэх/ нар харилцан тохиролцож байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Энэхүү гэрээний зорилго нь нийлүүлэгч нь өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд цуглуулсан, худалдан авагчийн шаардлагыг хангахуйц PET1 тэмдэглэгээ бүхий ундаа, усны хуванцар сав, бор өнгийн картон цаас, бүх төрлийн лаазыг хүлээлгэж өгөх, худалдан авагч нь хэлэлцэн тохирсон хөлс төлөх болон бусад харилцааг зохицуулахад оршино.

ХОЁР. ТӨЛБӨР ТООЦОО, ХУГАЦАА

2.1 1кг хуванцар савны үнэ 450 / 500 / төгрөг байна.

2.2 Нийлүүлэгч төлбөр төлөгдсөнөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор и-баримтыг шивнэ.

2.3 ***Төлбөр төлөх нөхцөл:*** Хуванцар савыг хүлээлгэж өгснөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор төлбөрийг шилжүүлнэ.

2.4 ***Төлбөр төлөх данс:*** Нийлүүлэгчийн 3096015653 тоот "ДТҮ" ХХК дансны нэртэй "Капитрон" банкны дансаар төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэнэ.

2.5 ***Гэрээний хугацаа:*** Энэхүү гэрээ нь баталгаажсан өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

2.6 Гэрээний хугацаа дуусах үед талууд ямар нэгэн санал гаргаагүй бол гэрээ дахин 1 жилээр сунгагдана.

2.7 Гэрээний төлбөрийг нэмэх, хасах асуудлыг талууд харилцан тохиролцож шийдэх бөгөөд зөвхөн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулснаар шинэ төлбөрийн нөхцөл болон дүн баталгаажна.

2.8 Нийлүүлэгчийн хүлээлгэж өгсөн хуванцар савнууд дунд өөр төрлийн хуванцар сав болон хэт бохирдсон хуванцар сав нь 2кг–аас хэтэрсэн тохиолдолд энэ талаар мэдээллийг Худалдан авагч нь Нийлүүлэгчид мэдэгдэж нийт хэмжээгээр хорогдолд тооцож төлбөрийг төлнө.

ГУРАВ. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1 **Нийлүүлэгчийн хүлээх үүрэг**

3.1.1 Нийлүүлэгч нь зөвхөн PET1 тэмдэглэгээ бүхий ундаа, усны хуванцар савыг цуглуулж, хүлээлгэж өгөх бөгөөд бусад төрлийн хуванцар савыг холихгүй байх үүрэгтэй.

3.1.2 Нийлүүлэгч нь хэт бохирдсон болон зориулалтын бусаар ашигласан савнуудыг /айраг, сүү, цагаан идээний төрлийн зүйл хийсэн болон хэт бохирдсон/ тээвэрлэхээс өмнө ангилан ялгасан байх үүрэгтэй.

3.1.3 Бүтээгдэхүүн тээвэрлэхээс ажлын 2 хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдэх бөгөөд машинд шууд ачихад бэлэн болгосон байна.

3.1.4 Худалдан авагчийн хүлээлгэн өгсөн хуванцрын уутыг зориулалтын дагуу ашиглах бөгөөд гэрээ цуцлах тохиололд хүлээн авсан тоо хэмжээгээр буцааж өгөх үүрэгтэй.

3.1.5 Нийлүүлэгч нь хуванцар цуглуулах уутыг дүүргэсний дараа дуудлага өгнө.

3.1.6 Машинд ачих зам талбайг чөлөөлж, чөлөөтэй нэвтрэх боломжоор хангах, гэмтэж болзошгүй эд хөрөнгийг холдуулна.

3.1.7 Нийлүүлэгч өөрсдийн тээврийн хэрэгсэлээр түүхий эд хүлээн авах цэгт хүргэх тохиолдолд тухай бүр харицсан төлөөлөгчид утсаар мэдэгдэж машины дугаарыг бүртгүүлнэ.

3.2 Худалдан авагчийн хүлээх үүрэг

3.2.1 Худалдан авагч нь өөрсдийн зориулалтын төхөөрөмжөөр жинлэж баталгаажсан хэмжээгээр тооцож энэ гэрээний 2.3-т заасан хугацаанд төлбөрийг төлөх үүрэгтэй.

3.2.2 Худалдан авагч нь дуудлага ирүүлсэнээс хойш ажлын 2 хоногийн дотор тээвэрлэнэ.

3.2.3 Нийлүүлэгчид цуглуулах хуванцар савны талаар мэдээлэл болон гарын авлага өгөх үүрэгтэй.

<u>ДӨРӨВ. БУСАД</u>

5.1. *<u>Мэдэгдэл.</u>* Энэхүү гэрээтэй холбоотой аливаа мэдэгдлийг бичгээр үйлдэж, биечлэн эсхүл баталгаат шуудангаар Гэрээнд заасан хаягаар хүргүүлнэ.

5.2. *<u>Маргаан шийдвэрлэх.</u>* Энэхүү гэрээтэй холбоотой аливаа маргааныг Талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд Шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

5.3. *<u>Гэрээ цуцлах:</u>* Аль нэг тал гэрээний хугацаанаас өмнө гэрээ цуцлах бол нөгөө талдаа ажлын 10 хоногийн өмнө албан бичгээр мэдэгдэнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

ХУДАЛДАН АВАГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ	**НИЙЛҮҮЛЭГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ**
“Эс И Эс Эс Смарт Солюшн” ХХК-ийн Төлөөлөгч	“Дарханы ноосролтын үйлдвэр” ХХК
____________ / Ануарсайхан.	____________ / Н. Батцэнд -г
Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 1 хороо, 11 хороолол, Токиогийн гудамж 2-4 тоот	Хаяг: ....
Утас: 80249933, 95541114.	Утас: 75550011
И-мэйл: unurjargal.sesl@gmail.com	И-мэйл: info@dmp.mn

"ЮТО" ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

/Ө.БАТСАЙХАН/

"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР" ХК-ийн
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

/М.ОТГОНБАЯР/

ТЕХНИКИЙН ХАЯГДАЛ ТОС БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2021 оны 10-р сарын 12-ны өдөр *№* *Улаанбаатар хот.*

Энэхүү гэрээг нэг талаас Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа 5003032 тоот регистрийн дугаартай **"ЮТО" ХХК**- г төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Ө.Батсайхан, нөгөө талаас Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа 6298141 тоот регистрийн дугаартай "**Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХК** -г төлөөлж Ерөнхий захирал М.Отгонбаяр нар дор дурдсан зүйлийг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр Монгол Улсын Иргэний Монгол улсын Иргэний хуулийн 243-264 дүгээр зүйл заалтыг баримтлан энэхүү техникийн ажилласан тос бэлтгэн нийлүүлэх гэрээг байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Энэхүү гэрээгээр **"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХК** (цаашид **ХУДАЛДАН АВАГЧ** гэх) болон "**ЮТО" ХХК** (цаашид **НИЙЛҮҮЛЭГЧ** гэх) нарын гэрээнд заасан хугацаанд машин механизмын, тоног төхөөрөмжийн, хөдөлгүүрийн, гидрийн болон моторын тосыг солих үед гарах техникийн хаягдал тос буюу аюултай хог хаягдал /цаашид "АХХ" гэх/-г цуглуулах, тээвэрлэх, бэлтгэн нийлүүлэх, түүнд тохирох үнийг төлөх болон бусад холбогдох харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 Энэхүү гэрээ нь талуудын хооронд хийгдсэн тохиролцоонуудыг агуулж байгаа бөгөөд энэхүү гэрээнд тодорхой байдлаар тусгаж оруулсан заалтуудыг оролцуулахгүйгээр Үйлчилгээтэй холбоотой хэлцэл, мэдэгдэл, аман болон бичгээр хийсэн тохиролцоог энэхүү гэрээ орлож байгаа болно.

1.3 Энэхүү гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол түүнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж, хоёр тал гарын үсэг зураагүй бол тэдгээрийг хүчин төгөлдөр бус гэж үзнэ.

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

2.1 Гэрээ нь **"ЮТО" ХХК** болон **"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХК** -ийн төлөөлөлүүд гарын үсэг зурснаар хугацаагүй хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.

2.2 Гэрээнд оролцогч талууд Монгол Улсын Иргэний хуульд зааснаар гэрээний үүргээ бүрэн буюу хэсэгчлэн биелүүлээгүй гэж үзсэн тохиолдолд гэрээг дуусгавар болгохыг санал болгох эрхтэй.

2.3 Гэрээний хугацаа дуусгавар болоход талууд гэрээг үргэлжлүүлэх эсэх талаар харилцан мэдэгдэл ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээ анх байгуулагдсан хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.

2.4 Энэхүү гэрээний нөхцөл, болзол, заалтаас татгалзан дуусгавар болгох тухай санал, шалтгааныг талууд зөвхөн албан бичгээр тайлбарлан гаргана.

тушаал, тогтоол эсхүл Засгийн газрын эрх бүхий байгууллагын журам эсхүл зөвшөөрлийг алдах явдал бөгөөд энэ бүхэн аль ч талын үйлдэлд үндэслэгдээгүй байх ёстой.

5.3 Дээрхээс шалтгаалах ажил зогсоолт эсхүл энэ гэрээний дагуу үзүүлэх үйлчилгээний гүйцэтгэл тасалдсаны улмаас цаг хугацааны хувьд хойшлогдох асуудлыг аль болох яаралтай засаж залруулна.

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

6.1 Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж, талууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг даран баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.

6.2 Энэхүү гэрээнд заасан хэлцлүүд хэрэгжсэн эсэхийг үл харгалзан гэрээнд тусгагдсан болон гэрээг бэлтгэх, хэрэгжүүлэх үед гэрээнд оролцогч талуудын зүгээс гарсан аливаа зардлыг талууд өөр өөрсдөө хариуцна.

ДОЛОО. МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

7.1 Талууд харилцагч талынхаа бизнесийн нэр хүндийг хүндэтгэж, тэгш эрхийн зарчимд тулгуурлан ажиллана.

7.2 Талууд гэрээний хугацаанд харилцан ашигтай, найрсаг байдлаар хамтран ажиллаж аливаа маргааныг зөвшилцлийн замаар шийдвэрлэх бөгөөд хэрэв тодорхой зөвшилцөлд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хуулийн дагуу харъяалагдах шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН:

НИЙЛҮҮЛЭГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ: " ЮТО" ХХК-ны	ХУДАЛДАН АВАГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ: "Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХК-ны
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР	Байгал орчны инженер
(ЮТО ХХК stamp, signature) Г. БАТЦОГТ /	(signature) /М.ӨЭЛҮН /

ТАЛУУДЫН АЛБАН ЁСНЫ ХАЯГ:

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, БЗД , 26-р хороо, 404-103 тоот Утас: 99097688, 99090313	Хаяг: Монгол улс, Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 2-р баг, Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХК-ийн төв оффисын 304 тоот Утас: 99279734

БАТЛАВ.
НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ
ЭМЧ Б.МӨНХБАТ

БАТЛАВ.
"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР"
ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
А.АРИУНБОЛД

ЭМНЭЛГИЙН АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ, ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭХ УСТГАХ ГЭРЭЭ

2022 оны 09 сарын19 өдөр **Дархан-Уул**

Нэг. Гэрээний үндэслэл:

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/505 тоот тушаал, 2017 оны Сангийн сайд, эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 264/А/293 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулав.

Хоёр. Гэрээний зорилго

Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хог хаягдлыг цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, устгах, иргэний эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах зорилготой.

Энэхүү гэрээ нь нэг талаас **Дархан Нэгдсэн эмнэлэг** (цаашид гүйцэтгэгч гэх)-г хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэж устгах, Нөгөө талаас **“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ТӨХК** (цаашид захиалагч) хоёрын уялдаа холбоог сайжруулах, ариутгал устгалын үйлчилгээг стандартын дагуу үзүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлж үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэгдэнэ.

Гурав. Захиалагч талын эрх үүрэг

1.Хагалгааны болон боолтын материал, хэрэглэсэн зүү тариур, бээлий, толь тарианы шил, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, бусад эмнэлгийн гаралтай аюултай хог хаягдлыг зохих журам зааврын дагуу зориулалтын аюулгүй хайрцаг, шар уутанд хийж Нэгдсэн эмнэлгийн устгалд өгнө.

2.Долоо хоногийн 4 дэх өдөр аюултай хог хаягдлаа стандартын дагуу бэлдэж бэлэн болгосон байх

3.Хог хаягдлын тээврийн хэрэгсэл очиход хүлээгдэл үүсэхгүй, холбоо барих утас бичсэн байх

4.Захиалагч тал нь баглаа боодлыг өөрсдөө хангаж бэлдэнэ.

5. Сарын 10,000 /арван мянга/ төгрөг, жилийн 120,000 /зуун хорин мянга/ төгрөг бүхий төлбөрийг Төрийн сан банк /100190020002/-дансанд бүтэн жилээр гэрээ хийхдээ тушаасан байх

Дөрөв. Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

1.Захиалагч тал нь ирсэн тусгай хог хаягдлыг стандартын дагуу ариутгал устгалыг хийнэ.

2.Тээвэрлэлтийн шаардлага хангаагүй, уут савны бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, ангилан ялгаагүй, зориулалтын бус уут саванд хийсэн, хэмжээ нэр төрөл нь тохироогүй хог хаягдлыг хүлээн авч тээвэрлэхгүй.

Тав. Гэрээний хугацаа нөхцөл

1.Гэрээг 2 тал харилцан тохирч 2022 оны 09 сарын 19 өдрөөс 2022 оны 09 сарын 19 өдрийг хүртэл 1 жилийн /жилээр, улирлаар/ хугацаатай байгуулна.

2.Нөгөө талын зөвшөөрөлгүйгээр 1 тал дангаараа гэрээг цуцлах эрхгүй.

3.Эмнэлгийн байгууллага нь аль нэг талаас гэрээг цуцлах гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах санал гаргавал харилцан тохирч гэрээг цуцлах буюу өөрчлөлт оруулж болно.

4.Ажил үйлчилгээтэй холбоотой маргааныг харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

5. Гэрээг 2 хувь үйлдэж 1 хувийг нь захиалагч байгууллагад, нөгөө хувийг Халдвар сэргийлэлтийн тасагт хадгална.

6.Гэрээ гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

Үйлчлэгч байгууллагыг төлөөлж:

Нэгдсэн эмнэлэг

Халдвар судлаач Ц.Сэлэнгэ

Утас:95803070

Үйлчлүүлэгч байгууллагыг төлөөлж:

“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ТӨХК

БОХАБЭАА-ны даргын үүргийг хавсран гүйцэтгэгч М.Даваахүү

БОХАБЭАА-ны БО-ны ахлах инженер

А.Калемшарив

БАТЛАВ:

ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

ГАЗРЫН ДАРГА ______________ З.ЭРДЭНЭБАТ

БАТЛАВ:

"Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК"-н

ЗАХИРАЛ ______________ /Г.Бүрэнжаргал/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ, ЦУГЛУУЛАХ, УСТГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

№.....

Нэг. Гэрээний үндэслэл:

Гэрээ байгуулагч талууд "Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хууль", "Зөрчлийн тухай хууль" эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн акт, Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/216 тоот тушаалыг үндэслэн, харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Иргэн, ААН байгууллагын нэр	Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК	
Регистерийн дугаар	2051303	
Үйл ажиллагааны чиглэл	16-р баг үйлдвэрийн район оффисын байр	
Иргэн, ААНБ-ын хаяг	95187715.	
ААНБ-ын холбогдох утас	[illegible]	
Данс	Хаан банкны 5108363490 тоот данс	
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж /төрөл: **Аюултай/**	Улиралд ..90000.. төгрөг	1 удаагийн ачилт .... төгрөг
Гэрээний хугацаа	2023 оны ..09..-р сарын ..12..-ны өдрөөс 2024оны ..09..-р сарын..11..-ны өдөр хүртэл	

Хоёр:Гэрээний зорилго

Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хог хаягдлыг цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, устгах, иргэний эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах зорилготой.

Энэхүү гэрээ нь нэг талаас "Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газар" ОНӨААТҮГ (цаашид гүйцэтгэгч гэх)-г хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэж устгах, Нөгөө талаас эрүүл мэндийн салбар ......DTV. – Н. Батцэнгэл...... эмнэлэг, эмийн сан (цаашид захиалагч) хоёрын уялдаа холбоог сайжруулах, ариутгал устгалын үйлчилгээг стандартын дагуу үзүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлж үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэгдэнэ.

Гурав: Захиалагч талын эрх үүрэг

1. Хагалгааны болон боолтын материал, хэрэглэсэн зүү тариур, бээлий, толь харианы шил, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, бусад эмнэлгийн гаралтай аюултай хог хаягдлыг зохих журам зааврын дагуу зориулалтын аюулгүй хайрцаг, шар уутанд хийж гүйцэтгэгч талд буюу устгалд хүлээлгэн өгнө.

2. Захиалагч тал нь улиралд 1удаа аюултай хог хаягдлаа стандартын дагуу сав баглаа боодлыг бэлдэж бэлэн болгосон байх,

3. Хог хаягдлын тээврийн хэрэгсэл очиход хүлээгдэл үүсгэхгүй байх.

4. Тооцоог сар бүрийн 25ны дотор багтаан төлбөрийг барагдуулах үүрэг хүлээнэ.

Дөрөв: Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

1. Захиалагч талаас ирсэн аюултай хог хаягдлыг стандартын дагуу устгалыг хийнэ.

2. Тээвэрлэлтийн шаардлага хангаагүй, уут савны бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, ангилан ялгаагүй, зориулалтын бус уут саванд хийсэн, хэмжээ нэр төрөл нь тохироогүй, хог тээврийн хураамжаа тайлант хугацаанд төлөөгүй, хуримтлагдсан өртэй ААНБ-ын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.

3. Ажлын ачаалал, цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч графикт хугацаанд хогийг ачиж тээвэрлэж чадахгүй бол урьдчилан мэдэгдэнэ.

Тав. Гэрээний нөхцөл

1. Нөгөө талын зөвшөөрөлгүйгээр 1 тал дангаараа гэрээг цуцлах эрхгүй.

2. Аль нэг талаас гэрээг цуцлах гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах санал гаргавал харилцан тохирч гэрээг цуцлах буюу өөрчлөлт оруулж болно.

3. Ажил үйлчилгээтэй холбоотой маргааныг харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

4. Гэрээг 2 хувь үйлдэж 1 хувийг нь захиалагч байгууллагад, нөгөө хувийг гүйцэтгэгч байгууллагад хадгална.

5. Гэрээ гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Дигаа ________________ Т.АМГАЛАНБААТАР

АХЛАХ БАЙЦААГЧ

Б.Отгс ________________ Б.ОТГОНТУЯА

Утас: 88063230

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

АЛБАН ТУШААЛ: Боховбэаа … эрхлэгч

Н.Батцэцэг ________________ ……………

АЛБАН ТУШААЛ:

________________ ……………

Утас:

БАТЛАВ:
"ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР"-ЫН ДАРГА
____________ З.ЭРДЭНЭБАТ

БАТЛАВ:
"Дархан Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХХК
"-н ЗАХИРАЛ /ДАРГА/
/Г. Бурдгжав/

ХОГ ХАЯГДАЛ АЧИЖ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

2023оны 09.сар.12.өдөр №...... Дархан-Уул аймаг

Иргэн, ААН байгууллагын нэр	Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр	
Регистерийн дугаар	2051303.	
Үйл ажиллагааны чиглэл	Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа.	
Иргэн, ААНБ-ын хаяг	16-р баг үйлдвэрийн район оффисын байр	
ААНБ-ын холбогдох утас	95975809	
Данс	Хаан банк 5108367520	
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн төрөл	Сард ....төгрөг	Рейсийн тоогоор 1 рейс 1м³ – 15000 Төгрөг
Гэрээний хугацаа	20.23. оны 09.-р сарын 12.ны өдрөөс 2024. оны 09..-р сарын 11....ны өдөр хүртэл	
Гэрээний сунгалт	20..... оны .....-р сарын ......ны өдрөөс 20..... оны .....-р сарын ......ны өдөр хүртэл	

Гүйцэтгэгч талаас "Дархан Хотын Тохижилт Үйлчилгээний Газар" ОНӨААТҮГ-ыг төлөөлж Ахлах байцаагч Баянхишиг овогтой Отгонтуяа Нөгөө талаас ....Ж.............овогтой.............Даваадагва............../цаашид захиалагч тал гэх/ нар нь "Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хууль", "Зөрчлийн тухай хууль" эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудыг үндэслэн харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээний зорилго нь гүйцэтгэгч тал нь ААНБ-аас гарч байгаа ахуйн болон аюултай, эрсдэлтэй хог хаягдлыг гэрээнд заасан хугацаанд ачиж тээвэрлэх түрж булж устгах, захиалагч тал нь гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрийг төлөх болон байгууллага хоорондын ажлын уялдаа сайжруулж хариуцлагыг дээшлүүлэхэд оршино.

Хоёр. Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

2.1 Захиалагч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй

2.2 Хог хаягдал тээвэрлэсний хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулахыг шаардах эрхтэй

2.3 Хог тээврийн машин орж ачих боломжгүй байршилд байгаа, тогтоосон цэгт төвлөрүүлээгүй, хог тээврийн хураамжаа тайлант хугацаанд төлөөгүй, хуримтлагдсан өртэй ААНБ-ын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.

2.4 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжуудыг үндэслэн хог хаягдлаа ачиж тээвэрлүүлэх, зориулалтын зөвшөөрөгдсөн цэгт хаяхыг шаардах эрхтэй

2.5 Хог хаягдлыг дуудлагаар буюу графикт хугацаанд гэрээний дагуу ачих үүрэг хүлээнэ.

2.6 Ажлын ачаалал, цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч графикт хугацаанд хогийг ачиж тээвэрлэж чадахгүй бол урьдчилан мэдэгдэнэ.

Гурав. Захиалагч талын эрх үүрэг

3.1 Гүйцэтгэгч талаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй.

3.2 Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийн талаар төрийн болон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээллэх, тайлбар мэдээ авах эрхтэй.

3.3 Хог хаягдлын төлбөрийг сар бүрийн 25ны дотор багтаан барагдуулах үүрэг хүлээнэ.

3.4 Хог хаягдлаа ачиж тээвэрлэх захиалга өгсөн үед тээврийн хэрэгсэл очиход хариуцсан ажилтнаа байгууллага дээрээ байлгаж, хог ачилтанд хяналт тавих үүрэг хүлээнэ.

3.5 ААНБ-ууд нь хог хаягдлыг саадгүй ачих нөхцлийг бүрдүүлсэн байх, тохиромжтой, стандартын хогийн савтай байх, хог хаягдлын талаархи хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг ханган ажиллах

3.6 Захиалагч тал нь хог хаягдлыг өөрсдийн машинаар тээвэрлэхээр болвол Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын "Бараат" хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хаяна.

Дөрөв. Талуудын хүлээх хариуцлага

4.1 Энэхүү гэрээний 3.3-т заасан хугацаанд захиалагч тал үйлчилгээний төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутам үнийн дүнгийн 0.2 хувиар алданги тооцож төлнө.

4.2 Нийтийн эдэлбэр газар болон ногоон бүсэд хог хаягдал хаясан иргэн, ААН-ийн зөрчил үйлдэхэд ашигласан тээврийн хэрэгсэл хураах, унаа хөсөг, техник тоног төхөөрөмжийг хураах, "Зөрчлийн тухай хууль"-ийн 6 дугаар зүйлийн 1.2,3,4,5.6т зааснаар зөрчил гаргасан хүнийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

4.3 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх болон хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гарч болох бүх маргаан зөрчил зэргийг харилцан тохиролцож шийдвэрлэх ба үл тохиролцсон тохиолдолд Монгол улсын хуулийн дагуу тухайн бүс нутагийн харьяалах шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

4.4 Гэрээг 2 хувь үйлдэж гэрээнд эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.

Тав. Нэмэлт заалт

.........Тэнэр хүк эргэлт хогийг тээвэрлэх..
....
....
....

ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ЭДИЙН ЗАСАГЧ

______Амгал______ Т.АМГАЛАНБААТАР

АХЛАХ БАЙЦААГЧ

______Б.Отга______ Б.ОТГОНТУЯА

Утас: 88063230

99371701 – дис.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Албан тушаал:

ААА-ны дарга .... Ц.Даваадалай

Албан тушаал:

______________ ....

Утас: ....

БАТЛАВ.
НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ
ЭМЧ Б.МӨНХБАТ

БАТЛАВ.
"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР"
ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
А.АРИУНБОЛД

ЭМНЭЛГИЙН АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ, ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭХ УСТГАХ ГЭРЭЭ

2022 оны 09 сарын19 өдөр **Дархан-Уул**

Нэг. Гэрээний үндэслэл:

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/505 тоот тушаал, 2017 оны Сангийн сайд, эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 264/А/293 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулав.

Хоёр. Гэрээний зорилго

Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хог хаягдлыг цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, устгах, иргэний эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах зорилготой.

Энэхүү гэрээ нь нэг талаас **Дархан Нэгдсэн эмнэлэг** (цаашид гүйцэтгэгч гэх)-г хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэж устгах, Нөгөө талаас **"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ТӨХК** (цаашид захиалагч) хоёрын уялдаа холбоог сайжруулах, ариутгал устгалын үйлчилгээг стандартын дагуу үзүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлж үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэгдэнэ.

Гурав. Захиалагч талын эрх үүрэг

1.Хагалгааны болон боолтын материал, хэрэглэсэн зүү тариур, бээлий, толь тарианы шил, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, бусад эмнэлгийн гаралтай аюултай хог хаягдлыг зохих журам зааврын дагуу зориулалтын аюулгүй хайрцаг, шар уутанд хийж Нэгдсэн эмнэлгийн устгалд өгнө.

2.Долоо хоногийн 4 дэх өдөр аюултай хог хаягдлаа стандартын дагуу бэлдэж бэлэн болгосон байх

3.Хог хаягдлын тээврийн хэрэгсэл очиход хүлээгдэл үүсэхгүй, холбоо барих утас бичсэн байх

4.Захиалагч тал нь баглаа боодлыг өөрсдөө хангаж бэлдэнэ.

5. Сарын 10,000 /арван мянга/ төгрөг, жилийн 120,000 /зуун хорин мянга/ төгрөг бүхий төлбөрийг Төрийн сан банк /100190020002/-дансанд бүтэн жилээр гэрээ хийхдээ тушаасан байх

Дөрөв. Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

1.Захиалагч тал нь ирсэн тусгай хог хаягдлыг стандартын дагуу ариутгал устгалыг хийнэ.

2.Тээвэрлэлтийн шаардлага хангаагүй, уут савны бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, ангилан ялгаагүй, зориулалтын бус уут саванд хийсэн, хэмжээ нэр төрөл нь тохироогүй хог хаягдлыг хүлээн авч тээвэрлэхгүй.

Тав. Гэрээний хугацаа нөхцөл

1.Гэрээг 2 тал харилцан тохирч 2022 оны 09 сарын 19 өдрөөс 2022 оны 09 сарын 19 өдрийг хүртэл 1 жилийн /жилээр, улирлаар/ хугацаатай байгуулна.

2.Нөгөө талын зөвшөөрөлгүйгээр 1 тал дангаараа гэрээг цуцлах эрхгүй.

3.Эмнэлгийн байгууллага нь аль нэг талаас гэрээг цуцлах гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах санал гаргавал харилцан тохирч гэрээг цуцлах буюу өөрчлөлт оруулж болно.

4.Ажил үйлчилгээтэй холбоотой маргааныг харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

5. Гэрээг 2 хувь үйлдэж 1 хувийг нь захиалагч байгууллагад, нөгөө хувийг Халдвар сэргийлэлтийн тасагт хадгална.

6.Гэрээ гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

Үйлчлэгч байгууллагыг төлөөлж:

Нэгдсэн эмнэлэг

Халдвар судлаач Ц.Сэлэнгэ

Утас:95803070

Үйлчлүүлэгч байгууллагыг төлөөлж:

“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ТӨХК

БОХАБЭАА-ны даргын үүргийг хавсран гүйцэтгэгч М.Даваахүү

БОХАБЭАА-ны БО-ны ахлах инженер

А.Калемшарив

БАТЛАВ:

ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

ГАЗРЫН ДАРГА ______________ З.ЭРДЭНЭБАТ

БАТЛАВ:

"Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК"-н

ЗАХИРАЛ ______________ /Г.Буянжаргал/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ, ЦУГЛУУЛАХ, УСТГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

№.....

Нэг. Гэрээний үндэслэл:

Гэрээ байгуулагч талууд "Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хууль", "Зөрчлийн тухай хууль" эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн акт, Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/216 тоот тушаалыг үндэслэн, харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Иргэн, ААН байгууллагын нэр	Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК	
Регистерийн дугаар	2051303	
Үйл ажиллагааны чиглэл	16-р баг үйлдвэрийн район оффисын байр	
Иргэн, ААНБ-ын хаяг	95187715.	
ААНБ-ын холбогдох утас	Зилия.	
Данс	Хаан банкны 5108363490 тоот данс	
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж /төрөл: **Аюултай/**	Улиралд 90000 төгрөг	1 удаагийн ачилт .... төгрөг
Гэрээний хугацаа	2023 оны 09-р сарын 12-ны өдрөөс 2024оны 09-р сарын 11-ны өдөр хүртэл	

Хоёр:Гэрээний зорилго

Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хог хаягдлыг цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, устгах, иргэний эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах зорилготой.

Энэхүү гэрээ нь нэг талаас "Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газар" ОНӨААТҮГ (цаашид гүйцэтгэгч гэх)-г хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэж устгах, Нөгөө талаас эрүүл мэндийн салбар ....DTV. - Н. Батцэнгэл.................... эмнэлэг, эмийн сан (цаашид захиалагч) хоёрын уялдаа холбоог сайжруулах, ариутгал устгалын үйлчилгээг стандартын дагуу үзүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлж үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэгдэнэ.

Гурав: Захиалагч талын эрх үүрэг

1. Хагалгааны болон боолтын материал, хэрэглэсэн зүү тариур, бээлий, толь тарианы шил, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, бусад эмнэлгийн гаралтай аюултай хог хаягдлыг зохих журам зааврын дагуу зориулалтын аюулгүй хайрцаг, шар уутанд хийж гүйцэтгэгч талд буюу устгалд хүлээлгэн өгнө.

2. Захиалагч тал нь улиралд 1удаа аюултай хог хаягдлаа стандартын дагуу сав баглаа боодлыг бэлдэж бэлэн болгосон байх,

3. Хог хаягдлын тээврийн хэрэгсэл очиход хүлээгдэл үүсгэхгүй байх.

4. Тооцоог сар бүрийн 25ны дотор багтаан төлбөрийг барагдуулах үүрэг хүлээнэ.

Дөрөв: Гүйцэтгэгч талын эрх үүрэг

1. Захиалагч талаас ирсэн аюултай хог хаягдлыг стандартын дагуу устгалыг хийнэ.

2. Тээвэрлэлтийн шаардлага хангаагүй, уут савны бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, ангилан ялгаагүй, зориулалтын бус уут саванд хийсэн, хэмжээ нэр төрөл нь тохироогүй, хог тээврийн хураамжаа тайлант хугацаанд төлөөгүй, хуримтлагдсан өртэй ААНБ-ын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэхгүй байх эрхтэй.

3. Ажлын ачаалал, цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч графикт хугацаанд хогийг ачиж тээвэрлэж чадахгүй бол урьдчилан мэдэгдэнэ.

Тав. Гэрээний нөхцөл

1. Нөгөө талын зөвшөөрөлгүйгээр 1 тал дангаараа гэрээг цуцлах эрхгүй.

2. Аль нэг талаас гэрээг цуцлах гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах санал гаргавал харилцан тохирч гэрээг цуцлах буюу өөрчлөлт оруулж болно.

3. Ажил үйлчилгээтэй холбоотой маргааныг харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

4. Гэрээг 2 хувь үйлдэж 1 хувийг нь захиалагч байгууллагад, нөгөө хувийг гүйцэтгэгч байгууллагад хадгална.

5. Гэрээ гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

ДАРХАН ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ЭДИЙН ЗАСАГЧ

________________ Т.АМГАЛАНБААТАР

АХЛАХ БАЙЦААГЧ

________________ Б.ОТГОНТУЯА

Утас: 88063230

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

АЛБАН ТУШААЛ: Бохаблаамж 8912

И. Батгүүр ....

АЛБАН ТУШААЛ:

________________ ....

Утас:

БАТЛАВ

"ЭС И ЭС ЭЛ СМАРТ СОЛЮШН" ХХК

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

_______________ /Ч. АГИЙМАА/

ЭС И ЭС ЭЛ СМАРТ СОЛЮШН ХХК ХУДАЛДАН АВАГЧ АТА9755 6990916

БАТЛАВ

"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК

_______________ /Т. Дуламжав/

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР ХХК 1923060016 БТ00203 2051303

ХУВАНЦАР САВ НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2023 оны 07 сарын 06 өдөр SESL-23/.... Улаанбаатар хот

Энэхүү хуванцар сав нийлүүлэх гэрээ /цаашид "Гэрээ" гэх/-г

Нэг талаас, "Эс И Эс Эл Смарт Солюшн" ХХК (РД:6990916) /цаашид "Худалдан авагч" гэх/, түүнийг төлөөлж Худалдааны төлөөлөгч О.Амарсайхан

Нөгөө талаас, "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК (РД: 2051303) /цаашид "Нийлүүлэгч" гэх/, түүнийг төлөөлж БОХАБЭАА-ны дарга Н.Батцэнд хамтад нь "Талууд" гэх/ нар харилцан тохиролцож байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Энэхүү гэрээний зорилго нь нийлүүлэгч нь өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд цуглуулсан, худалдан авагчийн шаардлагыг хангахуйц PET1 тэмдэглэгээ бүхий ундаа, усны хуванцар сав, бор өнгийн картон цаас, бүх төрлийн лаазыг хүлээлгэж өгөх, худалдан авагч нь хэлэлцэн тохирсон хөлс төлөх болон бусад харилцааг зохицуулахад оршино.

ХОЁР. ТӨЛБӨР ТООЦОО, ХУГАЦАА

2.1 1кг хуванцар савны үнэ ....450..../.....500.........................../ төгрөг байна.

2.2 Нийлүүлэгч төлбөр төлөгдсөнөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор и-баримтыг шивнэ.

2.3 ***Төлбөр төлөх нөхцөл:*** Хуванцар савыг хүлээлгэж өгснөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор төлбөрийг шилжүүлнэ.

2.4 ***Төлбөр төлөх данс:*** Нийлүүлэгчийн ....3096015653.... тоот ...."ДТҮ" ХХК.... дансны нэртэй "....Капитрон...." банкны дансаар төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэнэ.

2.5 ***Гэрээний хугацаа:*** Энэхүү гэрээ нь баталгаажсан өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

2.6 Гэрээний хугацаа дуусах үед талууд ямар нэгэн санал гаргаагүй бол гэрээ дахин 1 жилээр сунгагдана.

2.7 Гэрээний төлбөрийг нэмэх, хасах асуудлыг талууд харилцан тохиролцож шийдэх бөгөөд зөвхөн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулснаар шинэ төлбөрийн нөхцөл болон дүн баталгаажна.

2.8 Нийлүүлэгчийн хүлээлгэж өгсөн хуванцар савнууд дунд өөр төрлийн хуванцар сав болон хэт бохирдсон хуванцар сав нь 2кг–аас хэтэрсэн тохиолдолд энэ талаар мэдээллийг Худалдан авагч нь Нийлүүлэгчид мэдэгдэж нийт хэмжээгээр хорогдолд тооцож төлбөрийг төлнө.

ГУРАВ. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1 Нийлүүлэгчийн хүлээх үүрэг

3.1.1 Нийлүүлэгч нь зөвхөн PET1 тэмдэглэгээ бүхий ундаа, усны хуванцар савыг цуглуулж, хүлээлгэж өгөх бөгөөд бусад төрлийн хуванцар савыг холихгүй байх үүрэгтэй.

3.1.2 Нийлүүлэгч нь хэт бохирдсон болон зориулалтын бусаар ашигласан савнуудыг /айраг, сүү, цагаан идээний төрлийн зүйл хийсэн болон хэт бохирдсон/ тээвэрлэхээс өмнө ангилан ялгасан байх үүрэгтэй.

3.1.3 Бүтээгдэхүүн тээвэрлэхээс ажлын 2 хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдэх бөгөөд машинд шууд ачихад бэлэн болгосон байна.

3.1.4 Худалдан авагчийн хүлээлгэн өгсөн хуванцрын уутыг зориулалтын дагуу ашиглах бөгөөд гэрээ цуцлах тохиололд хүлээн авсан тоо хэмжээгээр буцааж өгөх үүрэгтэй.

3.1.5 Нийлүүлэгч нь хуванцар цуглуулах уутыг дүүргэсний дараа дуудлага өгнө.

3.1.6 Машинд ачих зам талбайг чөлөөлж, чөлөөтэй нэвтрэх боломжоор хангах, гэмтэж болзошгүй эд хөрөнгийг холдуулна.

3.1.7 Нийлүүлэгч өөрсдийн тээврийн хэрэгсэлээр түүхий эд хүлээн авах цэгт хүргэх тохиолдолд тухай бүр харицсан төлөөлөгчид утсаар мэдэгдэж машины дугаарыг бүртгүүлнэ.

3.2 Худалдан авагчийн хүлээх үүрэг

3.2.1 Худалдан авагч нь өөрсдийн зориулалтын төхөөрөмжөөр жинлэж баталгаажсан хэмжээгээр тооцож энэ гэрээний 2.3-т заасан хугацаанд төлбөрийг төлөх үүрэгтэй.

3.2.2 Худалдан авагч нь дуудлага ирүүлсэнээс хойш ажлын 2 хоногийн дотор тээвэрлэнэ.

3.2.3 Нийлүүлэгчид цуглуулах хуванцар савны талаар мэдээлэл болон гарын авлага өгөх үүрэгтэй.

ДӨРӨВ. БУСАД

5.1. *Мэдэгдэл.* Энэхүү гэрээтэй холбоотой аливаа мэдэгдлийг бичгээр үйлдэж, биечлэн эсхүл баталгаат шуудангаар Гэрээнд заасан хаягаар хүргүүлнэ.

5.2. *Маргаан шийдвэрлэх.* Энэхүү гэрээтэй холбоотой аливаа маргааныг Талууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд Шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

5.3. *Гэрээ цуцлах:* Аль нэг тал гэрээний хугацаанаас өмнө гэрээ цуцлах бол нөгөө талдаа ажлын 10 хоногийн өмнө албан бичгээр мэдэгдэнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

ХУДАЛДАН АВАГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ	**НИЙЛҮҮЛЭГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ**
“Эс И Эс Эс Смарт Солюшн” ХХК-ийн Төлөөлөгч	“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК
______________ / Анар сайхан.	______________ / Н. Батцэнд - г
Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 1 хороо, 11 хороолол, Токиогийн гудамж 2-4 тоот	Хаяг: ....
Утас: 80249933, 95541114.	Утас: 75550011
И-мэйл: unurjargal.sesl@gmail.com	И-мэйл: info@dmp.mn

"ЮТО" ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

/Ө.БАТСАЙХАН/

"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР" ХК-ийн
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

/М.ОТГОНБАЯР/

ТЕХНИКИЙН ХАЯГДАЛ ТОС БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2021 оны 10-р сарын 12-ны өдөр *№* *Улаанбаатар хот.*

Энэхүү гэрээг нэг талаас Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа 5003032 тоот регистрийн дугаартай **"ЮТО" ХХК**- г төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Ө.Батсайхан, нөгөө талаас Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа 6298141 тоот регистрийн дугаартай "**Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХК** -г төлөөлж Ерөнхий захирал М.Отгонбаяр нар дор дурдсан зүйлийг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр Монгол Улсын Иргэний Монгол улсын Иргэний хуулийн 243-264 дүгээр зүйл заалтыг баримтлан энэхүү техникийн ажилласан тос бэлтгэн нийлүүлэх гэрээг байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Энэхүү гэрээгээр **"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХК** (цаашид **ХУДАЛДАН АВАГЧ** гэх) болон **"ЮТО" ХХК** (цаашид **НИЙЛҮҮЛЭГЧ** гэх) нарын гэрээнд заасан хугацаанд машин механизмын, тоног төхөөрөмжийн, хөдөлгүүрийн, гидрийн болон моторын тосыг солих үед гарах техникийн хаягдал тос буюу аюултай хог хаягдал /цаашид "АХХ" гэх/-г цуглуулах, тээвэрлэх, бэлтгэн нийлүүлэх, түүнд тохирох үнийг төлөх болон бусад холбогдох харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 Энэхүү гэрээ нь талуудын хооронд хийгдсэн тохиролцоонуудыг агуулж байгаа бөгөөд энэхүү гэрээнд тодорхой байдлаар тусгаж оруулсан заалтуудыг оролцуулахгүйгээр Үйлчилгээтэй холбоотой хэлцэл, мэдэгдэл, аман болон бичгээр хийсэн тохиролцоог энэхүү гэрээ орлож байгаа болно.

1.3 Энэхүү гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол түүнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж, хоёр тал гарын үсэг зураагүй бол тэдгээрийг хүчин төгөлдөр бус гэж үзнэ.

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

2.1 Гэрээ нь **"ЮТО" ХХК** болон **"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХК** -ийн төлөөлөлүүд гарын үсэг зурснаар хугацаагүй хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.

2.2 Гэрээнд оролцогч талууд Монгол Улсын Иргэний хуульд зааснаар гэрээний үүргээ бүрэн буюу хэсэгчлэн биелүүлээгүй гэж үзсэн тохиолдолд гэрээг дуусгавар болгохыг санал болгох эрхтэй.

2.3 Гэрээний хугацаа дуусгавар болоход талууд гэрээг үргэлжлүүлэх эсэх талаар харилцан мэдэгдэл ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээ анх байгуулагдсан хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.

2.4 Энэхүү гэрээний нөхцөл, болзол, заалтаас татгалзан дуусгавар болгох тухай санал, шалтгааныг талууд зөвхөн албан бичгээр тайлбарлан гаргана.

тушаал, тогтоол эсхүл Засгийн газрын эрх бүхий байгууллагын журам эсхүл зөвшөөрлийг алдах явдал бөгөөд энэ бүхэн аль ч талын үйлдэлд үндэслэгдээгүй байх ёстой.

5.3 Дээрхээс шалтгаалах ажил зогсоолт эсхүл энэ гэрээний дагуу үзүүлэх үйлчилгээний гүйцэтгэл тасалдсаны улмаас цаг хугацааны хувьд хойшлогдох асуудлыг аль болох яаралтай засаж залруулна.

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

6.1 Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэж, талууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг даран баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.

6.2 Энэхүү гэрээнд заасан хэлцлүүд хэрэгжсэн эсэхийг үл харгалзан гэрээнд тусгагдсан болон гэрээг бэлтгэх, хэрэгжүүлэх үед гэрээнд оролцогч талуудын зүгээс гарсан аливаа зардлыг талууд өөр өөрсдөө хариуцна.

ДОЛОО. МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

7.1 Талууд харилцагч талынхаа бизнесийн нэр хүндийг хүндэтгэж, тэгш эрхийн зарчимд тулгуурлан ажиллана.

7.2 Талууд гэрээний хугацаанд харилцан ашигтай, найрсаг байдлаар хамтран ажиллаж аливаа маргааныг зөвшилцлийн замаар шийдвэрлэх бөгөөд хэрэв тодорхой зөвшилцөлд хүрээгүй тохиолдолд Монгол Улсын хуулийн дагуу харъяалагдах шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН:

НИЙЛҮҮЛЭГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:	ХУДАЛДАН АВАГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:
" ЮТО" ХХК-ны	"Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр" ХК-ны
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР	Байгал орчны инженер
ЮТО ХХК 5003032 УЛААНБААТАР ХОТ	
Г. БАТЦОГТ /	М.ӨЭЛҮН /

ТАЛУУДЫН АЛБАН ЁСНЫ ХАЯГ:

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, БЗД , 26-р хороо, 404-103 тоот Утас: 99097688, 99090313	Хаяг: Монгол улс, Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 2-р баг, Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХК-ийн төв оффисын 304 тоот Утас: 99279734

“ДАРХАН ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ТӨХК

Гангийн үйлдвэр

Хөдөлгүүр, гидрийн тосны хаягдлыг ачуулсан тухай акт

2023.05.11

2023.05.11 –ны өдөр “ЮТО”ХХК-тай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу БОХАБЭАА-ны дарга Н. Батцэнд-ийн зөвшөөрлөөр “ЮТО” ХХК-ын 1384 УБА улсын дугаартай зориулалтын DAEWOO /цистерн/ автомашинаар хөдөлгүүр, гидрийн тосны хаягдалыг 16,000 литр ачиж үйлдвэрээс гаргалаа. 4-р постын харуул Ж. Амарсанаа хамт байлцаж ачуулав.

/Зураг хавсаргав./

Хянасан:	БОХАБЭАА-ны дарга	Н. Батцэнд
Акт үйлдсэн:	БО-ны инженер	Э. Мөнхжаргал
	Харуулын ахлах	Т. Чинбат
	ШТС-н нярав	Ч. Төгсжаргал

Хүлээн авсан: “ЮТО” ХХК-ын менежер /Ө.Болд/

Тээвэрлэж авч явсан жолооч: / Л.Баянмөнх/

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН ГҮЙЦЭТГЭЖ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН АКТ

2023 оны 04 сарын 18 өдөр №ДААТҮТӨХК/202207303 Улаанбаатар хот

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: *"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР" ТӨХК*

ТӨСЛИЙН НЭР БА БАЙРШИЛ: "ГАНГИЙН ҮЙЛДВЭР", *Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1-р баг*

1. Ажил гүйцэтгэгчийн нэр: "ТӨГРӨГ БАЯН ХАНГАЙ" *ХХК*

2. Ажил гүйцэтгэхэд мөрдсөн стандарт: *Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний A117 аргачлал, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуулах журам A618*

3. Ажил гүйцэтгэхэд хэрэглэсэн материал: *Хээрийн ажлын тэмдэглэл, GPS, ургамлын торлол, хиймэл дагуул болон байрзүйн зураг, MNS стандартууд, агаарын чанарын хэмжигч, усны PH хэмжигч, нийгмийн судалгаа, ГМС зураглал, дрон зураглал, хөрсний зүсэлт хийх хүрз,*

/материалын нэр, стандартын дугаар, үндсэн шинж чанарын үзүүлэлт

4. Ажил гүйцэтгэсэн үеийн нөхцөл : *Хэвийн*

5. Ажил эхэлсэн, дууссан хугацаа: **Гэрээт ажлын бүрдүүлэх материал бүрэн болсон өдрөөс эхэлнэ.** *Гэрээний дагуу 2023 оны 01 сарын 20-нд БОННҮ эцсийн тайланг хэвлэмэл байдлаар хүлээлгэн өгч Орон нутгийн иргэдийн хурлаар хэлэлцүүлэх хүсэлт өгсөн. 2023 оны 04 сарын 14нд гэрээт ажил бүрэн дууссан.*

6. Далд ажлын гүйцэтгэлийг магадлах фотозураг, шинжилгээний бичиг зэрэг баримт бичгийн бүрдэл:

- Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан-1%
- Баталгаажуулсан ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт -1%
- Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан -2%
- 5 жилийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө тайлан-2%
- Химийн эрсдлийн үнэлгээ -2%
- Хөрсний шинжилгээ -2%
- Усны шинжилгээ -1%
- Агаарын шинжилгээ -1%

Ажил хүлээлцэж авсан комиссын шийдвэр

______________________________ХҮЛЭЭН АВСАН______________________________

/Гүйцэтгэсэн ажлын судалгааны тайлан стандарт норм, ажлын даалгаврын биелэлт хангаж буй эсэх, хүлээн авсан эсвэл засах/

ХҮЛЭЭН АВСАН ЗАХИАЛАГЧ ТАЛ: ХҮЛЭЭЛГЭЖ ӨГСӨН ГҮЙЦЭТГЭГЧ ТАЛ:

“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ТӨХК-
ИЙН УУЛ УУРХАЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН
БОДЛОГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
_______________________/Н.БАТБАЯР/

“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ТӨХК-
ИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХӨДӨЛМӨР АЮУЛГҮЙ
БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН АЛБАНЫ ДАРГА
_______________________/Н.БАТЦЭНД/

ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ТӨХК -
ИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АХЛАХ ИНЖЕНЕР
_______________________/Э.НАНДИНБОЛОР/

“ТӨГРӨГ БАЯН ХАНГАЙ” ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
_______________________/М.ЭРДЭНЭБАЯР /

“ТӨГРӨГ БАЯН ХАНГАЙ” ХХК-ИЙН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН
_______________________/Г.ГЭРЭЛМАА /
