**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН НУТАГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ “ЗЭТ ДИ ЭЛ” ХХК-ИЙН MV-020815 ТООТ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙН ТӨМРИЙН ХҮДРИЙГ ИЛ АРГААР АШИГЛАХ ТӨСЛИЙН 2025 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

/АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: MV-020815/

/АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР:5297591 /

ХЯНАСАН:

ХБОБЗГ-ЫН АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ: ........................................................................./ /

БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАСАН:

“ЗЭТ ДИ ЭЛ” ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ……………………………………/LUO WEI/

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН ........................................................................../Б.ОДХҮҮ/

2025 он

# АГУУЛГА


УДИРТГАЛ ..... 2

НЭГ. ТУХАЙН ОНЫ УУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА ..... 4

ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /ХАВСРАЛТ 1-2/ ..... 6

ГУРАВ. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ..... 10

ДӨРӨВ. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ..... 13

ТАВ. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ..... 14

ЗУРГАА. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ..... 14

ДОЛОО. ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ..... 15

НАЙМ. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ..... 17

ЕС. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ ..... 24

АРАВ. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШААРДЛАГААР БИЕЛҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ..... 25

АРВАН НЭГ. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ..... 28

АРВАН ХОЁР. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ..... 30

АРВАН ГУРАВ. 2025 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАНГИЙН ДҮГНЭЛТ ..... 31

## УДИРТГАЛ

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт хэрэгжиж буй MV-020815 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дугаар бүхий “Дарцагтын төмрийн ордын зүүд хойд хэсэг” нэртэй ил уурхайн ажил 2025 оны 07 сараас эхлэн уурхайн бэлтгэл ажлыг хийж эхэлсэн болно.

Энэхүү байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг БОАЖЯ сайдын 2019 оны 10 сарын 29-ны өдрийн А/618 дугаартай тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу боловсруулав.

MV-020815 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбай нь Улаанбаатар хотоос зүүн урагш 300 км, төмөр замын 25-р зөрлөг болон Улаанбаатар-Сайншандыг холбосон авто замаас баруун тийш 8 км, Даланжаргалан сумаас баруун хойш 18 км, Шивээговь сумаас 34 км зайд байрлана.

**Зураг 1. Төсөл хэрэгжих талбайн байршил**

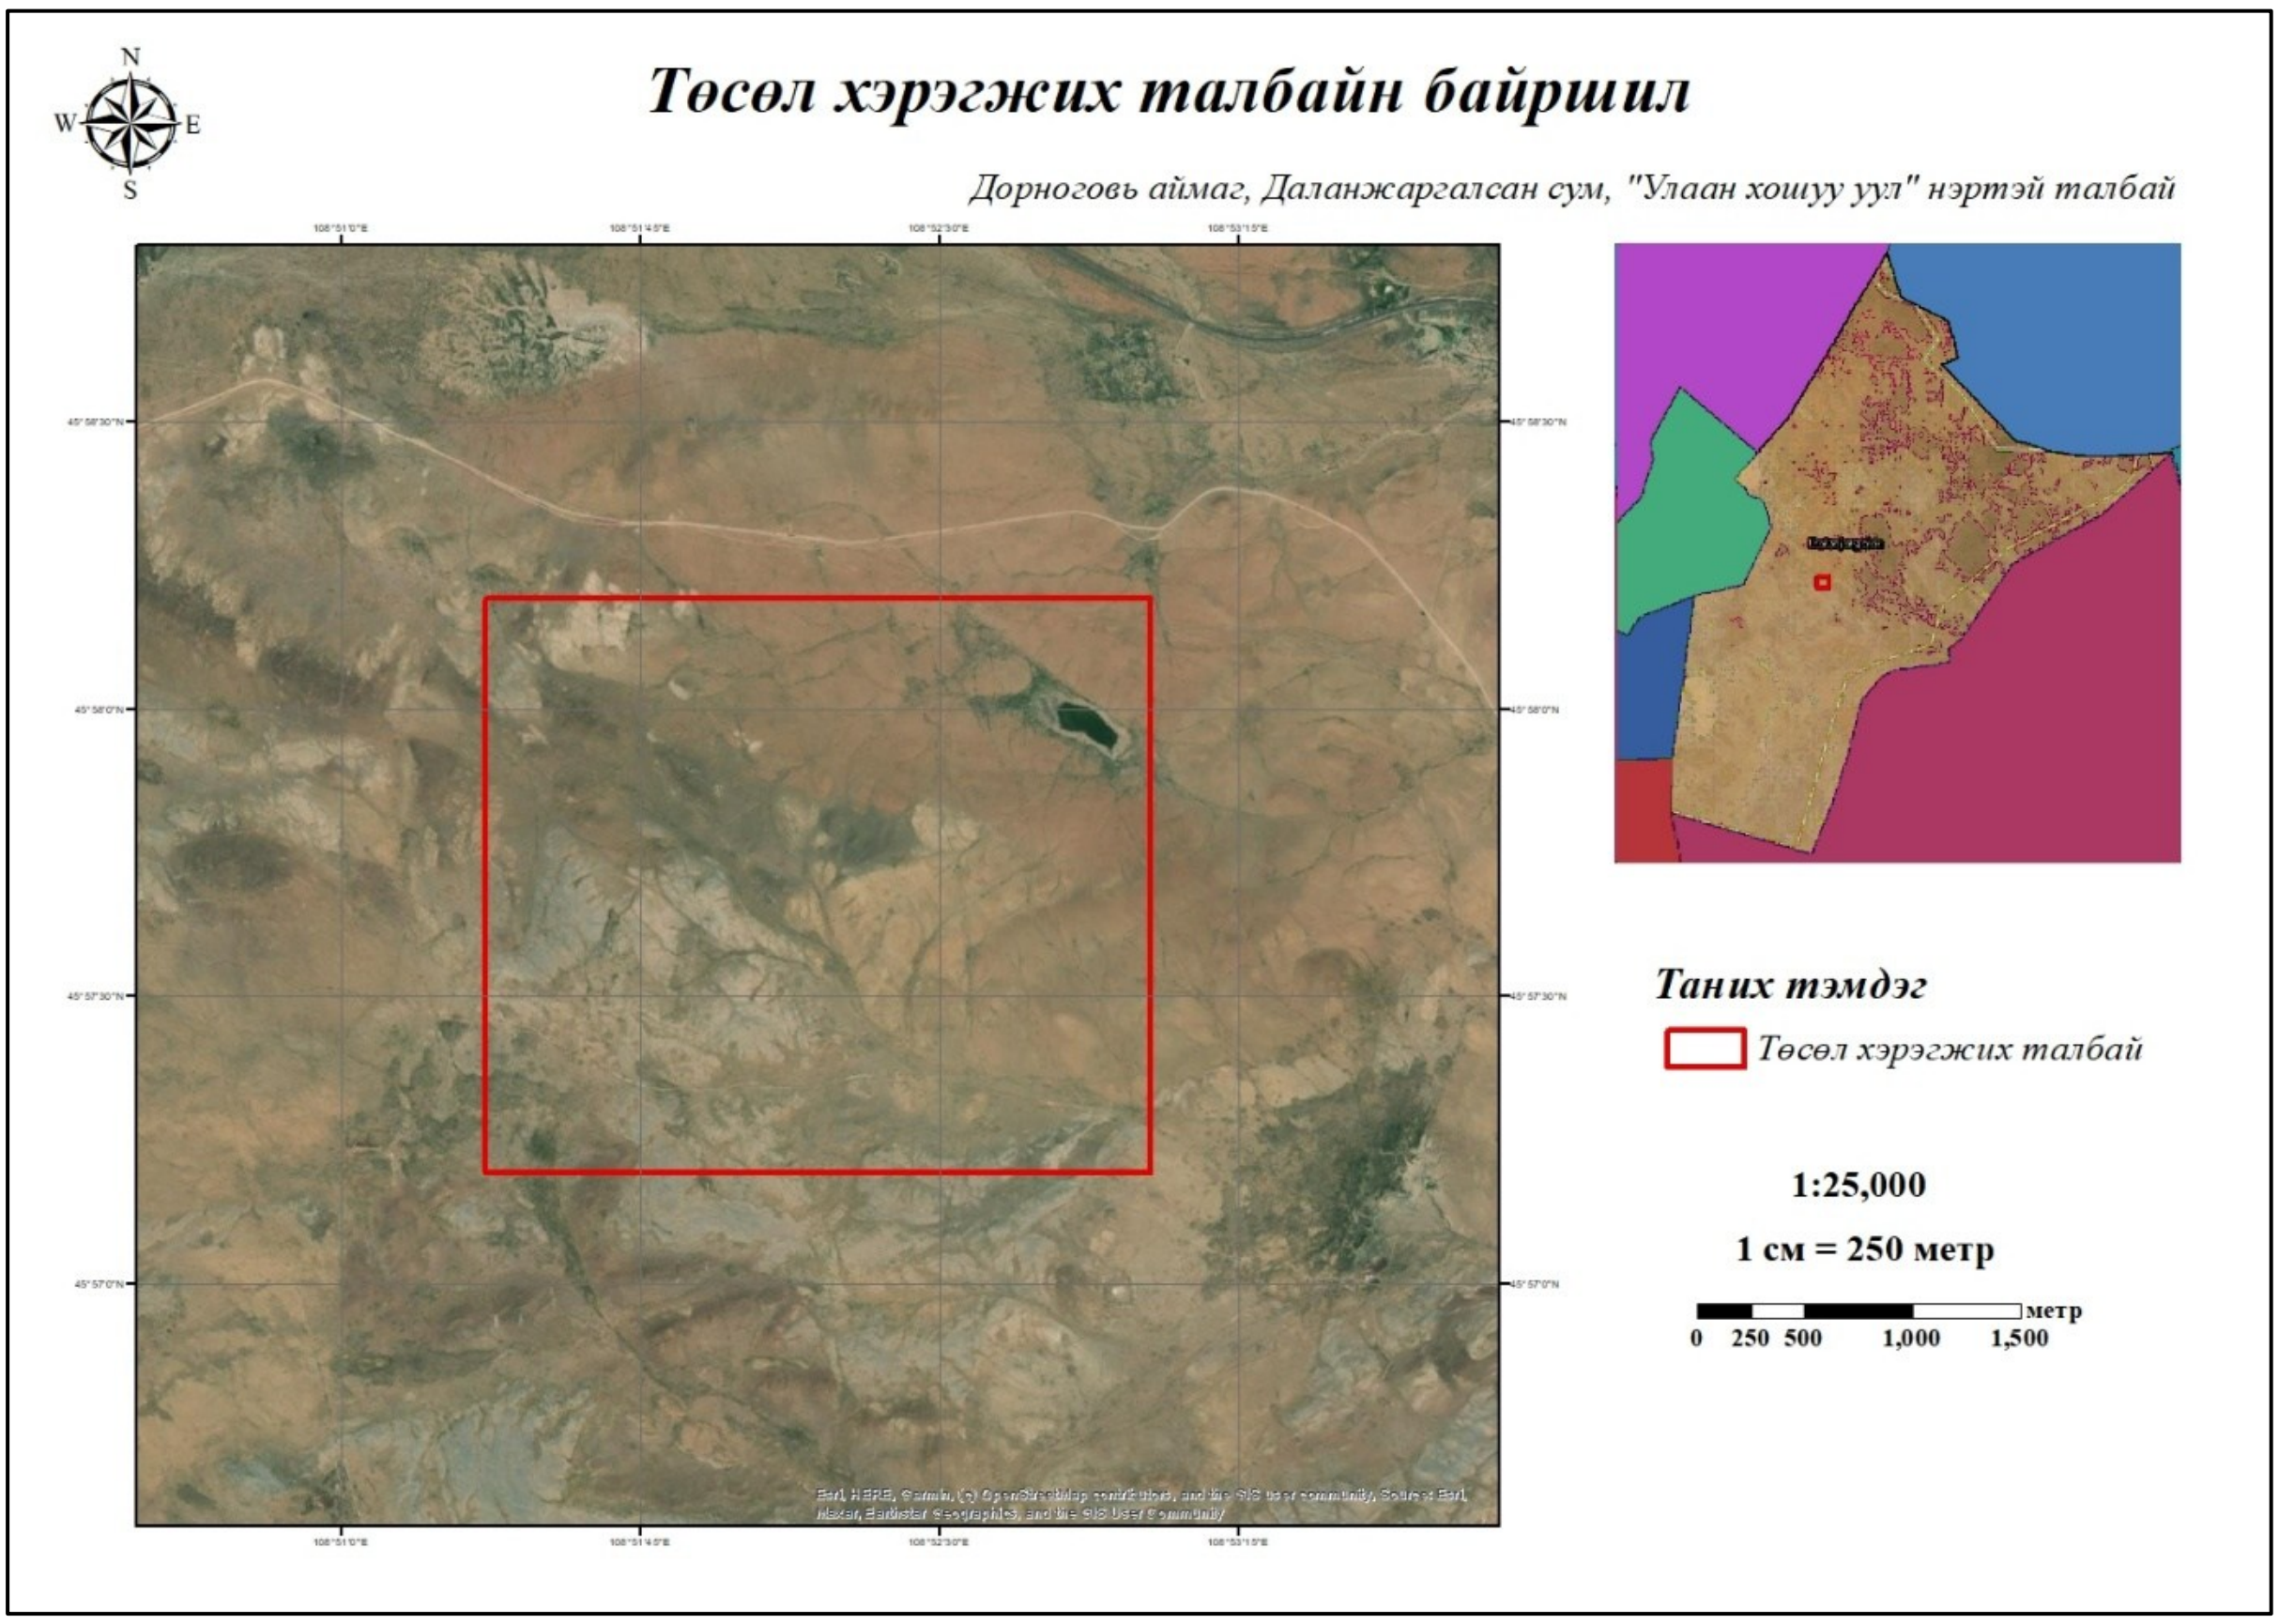


Орд газар байршиж байгаа талбай нь Хэнтийн уулархаг ба говийн мужийн завсрын бүсэд хамаарна. Газрын гадаргуу нь далайн төвшнөөс дээш 900-1210 м-т өргөгдсөн байдаг.

Гадаргуугийн рельеф нь гол төлөв толигор, мөлгөрдүү дов толгод юм. Ордын төвийн хэсгээр дайрсан цахирын судал ба цахирын бүс нь 0.8-1.05м-ийн өндөр хадан цохио үүсгэсэн байдаг. Ордын ойролцоо 2.0-7.0 км-ийн радиуст байрлах хужирлаг цайдам хөндий нь алсуур налуу заримдаа намгархаг, дэрсний сондуулаар хүрээлэгдсэн байдаг.

Цайдам, хуурай нурууд нь бороо хур багатай зун, намрын цагт цагаан хужир шүүгээр бүрхэгдсэн байдаг. Эдгээр цайдмуудад Зайрмаг, Хужирт, Жаргалантын хөндийнүүд хамаарна.

Эдгээр хөндийд нь Зайрмаг, Жаргалантын худаг байдаг ба худгаас жилийн дөрвөн улиралд хүн мал ундаалж байдаг.

Хөрс ургамлын бүтэц нь өөрийн тархалт, зузаанаараа харилцан адилгүй байна. Талбайг хэмжээнд хүрэн, цайвар хүрэн, нам дор газарт цайвар шаргал, хужирлаг, толгодын эл хажуугаар хүрэвтэр өнгийн хөрс ялгагдана. Хүрэн, хүрэн бор хөрс нь голдуу элсэнцэр агуулах ба хужирлаг цайвар шаргал хөрс нь аллювиаль нуурын гаралтай шавар, шавранцраас тогтоно.

Шимт хөрсний үеийн зузаан нь 0.05-0.2 м, хааяа 30-40 см хүртэл хэлбэлзэнэ. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ургамлын тархац маш сийрэг, хонхор хотгор газрууд толгодын хажуу бэл хэсэгт хур борооны дараа газар нь сэргэж ургамлын тархац ихэсдэг. Ургамлын бүрхэвч бүрдүүлэгч нэр төрлийн өвс ургамал нь хялгана агь таана, хөмөл, шарилж зэрэг болно. Дов толгодын нуруу хажуу хэсгээр алтан харгана, дэрс цайдам хөндийн хэсэгт бударгана, дэрс ургадаг. Нутаг дэвсгэр нь бүхэлдээ эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай бүсэд багтана. Ажиглалтаас үзэхэд улирал, сар, хонгийн температур нь эрс хэлбэлздэг, хур тунадас бага, хуурайвтар байдаг. Сарын хамгийн бага дундаж температур нь 1-р сард -12°C-25°C, хамгийн өндөр дундаж температур нь 7-р сард +20°C +22°C байдаг. Дулааны улиралд 9 сарыг дуустал үргэлжилдэг. Хур тунадас бага унадаг, жилд дунджаар 160-180 мм хүрдэг. Үүний ихэнх хэсэг нь зуны улирлын сүүлч, намрын эхээр бороо ордогтой холбоотой ба өвөлд дунджаар 23-27 мм хур тунадас унадаг. Эх газрын баруун хойноос чиглэлтэй салхи зонхилно. Салхины хурд 2.8-7.3 м.сек хүртэл хурдасч шороон ба цасан шуурга шуурч хүчтэй салхилдаг.

# НЭГ. ТУХАЙН ОНЫ УУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

а. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн товч мэдээлэл

| д/д | Мэдээллийн төрөл | Утга |
|---|---|---|
| 1а. | 1. Төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэр | “Зэт Ди Эл” ХХК |
| | 2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн дугаар | 9019046035<br>(РД: 5297591) |
| | 3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны чиглэл | Төмрийн хүдэр олборлолт |
| | 4. Аж ахуйн нэгжийн харьяаллын хаяг | УБ хот, СБдүүрэг 1- хороо ,5-р хороолол, Энхтайвны өргөн чөлөө, Эко интернэйшнл тауэр, 15давхар |
| | 5. Захирлын нэр, утас, цахим шуудангийн хаяг | Luo Wei, утас: 77189988, lw@tzkyjt.com |
| | 6. Холбогдох мэргэжилтний нэр, утас, цахим шуудангийн хаяг | Төслийн менежер: Х.Бат-Эрдэнэ 99453205<br>Байгаль орчны мэргэжилтэн: Б.Одхүү 95334658<br>baterdene@tzky.mn<br>odkhuu@tzky.mn |
| 2а. | 1. Төслийн нэр | “Дарцагтын төмрийн ордын зүүн хойд хэсэг” төмрийн хүдэр олборлох ил уурхайн 2025 оны БО-ны менежментийн төлөвлөгөө |
| | 2. Төслийн харьяаллын байршил | Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сум |
| | 3. Төслийн ангилал<br>а. нүүрс, алт, жонш, төмрийн хүдэр гэх мэт<br>б. ил уурхай, далд уурхай, шороон орд. Баяжуулах | Төмрийн хүдэр<br>ил уурхай |
| | 4. Төсөл эхэлсэн огноо | 2025 оны 07-р сарын 16 |
| | 5. Төсөл хэрэгжих хугацаа | 2037 оны 12-р сар хүртэл |
| | 6. Уурхайн хаалт эхлэх огноо | 2037 он |
| | 7. Хаалтын дараах зориулалт | бэлчээр |
| | 8. ТЭЗҮ тодотгол баталсан огноо | - |
| | 9. Урьд оны бүтээгдэхүүний нийт хэмжээ (дунджаар) | Уурхайн эхний жил |
| | 10. Ажилчдын тоо | 30 |
| | 11. Тухайн жилийн ажлын ерөнхий төлөв байдал | |
| | 12. Тухайн төсөлд хамаарагдах дэд бүтэц<br>- замын урт<br>- шатахуун түгээгүүрийн тоо<br>- шатахуун агуулахын агууламжийн хэмжээ<br>- тэслэх, дэлбэрэх бодисын үйлдвэрийн хүчин чадал г.м | |

б. Төсөл хэрэгжүүлэх чиглэлээр олгодог тусгай зөвшөөрөл, дүгнэлт, лавлагааны товч мэдээлэл

<table>
<tr><th>д/д</th><th colspan="3">Мэдээллийн төрөл</th><th>Утга</th></tr>
<tr><td rowspan="14">2б.</td><td colspan="3">1. Тусгай зөвшөөрлийн төрөл /ашигт малтмал/ дугаар<br>Хүчинтэй хугацаа<br>Талбайн хэмжээ</td><td>Ашигт малтмал ашиглах<br>MV-020815<br>2047.05.11<br>398.79 га</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Тусгай зөвшөөрлийн төрөл /химийн бодис ашиглах/ дугаар хүчинтэй хугацаа</td><td>хамаарахгүй</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Химийн бодисын агуулгад хийсэн Мэргэжлийн хяналтын газрын тодорхойлолт</td><td>хамаарахгүй</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Галын дүгнэлтийн огноо, дугаар</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний огноо, баталсан хуулийн этгээд</td><td>2024.05.20<br>12/2407<br>БОАЖЯ-ны Ерөнхий шинжээч Г.Энхмөнх</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний огноо, баталсан хуулийн этгээд</td><td>2024<br>БОАЖЯ-ны Ерөнхий шинжээч Ч.Хандсүрэн</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Ус ашиглуулах дүгнэлтийн огноо</td><td>2025.08.18</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Тухайн жилийн уулын ажлын батлагдсан төлөвлөгөөний огноо</td><td>2025.04</td></tr>
<tr><td colspan="3">9. Батлагдсан уулын ажлын төлөвлөгөөний 1.1, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11 дэх маягтыг хавсаргах</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">10. Нөхөн сэргээлт</td><td rowspan="2">Техникийн нөхөн сэргээлтийн талбай /га-аар/</td><td>тайлант онд гүйцэтгэсэн</td><td>-</td></tr>
<tr><td>төлөвлөгөөт онд гүйцэтгэх</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Биологийн нөхөн сэргээлтийн талбай /га-аар/</td><td>тайлант онд гүйцэтгэсэн</td><td>-</td></tr>
<tr><td>төлөвлөгөөт онд гүйцэтгэх</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">11. Тухайн жилд баримтлах стандартын дугаар -үндэсний</td><td>MNS5914:2008, MNS 5915:2008, MNS 5916:2008, MNS 5917:2008, MNS 5918:2008, MNS 3298-90 MNS4048-88, MNS 0012-013-91, MNS 5080-2001 гэх мэт</td></tr>
</table>

## ХОЁР. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /ХАВСРАЛТ 1-2/

**Хүснэгт 1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт**

| № | Гол ба сөрөг болзошгүй сөрөг нөлөө | Төлөвлөсөн ажил | Төлөвлөсөн төсөв /мян.төг/ | Хэрэгжилт | Биелсэн эсэх | Биелэлт төсөв /мян.төг/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **АГААР ОРЧИН** | | | | | | |
| 1 | Уурхай орчимд тоосжилт үүсэх | Уурхайн ам орчим болон тээврийн гол замыг чийгшүүлэх, услах, дагтаршуулах | 2 000.0 | Тогтмол хугацаанд усалгаа хийсэн | Тийм | ҮАЗ |
| 2 | | Жил бүрийн орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу агаар, орчин дахь тоосны хэмжээг тодорхойлж байх | ОХШХ | Уурхайн орчны агаарын хэмжилт хийсэн | Тийм | ОХШХ |
| **ГАДАРГЫН БА ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ НӨӨЦ** | | | | | | |
| 1 | Ашиглаж буй усны чанар муудах, хүрэлцээ бага байх | Ус ашиглах дүгнэлтийг жил бүрийн эхэнд гаргуулах | ҮАЗ | Умард говийн гүвээт- Халхын дундад талын сав газраар 2025 оны 08-р сарын 18-ны өдрийн Е-2507-000302 тоот ус ашиглуулах дүгнэлтийг гаргуулсан | Тийм | 100.0 |
| 2 | | Ус ашигласны төлбөрийг цаг тухайд нь тогтмол хугацаанд төлөх | ҮАЗ | Ус ашиглуулах дүгнэлтийн дагуу нийт төлбөрийг бүрэн төлсөн | Тийм | 2 389.403 |
| 3 | | Унд, ахуйн хэрэглээний усанд тогтмол шинжилгээ хийлгэж байх | ОХШХ | Талбайд байрлах худаг, нуур, лицензийн талбайгаас гадна 1 км газарт байрлах нуураас тус тус усны дээж авсан | Тийм | ОХШХ |
| **ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ** | | | | | | |
| 1 | Төслийн үйл ажиллагааны явцад ихээхэн талбайн хөрс овоолго, уурхайн тосгон, бусад байгууламжуудын дор дарагдаж, элэгдэл, эвдрэлд өртөнө. | Овоолго болон бусад байгууламжуудыг байгуулахын өмнө өнгөн хөрсийг хуулан авах, | ҮАЗ | Ил уурхайн уулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу шимт хөрсийг уурхайн өрнөлийн талбайгаас 0.2-0.3 метрийн зузаантайгаар хуулсан. | Тийм | ҮАЗ |
| | | Хуулж авсан өнгөн хөрсийг тусгайлан овоолго байгуулан хадгалах | | Шимт хөрсний гадаад овоолго 2 метрийн өндөртэй, 30 градусын налуутайгаар үерийн ус болон | Тийм | ҮАЗ |

| № | Гол ба сөрөг болзошгүй сөрөг нөлөө | Төлөвлөсөн ажил | Төлөвлөсөн төсөв /мян.төг/ | Хэрэгжилт | Биелсэн эсэх | Биелэлт төсөв /мян.төг/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | салхины нөлөө бага байх газар байгуулсан | | |
| 2 | Уурхайн замын ачааллаас хөрс элэгдэж, эвдрэлд орох | Хүнд машин механизм явах замыг засаж сайжруулан, байгалийн хөрс бүхий замаар тээвэрлэлт аль болох бага хийх | | Зам засвар, ашиглалт, үйлчилгээний ажилд зам тэгшлэх, замын бартаа саадыг арилгах, замын эвдрэлийг засах, халтиргаа гулгаа үүсэхээс хамгаалж зам дээр элс цацах, замыг бороо, үерээс хамгаалах зэрэг ажлуудыг хийсэн | Тийм | ҮАЗ |
| **УРГАМЛАН НӨМРӨГ** | | | | | | |
| 1 | Уурхайгаас олборлосон төмрийн хүдэр, хоосон чулуулгийн овоолго үүсгэх зэрэг ажлын үед ургамал устах, дарагдах, талхлагдах зэргээр хамгийн их нөлөөлөлд өртөнө. | Нөхөн сэргээлтэд ашиглах хөрсний шимт хэсгийн овоолгыг стандартын дагуу тусгайлан овоолж, салхинд хийсэхээс хамгаалах. | ҮАЗ | Шимт хөрсний гадаад овоолго 2 метрийн өндөртэй, 30 градусын налуутайгаар үерийн ус болон салхины нөлөө бага байх газар байгуулсан | Тийм | ҮАЗ |
| **АМЬТНЫ АЙМАГ** | | | | | | |
| 1 | Амьтны аймагт хохирол учруулах, тоо толгой хорогдох, идэш тэжээлийн хомсдол үүсэх | Мал амьтан өнгөрч гардаг хэсгүүдэд тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулах,<br>Авто машины хурдыг тогтоосон хязгаарт байлгах | 1 000.0 | Уурхайн бүсэд хурд хязгаарлах болон анхааруулах тэмдэгтүүдийг байрлуулсан | Тийм | 1 238.6 |
| **ТӨЛӨВЛӨСӨН ТӨСӨВ /мян.төг/** | | | **3 000.0** | **БИЕЛЭЛТ ТӨСӨВ /мян.төг/** | | **3 728.0** |

**Зураг 2. Шимт хөрс хуулах болон шимт хөрсний овоолго**

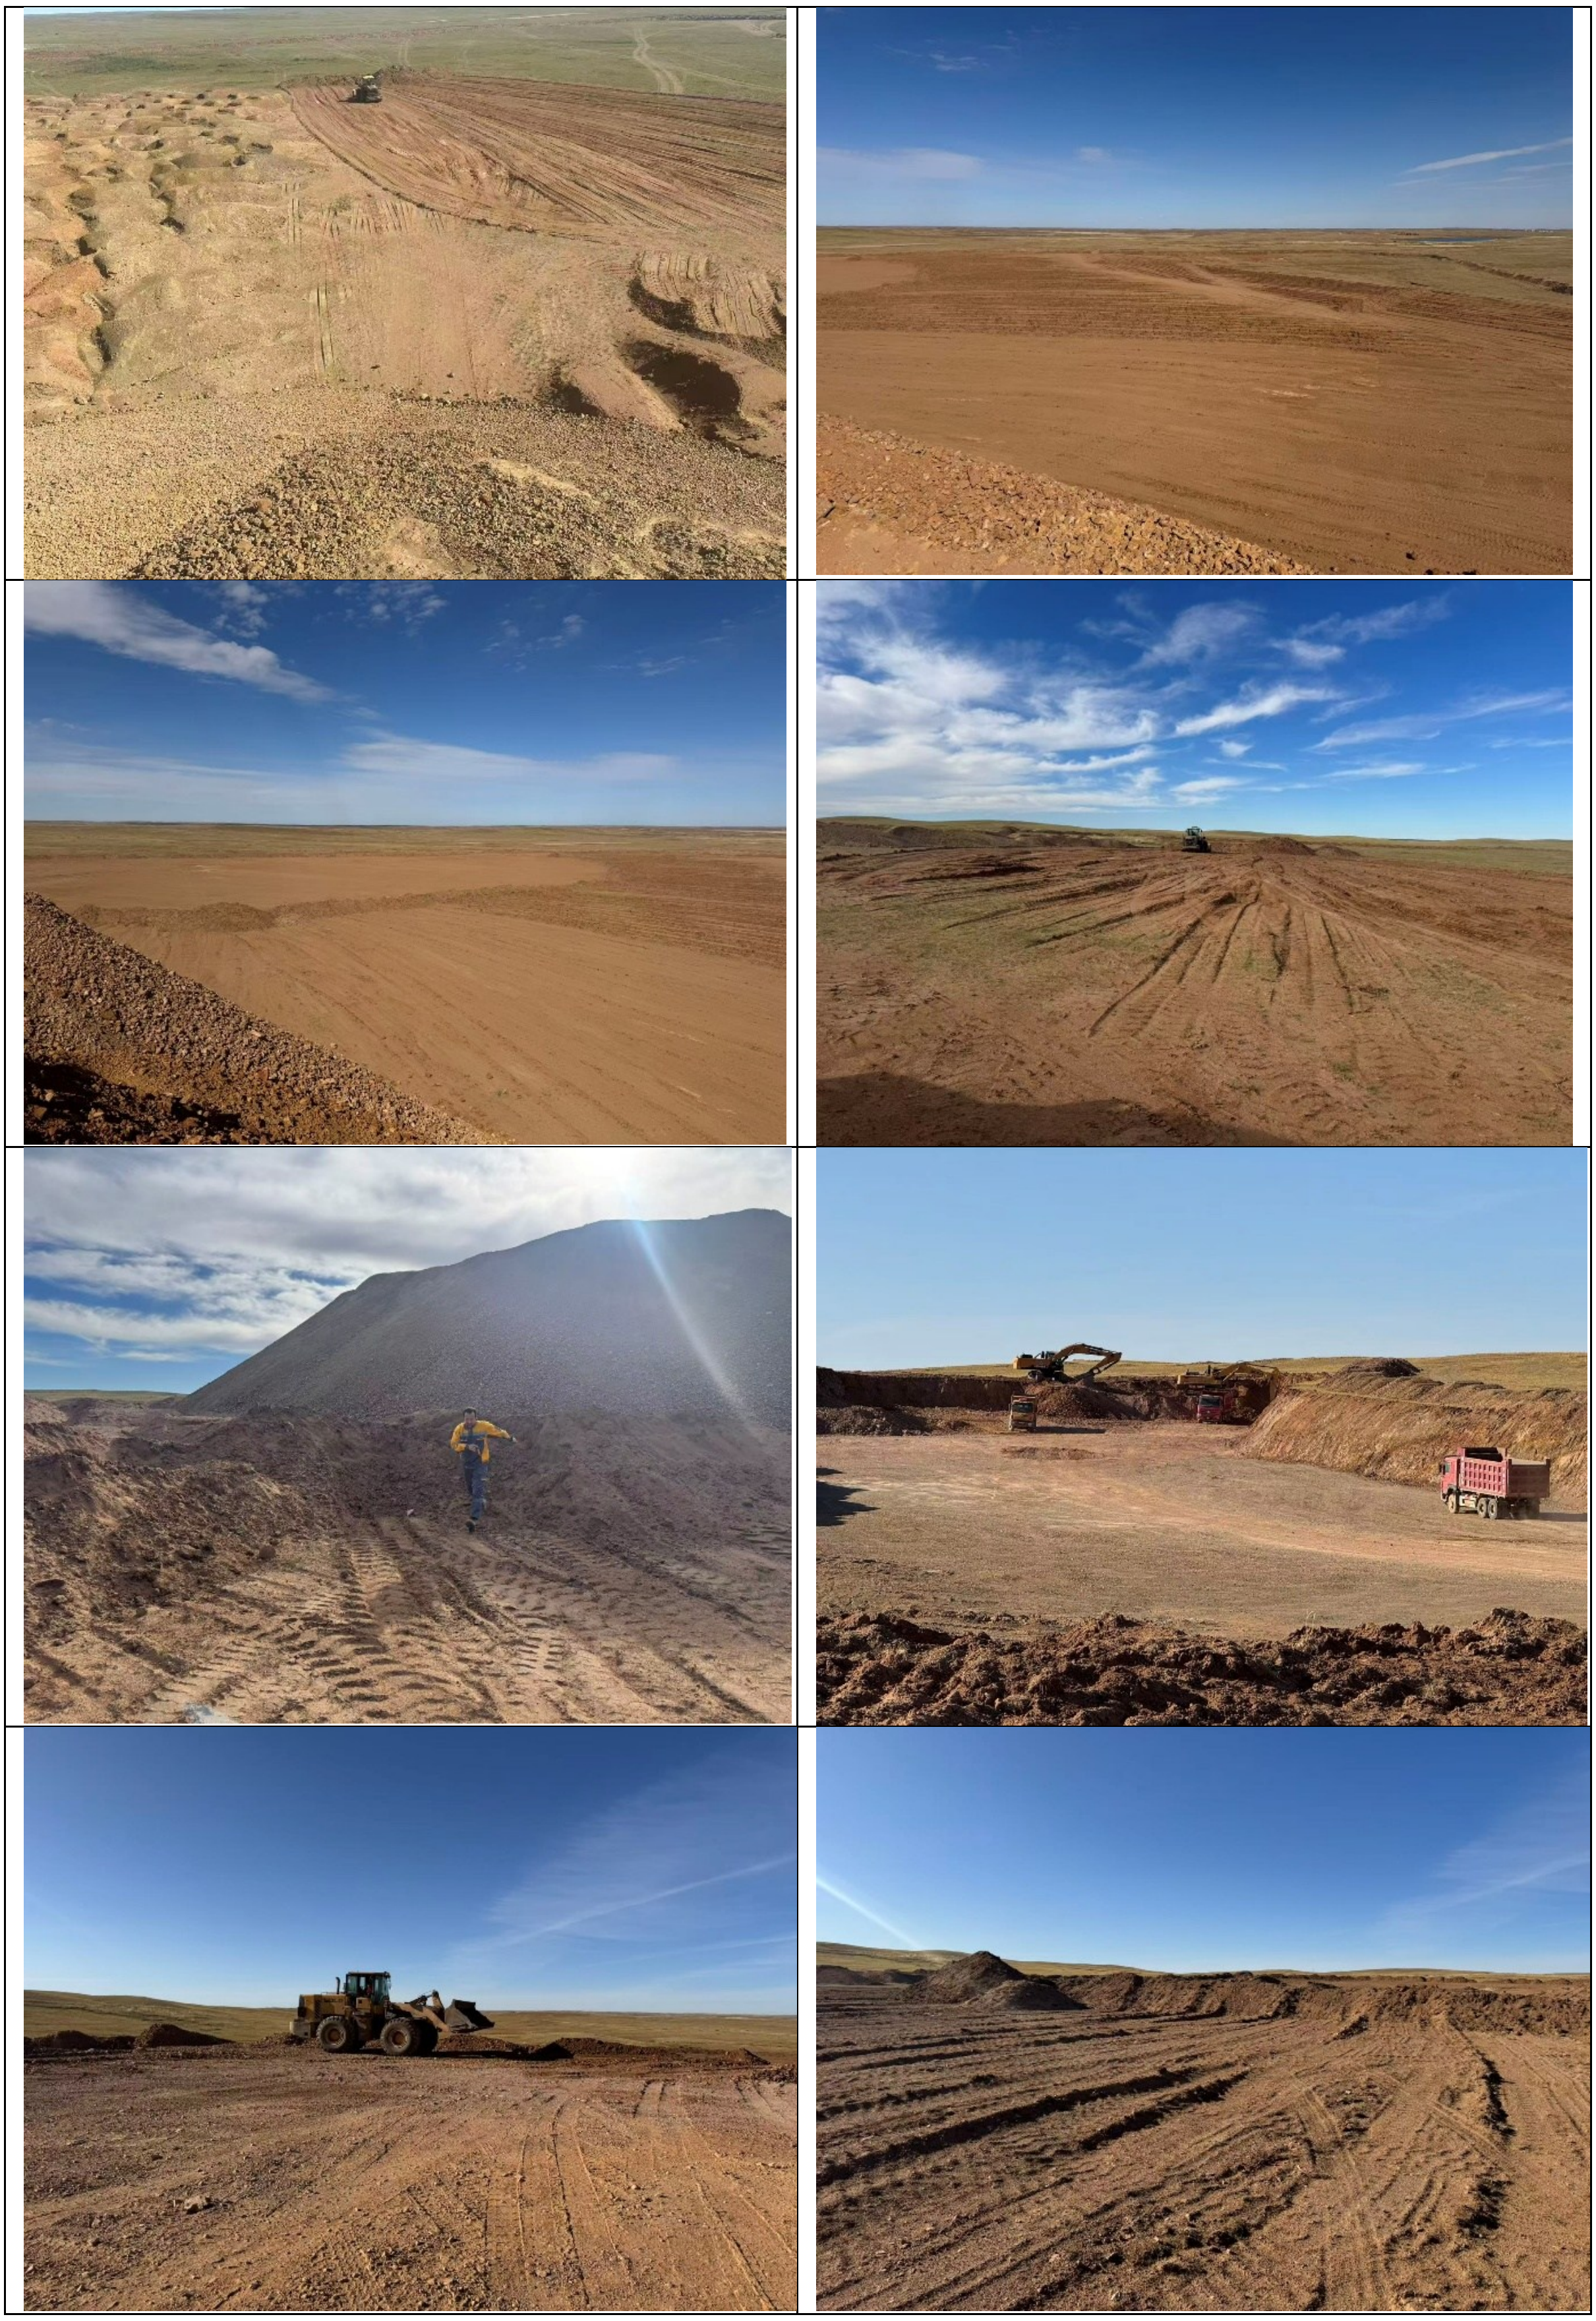

**Зураг 3. Уурхайн тэмдэг, тэмдэглэгээ**

## ГУРАВ. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2025 оны нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд уурхайн тосгон орчимд 500 ширхэг хайлаас мод тарьсан.

| Нөхөн сэргээлт | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **№** | **Төлөвлөсөн ажил** | **Төлөвлөсөн төсөв /мян.төг/** | **Хэрэгжилт** | **Биелсэн эсэх** | **Биелэлт төсөв /мян.төг/** |
| 1 | “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд уурхайн тосгон орчимд 500 ширхэг мод тарих | 5 000.0 | Уурхайн тосгон орчимд 500 ширхэг мод тарьсан | Тийм | 5 000.0 |
| 2 | Даланжаргалан сумын Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд модны нүх ухаж өгөх | УАЗ | Даланжаргалан сумын Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд модны 900 м нүхийг өөрийн техник болон түлш гарган ухаж өгсөн. | Тийм | 3 000.0 |
| **ТӨЛӨВЛӨСӨН ТӨСӨВ /МЯН.ТӨГ/** | | **5 000.0** | **БИЕЛЭЛТ ТӨСӨВ /МЯН.ТӨГ/** | | **8 000.0** |

Уурхайн тосгон орчимд 10 сарын 09-11-ны хооронд 3 өдрийн хугацаанд 500 ширхэг хайлаас модны суулгац суулгасан.

**Хүснэгт 2. Мод тарьсан талбайн координат**

| № | Уртраг | | | Өргөрөг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | град | мин | сек | град | мин | сек |
| 1 | 108 | 53 | 02 | 45 | 57 | 51 |
| 2 | 108 | 53 | 02 | 45 | 58 | 11 |

**Зураг 4. Мод тарьж буй үеийн зураг**

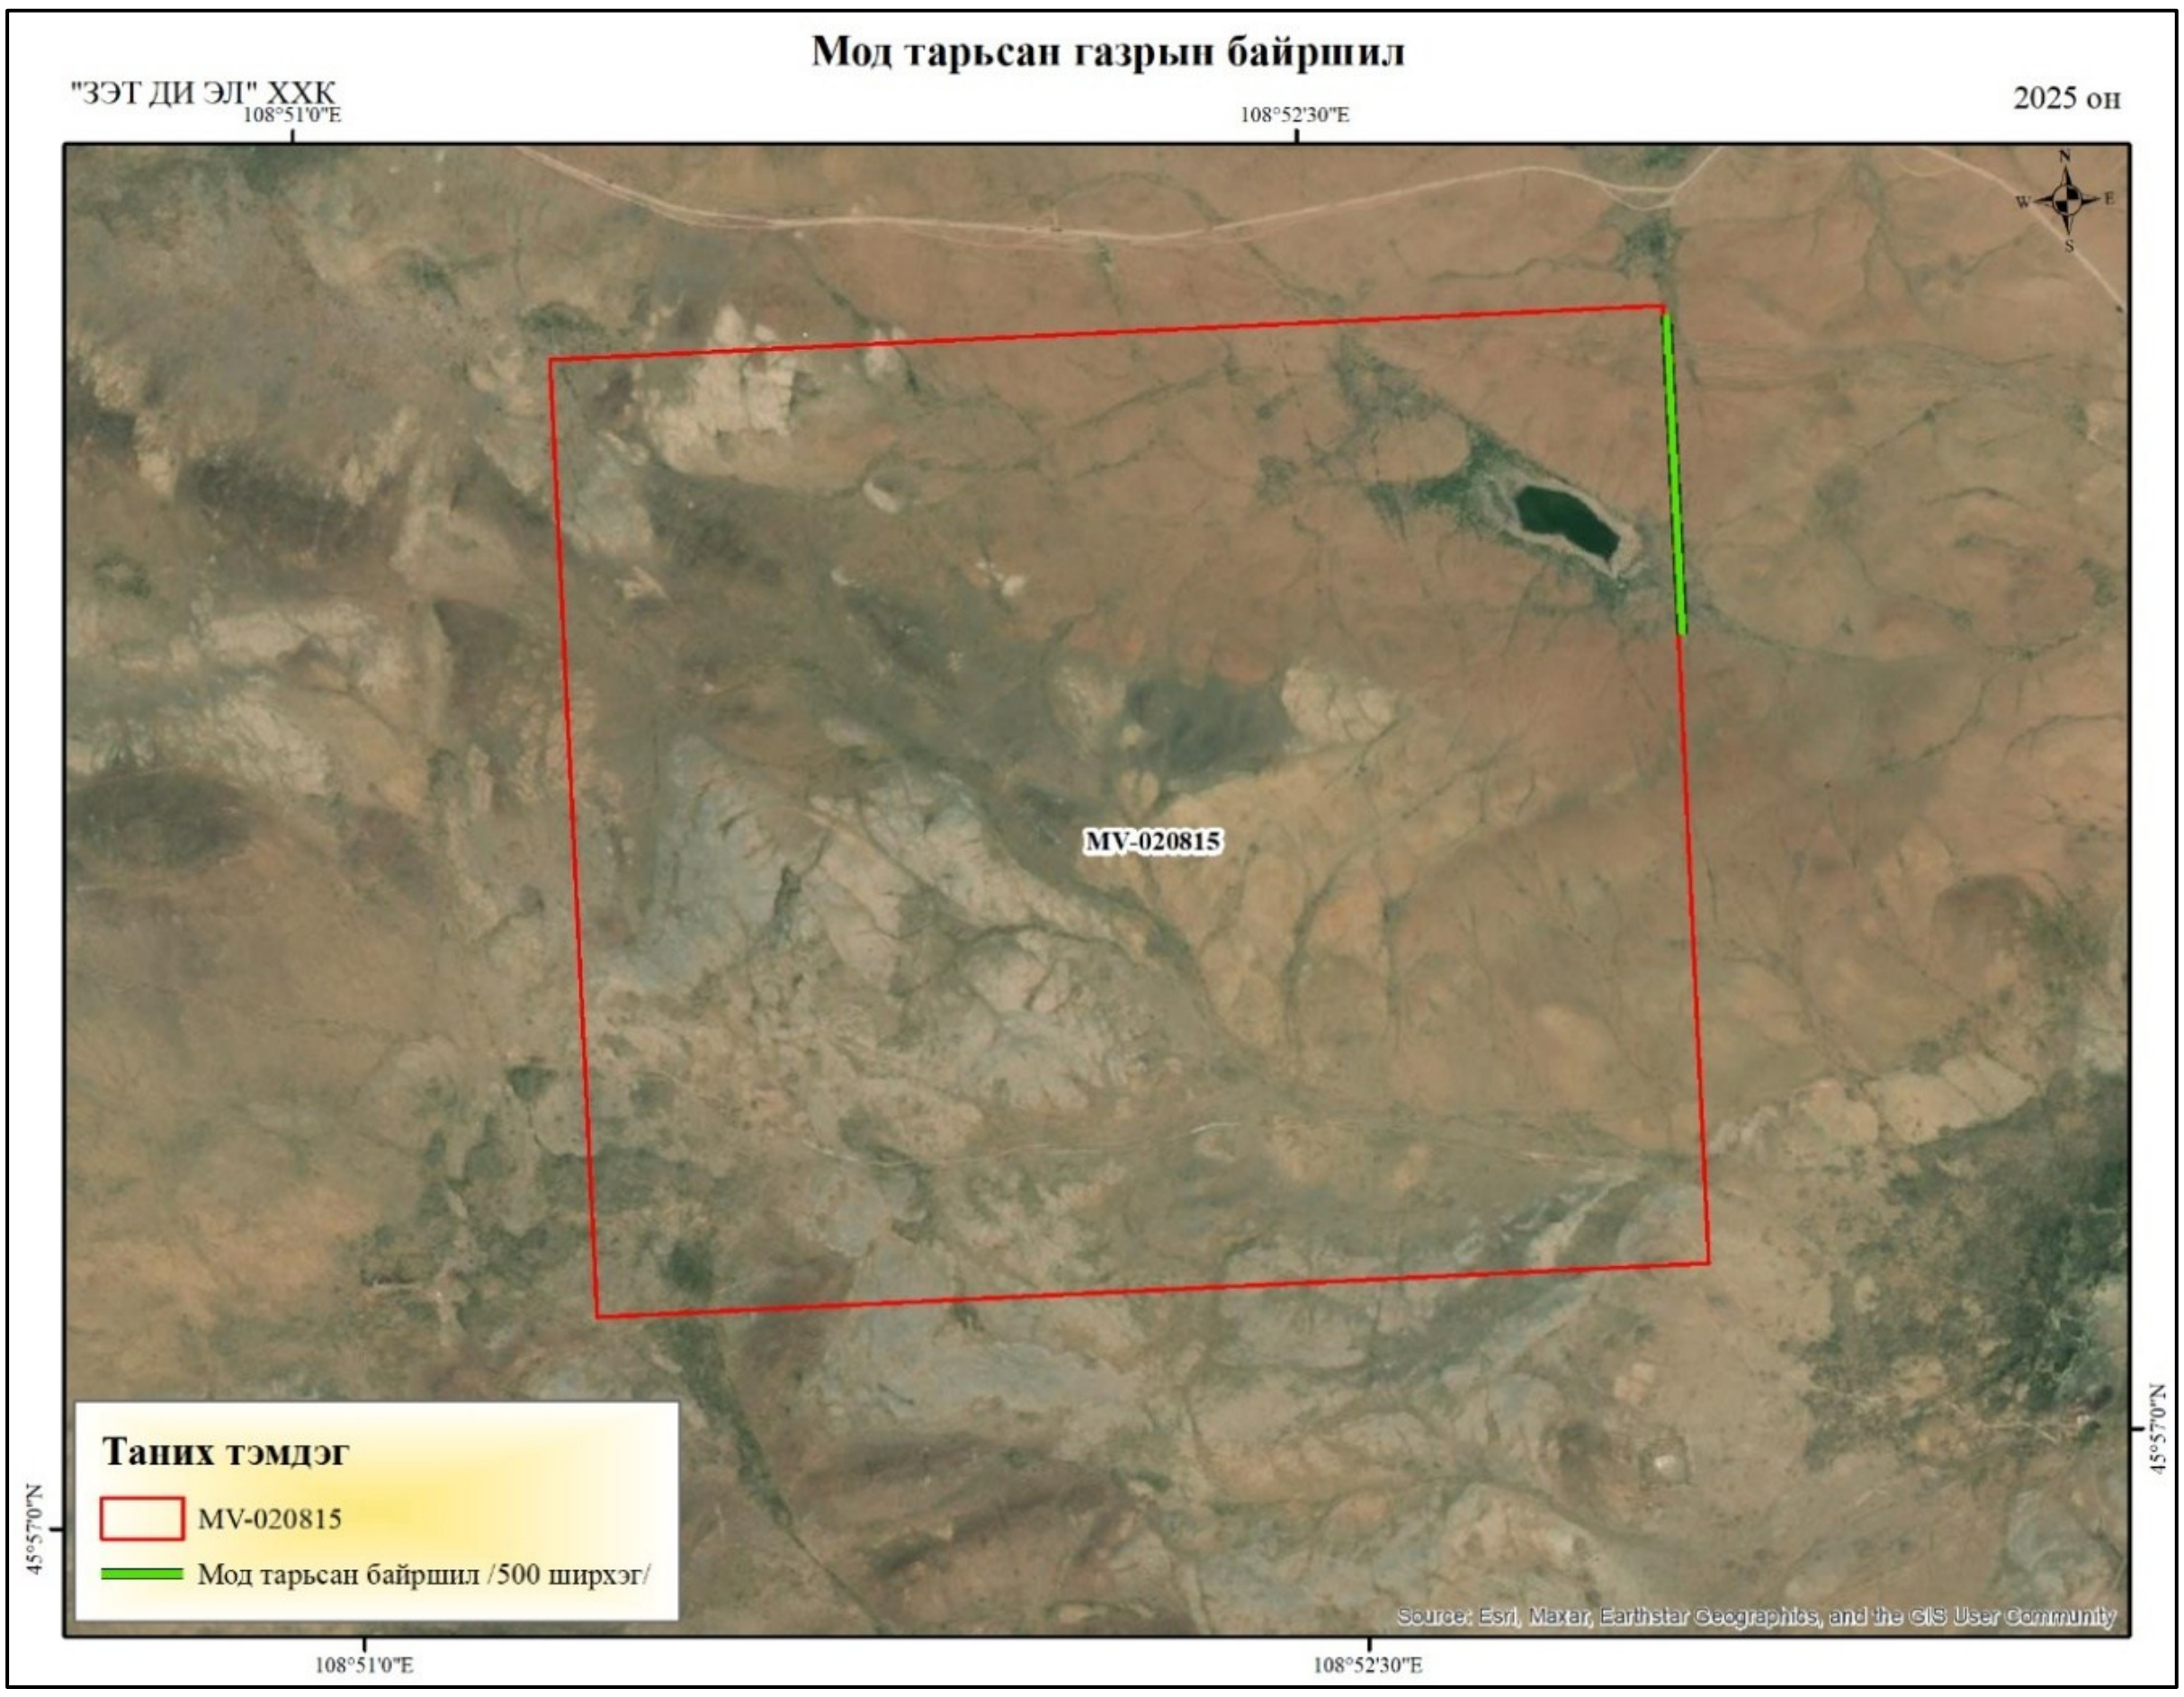
Мод тарьсан газрын байршил
"ЗЭТ ДИ ЭЛ" ХХК
2025 он
108°51'0"E
108°52'30"E
45°57'0"N
MV-020815
Таних тэмдэг
MV-020815
Мод тарьсан байршил /500 ширхэг/
Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

**Зураг 5. Даланжаргалан сумын модны нүхийг ухаж өгсөн**

## ДӨРӨВ. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"Зэт Ди Эл" ХХК нь дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд Даланжаргалан сумын ирүүлсэн саналын дагуу ногоон байгууламжийн усалгааны системд ус хадгалах ёмкост болон 500 метр урт шланк холбогдох сэлбэгийн хамт худалдан авалт хийж гүйцэтгэсэн.

| № | Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын зорилт | Төлөвлөсөн ажил | Төлөвлөсөн төсөв /мян.төг/ | Хэрэгжилт | Биелсэн эсэх | Биелэлт төсөв /мян.төг/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ногоон байгууламжийн усалгаа | Цомог багийн төвлөрсөн ногоон байгууламжийн усалгааны системийг хийлгэх | 10 000.0 | Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд Даланжаргалан сумын ирүүлсэн саналын дагуу ногоон байгууламжийн усалгааны системд ус хадгалах ёмкост болон 500 метр урт шланк холбогдох сэлбэгийн хамт худалдан авалт хийж гүйцэтгэсэн. | Тийм | 10 000.0 |
| **ТӨЛӨВЛӨСӨН ТӨСӨВ /МЯН.ТӨГ/** | | | **10 000.0** | **БИЕЛЭЛТ ТӨСӨВ /МЯН.ТӨГ/** | | **10 000.0** |

## ТАВ. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Төслийн талбайд ямар нэгэн айл өрх, өвөлжөө хаваржаа, худаг байхгүй учраас нүүлгэн шилжүүлэх ажил хийгдэхгүй.

## ЗУРГАА. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төслийн талбайд 2014 онд археологи, палеонтологийн судалгаа хийгдсэн бөгөөд тус судалгаагаар ямар нэгэн түүхийн дурсгалт зүйлс олдоогүй болно. Иймд цаашид уурхайн ашиглалтын үе шатанд ямар нэгэн түүх, соёлын дурсгал илэрсэн тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэж холбогдох арга хэмжээг авах болно.

## ДОЛОО. ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

| № | Болзошгүй аюул осол, сөрөг нөлөө | Төлөвлөсөн ажил | Төлөвлөсөн төсөв /мян.төг/ | Хэрэгжилт | Биелсэн эсэх | Биелэлт төсөв /мян.төг/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гал түймэр | Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах | ҮАЗ | Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх, уул уурхайн аврах 09 дүгээр ангийн захиргчаар баталгаажуулсан. | Тийм | ҮАЗ |
| | | - | - | Айраг сумын онцгой байдлын газраас хийсэн галын сургалтад хамрагдсан | Тийм | 400.0 |
| 2 | Тэсрэх бодис | Мэргэжлийн гэрээт байгууллагаар тэсэлгээний ажил гүйцэтгүүлэх | 3 600.0 | 2025 онд тэсэлгээний ажил явуулаагүй | Үгүй | - |
| | | Тэсрэх бодисын тоо бүртгэлийг тогтмол хийх | | 2025 онд тэсэлгээний ажил явуулаагүй | Үгүй | - |
| | | Тэсрэх бодисын үлдэгдэл, сав баглаа боодлыг гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулан аюулгүй болгох | | 2025 онд тэсэлгээний ажил явуулаагүй | Үгүй | - |
| **ТӨЛӨВЛӨСӨН ТӨСӨВ /мян.төг/** | | | **3 600.0** | **БИЕЛЭЛТ ТӨСӨВ /мян.төг/** | | **400.0** |

Аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгааллын ажлын хүрээнд Дорноговь аймгийн Айраг сумын онцгой байдлын газраас ажилчдад галын сургалт хийсэн.

**Зураг 6. Галын сургалт болон зөвлөмж өгсөн**

## НАЙМ. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдалд хяналт тавих, удирдлага, зохион байгуулалтыг оновчтой шийдвэрлэх зорилгоор “Уурхайн хог хаягдлыг зохицуулах журам”-ыг дотооддоо боловсруулж батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. Хог хаягдлын түр хадгалах цэг болон хогны савуудыг ангилан ялгах тэмдэг тэмдэглэгээг тавьсан.

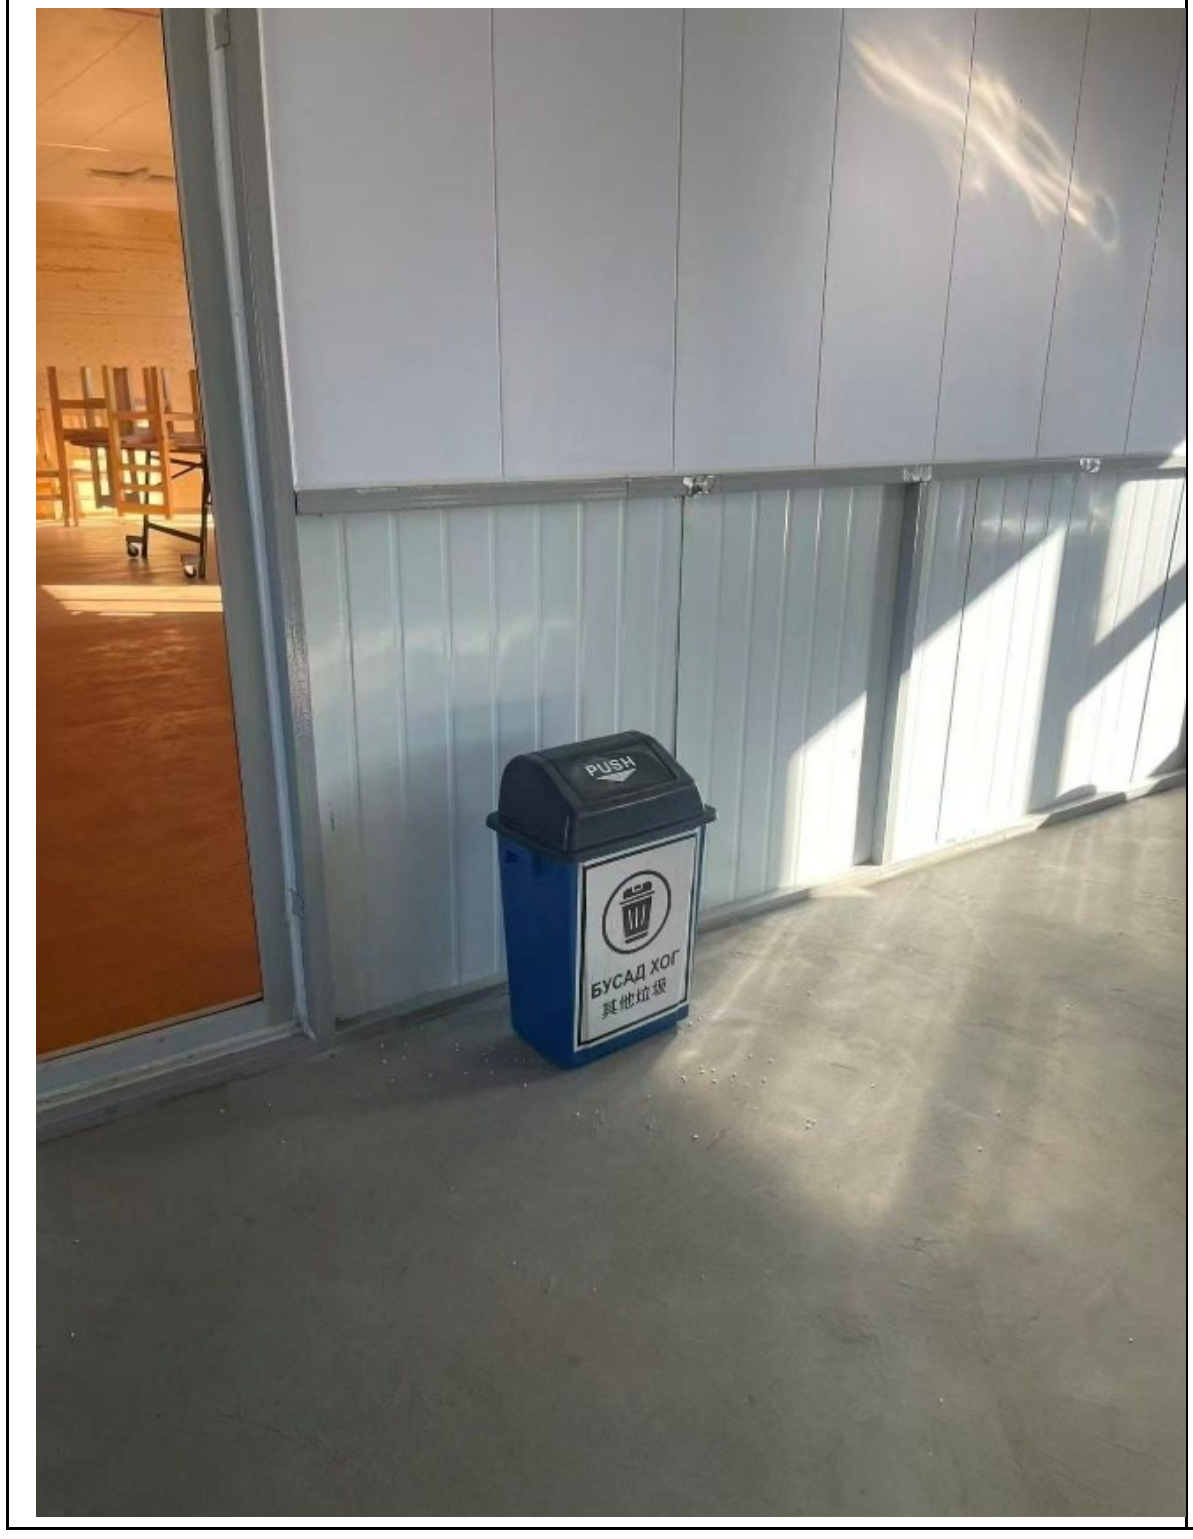

**Зураг 7. Хог хаягдлын журмын батлагдсан нүүр**

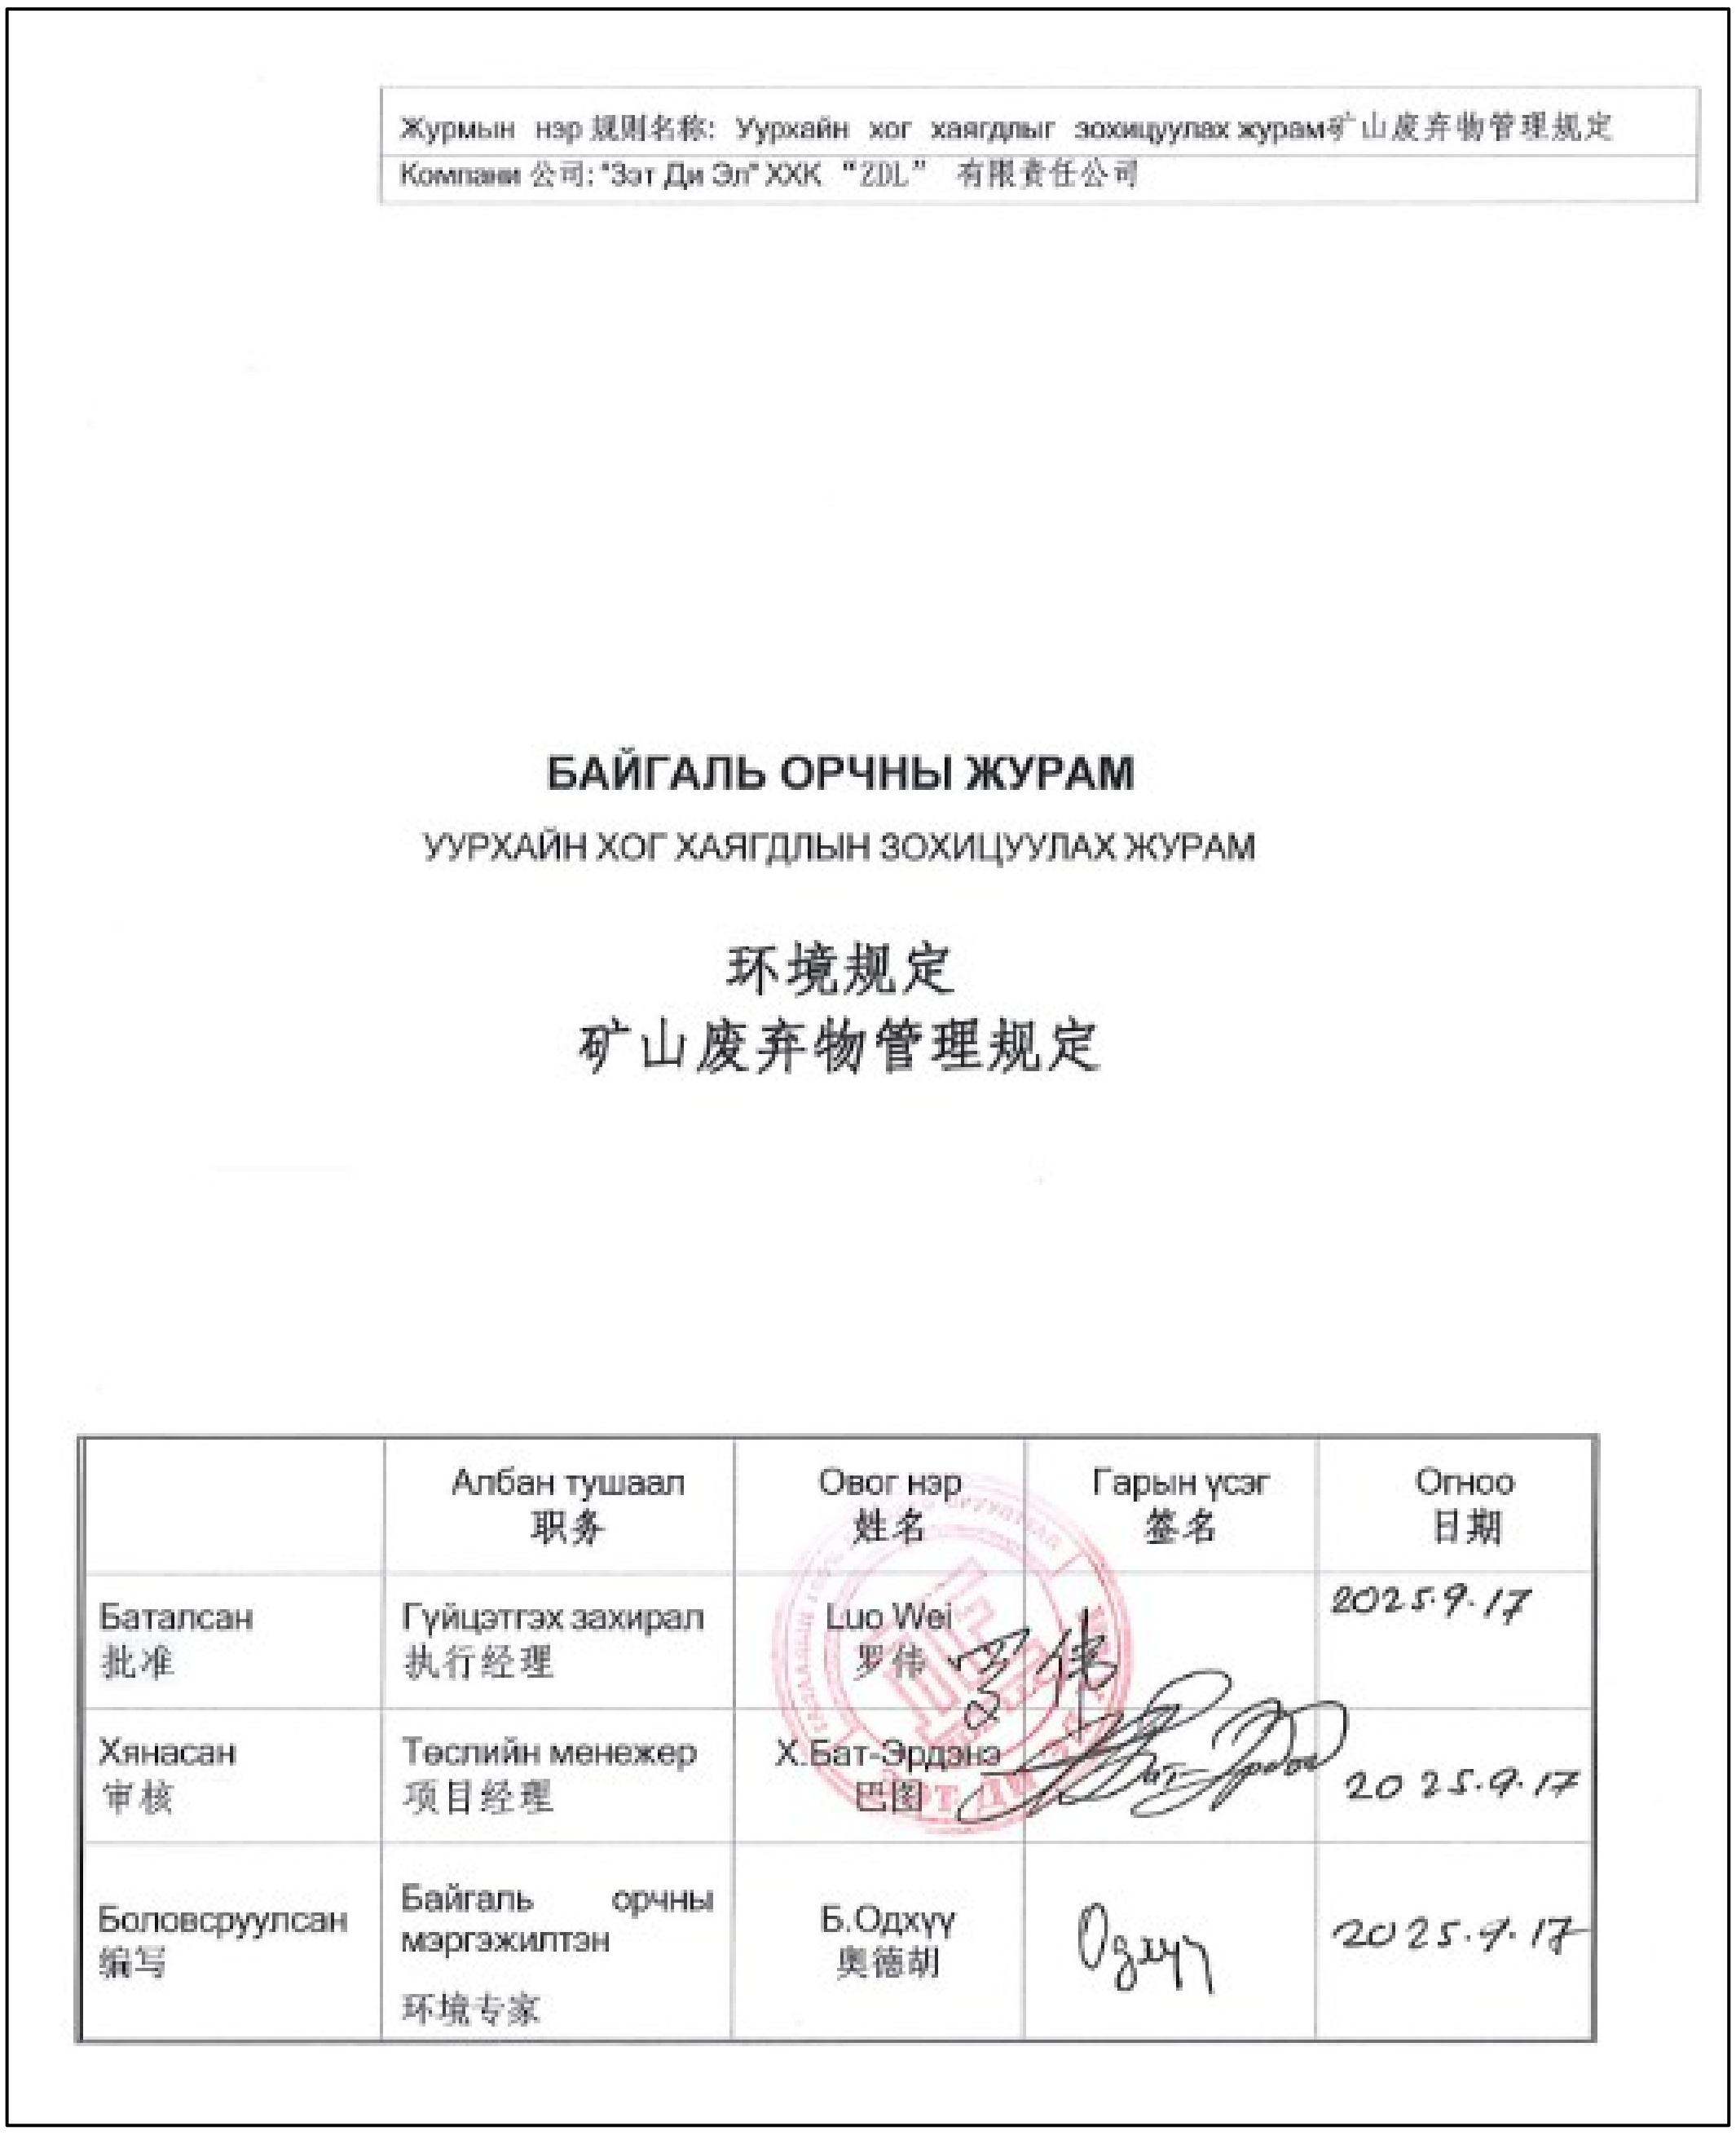

| |
|---|
| Журмын нэр 规则名称: Уурхайн хог хаягдлыг зохицуулах журам矿山废弃物管理规定 |
| Компани 公司: "Зэт Ди Эл" ХХК "ZDL" 有限责任公司 |

**БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЖУРАМ**

УУРХАЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ

环境规定
矿山废弃物管理规定

| | Албан тушаал 职务 | Овог нэр 姓名 | Гарын үсэг 签名 | Огноо 日期 |
|---|---|---|---|---|
| Баталсан 批准 | Гүйцэтгэх захирал 执行经理 | Luo Wei 罗伟 | | 2025.9.17 |
| Хянасан 审核 | Төслийн менежер 项目经理 | Х.Бат-Эрдэнэ 巴图 | | 2025.9.17 |
| Боловсруулсан 编写 | Байгаль орчны мэргэжилтэн 环境专家 | Б.Одхүү 奥德胡 | Одхүү | 2025.9.17 |

**Зураг 8. Уурхайн ойр орчмын цэвэрлэгээ**

Мөн энэ ажлын хүрээнд Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын засаг даргатай "Хог хаягдлын гэрээ"-г байгуулж ажиллаж байна. Гэрээний дагуу "Олон овоот"-ын хогийн цэгрүү зөөсөн.

**Зураг 9. Олон овоот буюу 25-р зөрлөгийн хогийн цэг дээр уурхайн хог хаягдлыг хаясан байдал**

**Хүснэгт 3. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт**

| № | Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл | Төлөвлөсөн ажил | Төлөвлөсөн төсөв /мян.төг/ | Хэрэгжилт | Биелсэн эсэх | Биелэлт төсөв /мян.төг/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахуйн | Хог хаягдлыг түр хадгалах цэгийг тохижуулах | 900.0 | Хог хаягдлыг түр хадгалах цэгийг тохижуулсан | Тийм | 900.0 |
| | | Хог хаягдлын гэрээ байгуулж, тогтмол тээвэрлүүлэх | 600.0 | Даланжаргалан сумын засаг даргатай хог хаягдлын гэрээ байгуулан ажиллаж байна. | Тийм | 1 200.0 |
| 2 | Үйлдвэрийн | Хоосон чулуулгийн овоолго үүсгэн хадгалах | УАЗ | Хоосон чулуулгийн овоолго үүсгэн хадгалсан | Тийм | УАЗ |
| 3 | Аюултай | Тэсрэх бодисын сав баглаа боодлыг гүйцэтгэгч компанид хүлээлгэн өгөх | УАЗ | Аюултай хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах тусгай зөвшөөрөл бүхий “Элемент” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. | Тийм | 2 500.0 |
| **ТӨЛӨВЛӨСӨН ТӨСӨВ /мян.төг/** | | | **1 500.0** | **БИЕЛЭЛТ ТӨСӨВ /мян.төг/** | | **4 600.0** |

| | |
|---|---|
| БАТЛАВ<br>"ЗЭТ ДИ ЭЛ"<br>ЗАХИРАЛ ВАН ЮУ ЧИ<br>20... оны ...сарын ...-ны өдөр | БАТЛАВ<br>ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН ЗАСАГ<br>ДАРГА О.БАЯРСАЙХАН<br>20... оны .... сарын ....-ны өдөр |

**ХОГ ХАЯГДЛЫН ГЭРЭЭ**

2025 оны 04сарын 28-ны өдөр №25-2DL-04-29-A

**Нэг. Нийтлэг үндэслэл**

Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Ариун цэврийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9.2, 20.1, 20.2, Даланжаргалан сумын ИТХ-н 2022оны 12 сарын 12 өдрийн 11/07 тоот тогтоолыг үндэслэв.

Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг арилгах түүнээс урьдчилан сэргийлэх ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулж эргүүлэн ашиглах, тээвэрлэх булах болон орчны ариун цэврийг тогтмол цэвэр байлгах, цэвэр эрүүл орчинд ажиллаж амьдрах орчныг бий болгоход оршино.

**Хоёр.Гэрээ байгуулагч талууд**

Нэг талаас Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын ЗДТГ-ыг төлөөлж БОБМэргэжилтэн ажилтай С.Дандарбаатар нөгөө талаас "Зэт ди эл" / Улаанбаатар хот БГ дүүрэг 1-р хороо 2-р хороолол Богд ар байр 9а байр 213 тоот улсын бүртгэлийн 9019046035 гэрчилгээтэй /"Зэт ди эл"-н дарга Ван юу чи нар харилцан тохиролцож 2025 оны 01 сарын 01-ний өдөөс 2025 оны 12 сарын 31-ийг хүртэл хугацаатайгаар энэхүү гэрээг байгуулав.

**Гурав.Төлбөр тооцсон байдал:**

Далажаргалан сумын ИТХ-ийн 2022 оны 11/07 тоот тогтоолын 1-р хавсралтад заасан 31-50 хүртэлх ажилтантай АМТ-н тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч /гэсэн заалтийг үндэслэн/ 1 сарын төлбөр 100,000 мянган төгрөг/-өөр тооцож

Ажиллах хугацаа: 12 сар
Сарын төлбөр: 100,000төг
Жилийн нийт төлбөр:1,200,000 төг

**Дөрөв. Сумын ЗДТГ эрх**

1. Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль Хог хаягдлын хууль, Ариун цэврийн тухай хуулийн дагуу хяналт тавьж ажиллах
2. Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдал гаргасаны төлбөрийг төвлөрүүлэх

**ХААН БАНК** Огноо/Date: 2025-04-30 17:25:07

**Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction Information**
Журналын /Journal No: 45263134

Системийн огноо/System Date: 2025-04-30 17:24:48

| | | | Дүн/Amount | Ханш/Rate |
|---|---|---|---|---|
| Дт | IBAN/Дансны/Картын дугаар<br>IBAN/Account/Card number<br>5037509270 | Нэр/Name<br>ЗЭТ ДИ ЭЛ | 1,200,000.00 MNT | 1.00 |
| Кт | Банкны дугаар/Branch No<br>050000<br>IBAN/Дансны/Картын дугаар<br>IBAN/Account/Card Number<br>5176120446 | Банкны нэр/Bank Name<br>ХААН БАНК<br>Нэр/Name<br>ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР | 1,200,000.00 MNT | 1.00 |

Гүйлгээний утга/Transaction description:
2250406852920; 5297591; 99999219

| | |
|---|---|
| **БАТЛАВ:** 审批： | **БАТЛАВ:** 审批： |
| **"ЭЛЕМЕНТ" ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ** | **"ЗЭТ ДИ ЭЛ" ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ** |
| "ELEMENT" 有限责任公司的执行董事 | "ZDL" 有限责任公司 |
| **/Б.ЭНХБАДРАЛ B.Enkhbadral/** | **/ LUO WEI 罗伟/** |

**ХИМИЙН ХОРТОЙ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ХАЯГДАЛ ТЭЭВЭРЛЭХ, УСТГАХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ**

化学有毒及危险物质废弃物运输和处置合同

№ ХБ-25/...176...

2025 оны 09-р сарын 18-ны өдөр 2025 年 9 月 18 日 — 合同编号 — Улаанбаатар хот 乌兰巴托市

**НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

一、总则

1. Нэг талаас "**Элемент**" ХХК РД: /2100061/ /цаашид "**Гүйцэтгэгч**" гэх/ түүнийг төлөөлж, Ерөнхий менежер албан тушаалтай Б.Ундармаа, нөгөө талаас /цаашид "**Захиалагч**" гэх/-ыг "**Зэт Ди Эл**" ХХК РД:/5297591/ түүнийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал албан тушаалтай Luo Wei нар харилцан тохиролцож, Монгол Улсын Иргэний хууль, Хог хаягдлын тухай хууль, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль, Байгаль орчны тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Монгол улсын шадар сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав.

一方为"ELEMENT"有限责任公司，注册号：/2100061/（以下简称"承包方"），由总经理 B. Undarmaa 代表；另一方为"ZDl"有限责任公司，注册号：/5297591/（以下简称"发包方"），由执行董事罗伟代表。

双方根据《蒙古国民法典》、《废弃物法》、《化学有毒及危险物质法》、《环境法》、《职业安全与卫生法》，以及由蒙古国副总理、环境与旅游部长、卫生部长联合颁布的《化学有毒及危险物质储存、运输、使用和处置规程》及其他相关法律法规，经协商一致，订立本合同。

1.1. Энэхүү гэрээний зорилго нь Гүйцэтгэгч тал нь гэрээнд заасан хугацаанд химийн аюултай хог хаягдлыг зориулалтын газарлуу ачиж тээвэрлэх, зориулалтын шатаах зууханд химийн бодисын аюултай хог хаягдлыг устгах, захиалагч төлбөрийг төлөх болон байгууллага хоорондын ажлын уялдааг сайжруулж хариуцлагыг дээшлүүлж, хамтран ажиллахад оршино.
本合同的目的在于：承包方在合同约定期限内，将危险化学废弃物运输至指定地点，并在专用焚烧炉中处置危险化学废弃物，将发包方支付相关费用。同时，通过本合同改善双方机构间的工作协调，提高责任意识，并开展合作。

1.2. Дараах баримт бичиг гэрээний хавсралт байх бөгөөд гэрээний салшгүй хэсэг болно.
下列文件作为本合同的附件，并构成本合同不可分割的一部分。

1.2.1 Устгал хийх хог хаягдлын мэдээлэл, үнэ /Хавсралт №1/
拟处置废弃物的信息及价格（附件一）；

1.2.2 Аюултай хог хаягдлын дагалдах бичиг

## ЕС. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

2025 онд байгаль орчны хяналт шинжилгээний ажлын хүрээнд агаар орчин, хөрсөн бүрхэвч, усан орчноос дээж авахаар төлөвлөсөн болно. Төлөвлөгөөний дагуу байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага болох “Мейк грийн” ХХК-тай гэрээ байгуулан мониторингийн ажлыг гүйцэтгэлээ.

| № | Хяналт шинжилгээний үзүүлэлт | Төлөвлөсөн төсөв /мян.төг/ | Хэрэгжилт | Биелсэн эсэх | Биелэлт төсөв /мян.төг/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Агаар | $SO_2$, $NO_2$, CO, Тоос, | 2 500.0 | “Мейк грийн” ХХК-тай гэрээ байгуулан мониторингийн ажлыг гүйцэтгэлээ. | Тийм | 6 600.0 |
| | Агаар бохирдуулагч бодисуудын ялгарлын хэмжээ | | | | |
| Дуу шуугиан | Уурхайн талбай, тоног төхөөрөмж, ажлын байранд 3 цэгт | 1 000.0 | | | |
| | Авто тээврийн зам дагуу | | | | |
| Хөрсөн бүрхэвч | Хөрсний нефть бүтээгдэхүүний бохирдол | 1 000.0 | | | |
| Усан орчин | Унд ахуйн зориулалтаар ашиглах усны pH, TDS, нийт хатуулаг, исэлдэх чанар, Ca, Mg, Na, K, $NH_4$, нийт Fe, $HCO_3$, Cl, $SO_4$, $NO_2$, $NO_3$, амт, үнэр, өнгө, тунгалаг чанар, эрдэсжилт г.м | 1 000.0 | | | |
| **ТӨЛӨВЛӨСӨН ТӨСӨВ /МЯН.ТӨГ/** | | **5 500.0** | **БИЕЛЭЛТ ТӨСӨВ /МЯН.ТӨГ/** | | **6 600.0** |

## АРАВ. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШААРДЛАГААР БИЕЛҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

Аймаг, сум, нийслэлийн Засаг даргын шаардлагаар биелүүлсэн арга хэмжээний тухайд: Монгол Улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42.1 заалт, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 179-р тогтоолын дагуу Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын засаг даргатай 2025 оны 02-р сарын 12-ны өдрийн 01 тоот хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулж ажилласан.

2025 оны 02-р сард малчдын өвөлжилтөд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 1200 боодол өвс тараасан.

**Зураг 10. Өвс тарааж буй зураг**

Мөн хамтран ажиллах гэрээнд заасны дагуу сумын "Чандмань илч ОНӨ" ХХК-д 200кВт хүчин чадал бүхий иж бүрэн цахилгаан генератороор хангасан.

**Зураг 11. 200кВт хүчин чадал бүхий цахилгаан генератор**

**Зураг 12. 3 оюутны сургалтын төлбөр төлсөн баримт**

**ХААН БАНК** Огноо/Date: **2025-10-29 12:41:50**

**Шилжүүлгийн мэдээлэл**/Transaction information

Журналын /Journal No: **32348572**

Системийн огноо/System Date: **2025-10-17 17:02:43**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Дт | IBAN/Дансны/Картын дугаар<br>IBAN/Account/Card number<br>**5037509270** | Нэр/Name<br>**ЗЭТ ДИ ЭЛ** | Дүн/Amount<br>**1,648,500.00 MNT** | Ханш/Rate<br>**1.00** |
| Кт | Банкны дугаар/Branch No<br>**050000**<br>IBAN/Дансны/Картын дугаар<br>IBAN/Account/Card Number<br>**5041123756** | Банкны нэр/Bank Name<br>**ХААН БАНК**<br>Нэр/Name<br>**МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ** | **1,648,500.00 MNT** | **1.00** |

Гүйлгээний утга/Transaction description:

**ЕВ-Д.Дугармаа 25B1NUM0524 Сургалт төлбөр 5297591**

**Харилцагч танд баярлалаа.**/Thank you to our customers

ХААН БАНК

Огноо/Date: 2025-10-29 12:42:11

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information
Журналын /Journal No: 32611705

Системийн огноо/System Date: 2025-10-17 17:06:40

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Дт | IBAN/Дансны/Картын дугаар<br>IBAN/Account/Card number<br>5037509270 | Нэр/Name<br>ЗЭТ ДИ ЭЛ | Дүн/Amount<br>3,000,000.00 MNT | Ханш/Rate<br>1.00 |
| Кт | Банкны дугаар/Branch No<br>050000<br>IBAN/Дансны/Картын дугаар<br>IBAN/Account/Card Number<br>5041769834 | Банкны нэр/Bank Name<br>ХААН БАНК<br>Нэр/Name<br>МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ | 3,000,000.00 MNT | 1.00 |

Гүйлгээний утга/Transaction description:
EB-Б.Батсүрэн 25B1NUM2938 Сургалт төлбөр 5297591

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

ХААН БАНК

Огноо/Date: 2025-10-29 12:42:25

Шилжүүлгийн мэдээлэл/Transaction information
Журналын /Journal No: 32762376

Системийн огноо/System Date: 2025-10-17 17:08:58

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Дт | IBAN/Дансны/Картын дугаар<br>IBAN/Account/Card number<br>5037509270 | Нэр/Name<br>ЗЭТ ДИ ЭЛ | Дүн/Amount<br>3,400,000.00 MNT | Ханш/Rate<br>1.00 |
| Кт | Банкны дугаар/Branch No<br>050000<br>IBAN/Дансны/Картын дугаар<br>IBAN/Account/Card Number<br>5041123756 | Банкны нэр/Bank Name<br>ХААН БАНК<br>Нэр/Name<br>МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ | 3,400,000.00 MNT | 1.00 |

Гүйлгээний утга/Transaction description:
EB-О.Буянзориг24B1NUM2783 сургалт төлбөр 5297591

Харилцагч танд баярлалаа./Thank you to our customers

**Хүснэгт 4. Орон нутагт хийж гүйцэтгэсэн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт**

| № | Төлөвлөгөө | Төлөвлөсөн төсөв /мян.төг/ | Хэрэгжилт | Биелсэн эсэх | Биелэлт төсөв /мян.төг/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 200 кВт-ын хүчин чадал бүхий генератор | Тийм | 47 000.0 |
| 2 | - | - | 1200 боодол өвс | Тийм | 19 800.0 |
| 3 | - | - | Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 3 оюутны сургалтын төлбөрийг төлсөн | Тийм | 8 048.5 |
| **ТӨЛӨВЛӨСӨН ТӨСӨВ /МЯН.ТӨГ/** | | **-** | **БИЕЛЭЛТ ТӨСӨВ /МЯН.ТӨГ/** | | **74 848.5** |

# АРВАН НЭГ. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Уурхайн бэлтгэл ажлын хүрээнд ажилчдын амрах байр, халуун усанд орох газар болон бие засах газруудыг стандартын дагуу барьж байгуулж байна.

**Зураг 13. Уурхайн кемпийн гадна тал**

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

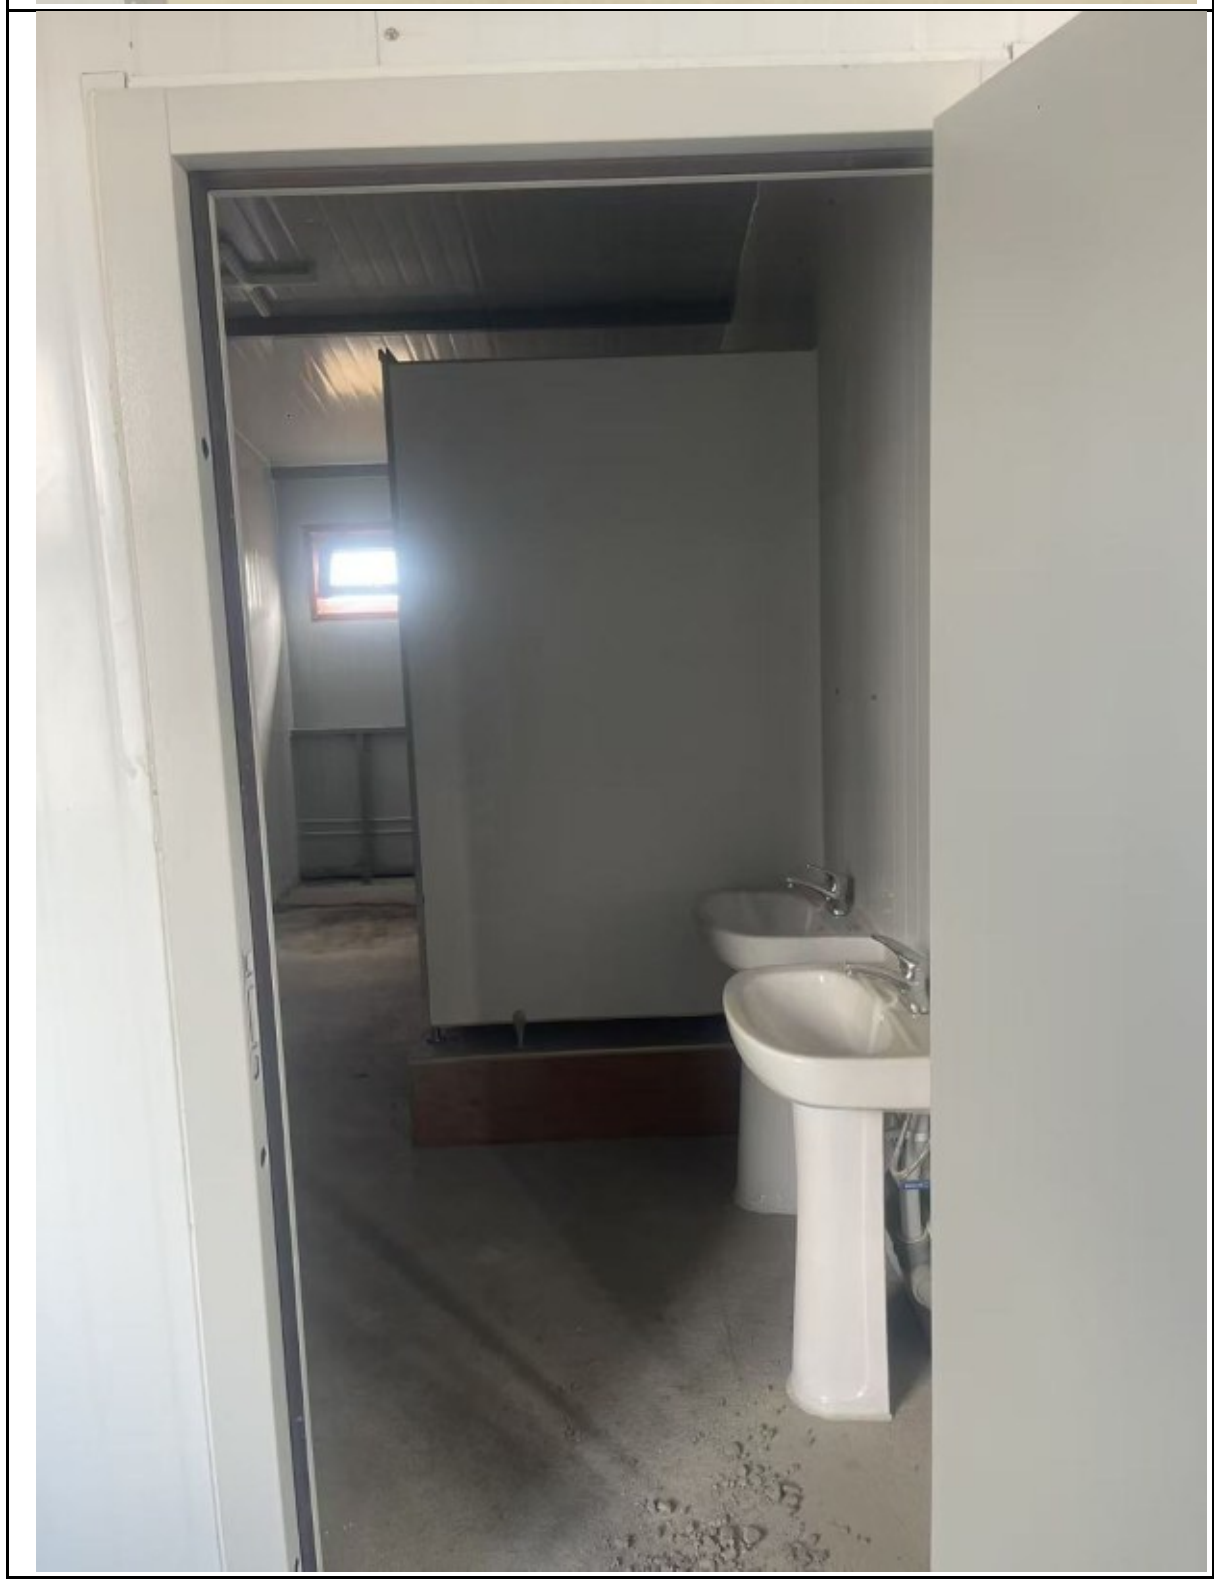

## АРВАН ХОЁР. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын Бичигт багийн иргэдийн нийтийн хурлаар Төмрийн хүдэр олборлох үйл ажиллагааны Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг Бичигт багийн иргэдэд танилцуулж, хуралд оролцсон иргэд тухайн хэлэлцүүлгийг хангалттай гэж үзсэн. Иргэдээс гарсан саналыг хуралдааны тэмдэглэлийн хамт оруулав.

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН 3 ДУГААР
БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН
ХУРАЛ

44137 Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум, Бичигт,
Утас: (705) 2-65-02

2025.06.20 № 04

танай______-ны №______-т

БАЙГАЛЬ ОРЧИН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЯАМАНД

ЗЭТ ДИ ЭЛ ХХК-ийн "Дарцагтын төмрийн ордын зүүн хойд хэсэг" MV-020815 тоот лицензтэй талбайд төмрийн хүдэр олборлох үйл ажиллагааны Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг Бичигт багийн иргэдэд танилцуулж, хуралд оролцсон иргэд тухайн хэлэлцүүлгийг хангалттай гэж үзэн иргэдээс гарсан саналыг хуралдааны тэмдэглэлийн хамт хүргүүлж байна.

ДАРГА Б.ЭРДЭНЭБАТ

**Шийдвэрлэсэн нь:**

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын Бичигт багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй "Зэт Ди эл" ХХК-ийн "Дарцагтын төмрийн ордны зүүн хойд хэсэг" төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хэлэлцэж Иргэдийн нийтийн хурлын тогтоол гаргаж Багийн дарга, Хурлын дарга, Малчидтай гэрээ байгуулах, Нөлөөллийн бүсийн айл өрхүүдийн хуучин худгуудыг засаж сайжруулахад туслах, Замын тоосжилт болон маршрутын дагуу явж тээвэрлэлт хийх замыг засаж сайжруулж байхыг "Зэт Ди эл" ХХК-д үүрэг болгов.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
Нарийн бичиг: О.Цэндсүрэн

Хянасан:
Дарга: Б.Эрдэнэбат

# АРВАН ГУРАВ. 2025 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАНГИЙН ДҮГНЭЛТ

"Зэт Ди Эл" ХХК нь Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших "Дарцагтын төмрийн ордын зүүн хойд хэсэг" нэртэй MV-020815 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд ТЭЗҮ-ийн дагуу болон 2025 оны уулын ажлын төлөвлөгөөгөөр ажиллаж чадаагүй бөгөөд эхний жил байсан тул уурхайн бэлтгэл ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно.

**Хүснэгт 5. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардлын нэгдсэн дүн**

| № | Зардлын утга | Төлөвлөгөө /мян.төг/ | Биелэлт /мян.төг/ |
|---|---|---|---|
| 1 | Сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө | 3 000.0 | 3 728.0 |
| 2 | Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө | 5 000.0 | 8 000.0 |
| 3 | Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө | 10 000.0 | 10 000.0 |
| 4 | Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговрын арга хэмжээний төлөвлөгөө | - | - |
| 5 | Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө | - | - |
| 6 | Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө | 3 600.0 | 400.0 |
| 7 | Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө | 1 500.0 | 4 600.0 |
| 8 | Удирдлага зохион байгуулалтын зардлын төлөвлөгөө | - | - |
| 9 | Орчны хяналт- шинжилгээний хөтөлбөр | 5 500.0 | 6 600.0 |
| 10 | БОМТ-г орон нутагт тайлагнах | 1 400.0 | ҮАЗ |
| Нийт | **2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нийт зардлын дүн** | **30 000.0** | 33 328.0 |
| | **Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээний биелэлт дүн** | - | **74 848.5** |
| **НИЙТ ДҮН** | | | **108 176.5** |
